






6.1. DIAGRAMA GANTT

 CONSULTORES Y EJECUTORES
CLARK S.A.C.

Oswaldo Carlos Tinco Pillaca
GERENTE GENERAL


Fabiola Virginia Jaulla Fuentes
INGENIERO CIVIL
CIP N° 113801

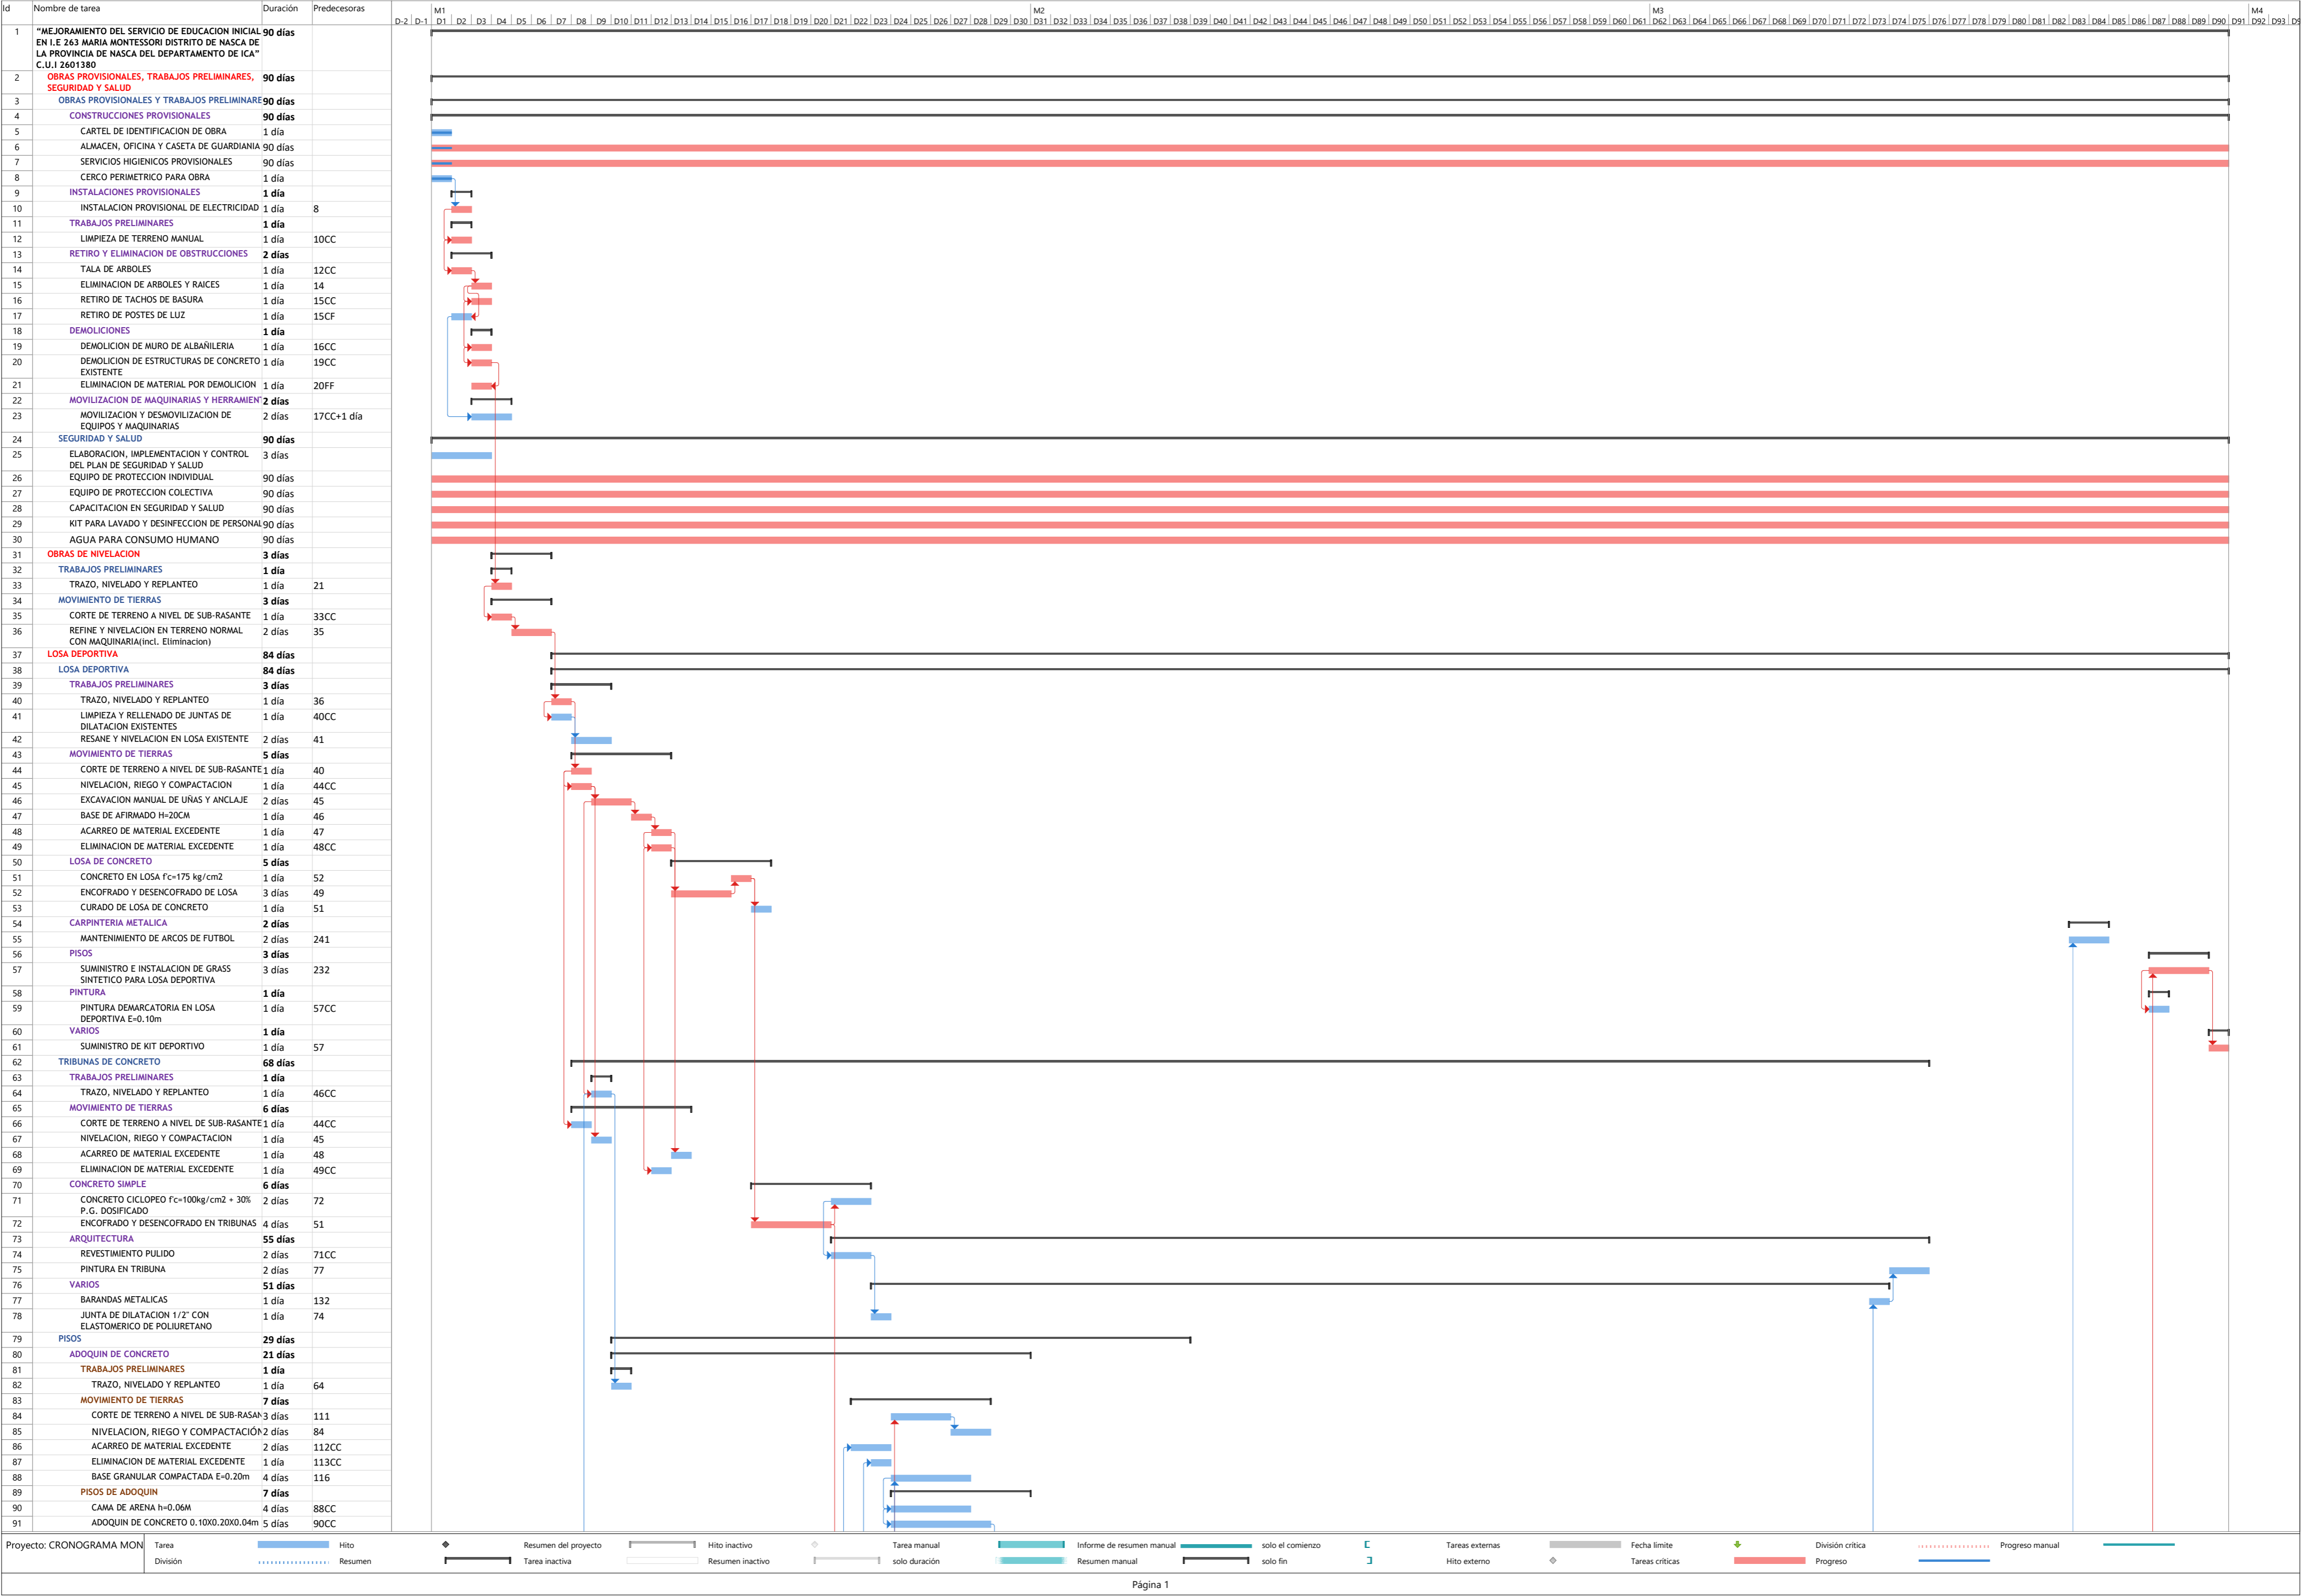


Nombre de tarea		Duración	Predecesoras	M1	M2	M3	M4
92	COMPACTACION Y LLENADO DE JUNTAS DE ADOQUIN	2 días	91				
93	PISO DE CONCRETO	9 días					
94	TRABAJOS PRELIMINARES	1 día					
95	TRAZO, NIVELADO Y REPLANTEO	1 día	92				
96	MOVIMIENTO DE TIERRAS	6 días					
97	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASA	2 días	95FF				
98	NIVELACION, RIEGO Y COMPACTACION	1 día	97				
99	EXCAVACION MANUAL DE UÑAS Y ANCLAJE	3 días	98CC				
100	BASE DE AFIRMADO H=20CM	2 días	99FF				
101	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	99FF				
102	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	101				
103	LOSA DE CONCRETO	6 días					
104	CONCRETO EN LOSA Fc=175 kg/cm2	1 día	105				
105	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA	3 días	100CC				
106	CURADO DE LOSA DE CONCRETO	2 días	104				
107	SARDINELES	16 días					
108	TRABAJOS PRELIMINARES	1 día					
109	TRAZO Y REPLANTEO	1 día	64CC				
110	MOVIMIENTO DE TIERRAS	3 días					
111	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO	3 días	72				
112	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	2 días	111FF				
113	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	112FF				
114	CONCRETO ARMADO	4 días					
115	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SARDINELES	4 días	111CC				
116	CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN SARDINELES	2 días	117FF				
117	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINEL	3 días	115CC				
118	JUNTAS DE SEPARACION 1"Ø4m	1 día	115CC				
119	MURETE	51 días					
120	TRABAJOS PRELIMINARES	1 día					
121	TRAZO Y REPLANTEO	1 día	118				
122	MOVIMIENTO DE TIERRAS	1 día					
123	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO	1 día	121FF				
124	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	123FF				
125	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	124FF				
126	CONCRETO SIMPLE	2 días					
127	CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN CIMIENTO	1 día	128				
128	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1 día	124CC				
129	ARQUITECTURA Y ACABADOS	49 días					
130	MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE CABEZA C:C:A-1:1:4 X 1.5CM	1 día	127				
131	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON C:A - 1:5	1 día	130				
132	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	2 días	160				
133	COBERTURA	59 días					
134	TRABAJOS PRELIMINARES	1 día					
135	TRAZO, NIVELADO Y REPLANTEO	1 día	131				
136	MOVIMIENTO DE TIERRAS	15 días					
137	EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL	5 días	135CC				
138	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	2 días	149				
139	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	137				
140	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	139CC				
141	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	2 días					
142	SOLADOS CONCRETO C:H 1:12, E=2"	2 días	137				
143	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	26 días					
144	ZAPATAS	5 días					
145	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60, EN ZAPATAS	2 días	142CC				
146	CONCRETO Fc=210Kg/cm2, EN ZAPATAS	3 días	145				
147	VIGA DE CIMENTACION	8 días					
148	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60, EN VIGA DE CIMENTACION	2 días	145CC				
149	CONCRETO Fc=210Kg/cm2, EN VIGAS DE CIMENTACION	3 días	146				
150	COLUMNAS	14 días					
151	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS	6 días	145CC				
152	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	8 días	149CC+1 día				
153	CONCRETO Fc=210Kg/cm2, EN COLUMNAS	4 días	152CC+3 días				
154	VIGA CANALETA	26 días					
155	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGA CANAL	6 días	151CC				
156	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	12 días	152				
157	CONCRETO Fc=210Kg/cm2, EN VIGA CANALET	7 días	156CC+3 días				
158	REVOQUES Y REVESTIMIENTO	16 días					
159	SOLAQUEO EN VIGAS Y COLUMNAS	4 días	157				
160	PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS	5 días	166				
161	COBERTURA METALICA AUTOSOPORTANTE	6 días					
162	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA METALICA AUTOPORTANTE	6 días	164CC				
163	CARPINTERIA METALICA	9 días					
164	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA METALICA	1 día	165				
165	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA METALICA H=5m	1 día	156				
166	PINTURA ESMALTE EPOXICO EN CARPINTERIA METALICA	2 días	162				
167	VARIOS	2 días					
168	CABLE DE ACERO TRENZADO Ø1/2"	2 días	241				
169	MALLA DE NYLON ALQUITRANADA N° 96	2 días	168CC				
170	PATIO DE INGRESO	23 días					
171	TRABAJOS PRELIMINARES	1 día					
172	TRAZO, NIVELADO Y REPLANTEO	1 día	174				
173	DEMOLICIONES	3 días					
174	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTE	2 días	156CC				
175	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	174				
176	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	175CC				
177	MOVIMIENTO DE TIERRAS	4 días					
178	EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL	2 días	175CC				
179	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	2 días	178				
180	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	178CC+1 día				

Proyecto: CRONOGRAMA MON

Tarea

División

<

