


Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE N° 003-2024/MPH-OEC-1			
		Fecha	6/06/2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA			
		RUC	20143137296			
		Dirección	Portal Municipal N° 44 (Parque Sucre), Ayacucho-Huamanga-Ayacucho			
		Teléfono(s)	066-317742 Anexo: 3063/3062			
		Correo electrónico	pelayon.huancahuari@munihuamanga.gob.pe			
		Persona de contacto	PELAYON HUANCAHUARI ALLCAHUAMAN			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	MULTISERVICIOS SEBASTIAN & INVERSIONES E.I.R.L.			
		RUC	20609665743			
		Dirección	P.J. SAN PEDRO MZA. F LITE. 08 - SAN JUAN BAUTISTA - AYACUCHO-TIENDA: AV. ARENALES N° 122			
		Teléfono(s)	967935795			
		Correo electrónico	leandres3085@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	CARBAJAL LEANDRES CLIMACO			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO			
		Se adjunta	Especificación es técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> <p>CPG. Pelayón Huancahuari Allcahuamán JEFE DE ABASTECIMIENTO</p> </div> <p>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</p>					


Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	06/06/2024
---	---------------------	------------

2	Cotización		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple X
			No cumple
	2.3	Monto total cotizado	S/ 44.503,50..... CUARENTA Y CUATRO MIL (...QUINIENTOS...TRES...CON 50.../100 SOLES
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4

3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	


4	 <p>SEBASTIAN MULTISERVICIOS & INVERSIONES E.I.R.L. RUC: 20609668743 Climaco carbajal leandres GERENTE GENERAL</p>
Nombre, firma y sello del proveedor	

Declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	06/06/2024
---	---------------------	------------

2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1	Descripción del objeto de la contratación
	2.2	Monto total según informe de indagación
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)
		ADQUISICION DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
		S/ 44.503.50 CUARENTA Y CUATRO MIL (...QUINIENTOS...TRES...CON 50.../100 SOLES
		- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4

3	Declaración jurada del proveedor
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>

4	 <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>
---	---

Anexo N° 2

Solicitud de cotización

1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE N° 003-2024/MPH-OEC-1
		Fecha	6/06/2024

2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUMANGA
		RUC	20143137296
		Dirección	Portal Municipal N° 44 (Parque Sucre), Ayacucho-Huamanga-Ayacucho
		Teléfono(s)	066-317742 Anexo: 3063/3062
		Correo electrónico	pelayon.huancahuari@munihuamanga.gob.pe
		Persona de contacto	PELAYON HUANCAHUARI ALLCCA HUAMAN

3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	AGUILAR LAZO KATERINE
		RUC	10478015912
		Dirección	JR. PICHINCHA N° 417 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
		Teléfono(s)	980431947
		Correo electrónico	aguilarlazokaterine4@gmail.com
		Representante o persona de contacto	AGUILAR LAZO KATERINE

4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO			
		Se adjunta	Especificación es técnicas	X	Términos de referencia	

5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					

6	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> <p>CPC. Pelayón Huancahuari Allcca Huaman JEFE DE ABASTECIMIENTO</p>					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Anexo N° 3


Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	06/06/2024
---	---------------------	------------

2	Cotización		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple X
			No cumple
	2.3	Monto total cotizado	S/ 49,496.00 Cuarenta y nueve mil (Cuatrocientos noventa) CON 00/100 SOLES
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4

3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	

4	 <p>Katherine Aguilar Lazo GERENTE</p>
Nombre, firma y sello del proveedor	

Declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	06/06/2024	
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
	2.2	Monto total según informe de indagación	S/ 49,490.00 Cuarenta y nueve mil (Cuatrocientos noventa) CON 00/100 SOLES
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	 Katherine Aguilar Lazo GERENTE		
Nombre, firma y sello del proveedor			

Anexo N° 2

Solicitud de cotización

1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE N° 003-2024/MPH-OEC-1
		Fecha	6/06/2024

2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
		RUC	20143137296
		Dirección	Portal Municipal N° 44 (Parque Sucre), Ayacucho-Huamanga-Ayacucho
		Teléfono(s)	066-317742 Anexo: 3063/3062
		Correo electrónico	pelayon.huancahuari@munihuamanga.gob.pe
		Persona de contacto	PELAYON HUANCAHUARI ALLCCA HUAMAN

3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	VILLAVEVERDE CHUMBES CRISTHOFFER ANTHONY
		RUC	10758541555
		Dirección	JR. JOSE CARLOS MARIATIGUE N° 19N CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO
		Teléfono(s)	927847254
		Correo electrónico	inversioneschumbes23@gmail.com
		Representante o persona de contacto	VILLAVEVERDE CHUMBES CRISTHOFFER ANTHONY

4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>

5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					

6	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO CPC. Pelayón Huancahuari Allccahuamán JEFE DE ABASTECIMIENTO					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					


Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	06/06/2024
---	---------------------	------------

2	Cotización		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple X
			No cumple
	2.3	Monto total cotizado	s/ 46,618.00 Cuarenta y seis mil seiscientos dieciocho CON 00/100 SOLES
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4

3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	


4	
Nombre, firma y sello del proveedor	

Declaración jurada del proveedor


1	Fecha del documento	06/06/2024
---	---------------------	------------

2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
	2.2	Monto total según informe de indagación	S/ 46,618.00 Cuarenta y seis mil (Seiscientos dieciocho) CON 00/100 SOLES
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4

3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	

4	 <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>
---	--

Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe		COMPRE N° 003-2024/MPH-OEC-1	
		Fecha de informe		5/06/2024	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO		
3	Antecedentes La Unidad de Abastecimiento, a través de la Subgerencia de Obras, tiene la necesidad de adquirir PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO, que brinde las condiciones de seguridad a la poblacion de zona y al predio de la infraestructura e instalacion del relleno sanitario buscnado elevar los niveles de eficiencia en el tratamiento de residuos solidos.				
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general				¿Cumple con la condición?
					Sí Cumple
	a. Disponibilidad inmediata				X
	De conformidad a las indagaciones de mercado se obtiene la información de que existe stock suficiente para la atención de manera inmediata, en concordancia a lo estipulado en la DIRECTIVA N° 022-2016-OSCE/CD - DISPOSICIONES APLICABLES A LA COMPARACIÓN DE PRECIOS.				
	b. Fáciles de obtener en el mercado				X
	Existe en el mercado pluralidad de postores dedicados a la venta de los bienes materia de contratación y están dispuestos a realizar la atención correspondiente.				
	c. Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado				X
	Se comercializan bajo una oferta estándar establecida en el mercado, debido a que, los bienes a adquirirse son de fabricación estándar a nivel nacional e internacional; asimismo, su comercialización es con precios estándar establecidos por el mercado.				
d. Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante				X	
Los bienes a adquirirse son de fabricación estándar a nivel nacional e internacional y no se requiere de ninguna modificación del o los productos, asimismo, según el estudio de mercado los bienes a adquirirse ya existen en el mercado como un producto final y listo para su empleo.					
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones NINGUNA.				
6	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> <p>CPC. Pelayón Huancabuan Aticcahuamán JEFE DE ABASTECIMIENTO</p> </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000002580
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO
PROVINCIA : 01 HUAMANGA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

MES : JUNIO
FECHA DE DOCUMENTO: 03/06/2024
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : CCMN-004147: ADQUISICION DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO

FECHA APROBACION: 04/06/2024
ESTADO CERTIFICACION: APROBADO

Nº DE DOCUMENTO: 002146

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRXCT/AVO BFN. DIV F GRPF META FFRB CGTTGSGSGDESIESPD	MONTO
0001 INICIAL	
0036 2566182 4000199 17 055 0124 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	44,503.50
0113 MEJORAMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	44,503.50
5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	44,503.50
07	
6 GASTOS DE CAPITAL	44,503.50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,503.50
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	44,503.50
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	44,503.50
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	44,503.50
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	44,503.50
TOTAL	44,503.50
TOTAL CERTIFICACION	44,503.50
TOTAL NOTA	44,503.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
C.P.C. Marela Cangana Gutiérrez
Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

CUADRO COMPARATIVO (BIENES)													
COMPARACION DE PRECIOS				Huamanga, 30 de mayo de 2024									
ADQUISICION DE PLACA DE CONCRETO PREFABRICADO PARA CERCO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO													
REFERENCIA													
AREA USUARIA:													
INFORME N° 803-2024-MPH/31.35													
SUB GERENCIA DE OBRAS-RESIDENTE DE OBRA													

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CPC: Delvyn Huanchen-Alliccahuamán
RESP. DE ADQUISICIONES (8)

OFICINA : P.J. SAN PEDRO MZA F LTE DB - SAN JUAN BAUTISTA - AYACUCHO- TIENDA : AV. ARENALES N° 122
leandres3085@gmail.com - Telefono 066 784683 - Cel. 967935795

FECHA : 30/05/2024

SEÑORES : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

RUC N°

20143137296

DIRECCION : PORTAL MUNICIPAL N° 44 - AYACUCHO - HUAMANGA- AYACUCHO

REF.

CANT.	U.M	DESCRIPCION	MARCA	P.U	P.TOTAL
538	UNID	PLACAS DE 2.30 X 0.04 X 0.50 m CON CEMENTO TIPO I f° c= 210 Kg/cm2	NACIONAL	62.00	33,356.00
91	UNID	POSTE 0.14X 0.14 X 3.70m CON CEMENTO TIPO I f° c=210 Kg/cm2	NACIONAL	122.50	11,147.50
TOTAL S/.					44,503.50

PLAZO DE ENTREGA : 05 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA O/C

FORMA DE PAGO : CCI N° 003-440-003004329703-52 BANCO INTERBANK

LUGAR DE ENTREGA : ALMACENES DE LA OBRA EN MENSION

VALIDEZ DE LA OFERTA : 2 DIAS CALENDARIOS


SEBASTIAN
MULTISERVICIOS & INVERSIONES E.I.R.L
RUC: 20609665743
Gimac y Carbajal leandres
GERENTE GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CPC Pelayón Huancahuan Alliccahuaman
RESP. DE ADQUISICIONES (e)


CERCO PREFABRICADO

TIPO PLACA H= 3.0 mt


MEDIDAS GENERALES

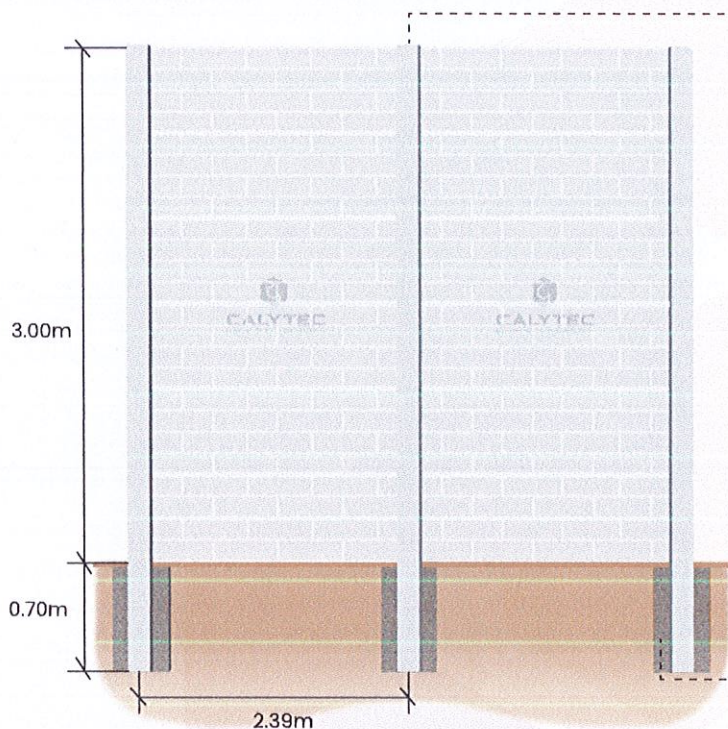

CORTE A-A

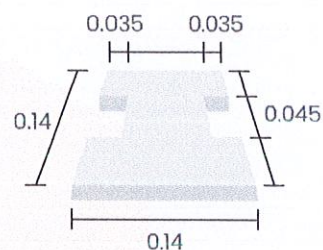


MEDIDA CIMENTO

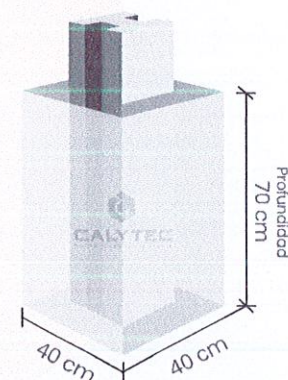

MÁS DISEÑOS

Modelo Liso



Modelo Piedra



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Cerco prefabricado de concreto, permite asegurar el terreno de una forma más **segura y rápida**. Elaborado con **materiales de alta calidad** garantizando la **durabilidad** del producto.
Modelos: A pedido, Tipo ladrillo, Liso y Piedra.

SEBASTIAN
MULTISERVICIOS e INVERSIONES S.R.L.
RUC: 20800665743


DETALLE DEL ACERO EN POSTE

Vista dentro del poste

Acero de 6mm

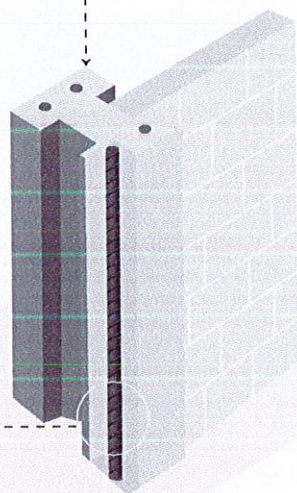

MEDIDA DE ACERO

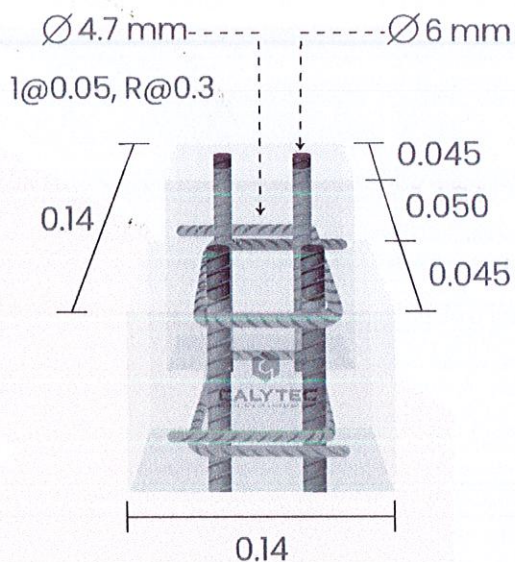

@: Separación de varilla a varilla Ø: Circunferencia

DETALLE DEL ACERO EN PLACA


Vista dentro de la placa

Uniones Soldadas

Ø 4.7 mm @ 0.20m

Vista 3/4

Espesor placa

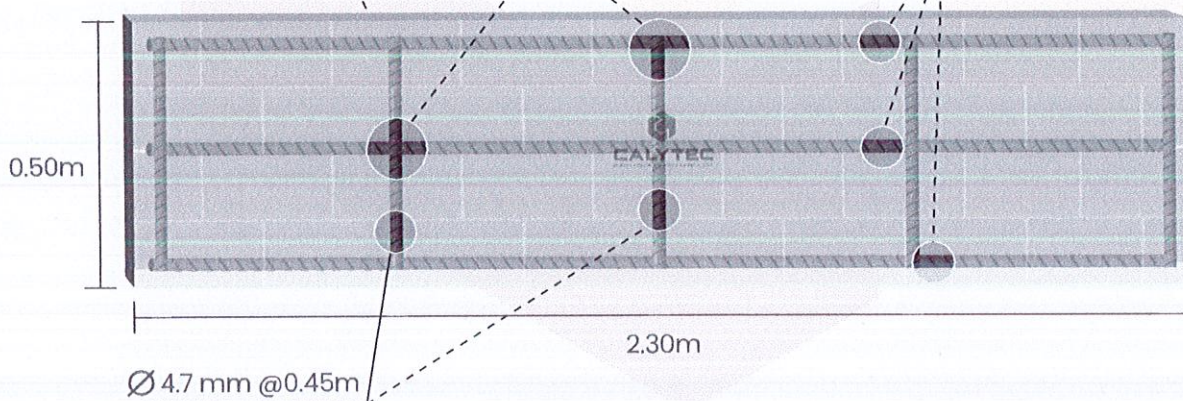

4 cm

PLACA

0.50x2.30x0.04 m
Acero de 4.7 mm

Peso
115.00kg

POSTE

0.14x0.14x3.70 m
Acero de 6 mm

Peso
150.00kg

RESISTENCIA CONCRETO F'c

210kg/cm² (Cemento tipo I)

SEBASTIAN Semipulido
MONTAÑES S.A. S. R. L. Protachado
RUC: 2150055713
Calle 10 de Agosto 1000, Lima 1, Perú



RUC N° 20609665743

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****MULTISERVICIOS SEBASTIAN & INVERSIONES E.I.R.L.**

Domiciliado en: MZA. F LOTE. 8 PSJ. SAN PEDRO (COSTADO DE NOTARIA ORE GAMBOA)
AYACUCHO - HUAMANGA - SAN JUAN BAUTISTA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 01/07/2022

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 01/07/2022

FECHA IMPRESIÓN: 28/05/2024**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20609665743 - MULTISERVICIOS SEBASTIAN & INVERSIONES E.I.R.L.

Tipo Contribuyente:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

27/06/2022

Fecha de Inicio de Actividades:

27/06/2022

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

MZA. F LOTE. 8 PSJ. SAN PEDRO (COSTADO DE NOTARIA ORE GAMBOA) AYACUCHO - HUAMANGA - SAN JUAN BAUTISTA

Sistema Emisión de Comprobante:

COMPUTARIZADO

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Secundaria 1 - 2395 - FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO

Secundaria 2 - 4652 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNICACIONES

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

NINGUNO

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 02/08/2022

BOLETA PORTAL DESDE 13/10/2022

Emisor electrónico desde:

25/07/2022

Comprobantes Electrónicos:

GUIA (desde 25/07/2022),FACTURA (desde 02/08/2022),BOLETA (desde 13/10/2022)

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 28/05/2024 6:08

© 1997 - 2024 SUNAT Derechos Reservados



Jr. Pichincha N° 417 Ayacucho - Huamanga - Ayacucho
E- aguilarlazokaterine4@gmail.com
Cel. 980431947

PROFORMA	
RUC 10478015912	
N°	08992


FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	05	2024

CLIENTE:
SEÑORES : Municipalidad Provincial de Huamanga
RUC : 20143137296
DIRECCION : Portal Municipal N° 44 - Ayacucho- Huamanga - Ayacucho

N°	CANT	U.M	DESCRIPCION	MARCA	P.U	P.TOTAL
1	538	UNID	PLACAS DE 2.30 X 0.04 X 0.50 m CON CEMENTO TIPO I f' c= 210 Kg/cm2	NACIONAL	70.00	37,660.00
	91	UNID	POSTE 0.14X 0.14 X 3.70m CON CEMENTO TIPO I f' c =210 Kg/cm2	NACIONAL	130.00	11,830.00
					TOTAL SI.	49,490.00
CONDICIONES DE VENTA						

PLAZO DE ENTREGA : 05 Días calendarios a partir del día siguiente de la notificación de la O/C
FORMA DE PAGO : CCI N° 003-44001336264706454 Banco Interbank
LUGAR DE ENTREGA : Almacen de la Obra


Katherine Aguilar Lazo
DIRECCION


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CPC Pelayón Huacachuari Alliccahuamán
RESP. DE ADQUISICIONES (e)



RUC N° 10478015912

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

AGUILAR LAZO KATERINE

Domiciliado en: AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 24/05/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 24/05/2017

FECHA IMPRESIÓN: 09/05/2024**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

[Retornar](#)[Imprimir](#)

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

10478015912 - AGUILAR LAZO KATERINE

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 47801591 - AGUILAR LAZO, KATERINE

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

18/04/2023

Fecha de Inicio de Actividades:

18/04/2023

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

-

Sistema Emisión de Comprobante:

COMPUTARIZADO

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Secundaria 1 - 4652 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNICACIONES

Secundaria 2 - 2395 - FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

FACTURA

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 20/04/2023

BOLETA PORTAL DESDE 22/05/2023

RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 16/03/2021

Emisor electrónico desde:

16/03/2021

Comprobantes Electrónicos:

RECIBO POR HONORARIO (desde 16/03/2021),FACTURA (desde 20/04/2023),BOLETA (desde 22/05/2023)

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 28/05/2024 6:12

© 1997 - 2024 SUNAT Derechos Reservados



Venta de Materiales de limpieza Construcción y Ferreteria en General
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR
Venta de Muebles de Melamina y Plasteria en General, Insumos Agrícolas, Útiles de Escritorio en
General, Venta de Equipos de Computo y Electronicos en General, Prestación de Servicios, Alquiler de
Maquinarias Menores y Otros.

PROFORMA	
RUC 10758541555	
N°	09856

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	05	2024

JR. JOSE CARLOS MARIATIGUE N° 19N CARMEN ALTO - HUAMANGA- AYACUCHO
inversioneschumbes23@gmail.com - Cel. 927847254

SEÑORES : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
RUC : 20143137296
DIRECCION : PORTAL MUNICIPAL N° 44 - HUAMANGA

CODICIONES DE VENTA
PLAZO DE ENTREGA : 05 DIAS CALENDARIOS

CANT	U.M	DESCRIPCION	MARCA	P.U	P.TOTAL
538	UNID	PLACAS DE 2.30 X 0.04 X 0.50 m CON CEMENTO TIPO I f° c= 210 Kg/cm2	NACIONAL	65.00	34,970.00
91	UNID	POSTE 0.14X 0.14 X 3.70m CON CEMENTO TIPO I f° c=210 Kg/cm2	NACIONAL	128.00	11,648.00
					46,618.00


INVERSIONES ANTHONY
RUC 10758541555
Crisopher Anthony Villaverde Chumbes
GERENTE

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CPC Pelayón Huancayuan Alliccahuamán
RES. DE ADQUISICIONES (a)



RUC N° 10758541555

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****VILLAVERDE CHUMBES CRISTHOFER ANTHONY**

Domiciliado en: AYACUCHO - HUAMANGA - CARMEN ALTO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 13/04/2023

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 13/04/2023

FECHA IMPRESIÓN: 28/05/2024**Nota:**Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

10758541555 - VILLAVERDE CHUMBES CRISTHOFER ANTHONY

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 75854155 - VILLAVERDE CHUMBES, CRISTHOFER ANTHONY

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

11/04/2023

Fecha de Inicio de Actividades:

11/04/2023

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

-

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4652 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNICACIONES

Secundaria 1 - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Secundaria 2 - 2395 - FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
"CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA - LEY N° 24682"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Firmado digitalmente por:
CORDERO PALOMINO EMERSON FIR
43153692 hard
SUB GERENTE
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/05/2024 15:42:38-0500



INFORME N° 000803-2024-MPH/31.35 [2428058.002]


A : DEYVIN VILCAPOMA MENDOZA
GERENTE
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

DE : EMERSON CORDERO PALOMINO
SUB GERENTE
SUBGERENCIA DE OBRAS

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO.

REFERENCIA : A) INFORME N°054-2024-MPH/31.35-PCWR (2428058.001)
B) CUI 2566182: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

FECHA : Ayacucho, 10 de Mayo del 2024




Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente, y en atención al documento de referencia, remitirle el requerimiento de **ADQUISICION DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO**, para la obra de la referencia, a fin de dar cumplimiento a las actividades programadas para dicha meta, la adquisición estará afecto a la siguiente cadena funcional programática.

PROYECTO	"CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"
FUNCIÓN	17 Ambiente
DIVISIÓN FUNC.	055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental
GRUPO FUNC.	0124 Gestión de los Residuos Sólidos
FINALIDAD	0026881 Mejoramiento de Relleno Sanitario Municipal
SEC. FUNC.	0113
FTE. FTO	07 Foncomun - Fideicomiso
TIPO DE RECURSO	"0"
ESPECIFICA DE GASTOS	26.23. 99 4

Se adjunta al presente:

- Especificaciones Técnicas-EETT
- Anexo N°05 Cuadro Multianual De Necesidades N°0000002319
- Resolución de aprobación
- Marco presupuestal
- Cuadro de Presupuesto Analítico



Por lo expuesto, le adjunto copia del presupuesto aprobado y relación de ítems, para que por intermedio de su despacho se remita a la Unidad de Abastecimiento, para la contratación respectiva.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM, la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM y el Art. 36 del D.S. 029-2021-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web Url: <http://sgd.munihuamanga.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php> e ingresando el siguiente Código de Verificación Digital: 2428058.002.42830150380

Página 1/2





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
"CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA - LEY N° 24682"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Firmado electrónicamente por:
PEREZ CONTRERAS WILMER RICARDO
46031718
RESIDENTE DE OBRA
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/05/2024 14:41:05



INFORME N° 000054-2024-MPH/31.35-PCWR [2428058.001]



A : EMERSON CORDERO PALOMINO
SUB GERENTE
SUBGERENCIA DE OBRAS

DE : WILMER RICARDO PEREZ CONTRERAS
RESIDENTE DE OBRA
SUBGERENCIA DE OBRAS

ASUNTO : SOLICITO LA ADQUISICIÓN DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO.

REFERENCIA : A) MARCO PRESUPUESTAL 2024 – META 113 CUI:2566182
"CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO ; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".
B) RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO N°46 -2024-MPH/CRAET.

FECHA : Ayacucho, 09 de Mayo del 2024

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y solicitarle la **ADQUISICIÓN DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO** para la obra: "CUI: 2566182 "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO ; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO". META – 0113,

La adquisicion de **PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO**, estará afecto a la siguiente cadena funcional programática.

Acción de INV.	36 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
PROYECTO	2566182 "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".
FUNCION	4000199 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS.
Función	17 AMBIENTE
División Funcional	055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental.
Grupo Funcional	00124 Gestión de los Residuos Sólidos.
Sec.Func. /Meta	0113
Finalidad	0026881 MEJORAMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL
Especifica de gastos	26.23.99.4
Rubro de financiamiento	07 FONCOMUN – FIDEICOMISO
Tipo de recursos	0

Por lo expuesto, le adjunto al presente los TDR, para que por intermedio de su despacho se remita a la Unidad de Abastecimiento, para la adquisicion respectiva.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM, la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM y el Art. 36 del D.S. 029-2021-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web Url: <http://sgd.munihuamanga.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php> e ingresando el siguiente Código de Verificación Digital: 2428058.001.42738039860

Página 1/2





Atentamente,

Firmado Electrónicamente por:
WILMER RICARDO PEREZ CONTRERAS
RESIDENTE DE OBRA
SUBGERENCIA DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Christian Edison Perez Poma
Reg. CIR. N° 204287
SUPERVISOR DE OBRA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA LA ADQUISICIÓN DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO., PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO".

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

LA ADQUISICIÓN DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO es para el proyecto "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO".

2. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente proceso busca construir cerco perimétrico que brinde las condiciones de seguridad a la población de la zona y al predio de la infraestructura e instalaciones del relleno sanitario buscando elevar los niveles de eficiencia en el tratamiento de los residuos sólidos.

3. ANTECEDENTES

Que, mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°263-2013/DSB/DIGESA/SA, de fecha 10 de setiembre del 2013, ha sido aprobado el Cerco perimétrico como el instrumento de gestión ambiental.

Que, la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, solicita la elaboración de la ficha técnica y expediente técnico para la construcción del cerco perimétrico del relleno sanitario, ubicado en la localidad de Lindipampa de la Comunidad de Uchuypampa del distrito de Tambillo, provincia de Huamanga – Ayacucho.

Que, mediante RESOLUCION DE LA COMISION DE REVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS N°056-2023-MPH/CRAET, de fecha 07 de junio del 2023 se aprueba el expediente técnico matriz reformulado IOARR del proyecto "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" **S/. 533,864.77** (Quinientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro con 77/100 Soles).

Que, mediante RESOLUCION DE LA COMISION DE REVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS N°059-2023-MPH/CRAET, de fecha 13 de junio del 2023, se aprueba el cuadro de presupuesto analítico por habilitación presupuestal del proyecto "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" por el monto de **S/. 533,864.77** (Quinientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro con 77/100 Soles).

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°211-2024-MPH/GM, de fecha 18 de abril del 2024, se aprueba el Adicional de Obra N°02(partidas nuevas) y Deductivo Vinculante N°01 del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Wilfredo Ricardo Pérez Contreras
Reg. CIP. N° 183364
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Christian Edison Verex Poma
Reg. CIP. N° 204207
SUPERVISOR DE OBRA

UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", por un monto neto de **S/. 253,457.70** Soles.

Que, mediante RESOLUCION DE LA COMISION DE REVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS N°046 -2024-MPH/CRAET, de fecha 02 de mayo del 2024, se aprueba el cuadro de presupuesto analítico por habilitación presupuestal del proyecto "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" por el monto de **S/. 459,398.55** (cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos noventa y ocho con 55/100 Soles).

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:

4.1. Objetivo general

Contar con un proveedor para la **ADQUISICIÓN DE PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO**; para realizar la construcción del cerco del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MED
LAS PLACA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO PARA CERCO DEBE CONTENER.		
❖ Placas de 2.30 x 0.04 x 0.50m con cemento Tipo I f'c=210 kg/cm2.	538	UNIDADES
❖ Postes 0.14 x 0.14 x 3.70 m con cemento Tipo I f'c=210 kg/cm2.	91	UNIDADES

4.2. Objetivos específicos

- ✓ Disminución del riesgo de contaminación ambiental.
- ✓ Implementación de mecanismo de desarrollo limpio.
- ✓ Incremento de la calidad de vida.
- ✓ Construcción de cerco perimetrico.
- ✓ Protección del relleno sanitario.

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA

- ❖ El alcance del suministro del cerco prefabricado tipo placa de concreto .
- ❖ Los componentes pre fabricado del cerco perimétrico tipo placa de concreto deberá contener como mínimo las siguientes características:

Descripción del poste de concreto prefabricado

Medidas: 0.14mx0.14mx3.70m

Material: concreto armado (cemento Portland tipo I, acero de 4.7mm y 6.0mm)

Resistencia: f'c=210 kg/cm2



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Wilmer Ricardo Pérez Contreras
Reg. CIP. N° 483984
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Christian Edison Pérez Poma
Reg. CIP. N° 204207
SUPERVISOR DE OBRA

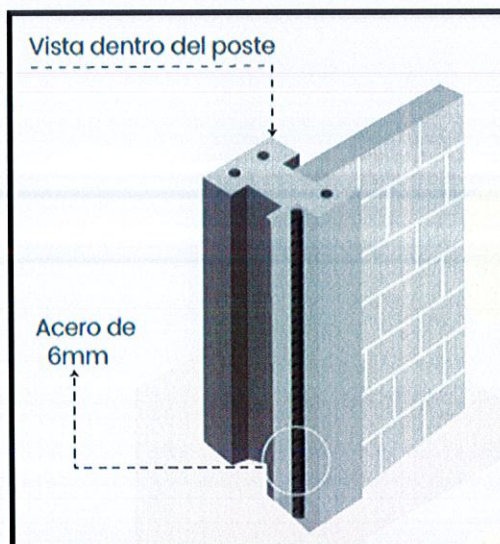


Imagen 1: Detalle de Poste Prefabricado

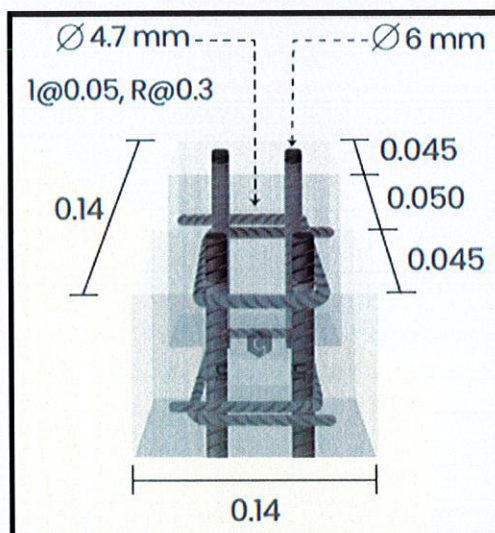


Imagen 2: Detalle de Acero de Poste Prefabricado

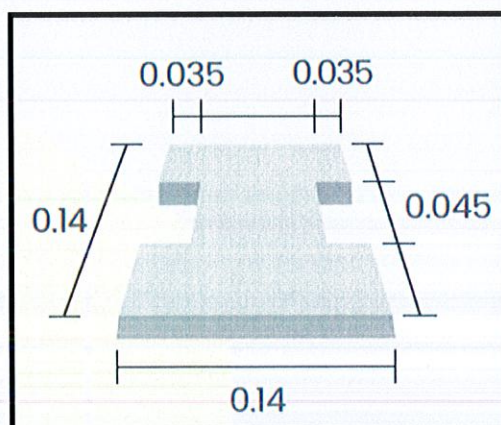


Imagen 3: Medidas en Planta de Poste Prefabricado

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Wilmer Rizarado Perez Contreras
Reg. CIP. N° 183994
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Christian Edison Perez Poma
Reg. CIP. N° 294297
SUPERVISOR DE OBRA

Descripción de placa de concreto prefabricado

Características: concreto con acabado liso

Medidas: 0.5m x2.30m, e(espesor)= 4cm

Material: concreto armado (cemento Portland tipo I, acero de 4.7mm)

Resistencia: $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$




Imagen 4: Espesor de Placas Prefabricadas.

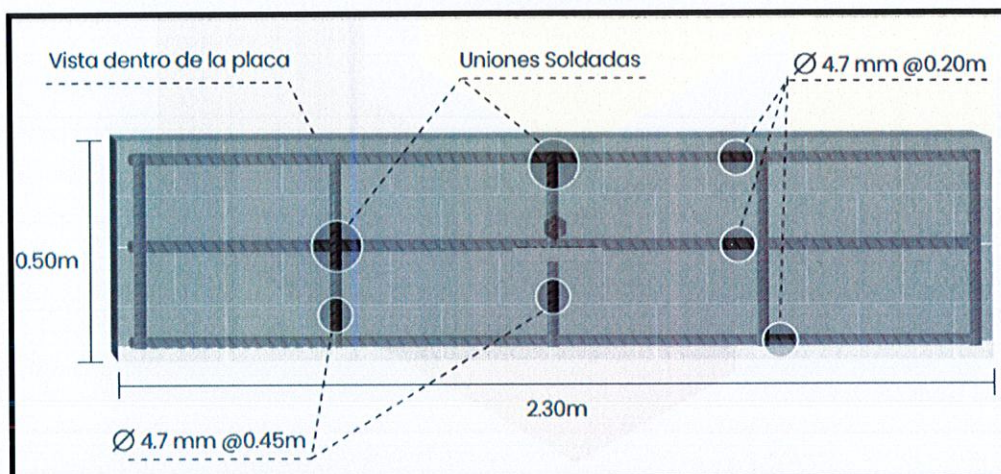


Imagen 4: Detalle de Refuerzo en Placas Prefabricadas.

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- Contar con Registro Nacional de Proveedores – Servicios (RNP) vigente.
- No tener impedimentos para contratar con el Estado.
- Estar autorizado por la SUNAT a emitir comprobantes de pago del rubro a proveer.
- Contar con CCI

7. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Lugar

La entrega de bien se realizará en los ambientes del almacén del proyecto "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" ubicado en:

Localidad : Uchuypampa

Distrito : Tambillo

Provincia : Huamanga

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Wilmer Ricardo Pérez Contreras
Reg. CIP N° 163964
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Christian Edison Pérez Poma
Reg. CIP N° 204207
SUPERVISOR DE OBRA

Departamento: Ayacucho

Plazo

El plazo de entrega se realizará, a los cinco días calendarios, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

ENTREGA	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD DEL BIEN
ENTREGA TOTAL	A LOS 05 DIAS CALENDARIOS, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	<ul style="list-style-type: none">❖ Placas de 2.30x0.04x0.50m con cemento Tipo I f'c=210 kg/cm2. 538 UNIDADES.❖ Postes 0.14x0.14x3.70 m con cemento Tipo I f'c=210 kg/cm2. 91 UNIDADES

8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La presente contratación se rige por el sistema de suma alzada.

9. TRANSPORTE

El transporte de los bienes a adquirir será bajo responsabilidad del proveedor toda vez que la entrega será en el ambiente almacén de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**.

10. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

El proveedor deberá presentar certificaciones y/o garantías de calidad del material suministro de cerco prefabricado tipo placa.

11. CONFIDENCIALIDAD:

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se encuentra relacionada al suministro de cerco pre fabricado tipo placa , quedando prohibido revelar dicha información a terceros. En tal sentido, el contratante de suministro de cerco pre fabricado tipo placa deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la entidad en materia de la seguridad de la información.

12. CONFORMIDAD Y PAGO DE LOS BIENES:

La recepción y conformidad de la presente se regula para lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

- La recepción será otorgada por el almacenero de obra
- La conformidad será otorgada por el Ing. Residente de Obra y V°B° del Supervisor de Obra.

De existir observaciones, LA ENTIDAD le comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, entregándole un plazo en subsanar no menor de dos (2) días calendarios, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTAS periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

13. FORMA DE PAGO:


El pago se efectuará con abono en la Cuenta CCI del proveedor en su totalidad, se realizará a la entrega del cerco pre fabricado tipo placa puesto en obra, sustentadas con las guías de remisión firmados por el almacenero de obra, con la conformidad del Residente de Obra y Visto bueno del Supervisor.

14. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

15. PENALIDADES APLICABLES:

En caso de retraso injustificado por parte del proveedor, la Entidad aplicará las penalidades correspondientes de acuerdo a la directiva vigente de la Municipalidad Provincial de Huamanga y la Ley de Contrataciones del Estado.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Wilfredo Rivas Contreras
Reg. CIP. N° 133364
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Christian Poma
Reg. CIP. N° 204207
SUPERVISOR DE OBRA

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: $F = 0.40$.
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: $F = 0.25$.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución contractual o la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el locador acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

Esta penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de contrato vigente cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

16. RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS:

El plazo máximo de responsabilidad del consultor por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados deberá ser no menor de (02) dos años contado a partir de la conformidad otorgada.

17. DECLARATORIA DE VIABILIDAD:

En el marco de un Proyecto de Inversión Pública referido al suministro de cerco prefabricado tipo placa en 214 .00 m, para el proyecto "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO, en el cual se hubiera considerado que la evaluación lo realizarán los responsables de obra.

18. NORMATIVA ESPECÍFICA:

- Ley 30225 ley de contracciones del estado y reglamento.
- Ley de 27444 de Procedimiento Administrativo General.
- Resolución de Contraloría N°195-88-CG, proceso de ejecución de obras por administración directa.
- Y las demás normas conexas.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Wilmer Ríos
Reg. CIP. N° 183964
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Christian Edison Perez Poma
Reg. CIP. N° 204207
SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000002319

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300440

Centro de Costo: 30044080105 SUB GERENCIA DE OBRAS
Fecha de Solicitud: 09/05/2024

Código Item N.-	ITEM Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
			EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
			Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor
207100080083	COLUMNA DE CONCRETO ARMADO TIPO H 16 cm X 16 cm X 3.90 m	Unidad	0.00	0.00	91.00	
207100080122	PLACA DE CONCRETO ARMADO 3.5 cm X 60 cm X 2.00 m PREFABRICADO PARA CERCO	Unidad	0.00	0.00	538.00	

Sustento para la aprobación de modificaciones del CMN, al día hábil siguiente de su presentación (numeral 27.4 del artículo 27):
De ser el caso, indicar el/los año(s) que corresponda(n) realizar la inclusión o exclusión de la programación:

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área usuaria, se suscribe:


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
CHRISTIAN ALVARO VARGAS
SUPERVISOR DE OBRA


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
ROGER ALVARO VARGAS
RESPONSABLE DE OBRA

Firma: Responsable del Área Usuaria

DESAGREGADO DE CUADRO ANALITICO PRESUPUESTAL

PROYECTO : "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

FTE.FTO : ADMINISTRACION DIRECTA
MODALIDAD : ABRIL 2024
AÑO

CLASIFICACIÓN DE GASTOS	EJECUCIÓN 2024	COEF.	UND.	CANT.	PRECIO	GASTOS POR ESPECÍFICAS 2024		
						COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN
	DESCRIPCIÓN							COSTO TOTAL
	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8		kg	288.00	6.50	1,937.00		
	CLAVOS PARA MADERA C/C 4"		kg	210.00	6.50	1,365.00		
	PLATINA 1 1/2" X 1/8		m	15.00	11.70	175.50		
	CEMENTO (PUESTO EN OBRA)		bol	1,424.00	31.00	44,144.00		44,144.00
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) PUESTO EN OBRA							
	MADERA (PUESTO EN OBRA)					41,193.90		41,193.90
	MADERA TORNILLO 2"x4"x10"		Und	307.00	56.00	17,192.00		
	MADERA TORNILLO 3"x3"x10"		Und	208.00	64.00	13,312.00		
	MADERA TORNILLO 1"x8"x10"		Und	101.00	56.00	5,656.00		
	MADERA TORNILLO 1"x10"x10"		Und	71.00	70.90	5,033.90		
	AGREGADOS (PUESTO EN OBRA)					24,900.00		24,900.00
	ARENA GRUESA PUESTO EN OBRA		m3	85.00	70.00	5,950.00		
	HORMIGÓN PUESTO EN OBRA		m3	150.00	60.00	9,000.00		
	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" PUESTO EN OBRA		m3	35.00	80.00	2,800.00		
	PIEDRA GRANDE 8" PUESTO EN OBRA		m3	85.00	70.00	5,950.00		
	PIEDRA MEDIANA 3/4"-1" PUESTO EN OBRA		m3	15.00	80.00	1,200.00		
	LADRILLOS (PUESTO EN OBRA)					32,500.00		32,500.00
	LADRILLO ARTESANAL		Mil	50.00	650.00	32,500.00		
	HERRAMIENTAS					3,150.00		3,150.00
	CARRITILLA BUGUI CON LLANTAS NEUMÁTICA		Und	10.00	230.00	2,300.00		
	PICOS PUNTA CON MANGO DE MADERA		Und	10.00	45.00	450.00		
	LAMPA DE CORTE CON MANGO DE MADERA		Und	10.00	40.00	400.00		
	COMBUSTIBLE					1,400.00		1,400.00
	GASOLINA		gln	80.00	17.50	1,400.00		
	CERCO PREFABRICADO					44,520.00		
	SUMINISTRO DE CERCO PREFABRICADO TIPO PLACA		m	212.00	210.00	44,520.00		
	OTROS BIENES					11,805.00		11,805.00
	TRIPLAY FENÓLICO 18mm x 1.22 x 2.44m		plh	30.00	110.00	3,300.00		
	PLASTICO DOBLE CARA AZUL/NEGRO X ROLLO		Und	8.00	500.00	4,000.00		
	MANGUERA		rl	2.00	80.00	160.00		
	CILINDRO PLASTICO 60gln		Und	5.00	125.00	625.00		
	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'		plh	17.00	15.00	255.00		
	GENERADOR DE ENERGÍA		Und	1.00	2,500.00	2,500.00		
	AMOLADORA		Und	1.00	350.00	350.00		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
COMISION DE REVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
PRESIDENTE V°B°
MIEMBRO V°B°
MIEMBRO V°B°
DICTAMEN REPROBADO
FECHA 01/2 MAY 2024

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
ALCALDIA
MAYORADO SULCA LEÓN
FEDATARIO TITULAR
R.A. N° 11-2024-MPH/A
09 MAY 2024
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUPERVISOR DE OBRA
CHRISTIAN EDISON PEREZ POMA
REG. CP. N° 204207



Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación De Expedientes Técnicos N° 046-2024-MPH/CRAET

Ayacucho, 02/05/2024

VISTO:

La Sesión No 034 -2024-MPH/CRAET, de fecha 02 de Mayo del 2024, sobre la Aprobación del Cuadro Presupuesto Analítico Adicional de Obra n° 02 del Proyecto: **"Construcción de Cerco Perimetrito en el (LA) Relleno Sanitario de la Localidad de Uchuypamapa, Distrito de Tambillo Provincia de Huamanga-Departamento de Ayacucho"** con Informe N° 03-2024-MPH/31-AMC-EET, Informe N° 732-2024-MPH/31.35, Informe N° 01-2024-MPH/31-RFRY, Informe N° 031-2024-MPH/31.35, Informe Técnico de Presupuesto Analítico del Adicional N° 02, Memorándum Múltiple N° 123-2024-MPH/15, y demás actuados, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en concordancia con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización;

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 003-2024-MPH/A, de fecha 05 de enero del 2024, sobre la Conformación de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos (CRAET) para el ejercicio fiscal 2024, de los Proyectos de Inversión Pública declarados viables por la Municipalidad Provincial de Huamanga;

La Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos (CRAET), es la Instancia Colegiada de la Municipalidad Provincial de Huamanga, encargada de revisar en segunda instancia el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales en la elaboración del expediente técnico, siendo la primera instancia la Unidad Formuladora;

Que, habiendo sido declarado viable de fecha 02 de Diciembre del 2022, el Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil (**Código de Inversiones No 2566182**) **"Construcción de Cerco Perimetrito en el (LA) Relleno Sanitario de la Localidad de Uchuypamapa, Distrito de Tambillo Provincia de Huamanga-Departamento de Ayacucho."** y mediante la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos se aprueba la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico Matriz No 094-2021-MPH/CRAET de fecha 15 de octubre del 2021, por el monto de **S/ 3'479,100.00** (Tres millones cuatrocientos setenta y nueve mil con 00/100 Soles);

Que, en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, (Sesión N° 034-2024-MPH/CRAET) de fecha 02 de Mayo del 2024, se **APRUEBA** el Cuadro Presupuesto Analítico, del Proyecto : **"Construcción de Cerco Perimetrito en el (LA) Relleno Sanitario de la Localidad de Uchuypamapa, Distrito de Tambillo Provincia de Huamanga-Departamento de Ayacucho."**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Es Copia Fiel del Original
que se tiene a la vista
Maximiliano Salca León
FEDATARIO TITULAR
R.A. N° 11-2024-MPH/A

02 MAY 2024

Teniendo en cuenta en referencia el Informe N° 003-2024-MPH/31-AMC-EET, de fecha 02 de Mayo del 2024; Resumen la Estructura del Adicional de Obra N° 02, aprobada con Resolución Gerencial Municipal N° 211-2024-MPH/GM es de la siguiente manera:

DESCRIPCION	MONTO
DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	S/ 222,724.76
AMPLIACION PRESUPUESTAL	S/ 253,458.00
ADICIONAL N° 02 CON DEDUCTIVO VINCULANTE	S/ 476,182.76

Por los fundamentos expuestos, de conformidad a lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, N° 31953-2024, Sector Publico;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - **APROBAR** el Cuadro Presupuesto Analítico Adicional de Obra N° 02 Partidas Nuevas, Deductivo Vinculante N° 01 para el Proyecto: **"Construcción de Cerco Perimetrito en el (LA) Relleno Sanitario de la Localidad de Uchuypamapa, Distrito de Tambillo Provincia de Huamanga-Departamento de Ayacucho."** por el monto de S/. 199,317.00 y **S/ 459,398.55** (Cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos noventa y ocho con 55/100 Soles), y un cronograma de ejecución 02 meses 60 días calendarios, por cumplir con los requisitos de los numerales 23.12 del Artículo 23° de la Directiva para la Formulación, Evaluación Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa o Convenio de la Municipalidad Provincial de Huamanga, que fue aprobado con el Decreto de Alcaldía N° 035-2016-MPH/A de fecha 23/12/2016; y está de acuerdo a la siguiente Estructura Funcional Programática:

PROYECTO	: 2566182	Construcción de Cerco Perimetrito en el (LA) Relleno Sanitario de la Localidad de Uchuypamapa, Distrito de Tambillo Prov. Hug- Ayacucho"
OBRA.	: 4000199	Construcción de Sistema de Recolección y Tratamiento de Residuos Solidos Ambiente.
FUNCION	: 17	Gestión Integral de la Calidad Ambiental.
DIVISION FUNC.	: 055	Gestión de los Residuos Sólidos.
GRUPO FUNC.	: 0124	
SEC. FUNC.	: 113	
FTE.FTO.	: 05	Recursos Determinado 07 Foncomun Fideicomiso T.R 0

Artículo Segundo. - **DISPONER**, la transcripción de la presente Resolución a las instancias: Secretaría General, Gerencia Municipal, Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, Unidad Formuladora, Estudios, Comisión Permanente de Desarrollo Territorial, (Sala de Regidores), y la Unidad de Planeamiento y Presupuesto OPP, Sub Gerencia de Obras, de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para su conocimiento y fines de ejecución.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones, la Publicación de la Presente Resolución CRAET, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos
Ing. Deyán Milcapoma Mendoza
PRESIDENTE
CIP: 194884

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos
Ing. RUBÉN PACHECO AVILA
MIEMBRO TITULAR
CIP: 203788

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos
Ing. Damián P. Torres Pérez
MIEMBRO TITULAR
CIP: 220771



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Es Copia Fiel del Original
que se tiene a la vista
Maximiliano Sulca León
FEDATARIO TITULAR
R.A. N° 11-2024-MPH/A

09 MAY 2024

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 - AYACUCHO
PROVINCIA : 01 - HUAMANGA
PLIEGO : 01 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PRODIPRY ACTIAJOBR FN DVF GRPF		Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Exp EspDet								
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
0113 0036 2566182 4000199 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124										
Meta: 00001 - 0026881 MEJORAMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL; METRO LINEAL: 1,700,000; AYACUCHO, HUAMANGA, AYACUCHO										
6 GASTOS DE CAPITAL			494,428	35,029.45	35,029.45	35,029.45	459,398.55	459,398.55	459,398.55	7.08 %
2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -			203,118	26,753.75	26,753.75	26,753.75	176,364.25	176,364.25	176,364.25	13.17 %
2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -			226,213	7,206.00	7,206.00	7,206.00	219,007.00	219,007.00	219,007.00	3.19 %
2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -			65,097	1,069.70	1,069.70	1,069.70	64,027.30	64,027.30	64,027.30	1.64 %
TOTAL META 0113			494,428	35,029.45	35,029.45	35,029.45	459,398.55	459,398.55	459,398.55	7.08 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07			494,428	35,029.45	35,029.45	35,029.45	459,398.55	459,398.55	459,398.55	7.08 %
TOTAL PLIEGO:			494,428	35,029.45	35,029.45	35,029.45	459,398.55	459,398.55	459,398.55	7.08 %



09 MAY 2024
