

Proyecto: MEJORAMIENTO, AMPLIA
Fecha: 22/07/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin


Tareas críticas


División crítica


Progreso


Fecha límite


Página 6

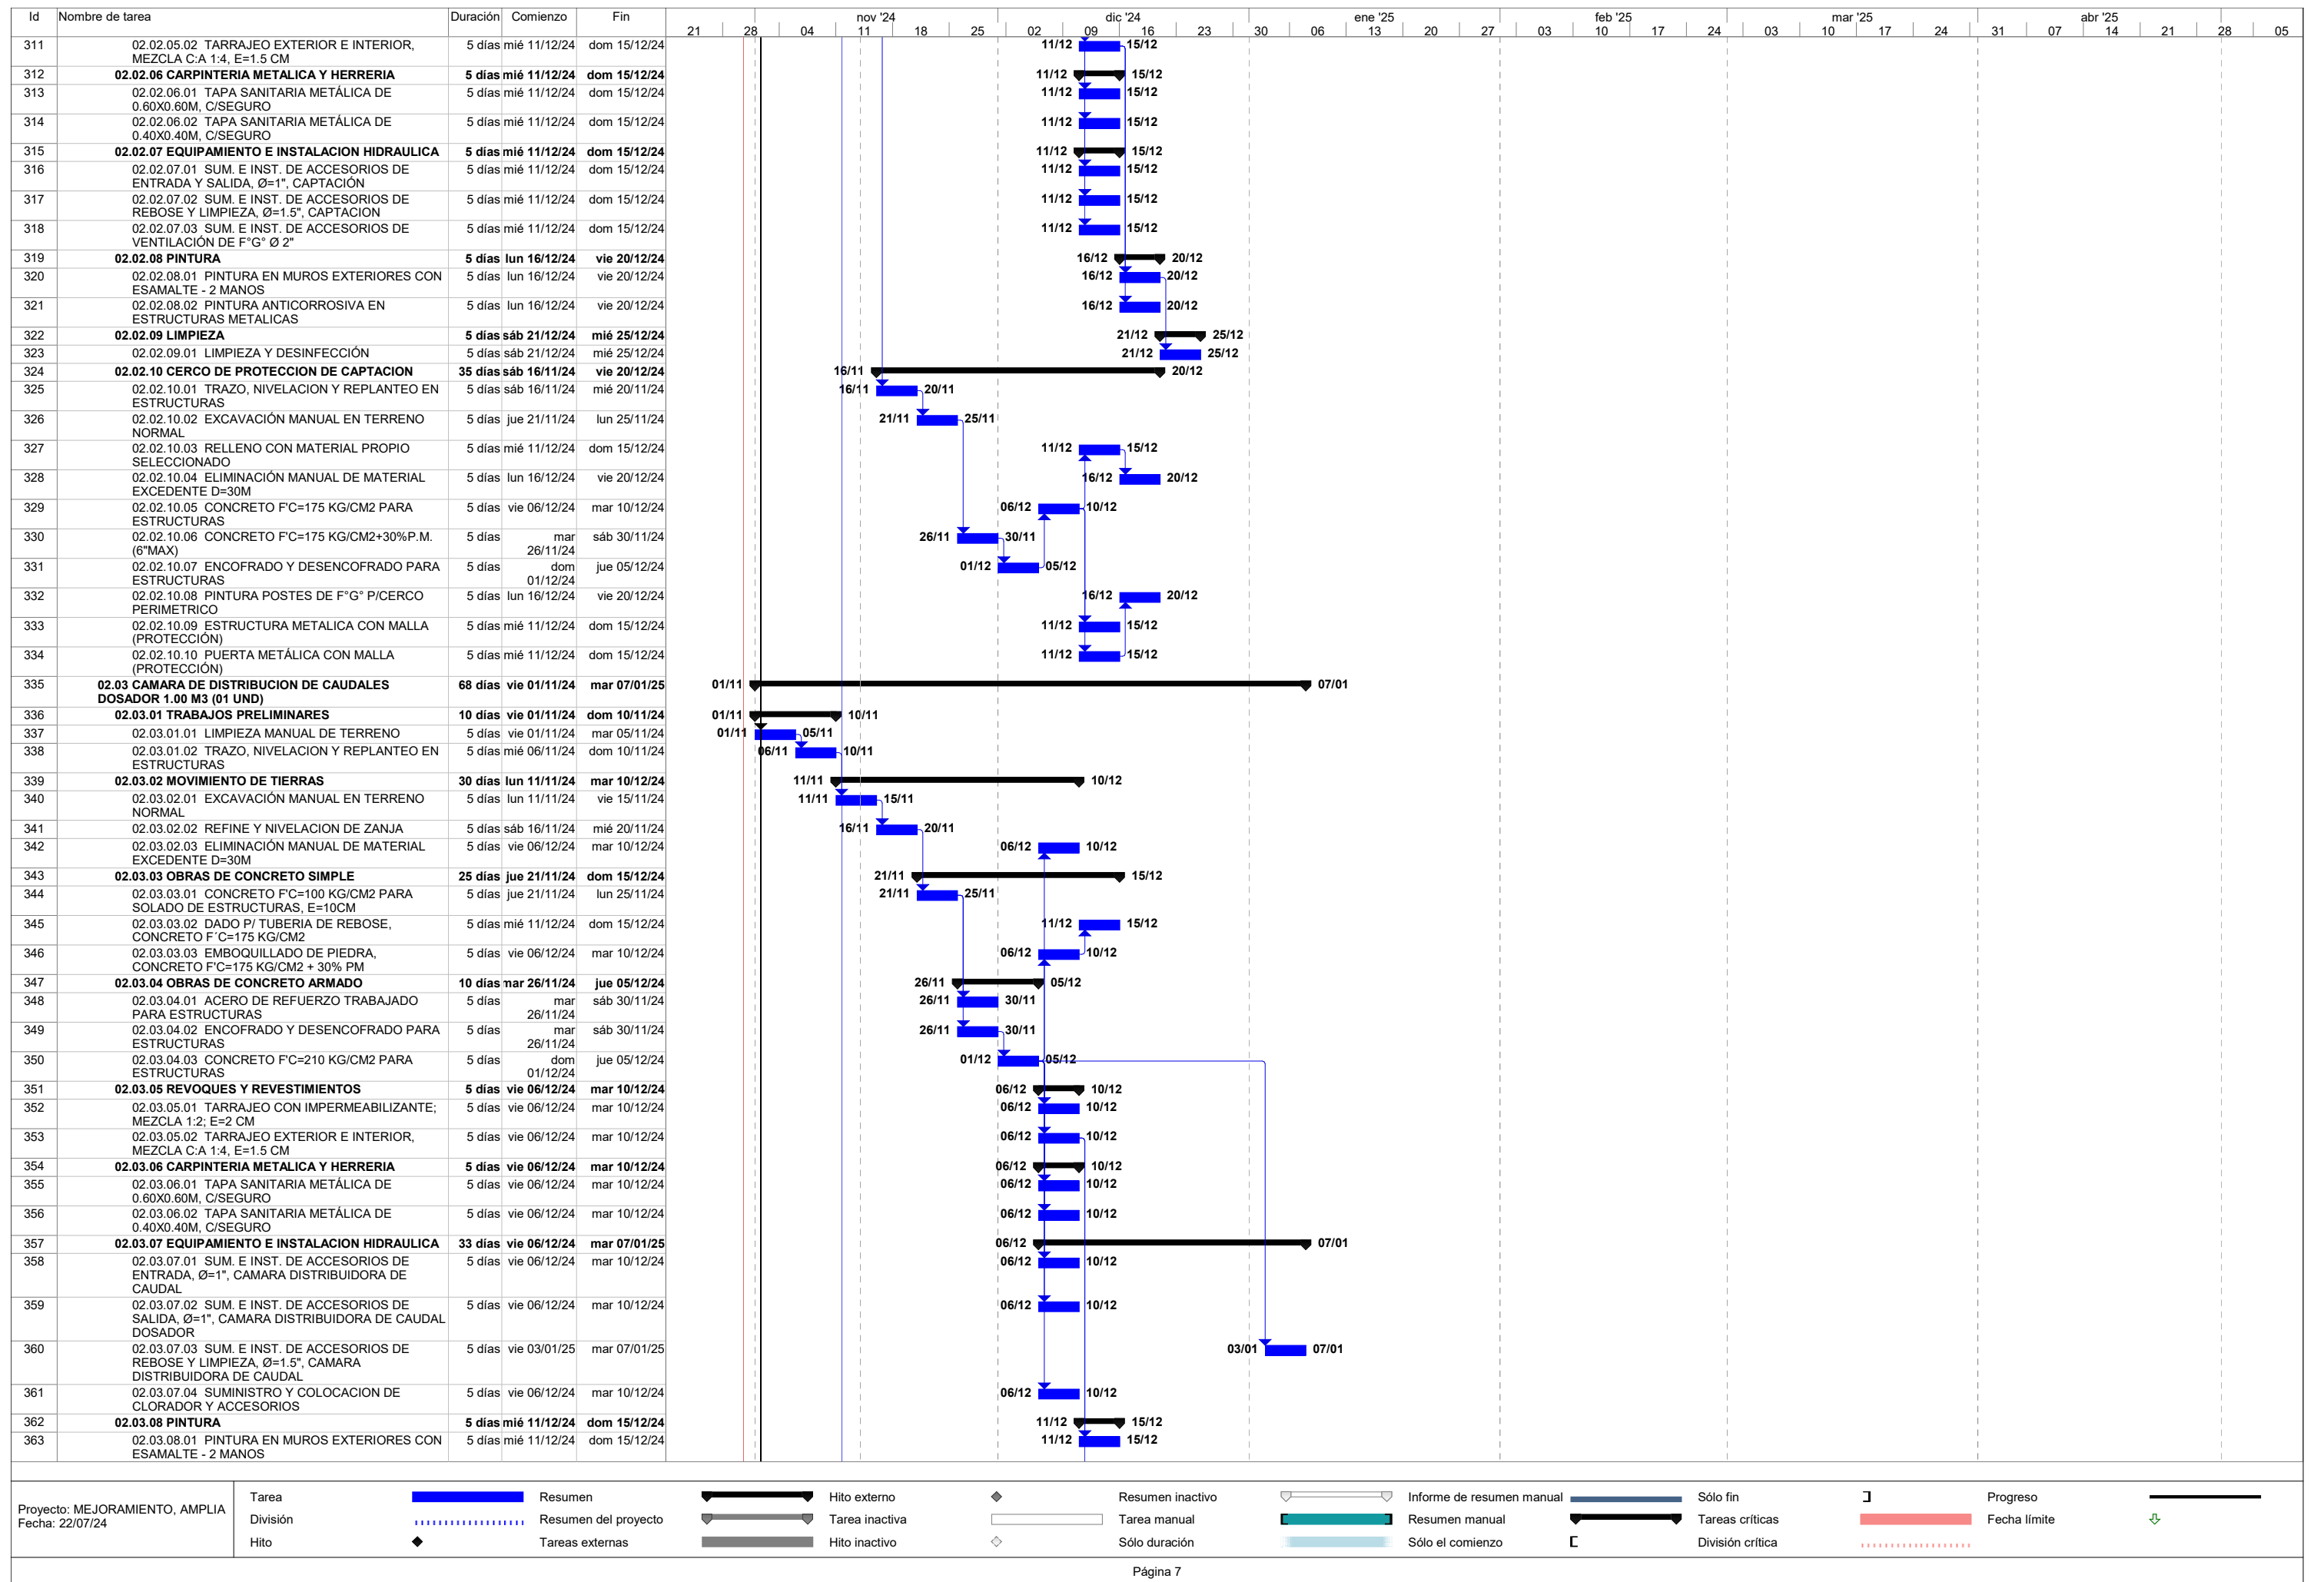


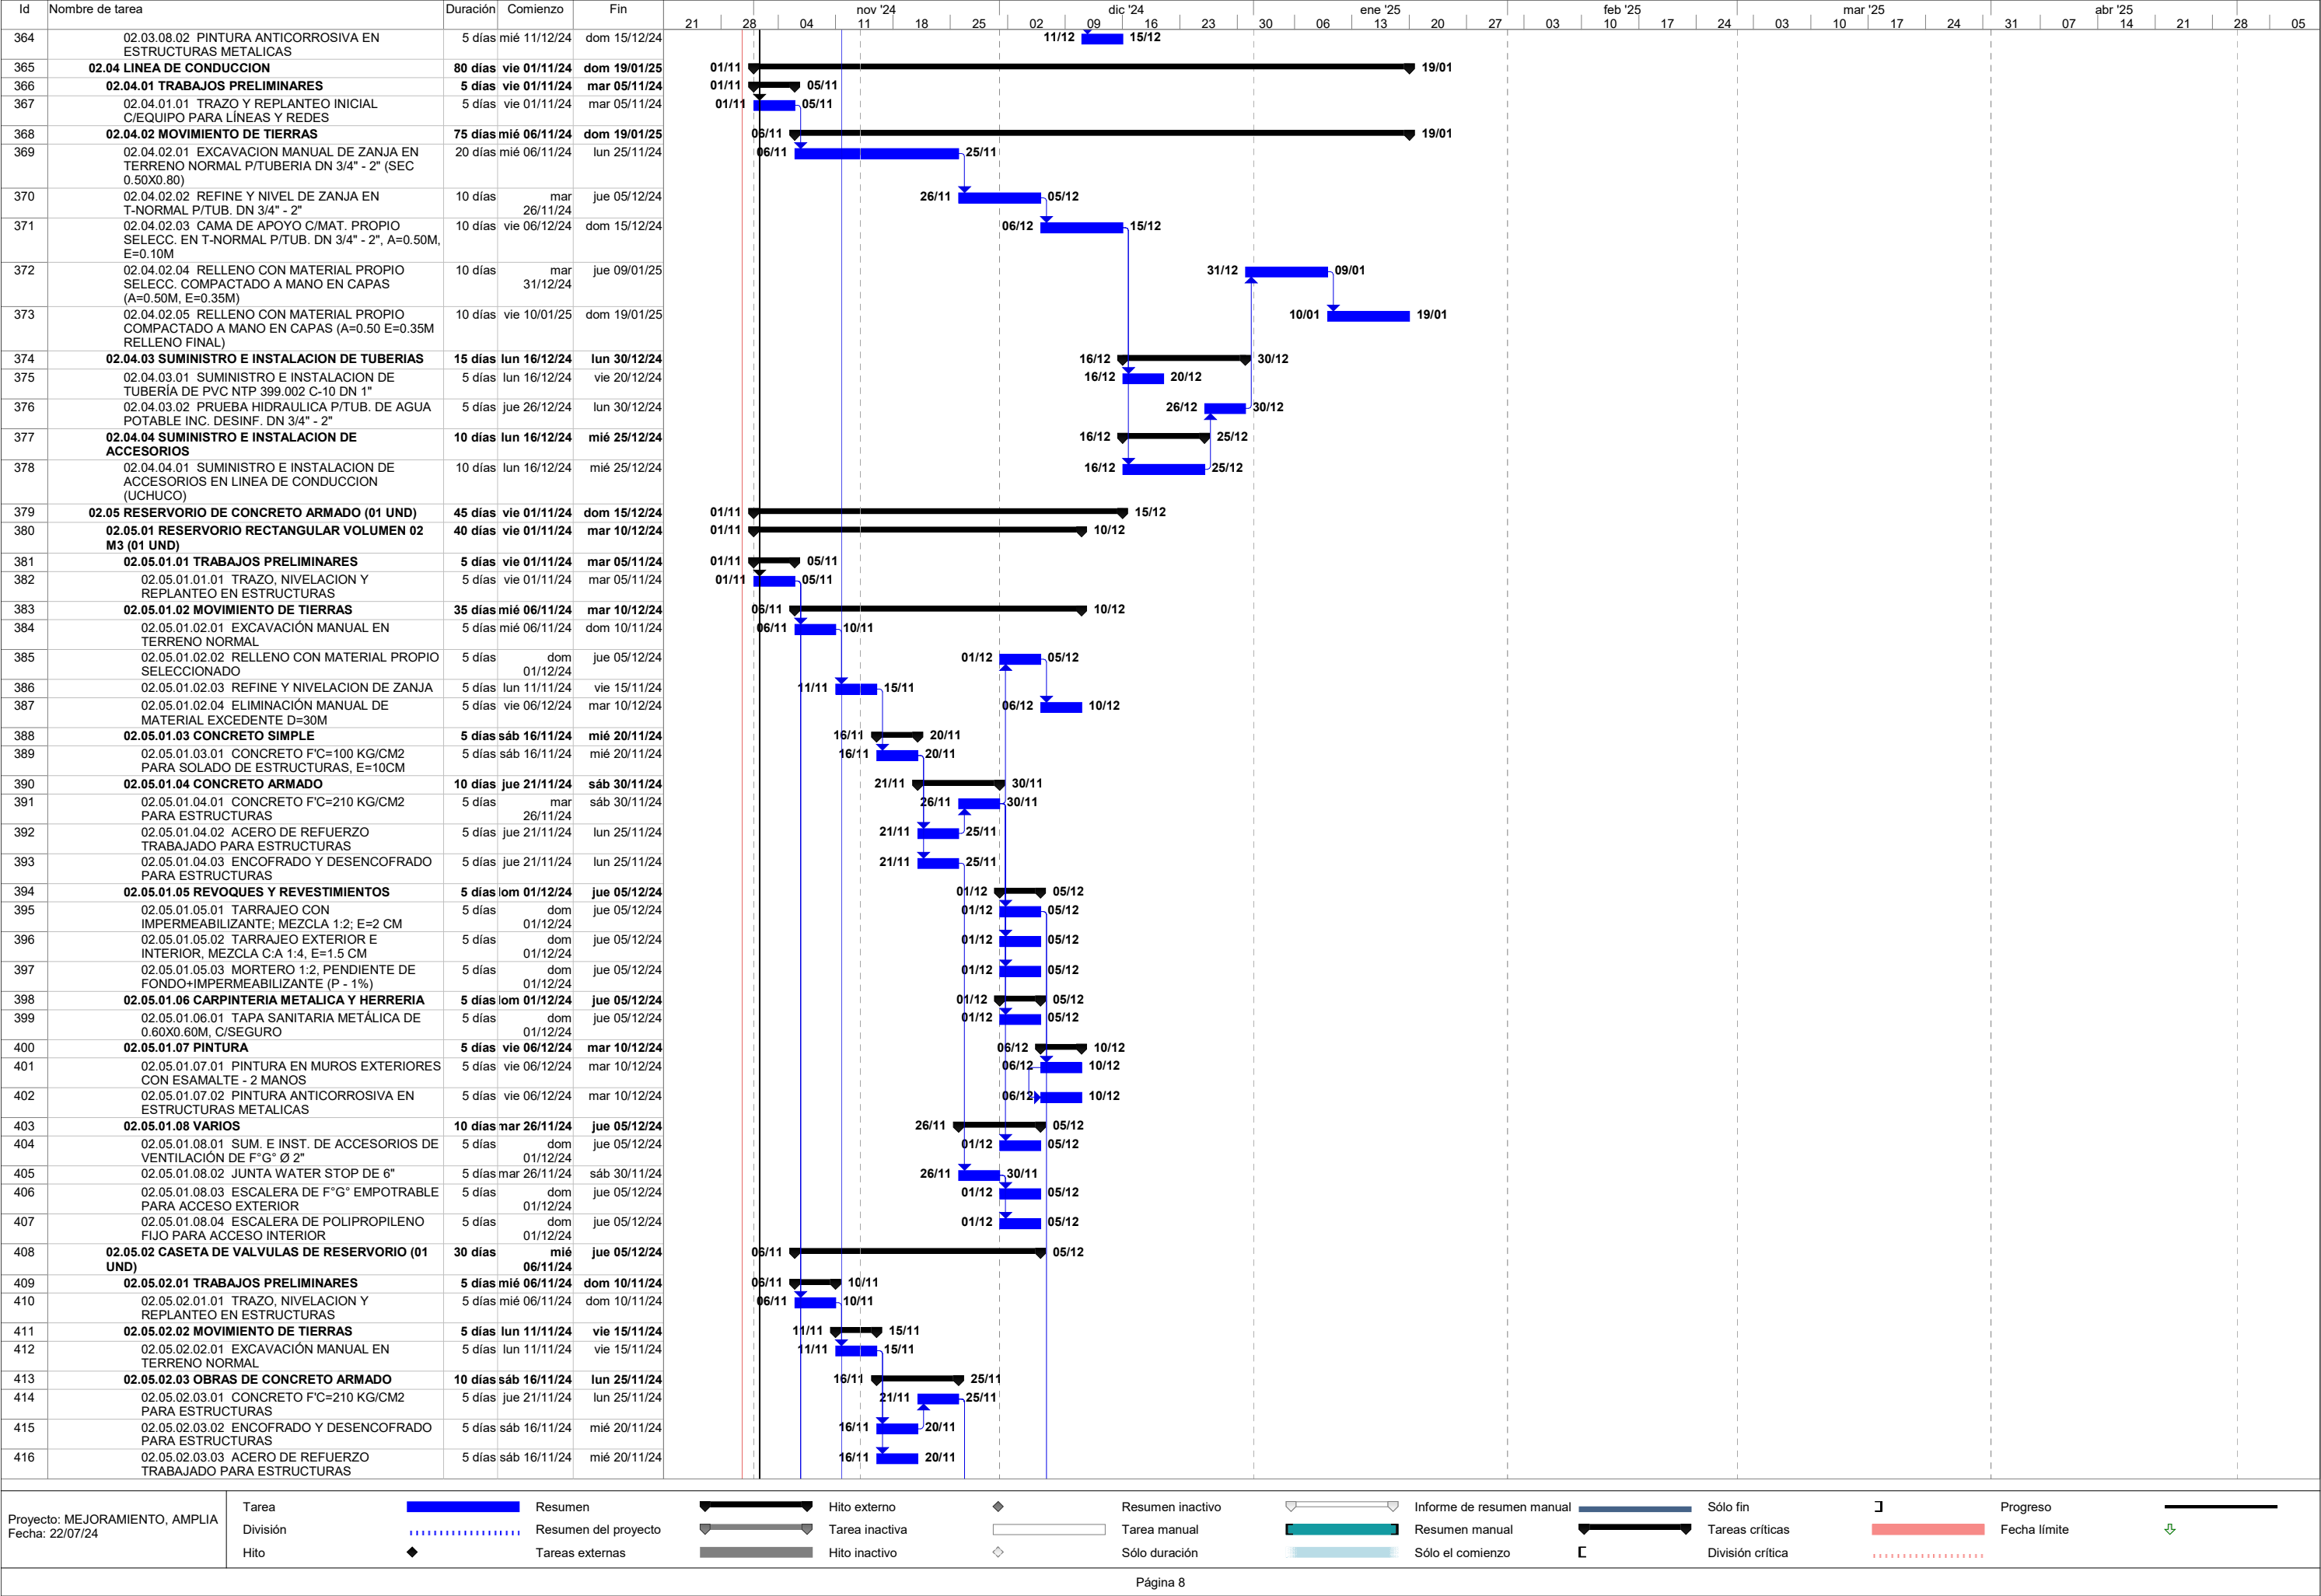


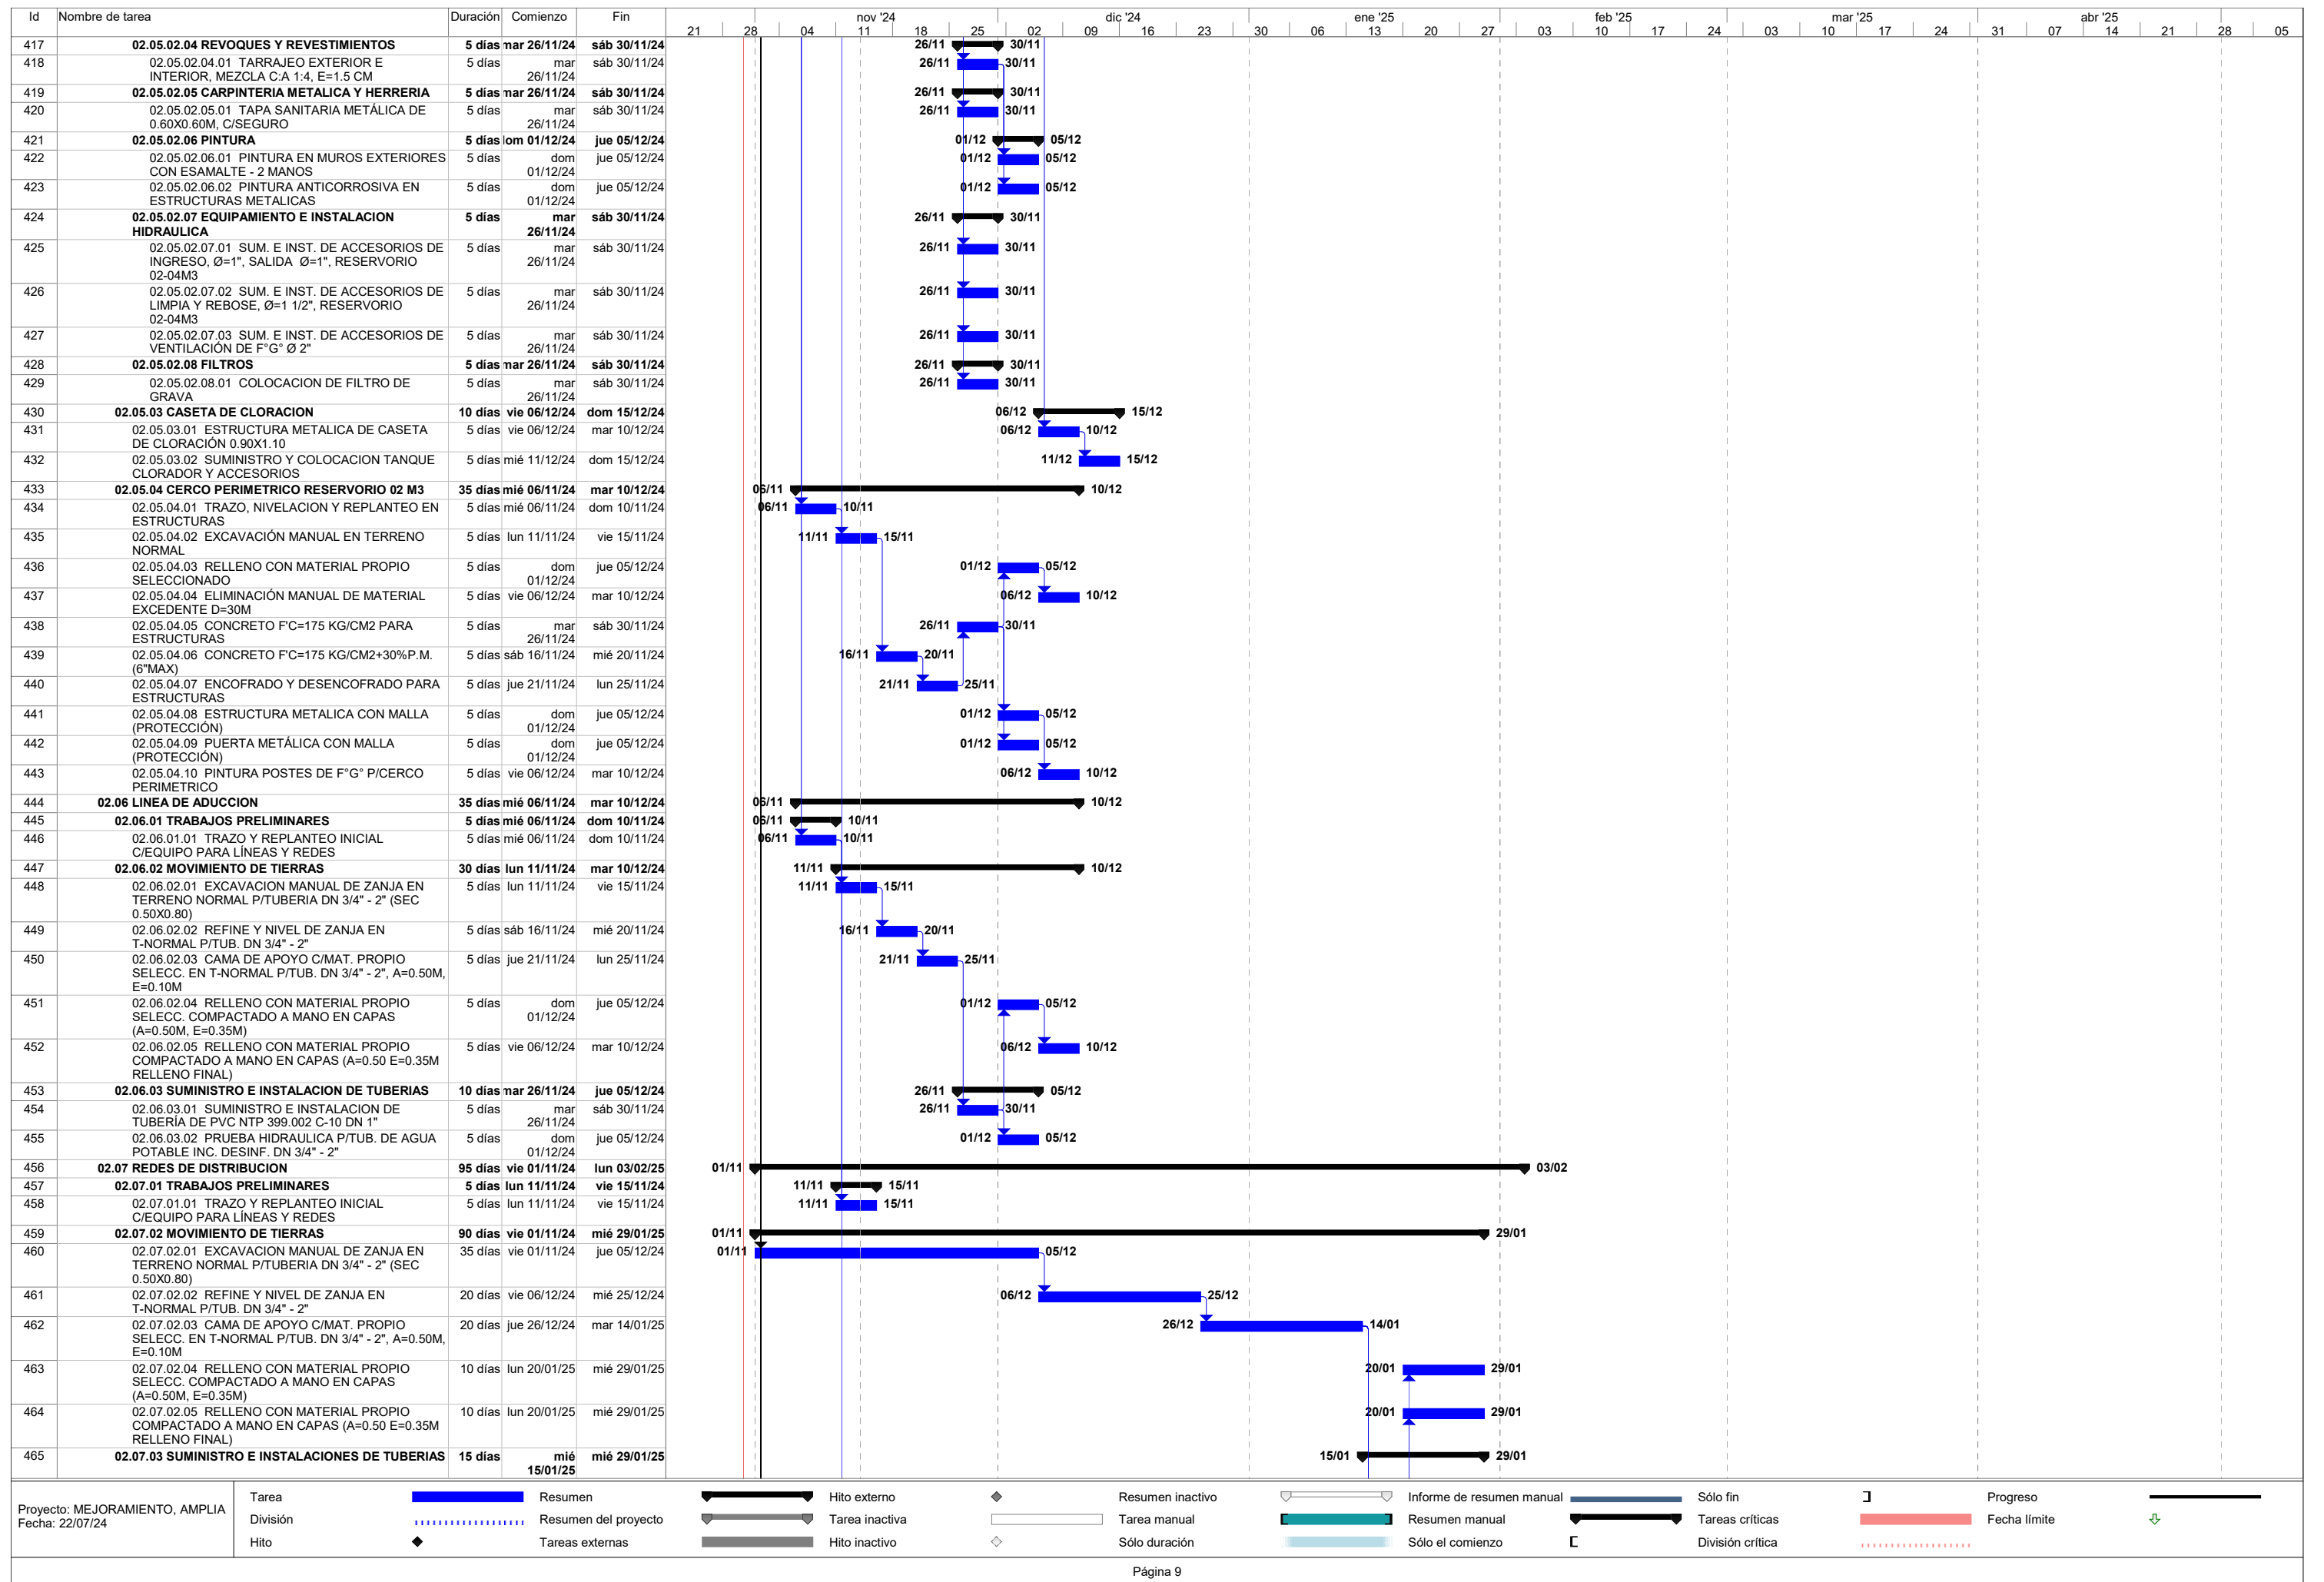


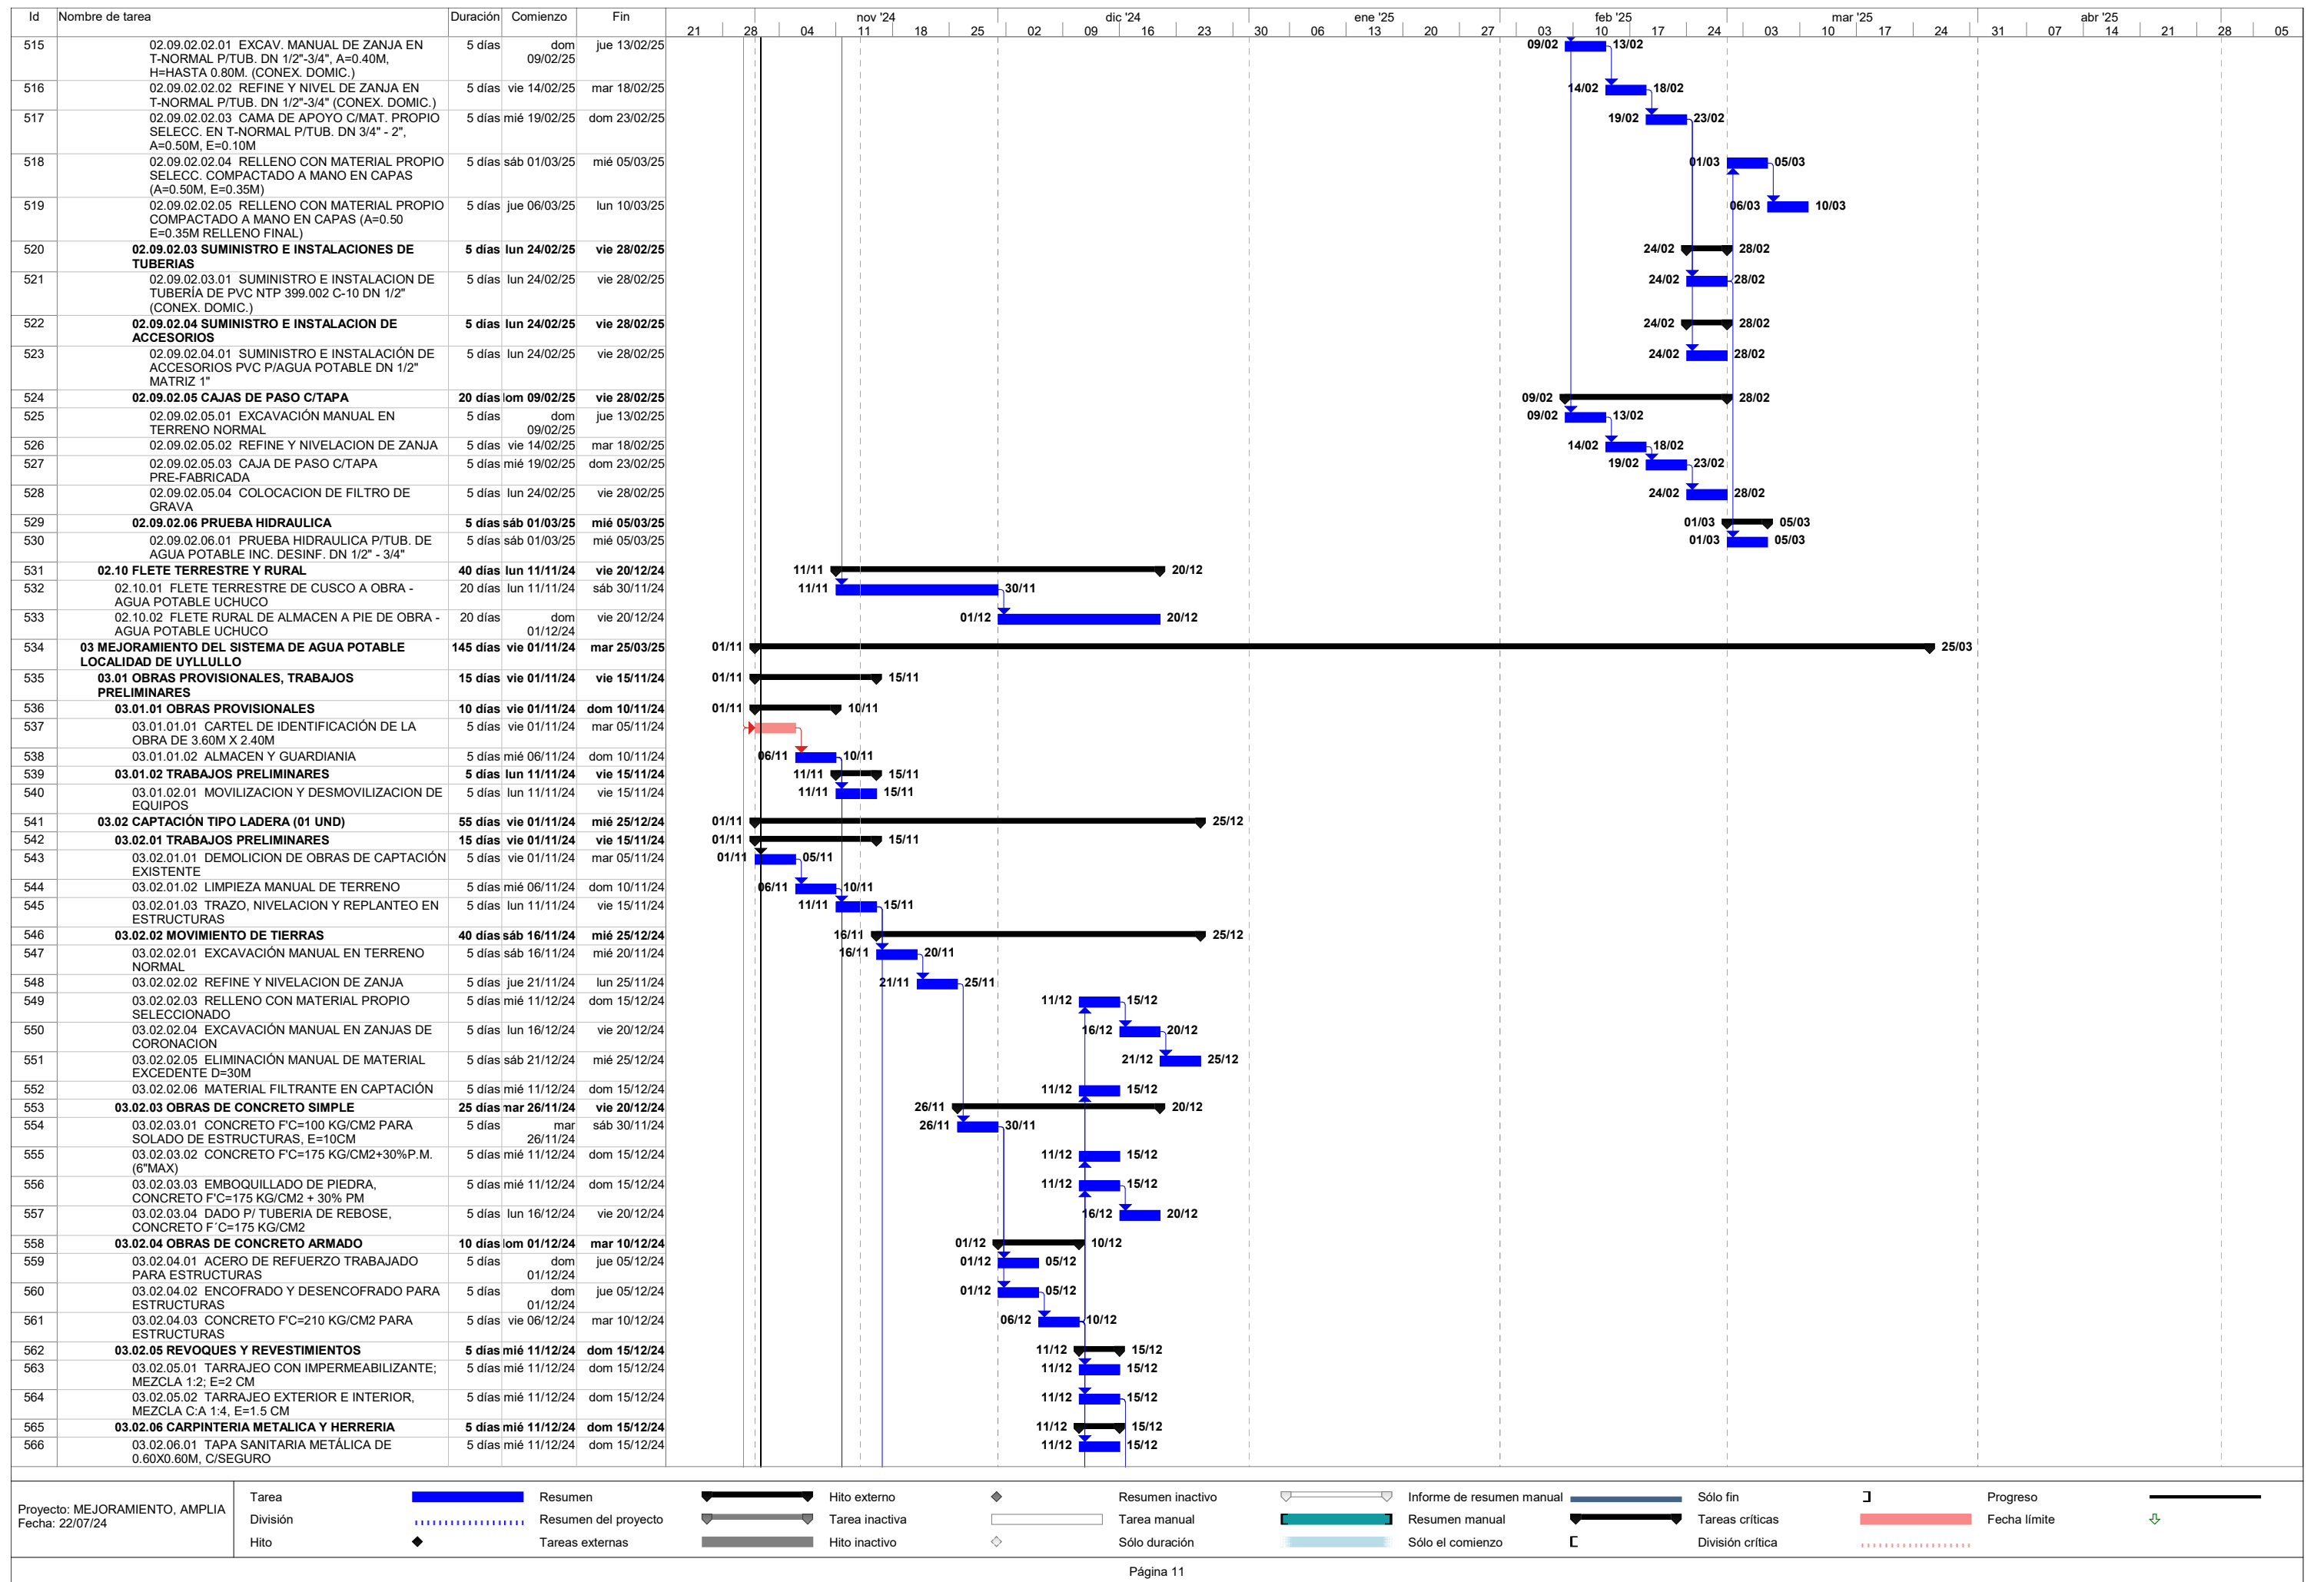

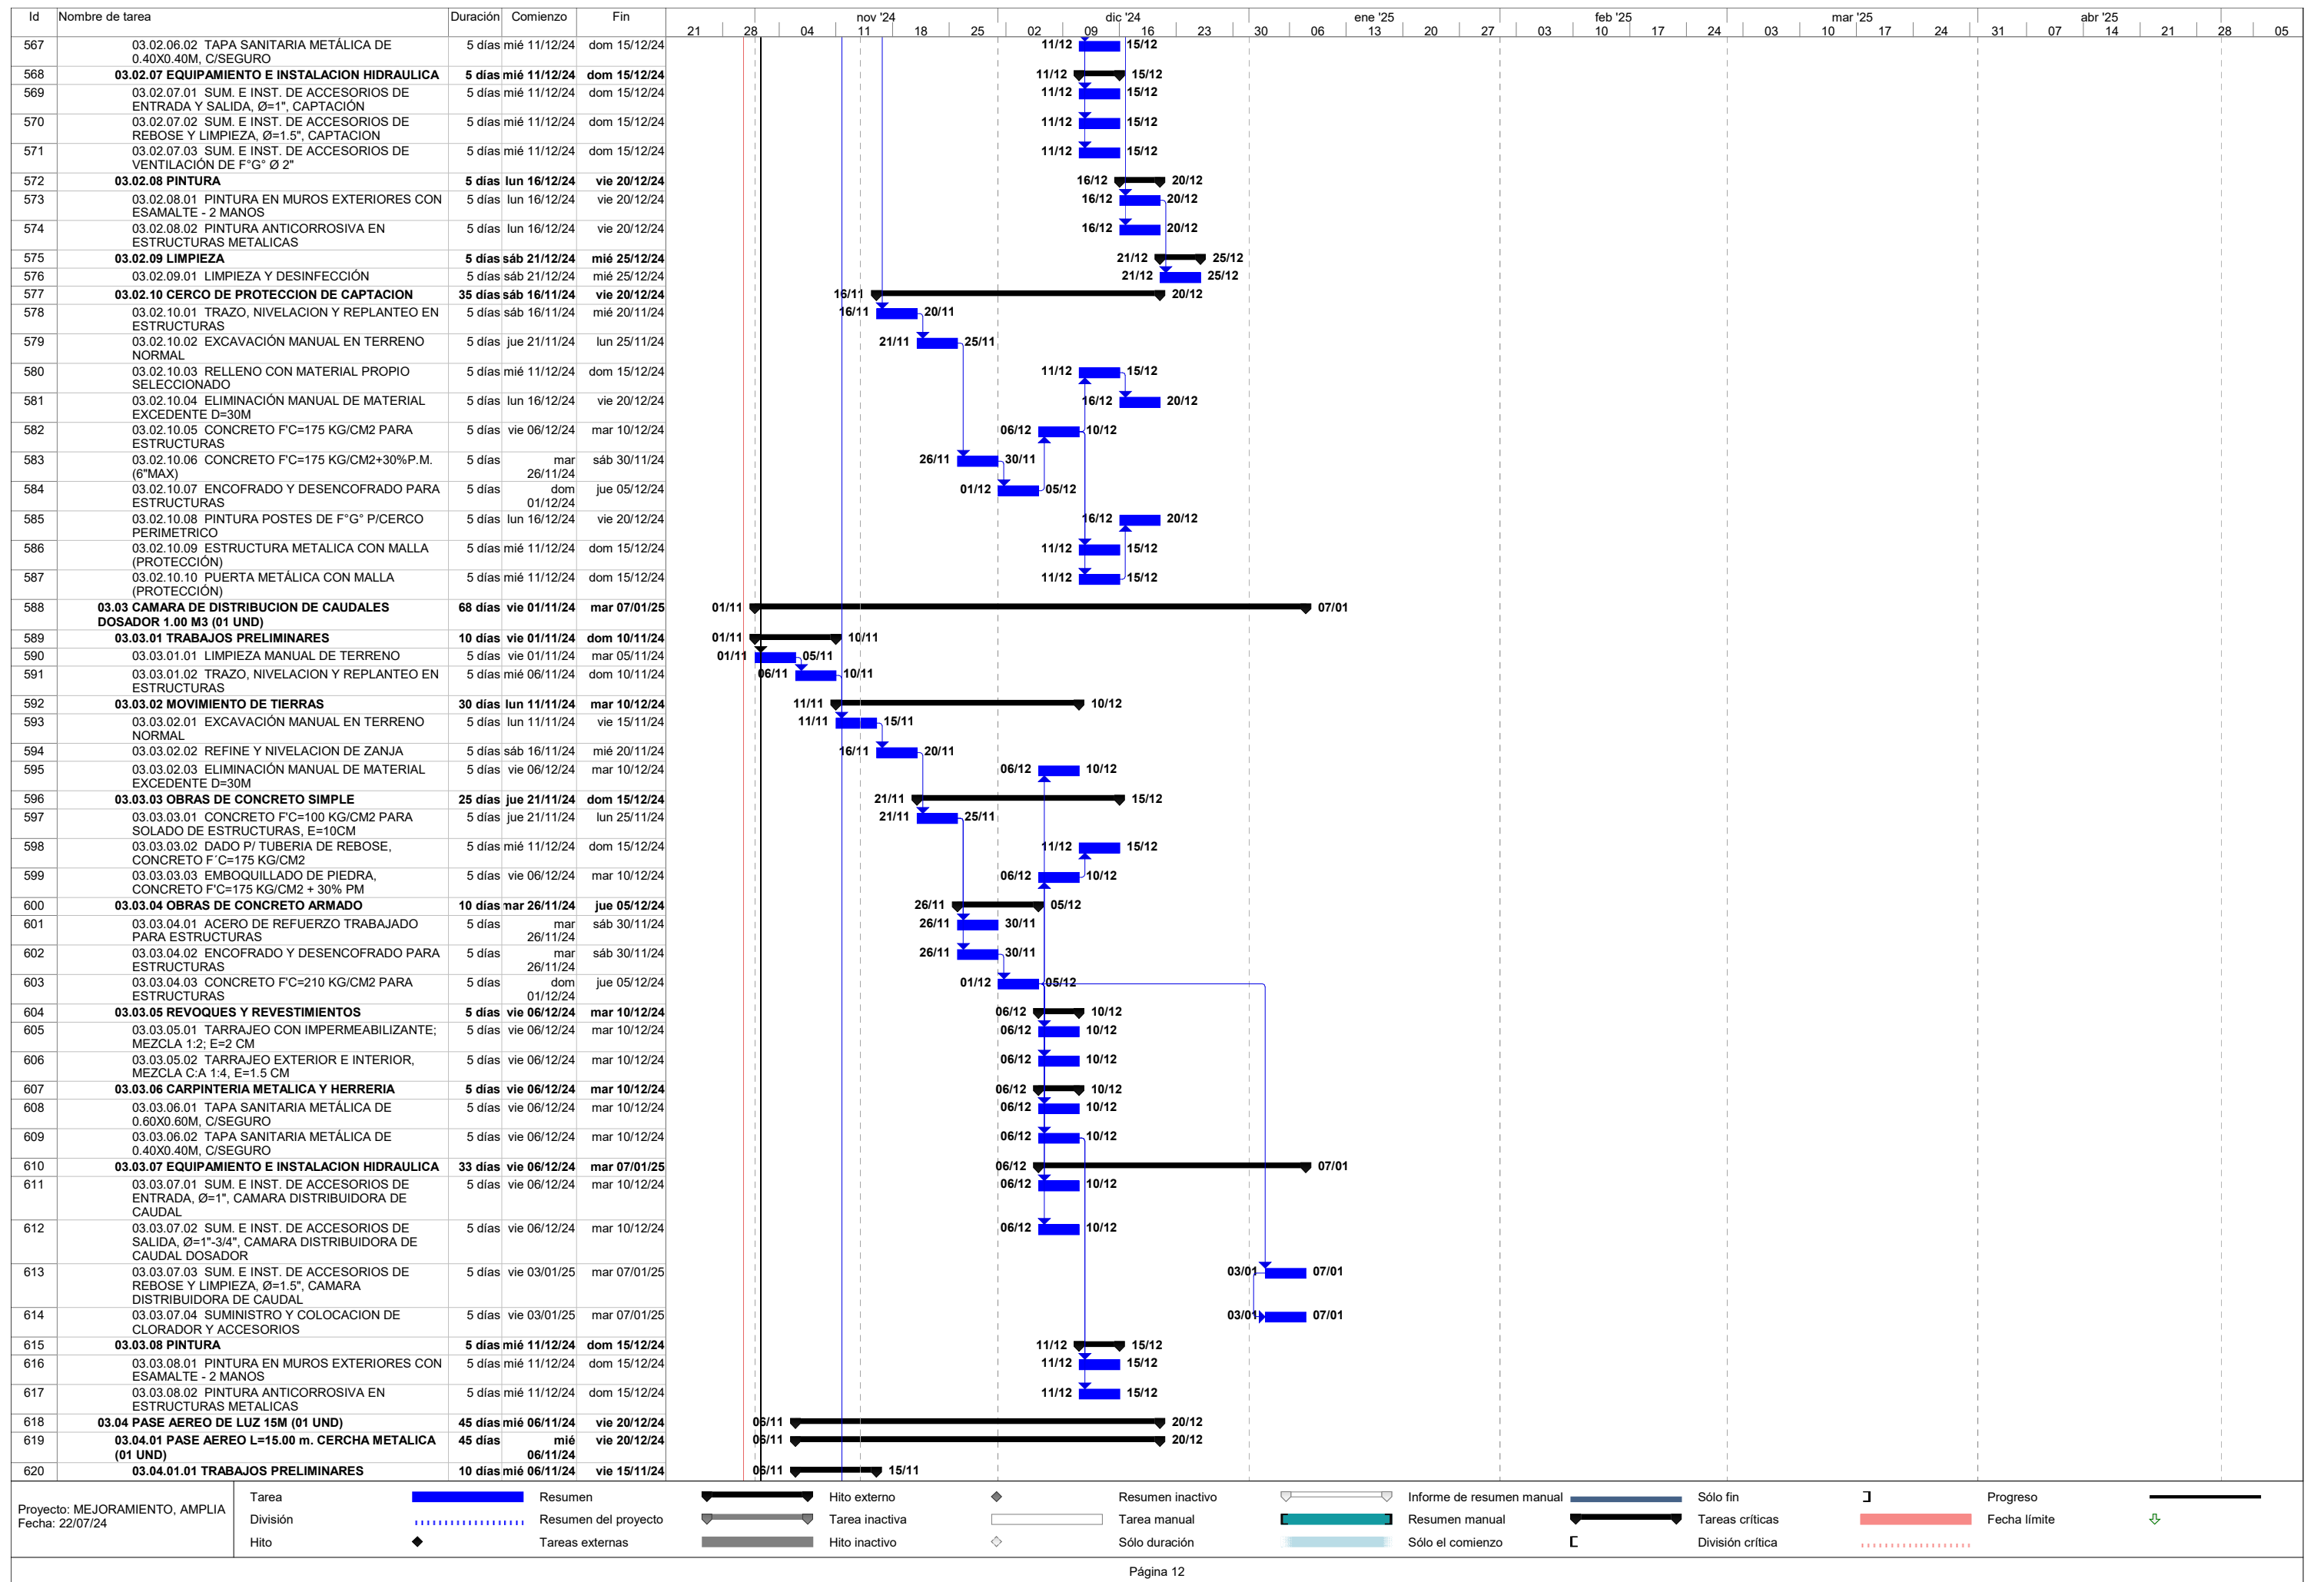

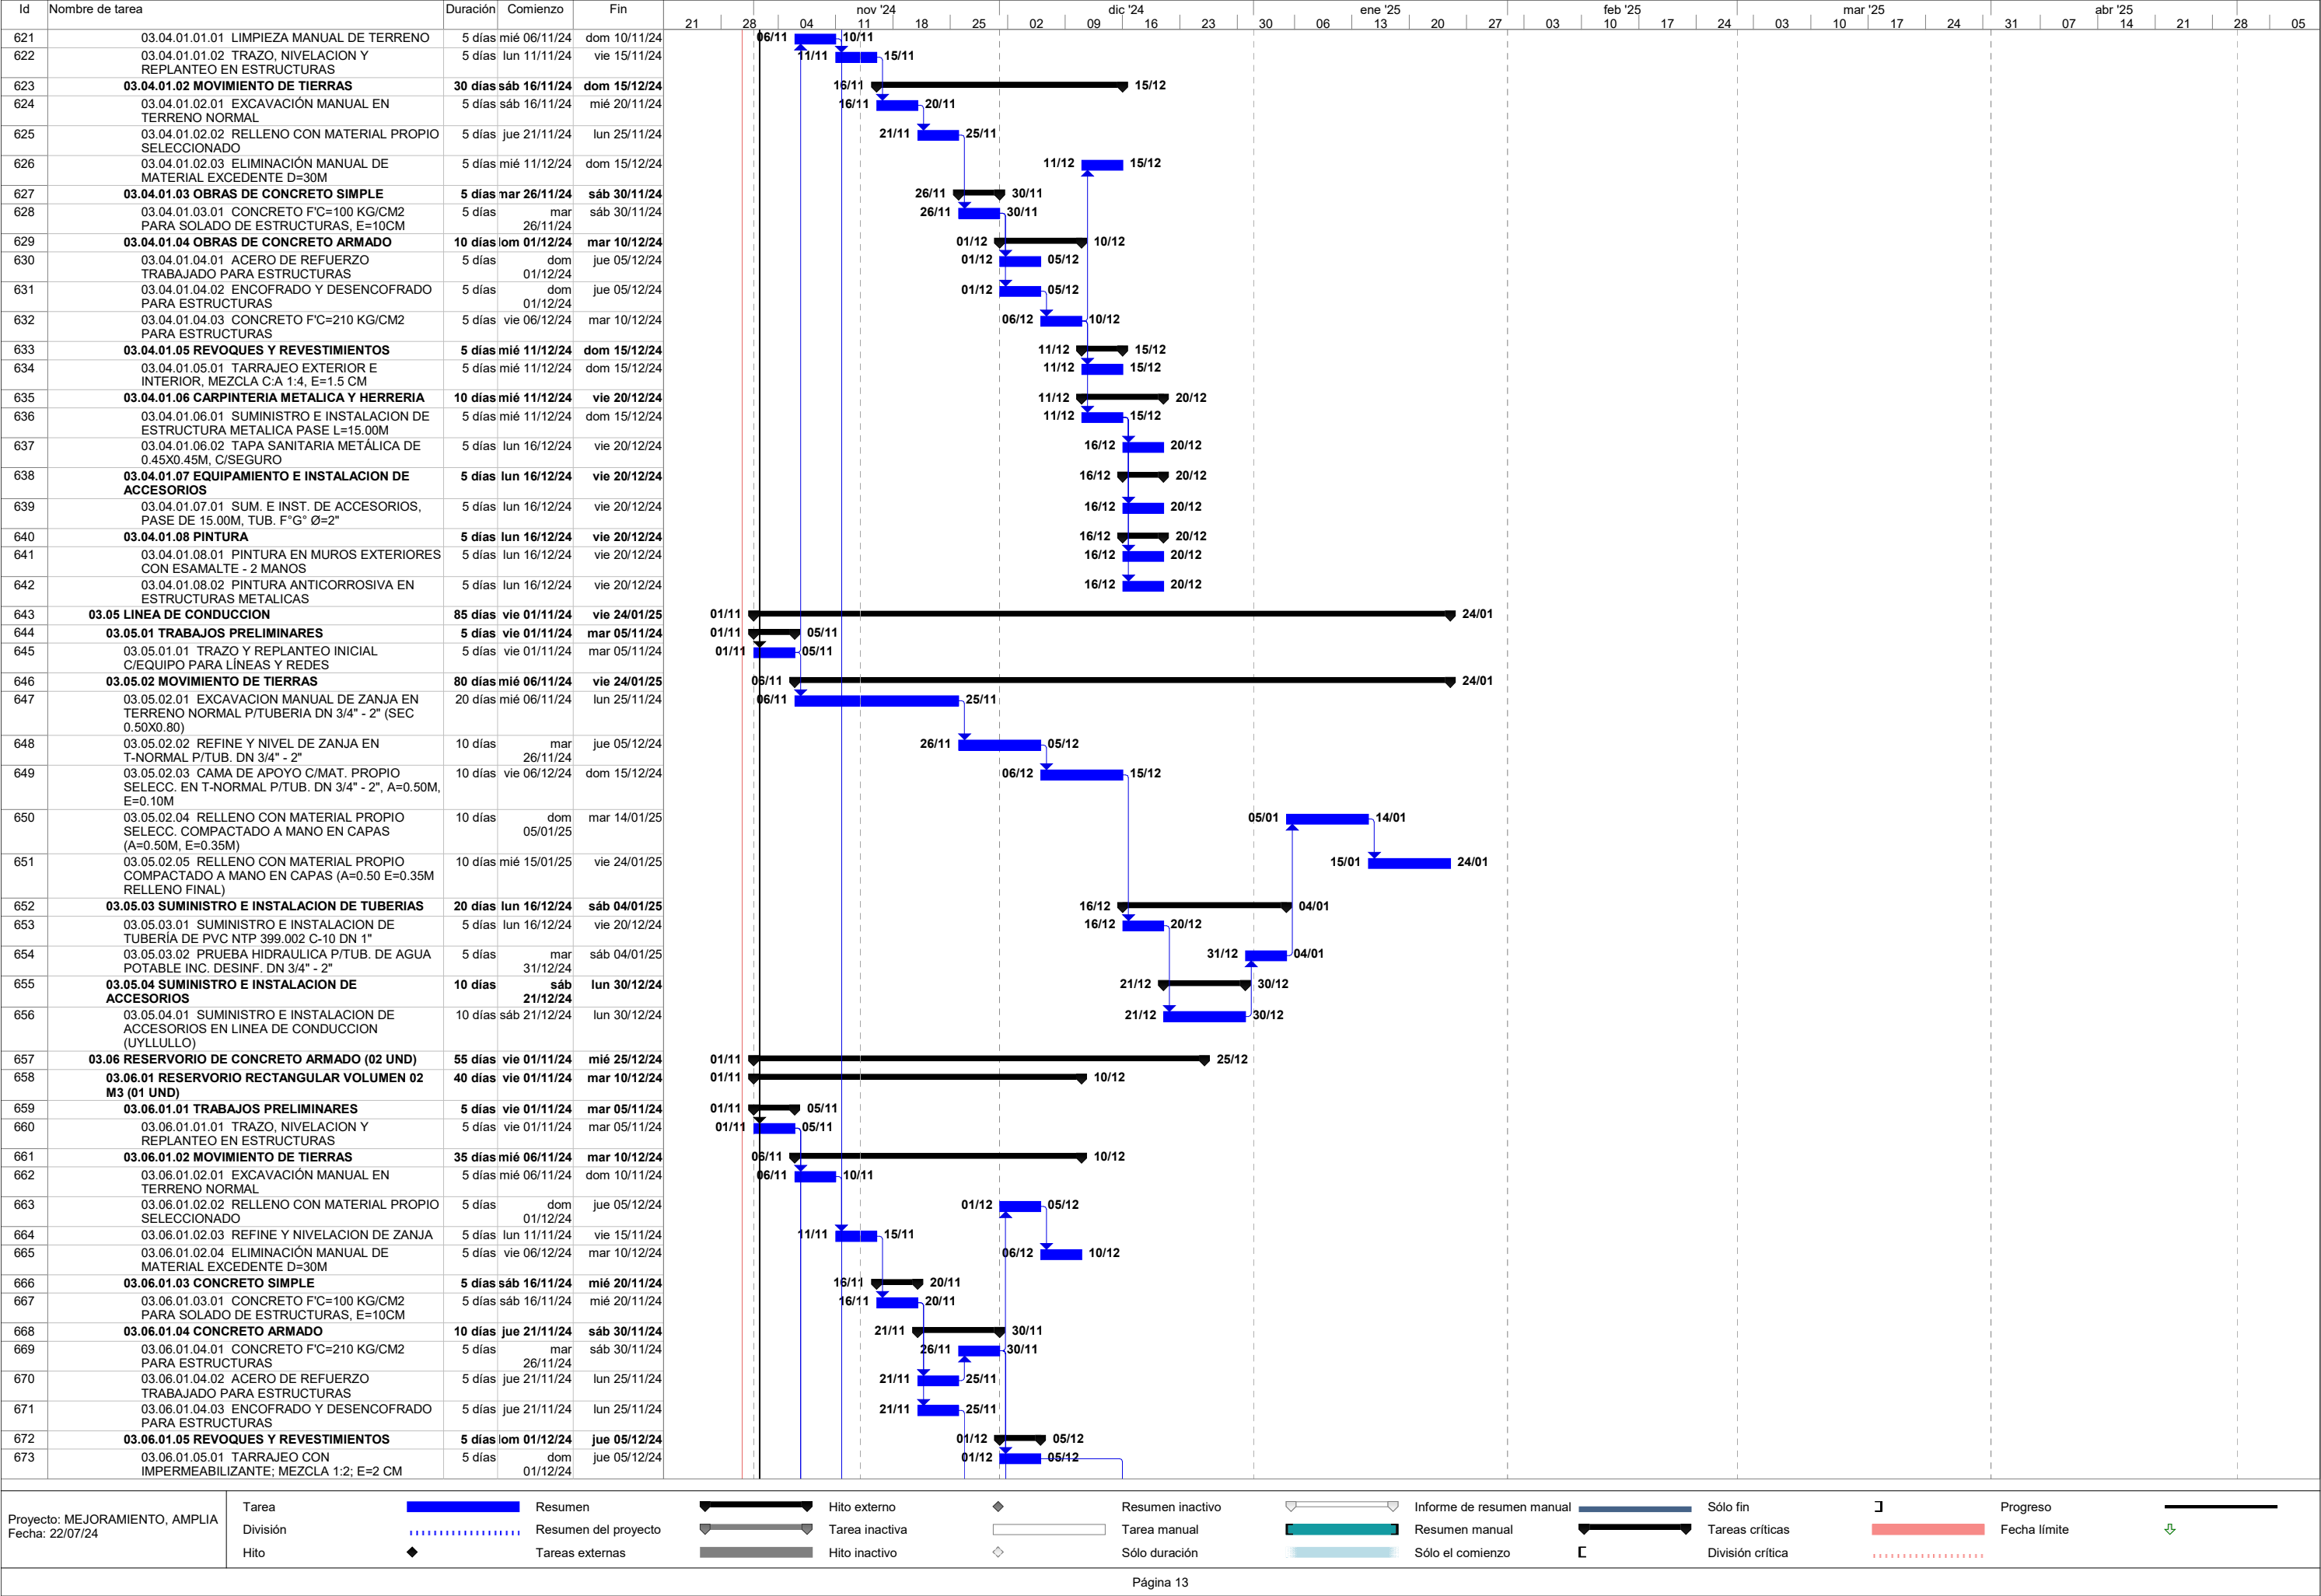

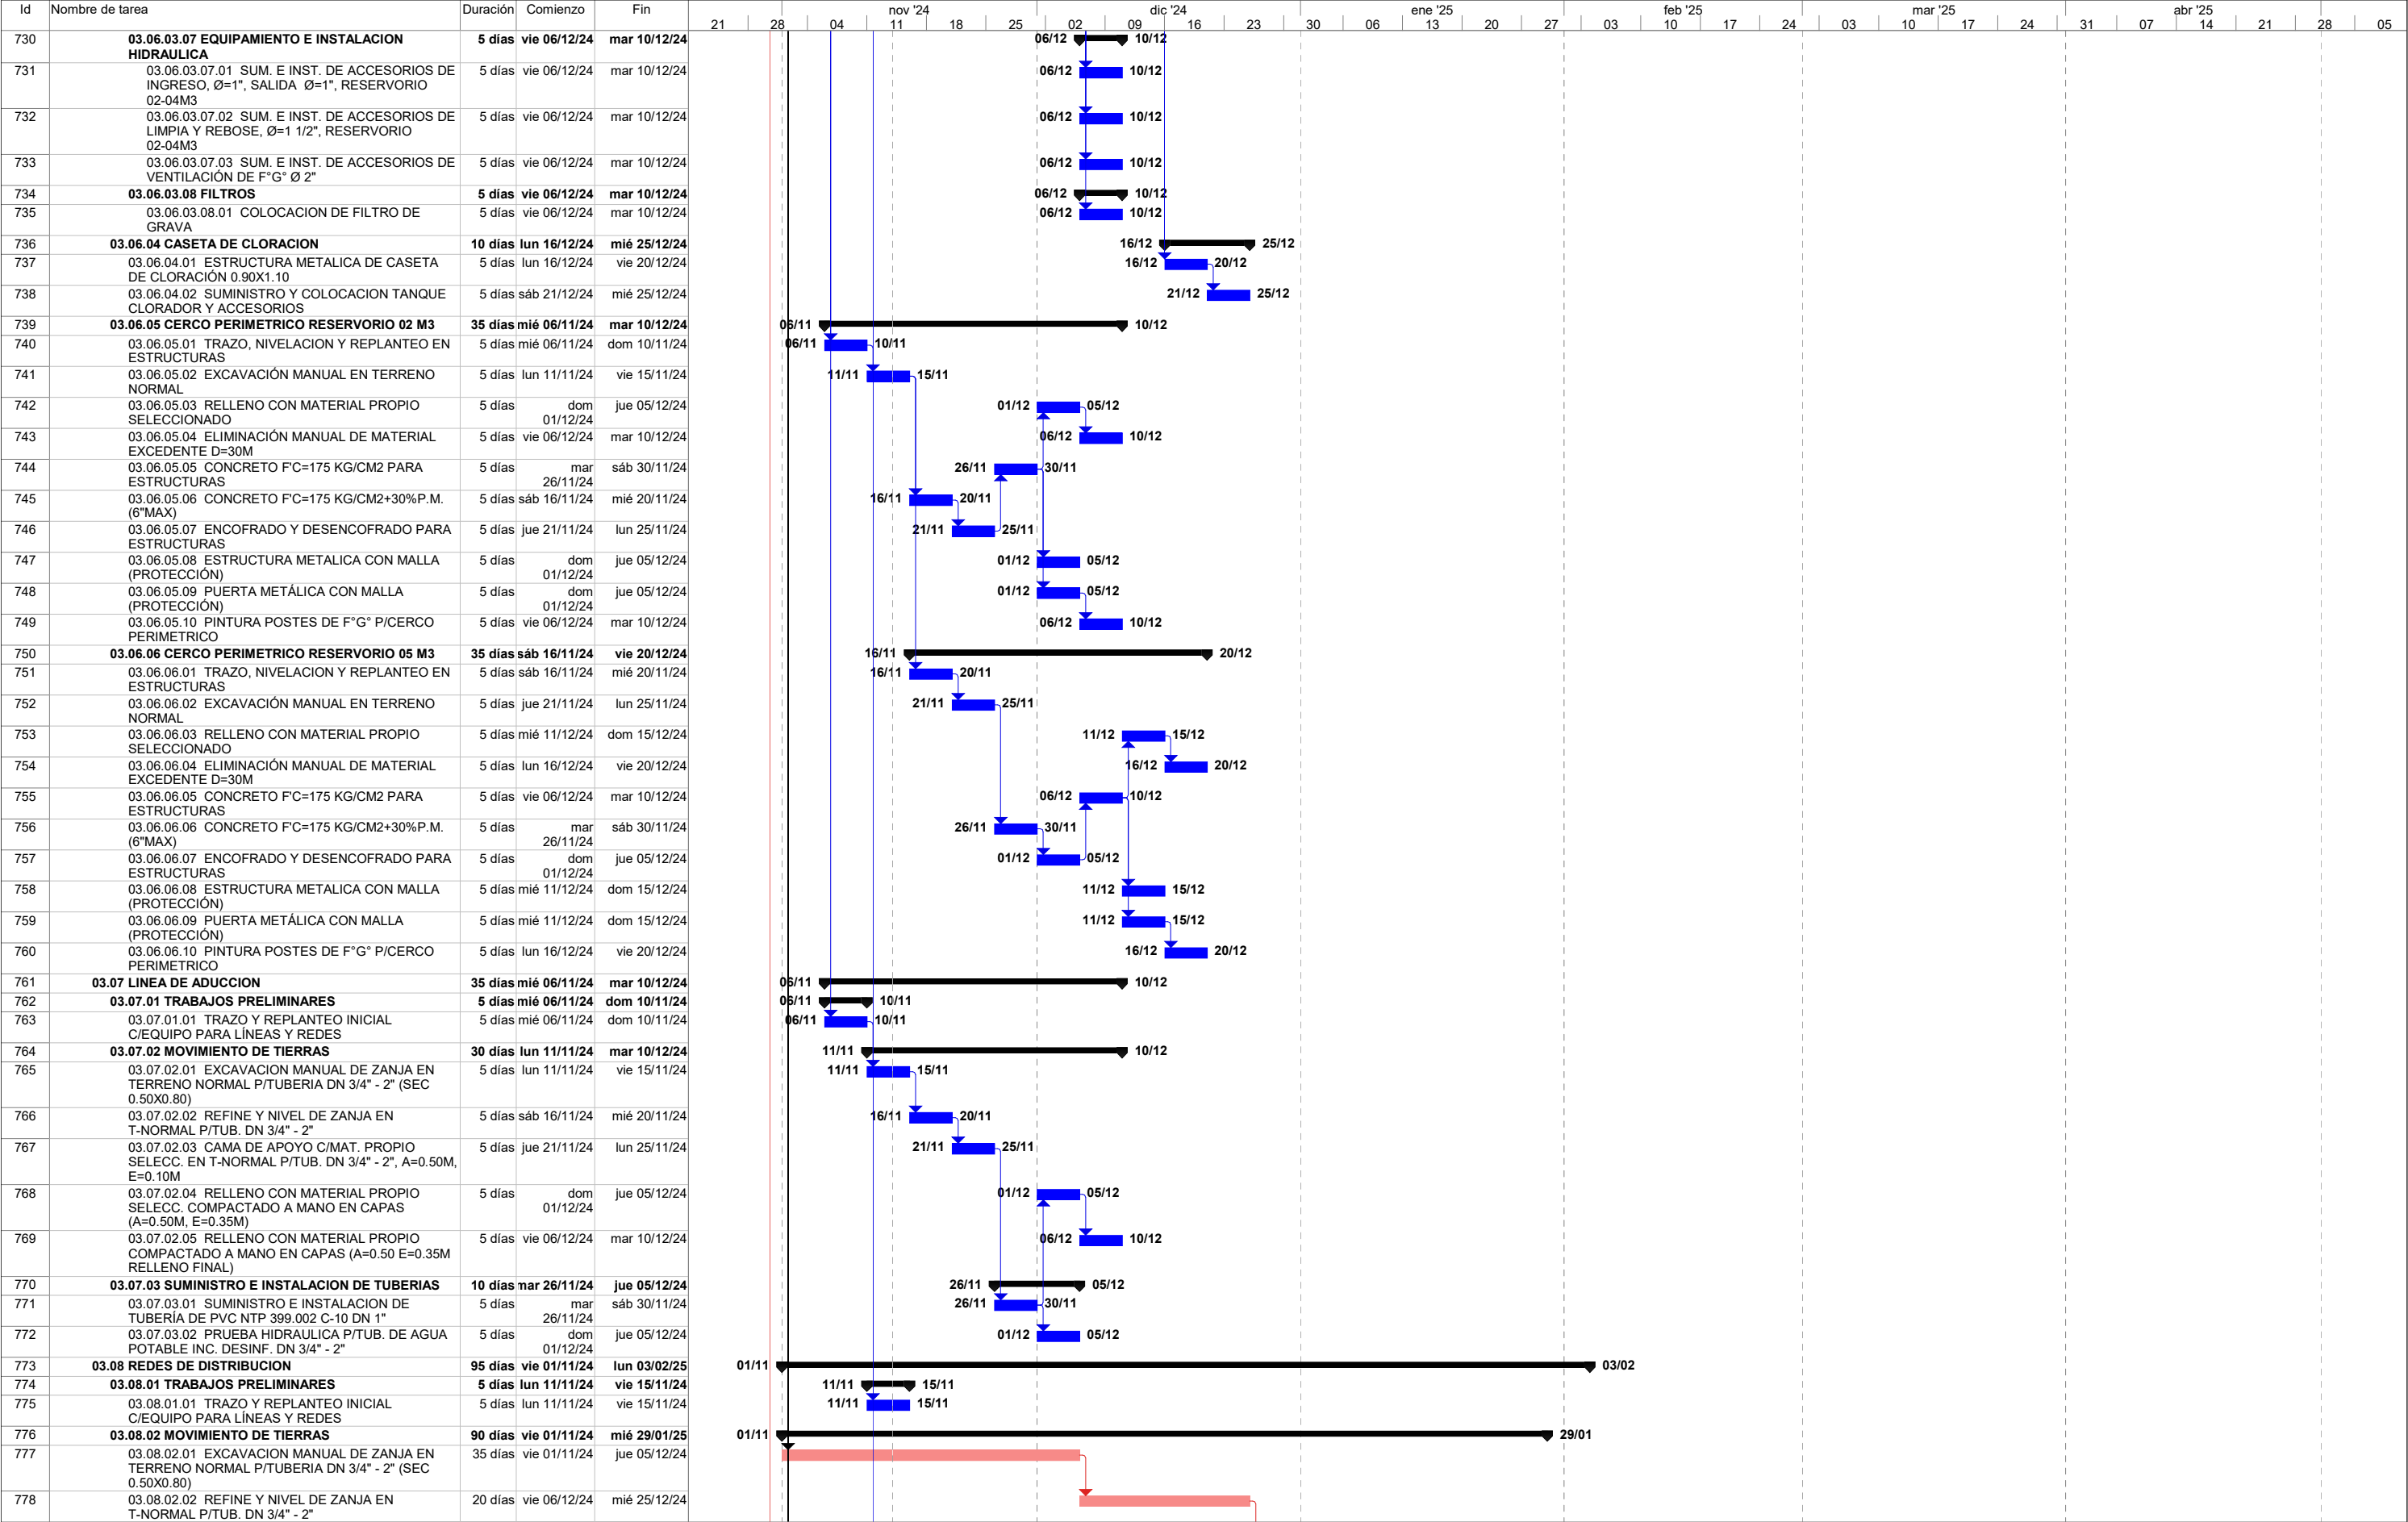

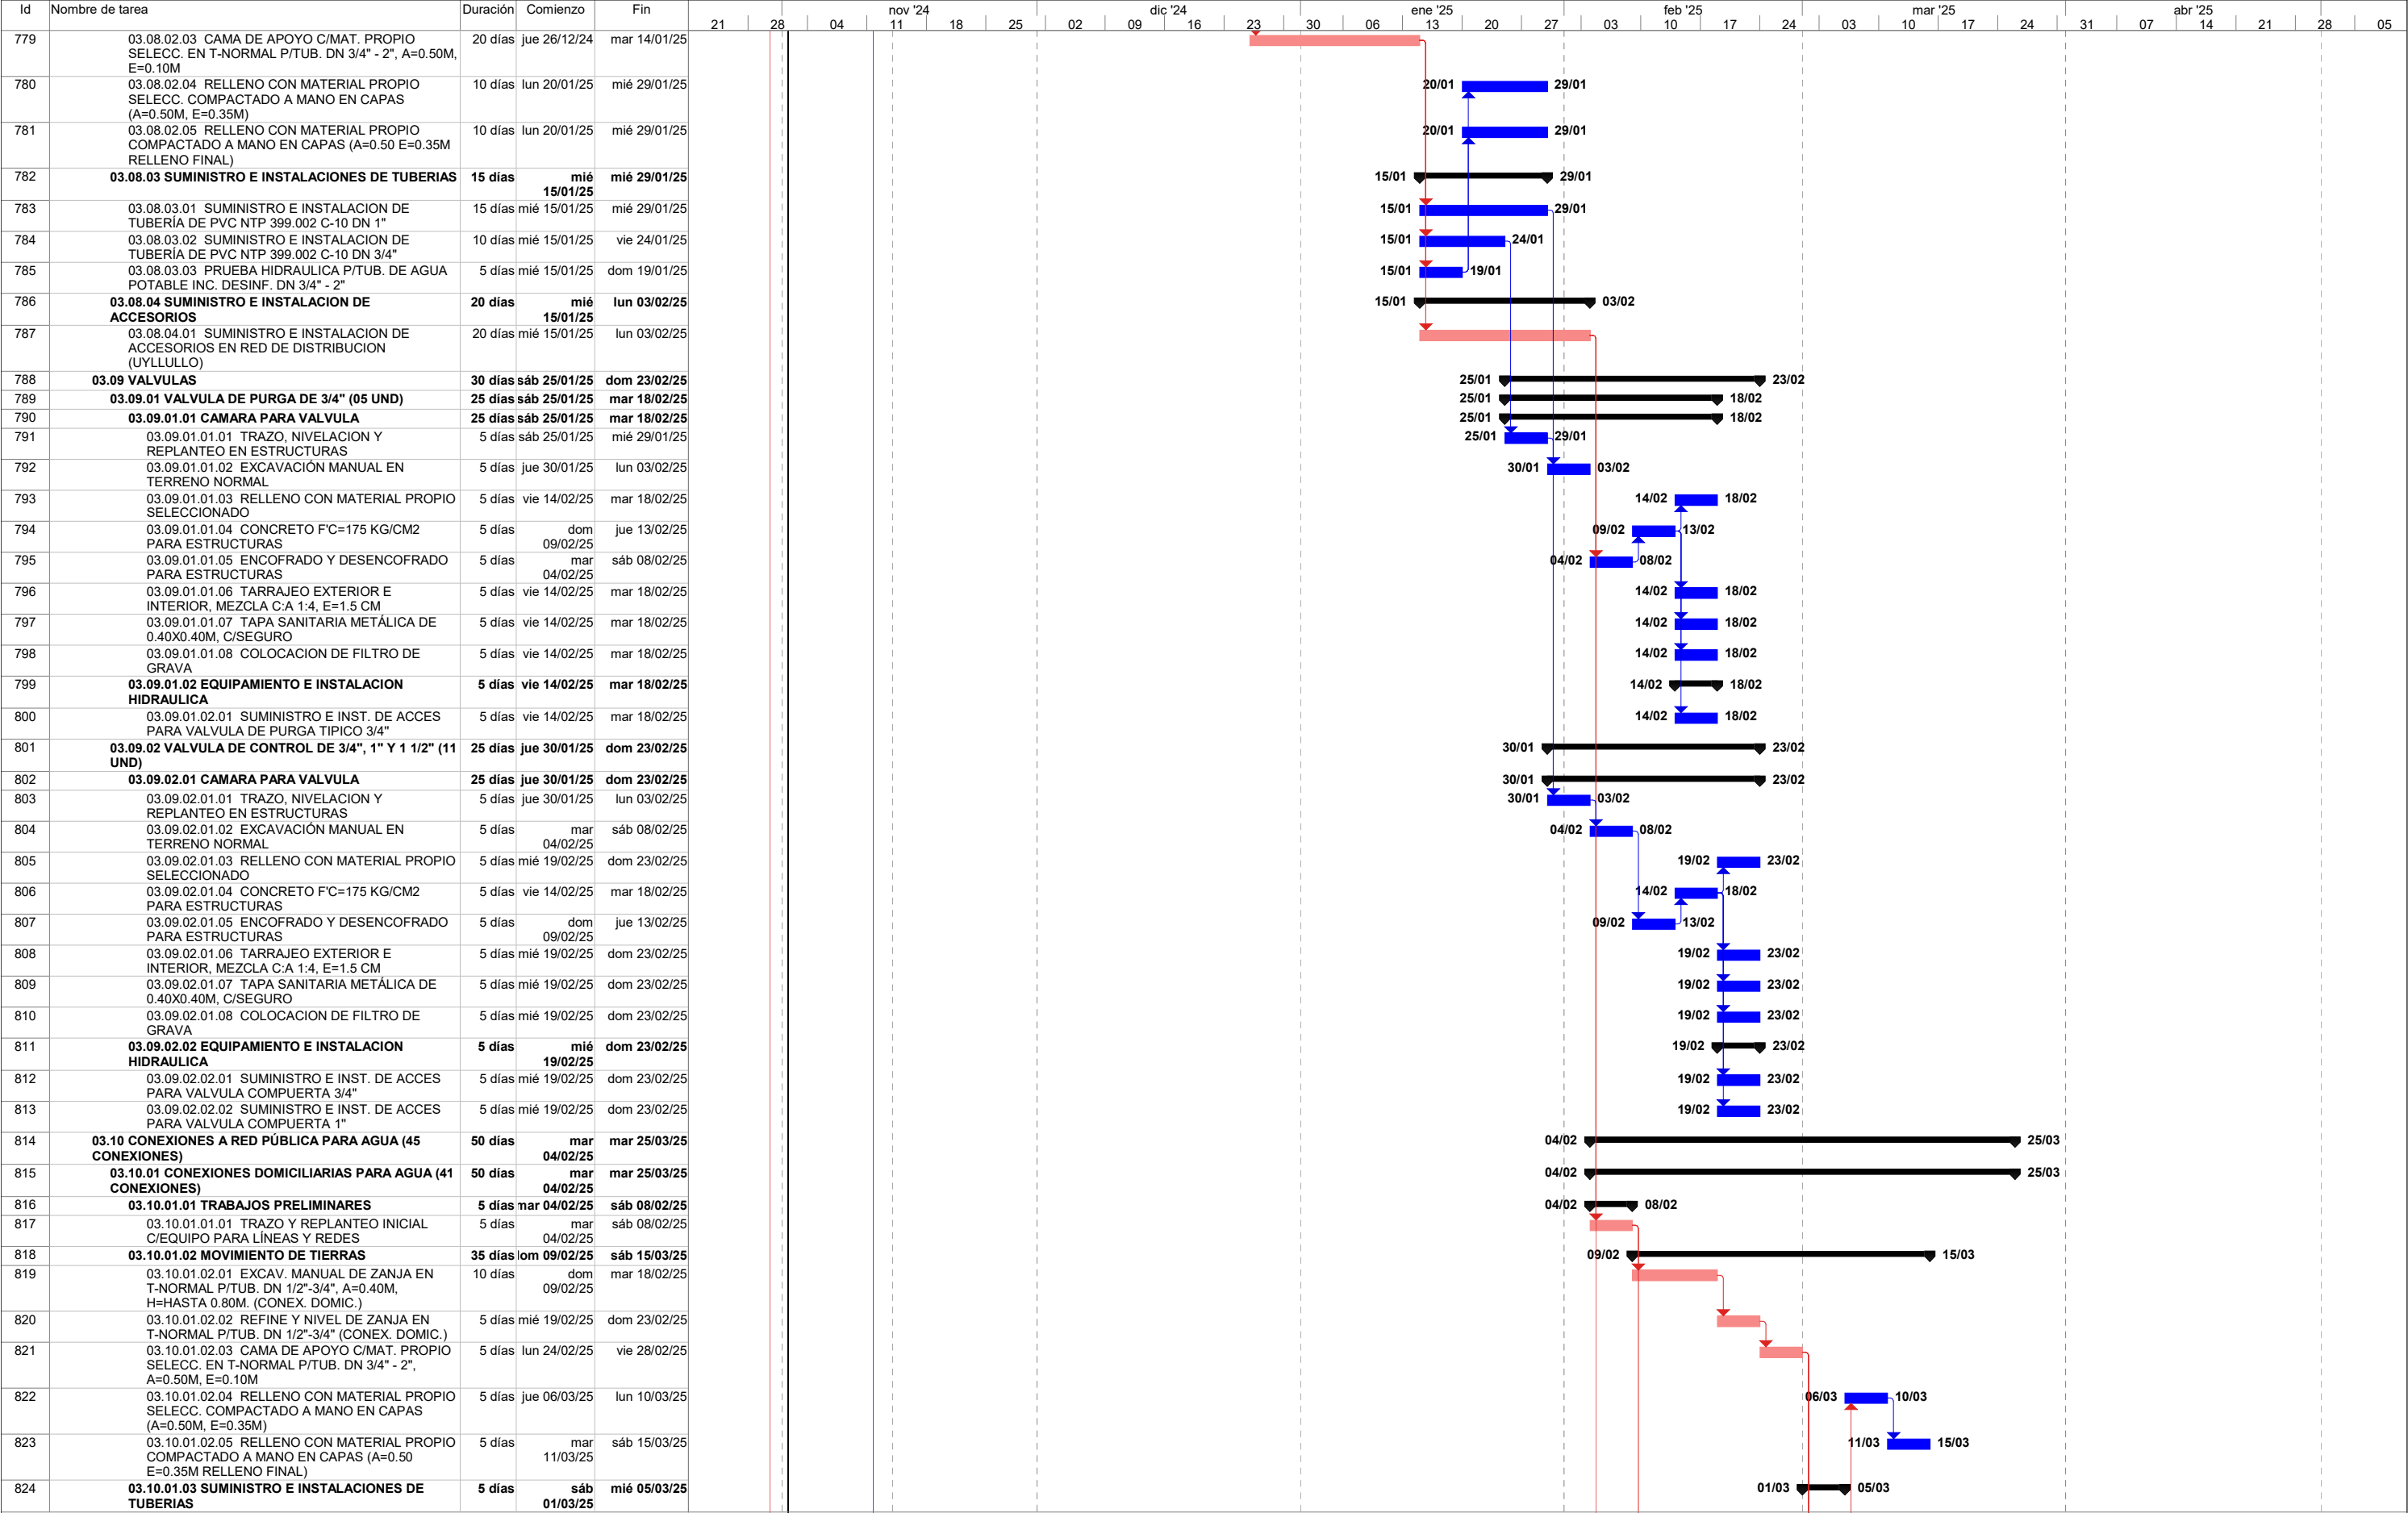

Proyecto: MEJORAMIENTO, AMPLIA
Fecha: 22/07/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Tareas críticas


División crítica

Progreso


Fecha límite


Nombre de tarea			Duración	Comienzo	Fin	nov '24				dic '24				ene '25				feb '25				mar '25				abr '25								
						21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05
825		03.10.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC NTP 399.002 C-10 DN 1/2" (CONEX. DOMIC.)	5 días	sáb 01/03/25	mié 05/03/25																													
826		03.10.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS	5 días	sáb 01/03/25	mié 05/03/25																													
827		03.10.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC P/AGUA POTABLE DN 1/2" MATRIZ 3/4"	5 días	sáb 01/03/25	mié 05/03/25																													
828		03.10.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC P/AGUA POTABLE DN 1/2" MATRIZ 1"	5 días	sáb 01/03/25	mié 05/03/25																													
829		03.10.01.05 CAJAS DE PASO C/TAPA	20 días	lom 09/02/25	vie 28/02/25																													
830		03.10.01.05.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	5 días	dom 09/02/25	jue 13/02/25																													
831		03.10.01.05.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	5 días	vie 14/02/25	mar 18/02/25																													
832		03.10.01.05.03 CAJA DE PASO C/TAPA PRE-FABRICADA	5 días	mié 19/02/25	dom 23/02/25																													
833		03.10.01.05.04 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	5 días	lun 24/02/25	vie 28/02/25																													
834		03.10.01.06 PILETAS DOMICILIARIAS	20 días	jue 06/03/25	mar 25/03/25																													
835		03.10.01.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/PILETA	5 días	jue 06/03/25	lun 10/03/25																													
836		03.10.01.06.02 ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCTURAS	5 días	mar 11/03/25	sáb 15/03/25																													
837		03.10.01.06.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/PILETA	5 días	dom 16/03/25	jue 20/03/25																													
838		03.10.01.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LAVADERO	5 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25																													
839		03.10.01.07 PRUEBA HIDRAULICA	5 días	jue 06/03/25	lun 10/03/25																													
840		03.10.01.07.01 PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. DE AGUA POTABLE INC. DESINF. DN 1/2" - 3/4"	5 días	jue 06/03/25	lun 10/03/25																													
841		03.10.02 CONEXIONES PUBLICAS PARA AGUA (04 CONEXIONES)	35 días	mar 04/02/25	lun 10/03/25																													
842		03.10.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES	5 días	mar 04/02/25	sáb 08/02/25																													
843		03.10.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO PARA LÍNEAS Y REDES	5 días	mar 04/02/25	sáb																													


Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin
875	04.02.01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS	5 días	lun 11/11/24	vie 15/11/24
876	04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS	40 días	sáb 16/11/24	mié 25/12/24
877	04.02.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	5 días	sáb 16/11/24	mié 20/11/24
878	04.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24
879	04.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
880	04.02.02.04 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS DE CORONACION	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24
881	04.02.02.05 ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M	5 días	sáb 21/12/24	mié 25/12/24
882	04.02.02.06 MATERIAL FILTRANTE EN CAPTACIÓ	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
883	04.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	25 días	mar 26/11/24	vie 20/12/24
884	04.02.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO DE ESTRUCTURAS, E=10CM	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24
885	04.02.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2+30%P.M. (6"MAX)	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
886	04.02.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
887	04.02.03.04 DADO P/ TUBERIA DE REBOSE, CONCRETO F'C=175 KG/CM2	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24
888	04.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO	10 días	om 01/12/24	mar 10/12/24
889	04.02.04.01 ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCTURAS	5 días	dom 01/12/24	jue 05/12/24
890	04.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	5 días	dom 01/12/24	jue 05/12/24
891	04.02.04.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS	5 días	vie 06/12/24	mar 10/12/24
892	04.02.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
893	04.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE; MEZCLA 1:2; E=2 CM	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
894	04.02.05.02 TARRAJEO EXTERIOR E INTERIOR, MEZCLA C:A 1:4, E=1.5 CM	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
895	04.02.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
896	04.02.06.01 TAPA SANITARIA METÁLICA DE 0.60X0.60M, C/SEGURO	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
897	04.02.06.02 TAPA SANITARIA METÁLICA DE 0.40X0.40M, C/SEGURO	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
898	04.02.07 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
899	04.02.07.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA, Ø=1", CAPTACIÓ	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
900	04.02.07.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA, Ø=1.5", CAPTACION	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
901	04.02.07.03 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN DE F"G" Ø 2"	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
902	04.02.08 PINTURA	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24
903	04.02.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESAMALTE - 2 MANOS	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24
904	04.02.08.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24
905	04.02.09 LIMPIEZA	5 días	sáb 21/12/24	mié 25/12/24
906	04.02.09.01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	5 días	sáb 21/12/24	mié 25/12/24
907	04.02.10 CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION	35 días	sáb 16/11/24	vie 20/12/24
908	04.02.10.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS	5 días	sáb 16/11/24	mié 20/11/24
909	04.02.10.02 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24
910	04.02.10.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
911	04.02.10.04 ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24
912	04.02.10.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS	5 días	vie 06/12/24	mar 10/12/24
913	04.02.10.06 CONCRETO F'C=175 KG/CM2+30%P.M. (6"MAX)	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24
914	04.02.10.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	5 días	dom 01/12/24	jue 05/12/24
915	04.02.10.08 PINTURA POSTES DE F"G" P/CERCO PERIMETRICO	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24
916	04.02.10.09 ESTRUCTURA METALICA CON MALLA (PROTECCIÓN)	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
917	04.02.10.10 PUERTA METÁLICA CON MALLA (PROTECCIÓN)	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
918	04.03 CAMARA ROMPE PRESIÓN (02 UND)	45 días	lun 11/11/24	mié 25/12/24
919	04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES	10 días	lun 11/11/24	mié 20/11/24
920	04.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	5 días	lun 11/11/24	vie 15/11/24
921	04.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS	5 días	sáb 16/11/24	mié 20/11/24
922	04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS	30 días	jue 21/11/24	vie 20/12/24
923	04.03.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24
924	04.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24
925	04.03.02.03 ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M</			

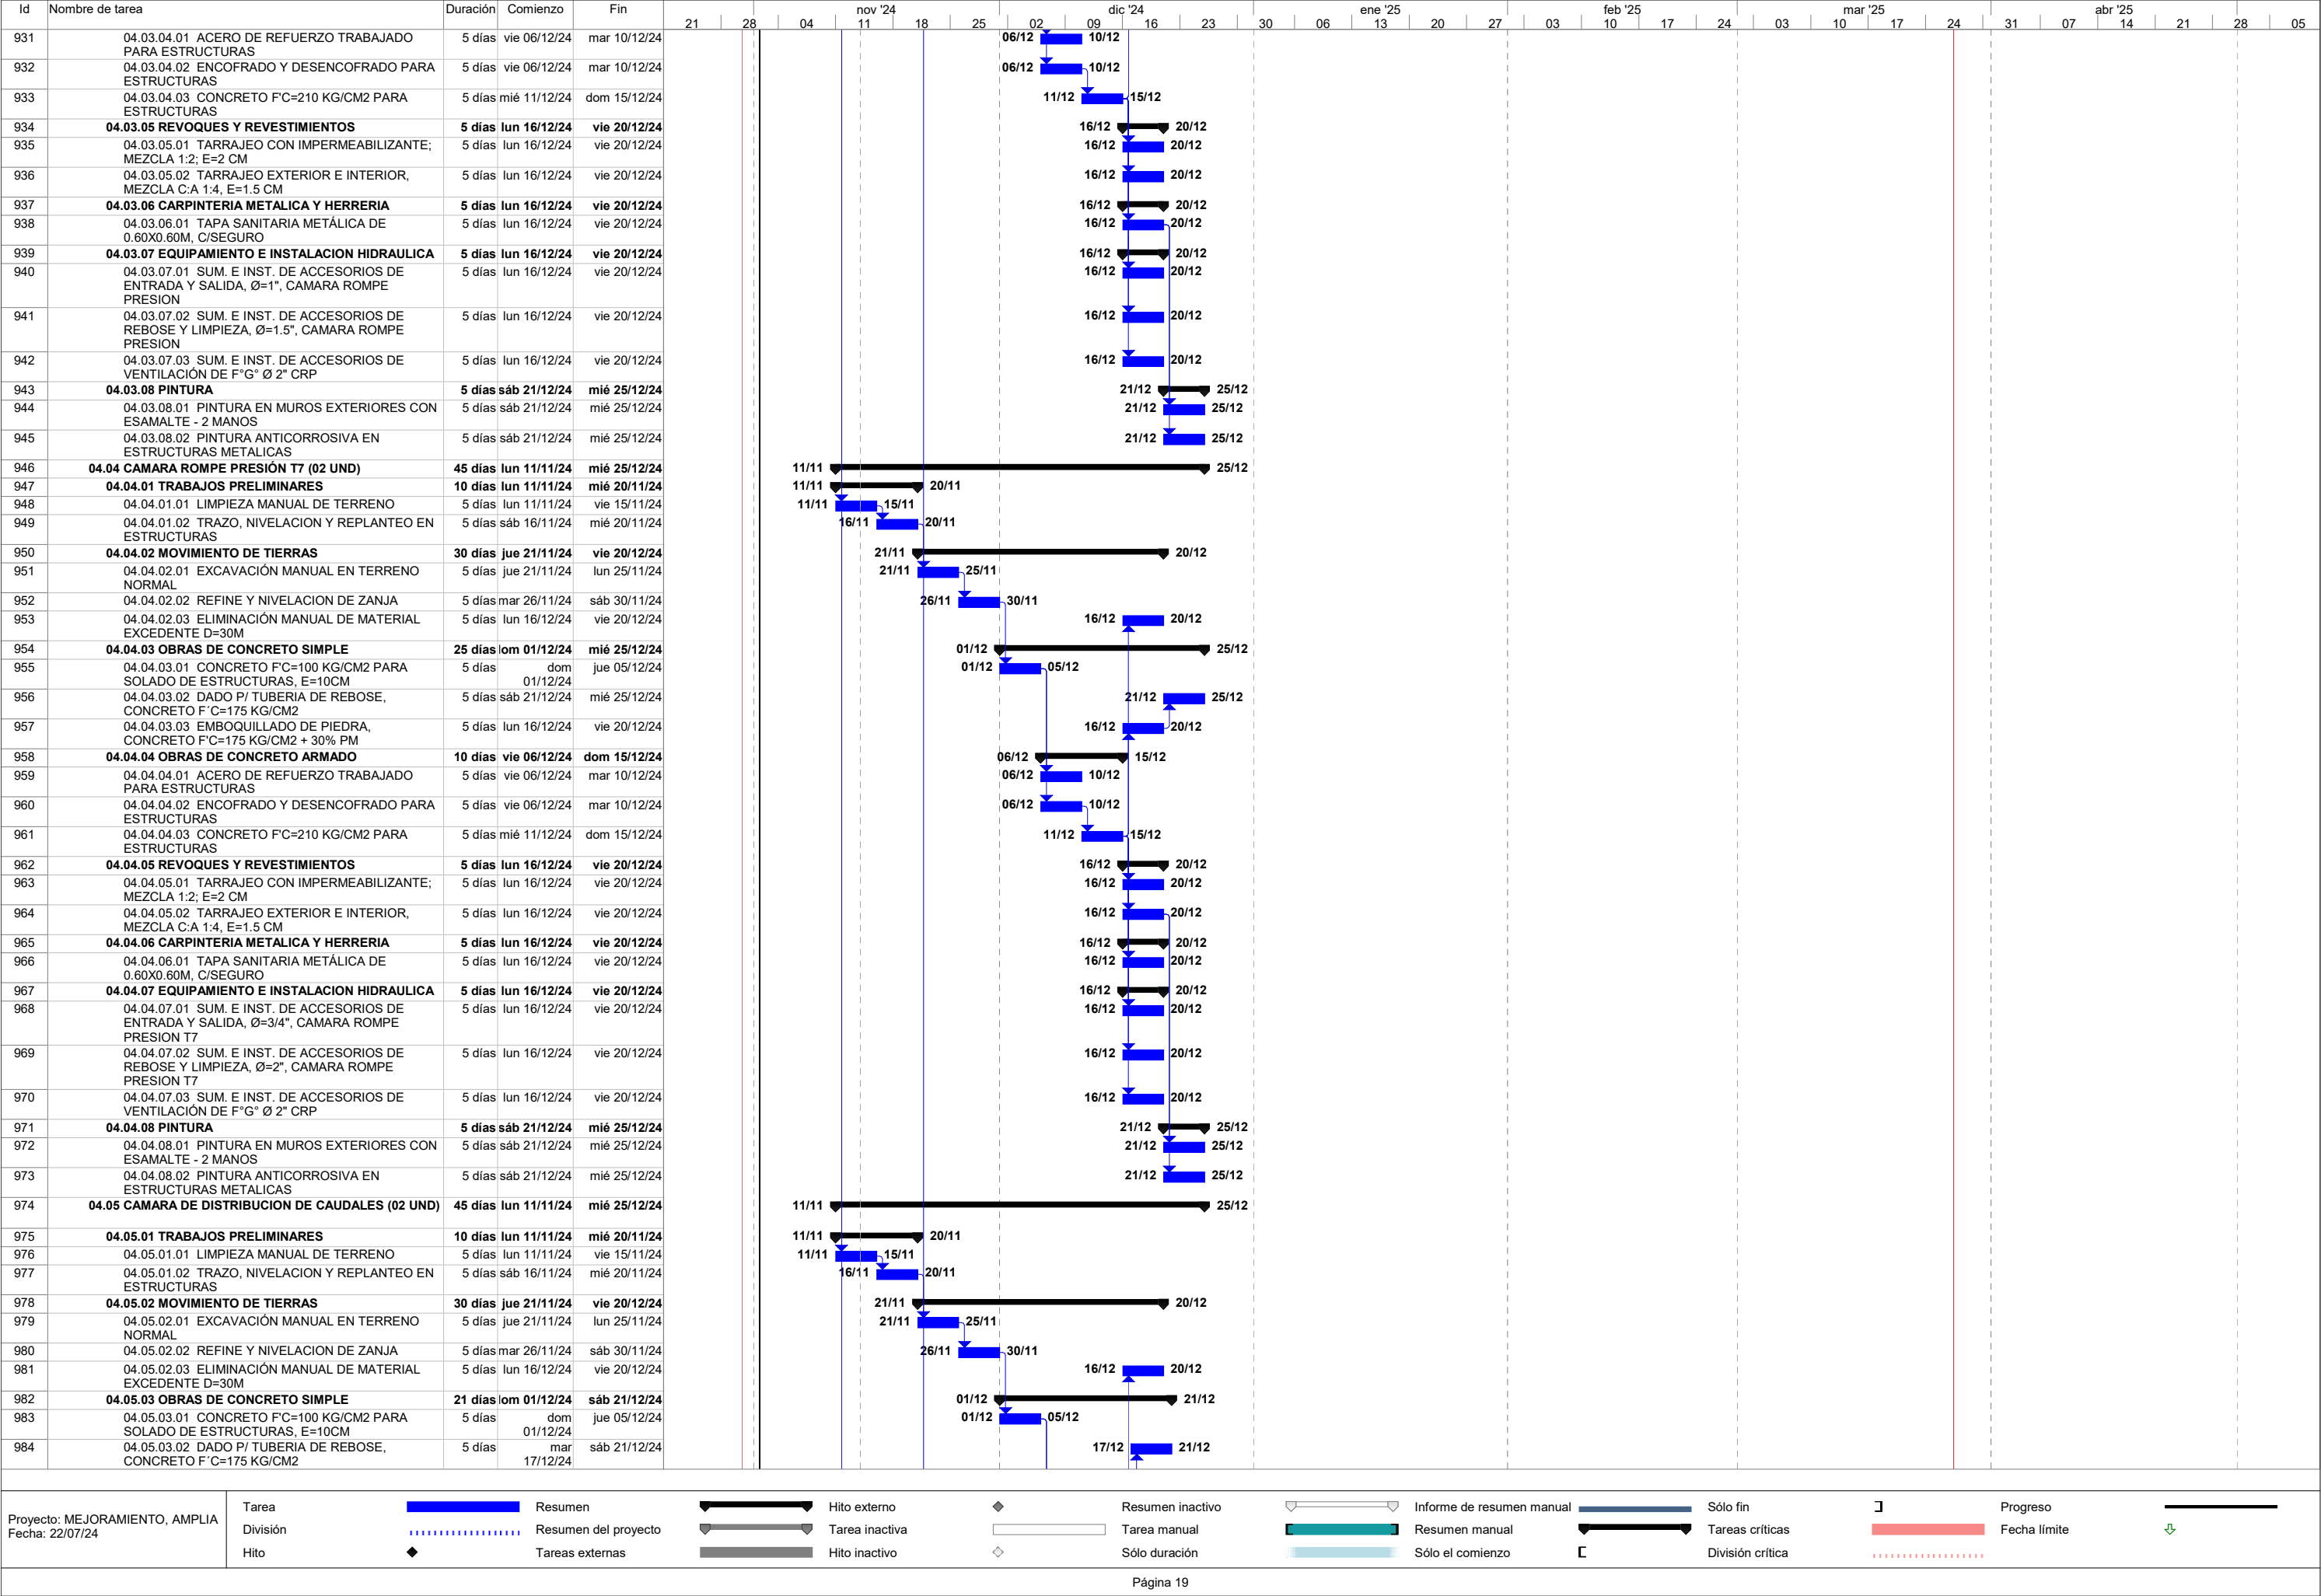



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21	28	04	nov '24	18	25	02	09	dic '24	16	23	30	06	ene '25	13	20	27	03	feb '25	10	17	24	03	mar '25	10	17	24	31	07	abr '25	14	21	28	05
985	04.05.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24									16/12	16/12																								
986	04.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO	10 días	vie 06/12/24	dom 15/12/24								06/12	15/12																									
987	04.05.04.01 ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCTURAS	5 días	vie 06/12/24	mar 10/12/24								06/12	10/12																									
988	04.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	5 días	vie 06/12/24	mar 10/12/24								06/12	10/12																									
989	04.05.04.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24								11/12	15/12																									
990	04.05.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24									16/12	20/12																								
991	04.05.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE; MEZCLA 1:2; E=2 CM	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24									16/12	20/12																								
992	04.05.05.02 TARRAJEO EXTERIOR E INTERIOR, MEZCLA C:A 1:4, E=1.5 CM	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24									16/12	20/12																								
993	04.05.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24									16/12	20/12																								
994	04.05.06.01 TAPA SANITARIA METÁLICA DE 0.60X0.60M, C/SEGURO	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24									16/12	20/12																								
995	04.05.06.02 TAPA SANITARIA METÁLICA DE 0.40X0.40M, C/SEGURO	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24									16/12	20/12																								
996	04.05.07 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24									16/12	20/12																								
997	04.05.07.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE ENTRADA, Ø=1", CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24									16/12	20/12																								
998	04.05.07.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA, Ø=1", CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24									16/12	20/12																								
999	04.05.07.03 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA, Ø=1.5", CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24									16/12	20/12																								
1000	04.05.08 PINTURA	5 días	sáb 21/12/24	mié 25/12/24									21/12	25/12																								
1001	04.05.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESAMALTE - 2 MANOS	5 días	sáb 21/12/24	mié 25/12/24									21/12	25/12																								
1002	04.05.08.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS	5 días	sáb 21/12/24	mié 25/12/24									21/12	25/12																								
1003	04.06 PASE AEREO DE LUZ 10M Y 12M (03 UND)	45 días	mié 06/11/24	vie 20/12/24	05/11																																	
1004	04.06.01 PASE AEREO L=10.00 m. CERCHA METALICA (02 UND)	45 días	mié 06/11/24	vie 20/12/24	05/11																																	
1005	04.06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES	10 días	mié 06/11/24	vie 15/11/24	05/11																																	
1006	04.06.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	5 días	mié 06/11/24	dom 10/11/24	06/11																																	
1007	04.06.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS	5 días	lun 11/11/24	vie 15/11/24	06/11																																	
1008	04.06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS	30 días	sáb 16/11/24	dom 15/12/24									16/11	15/12																								
1009	04.06.01.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	5 días	sáb 16/11/24	mié 20/11/24									16/11	20/11																								
1010	04.06.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24									21/11	25/11																								
1011	04.06.01.02.03 ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24									11/12	15/12																								
1012	04.06.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24									26/11	30/11																								
1013	04.06.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO DE ESTRUCTURAS, E=10CM	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24									26/11	30/11																								
1014	04.06.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO	10 días	lom 01/12/24	mar 10/12/24									01/12	10/12																								
1015	04.06.01.04.01 ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCTURAS	5 días	dom 01/12/24	jue 05/12/24									01/12	05/12																								
1016	04.06.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	5 días	dom 01/12/24	jue 05/12/24									01/12	05/12																								
1017	04.06.01.04.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS	5 días	vie 06/12/24	mar 10/12/24									06/12	10/12																								
1018	04.06.01.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24									11/12	15/12																								
1019	04.06.01.05.01 TARRAJEO EXTERIOR E INTERIOR, MEZCLA C:A 1:4, E=1.5 CM	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24									11/12	15/12																								
1020	04.06.01.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	10 días	mié 11/12/24	vie 20/12/24									11/12	20/12																								
1021	04.06.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PASE L=10.00M	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24									11/12	15/12																								
1022	04.06.01.06.02 TAPA SANITARIA METÁLICA DE 0.45X0.45M, C/SEGURO	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24									16/12	20/12																								
1023	04.06.01.07 EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ACCESORIOS	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24									16/12	20/12																								
1024	04.06.01.07.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS, PASE DE 10.00M, TUB. F°G° Ø=2"	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24									16/12	20/12																								
1025	04.06.01.08 PINTURA	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24									16/12	20/12																								
1026	04.06.01.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESAMALTE - 2 MANOS	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24									16/12	20/12																								
1027	04.06.01.08.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24									16/12	20/12																								
1028	04.06.02 PASE AEREO L=12.00 m. CERCHA METALICA (01 UND)	45 días	mié 06/11/24	vie 20/12/24	05/11																																	
1029	04.06.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES	10 días	mié 06/11/24	vie 15/11/24	05/11																																	
1030	04.06.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	5 días	mié 06/11/24	dom 10/11/24	06/11																																	
1031	04.06.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS	5 días	lun 11/11/24	vie 15/11/24	06/11																																	
1032	04.06.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS	30 días	sáb 16/11/24	dom 15/12/24									16/11	15/12																								
1033	04.06.02.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	5 días	sáb 16/11/24	mié 20/11/24									16/11	20/11																								
1034	04.06.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24									21/11	25/11																								
1035	04.06.02.02.03 ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24									11/12	15/12																								
1036	04.06.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/1																																		

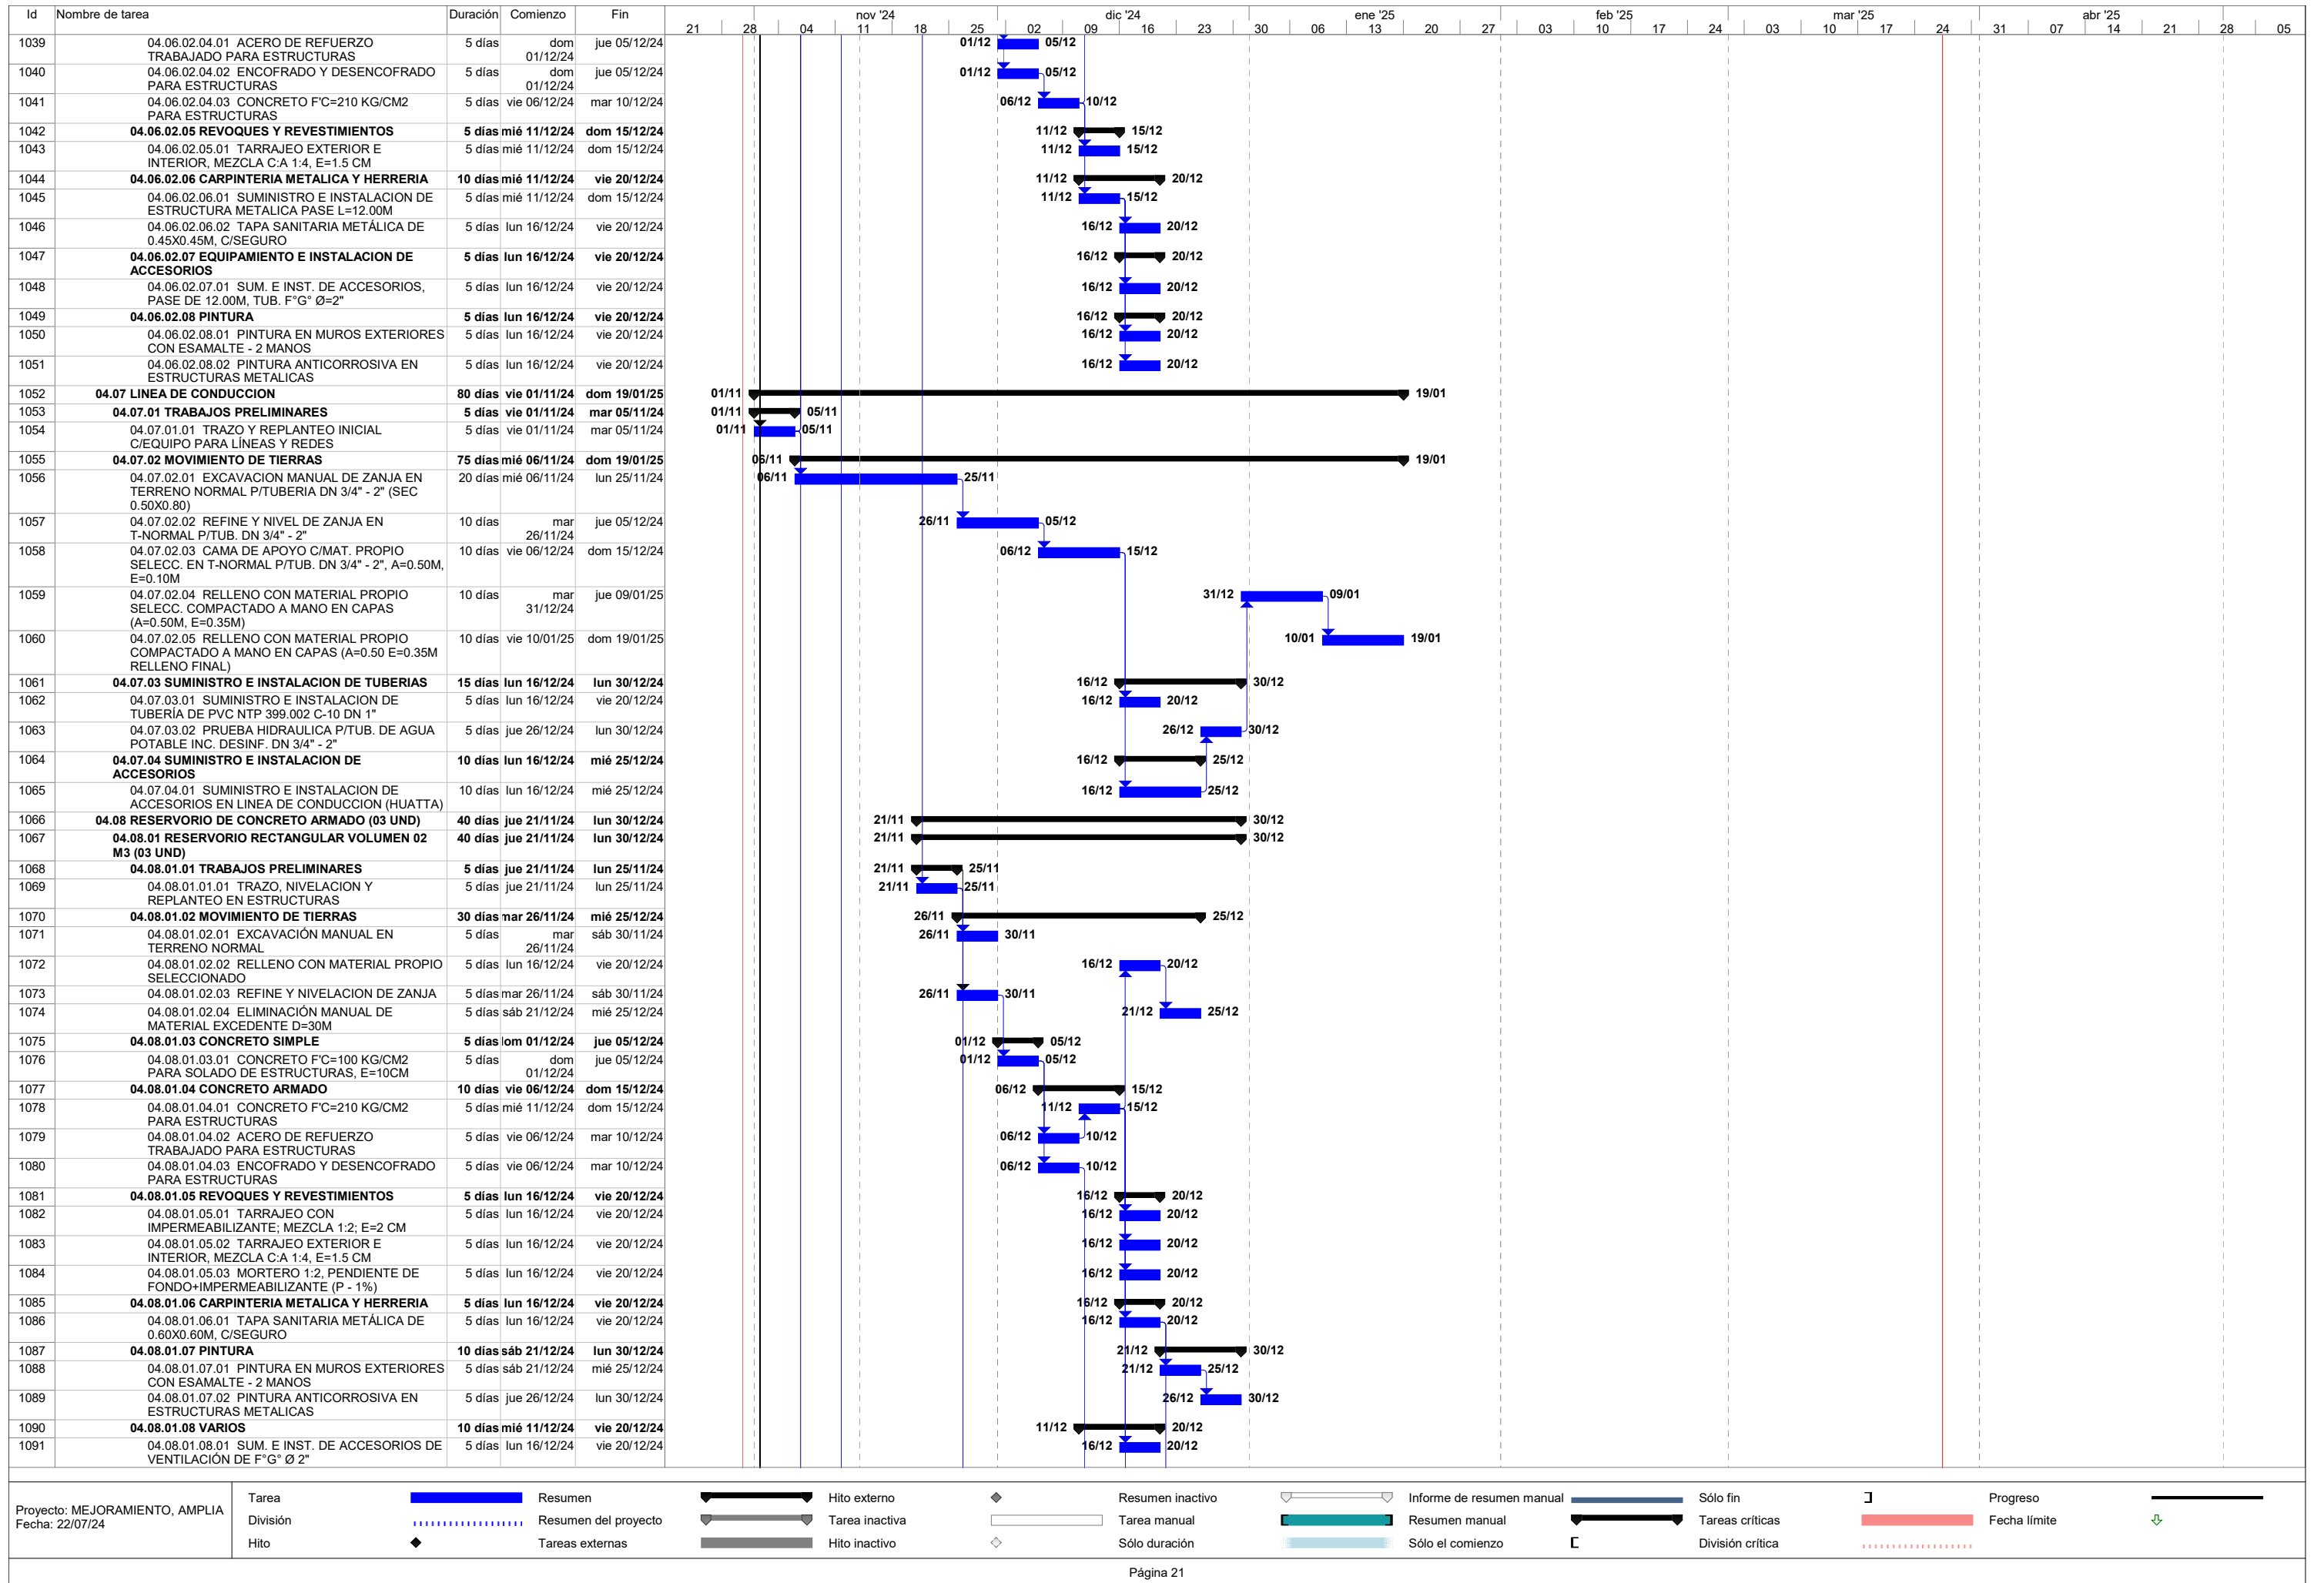


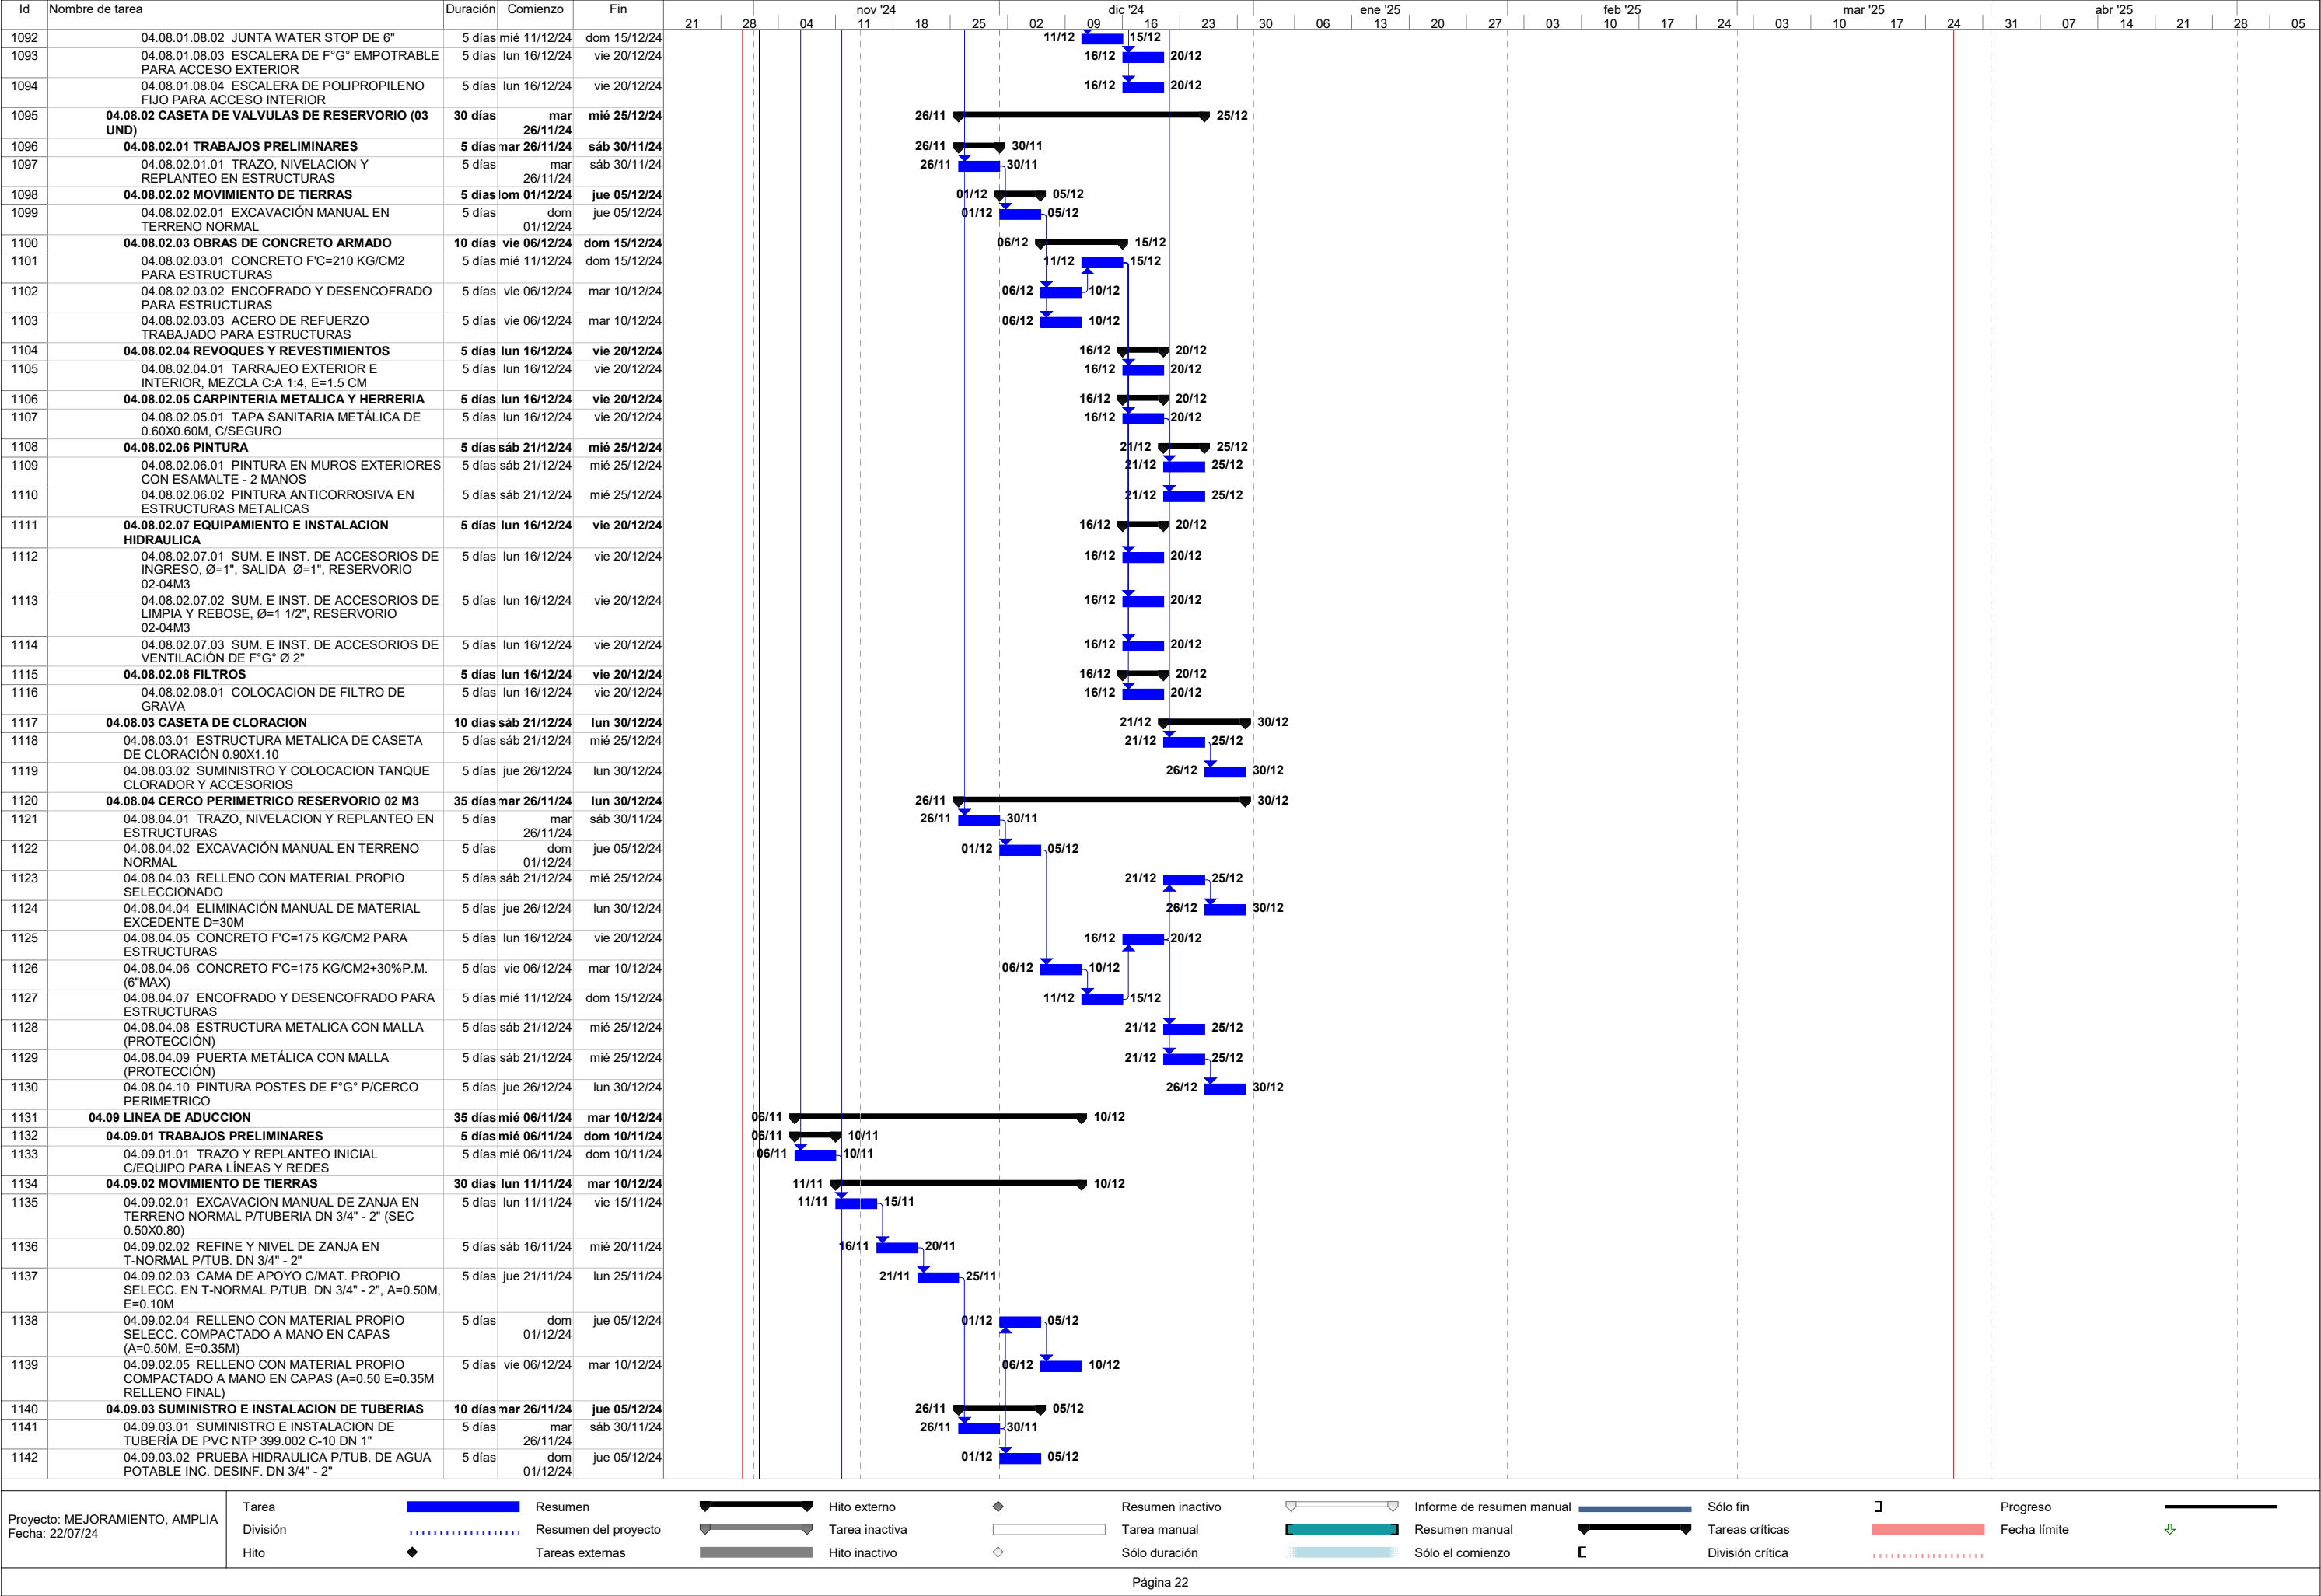


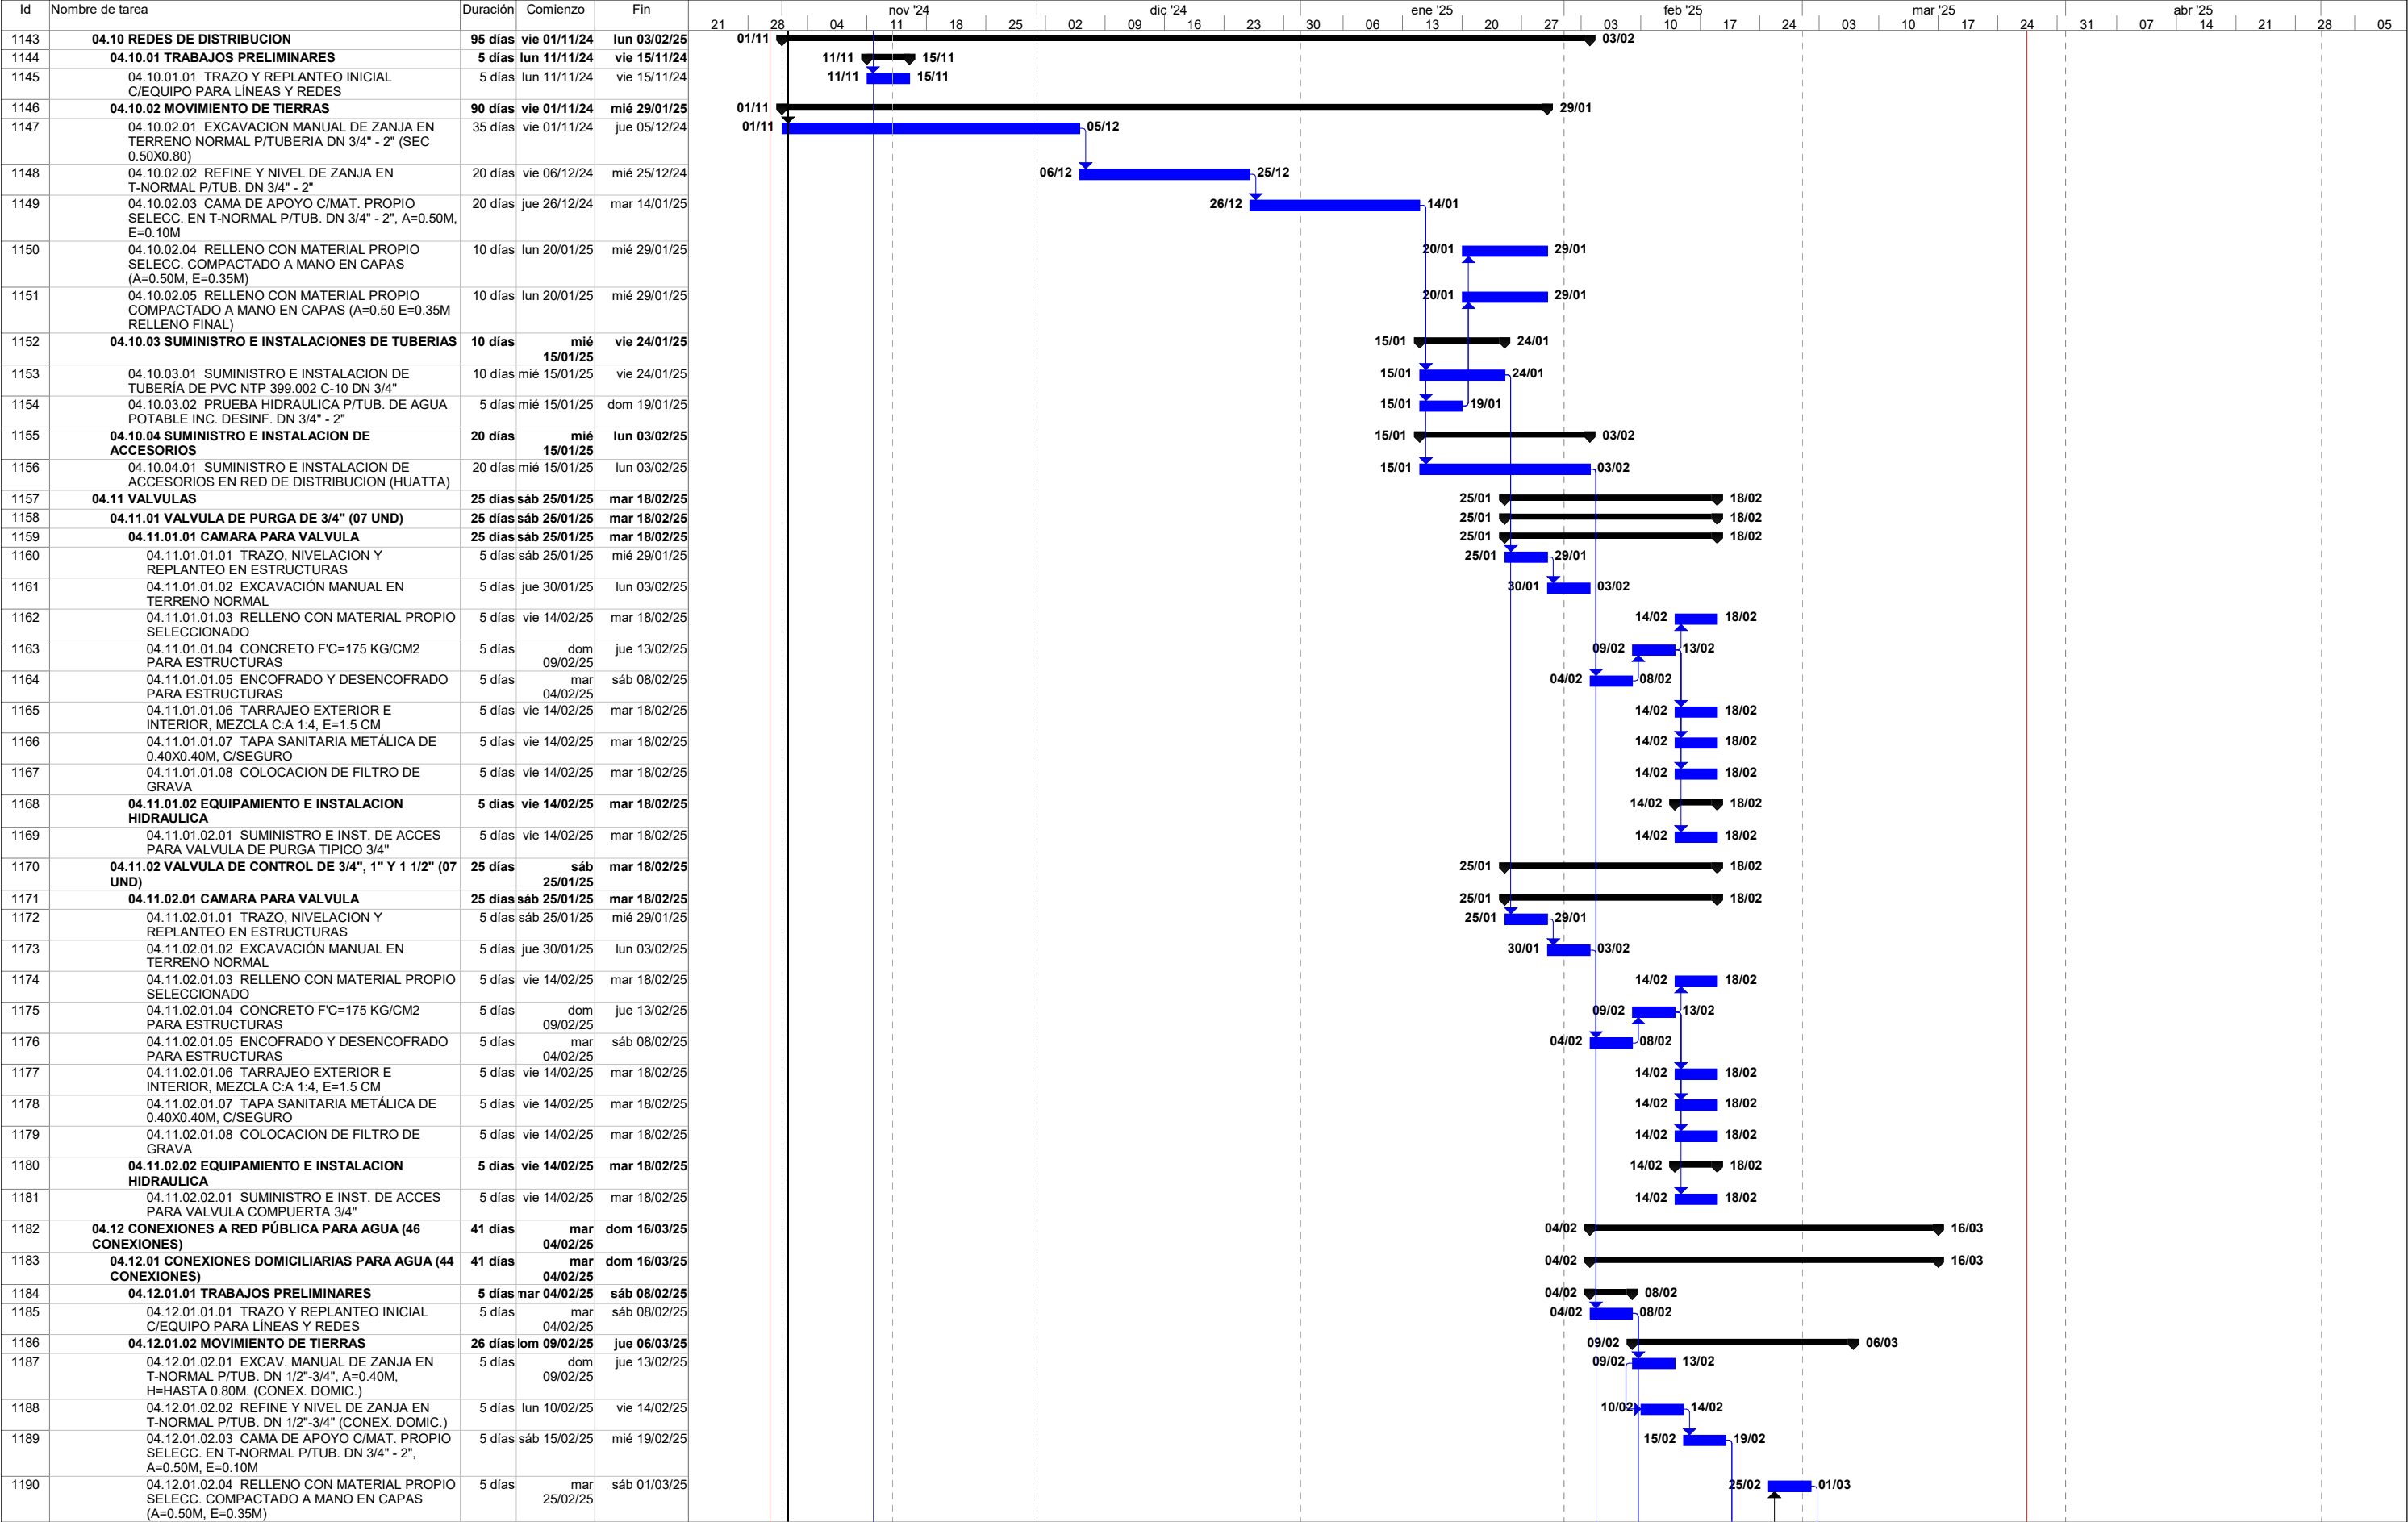


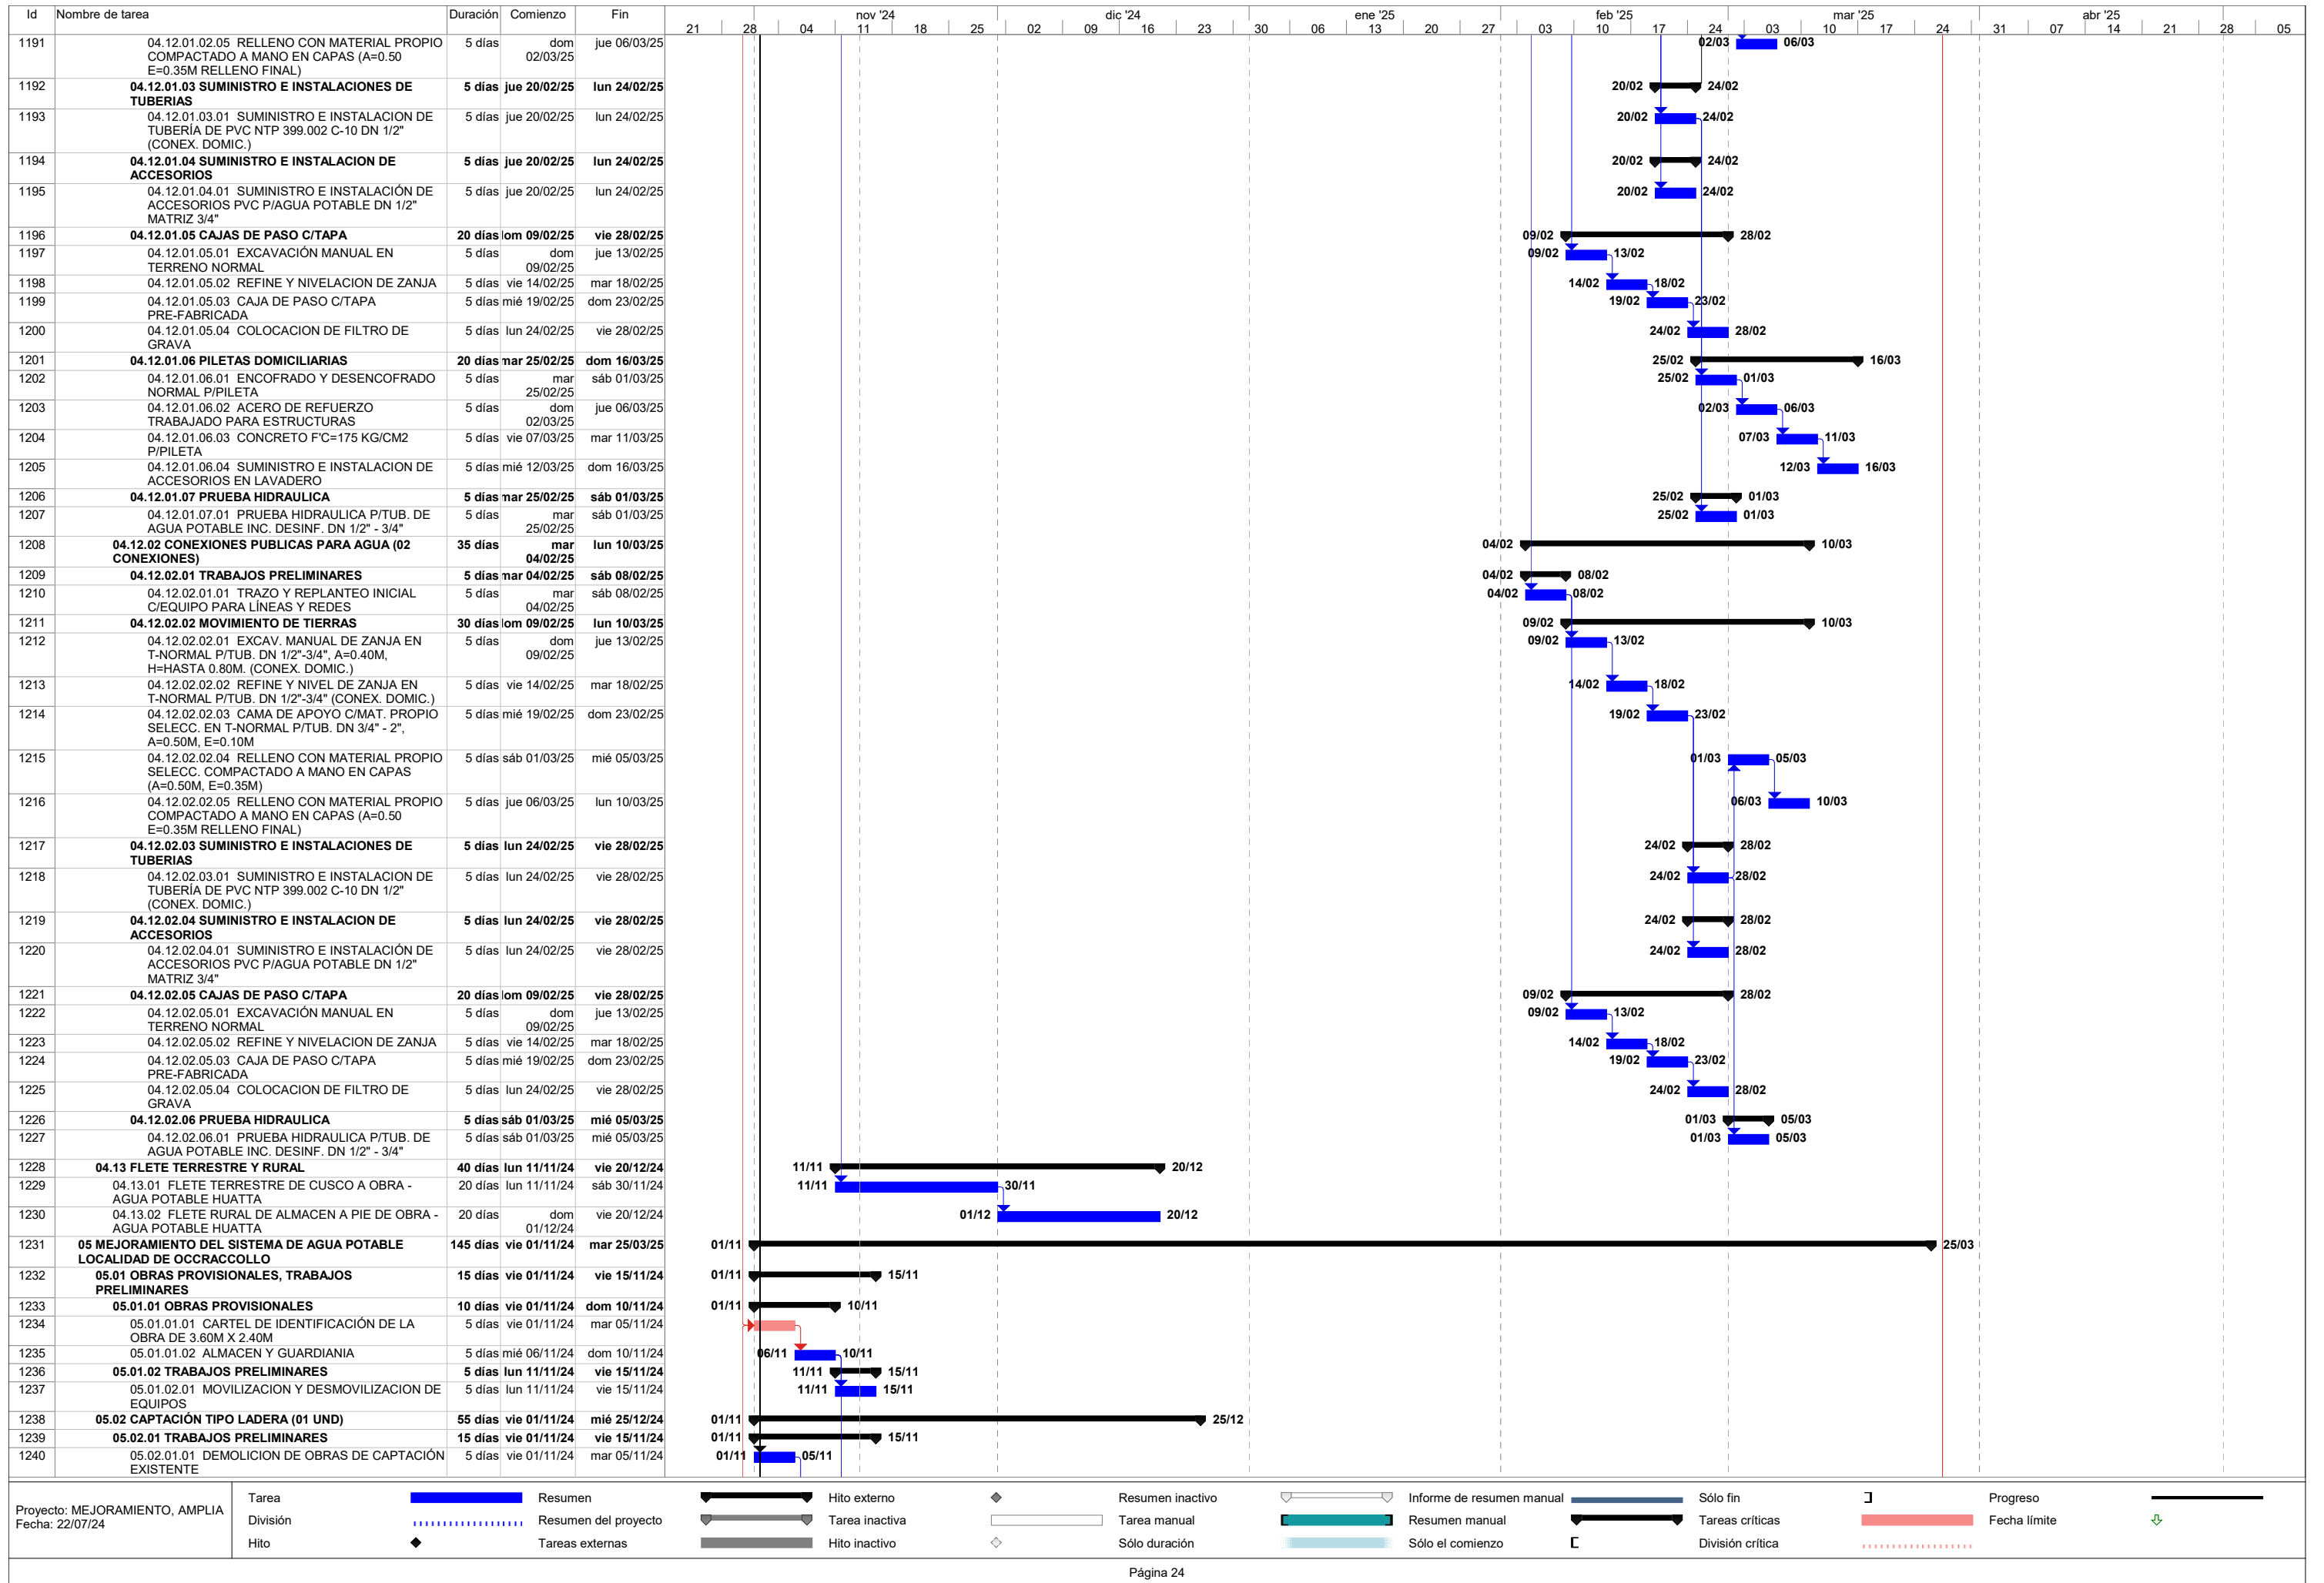


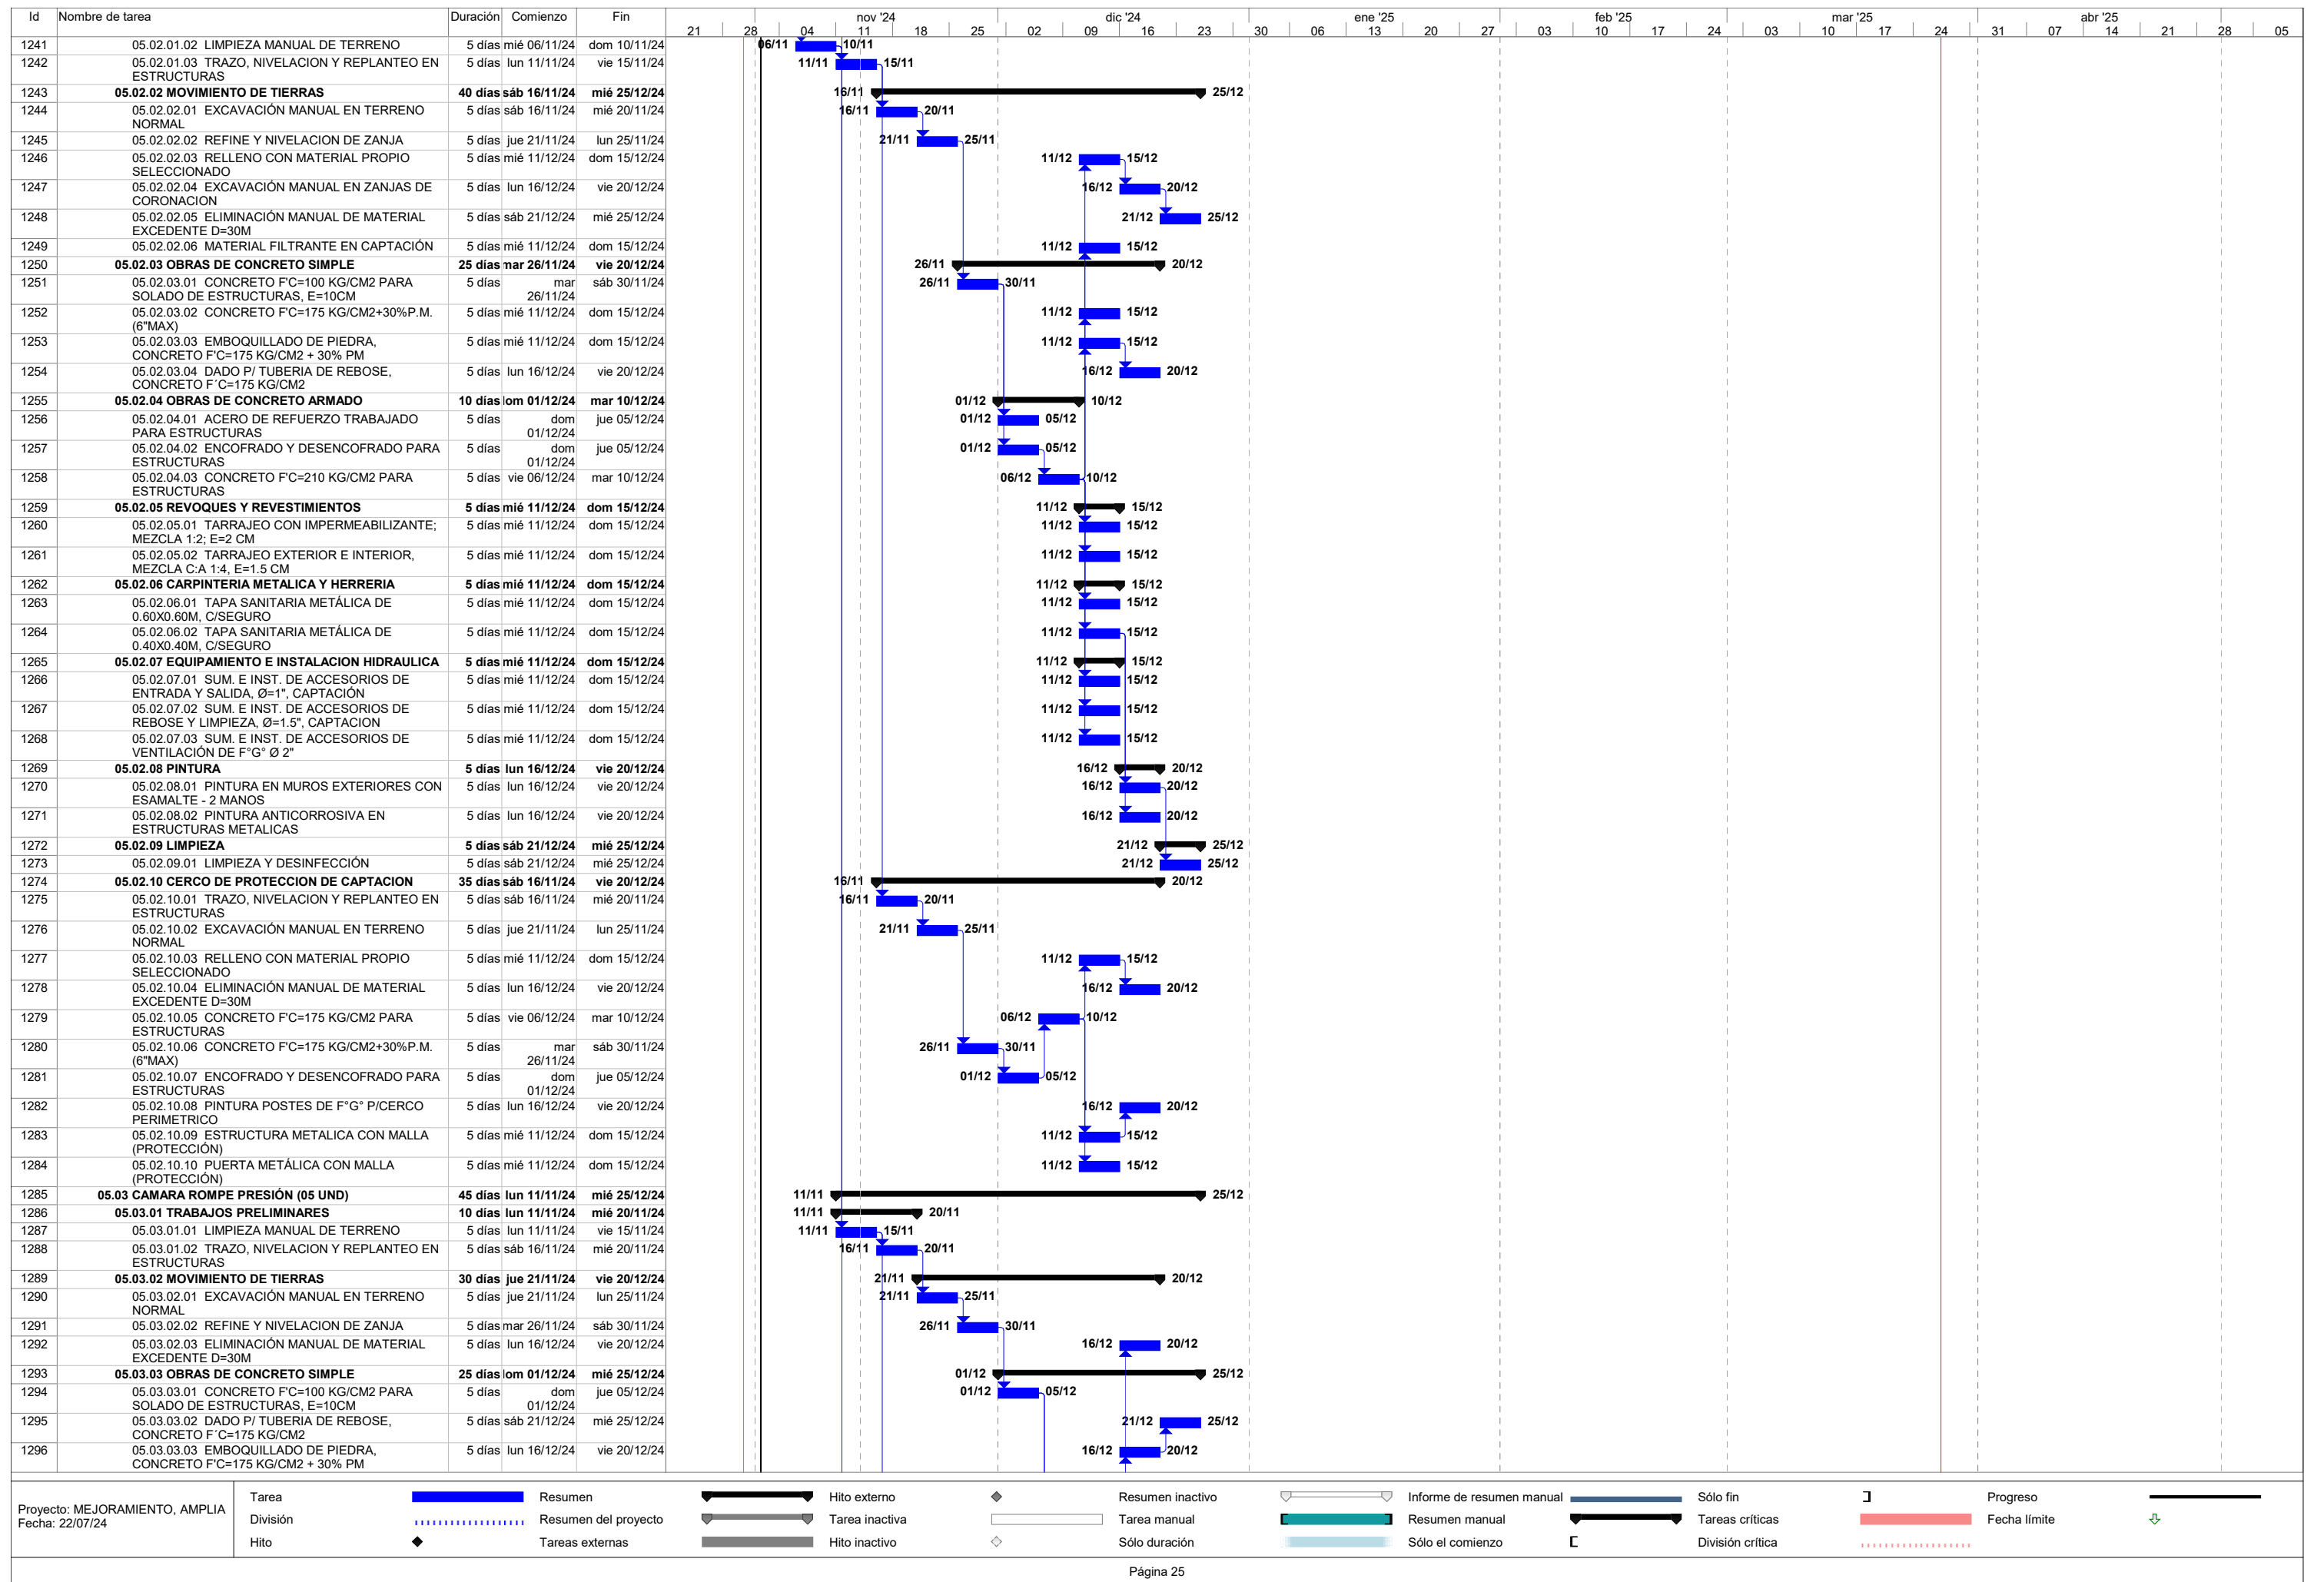


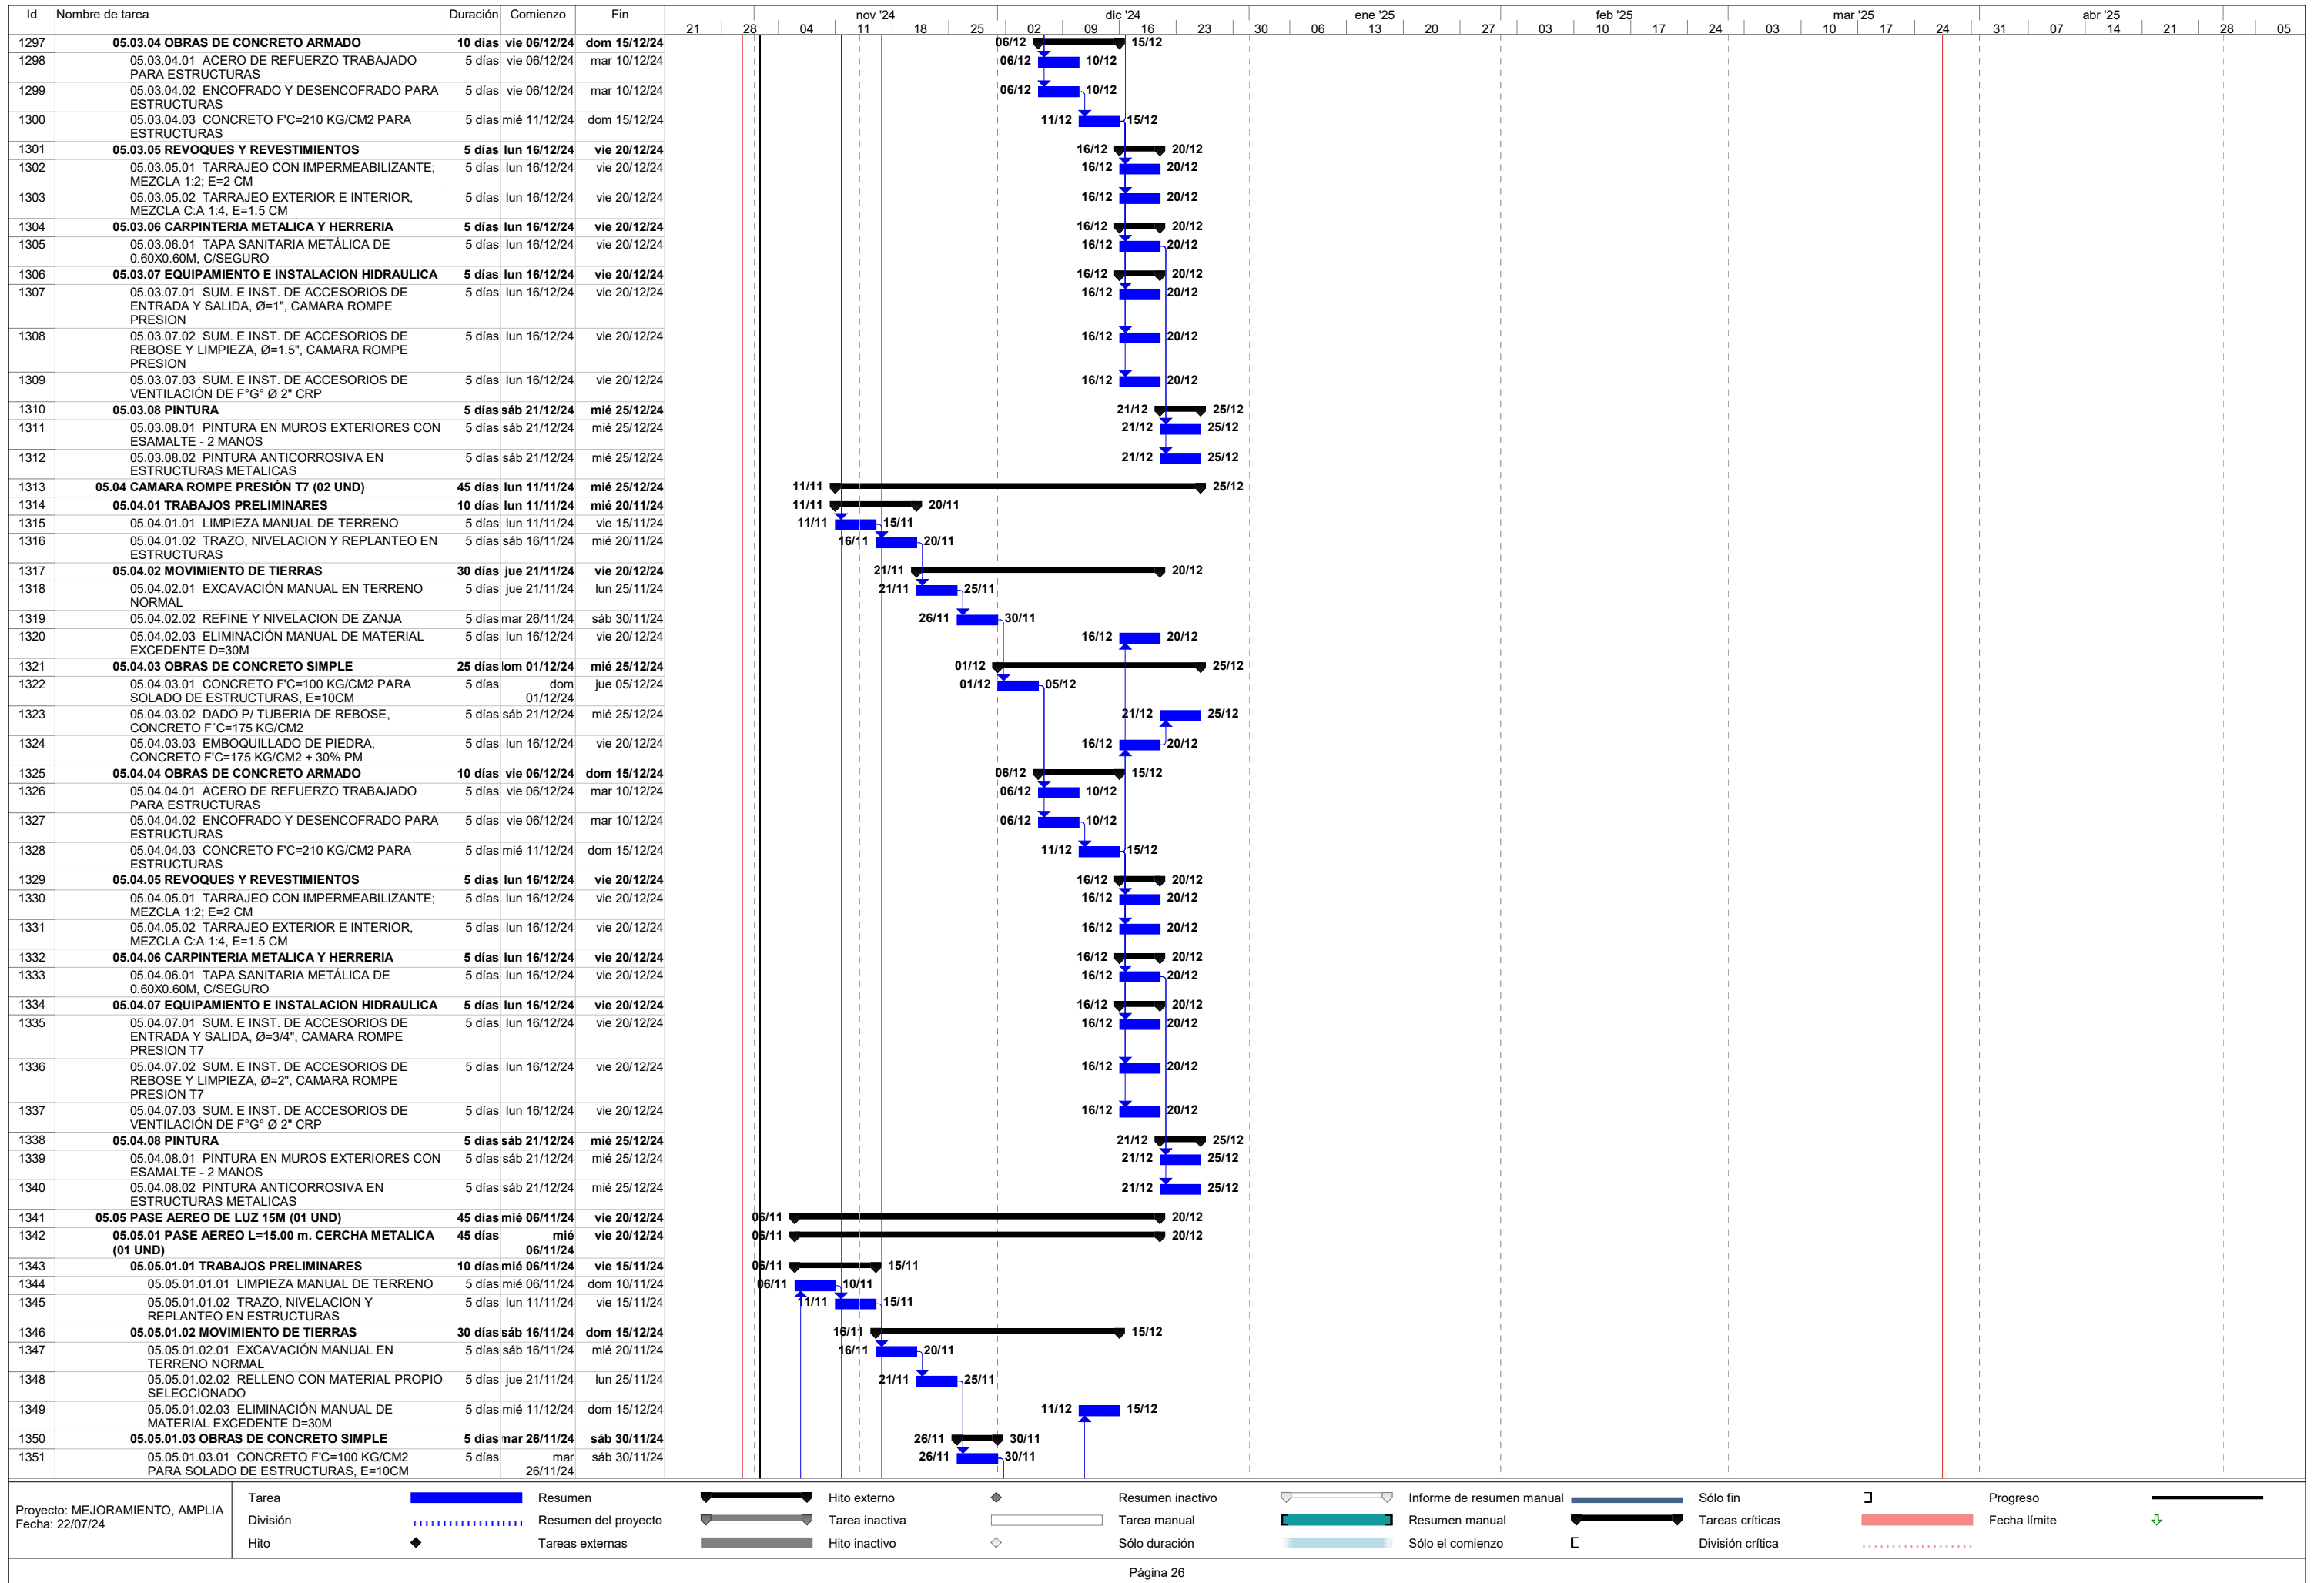


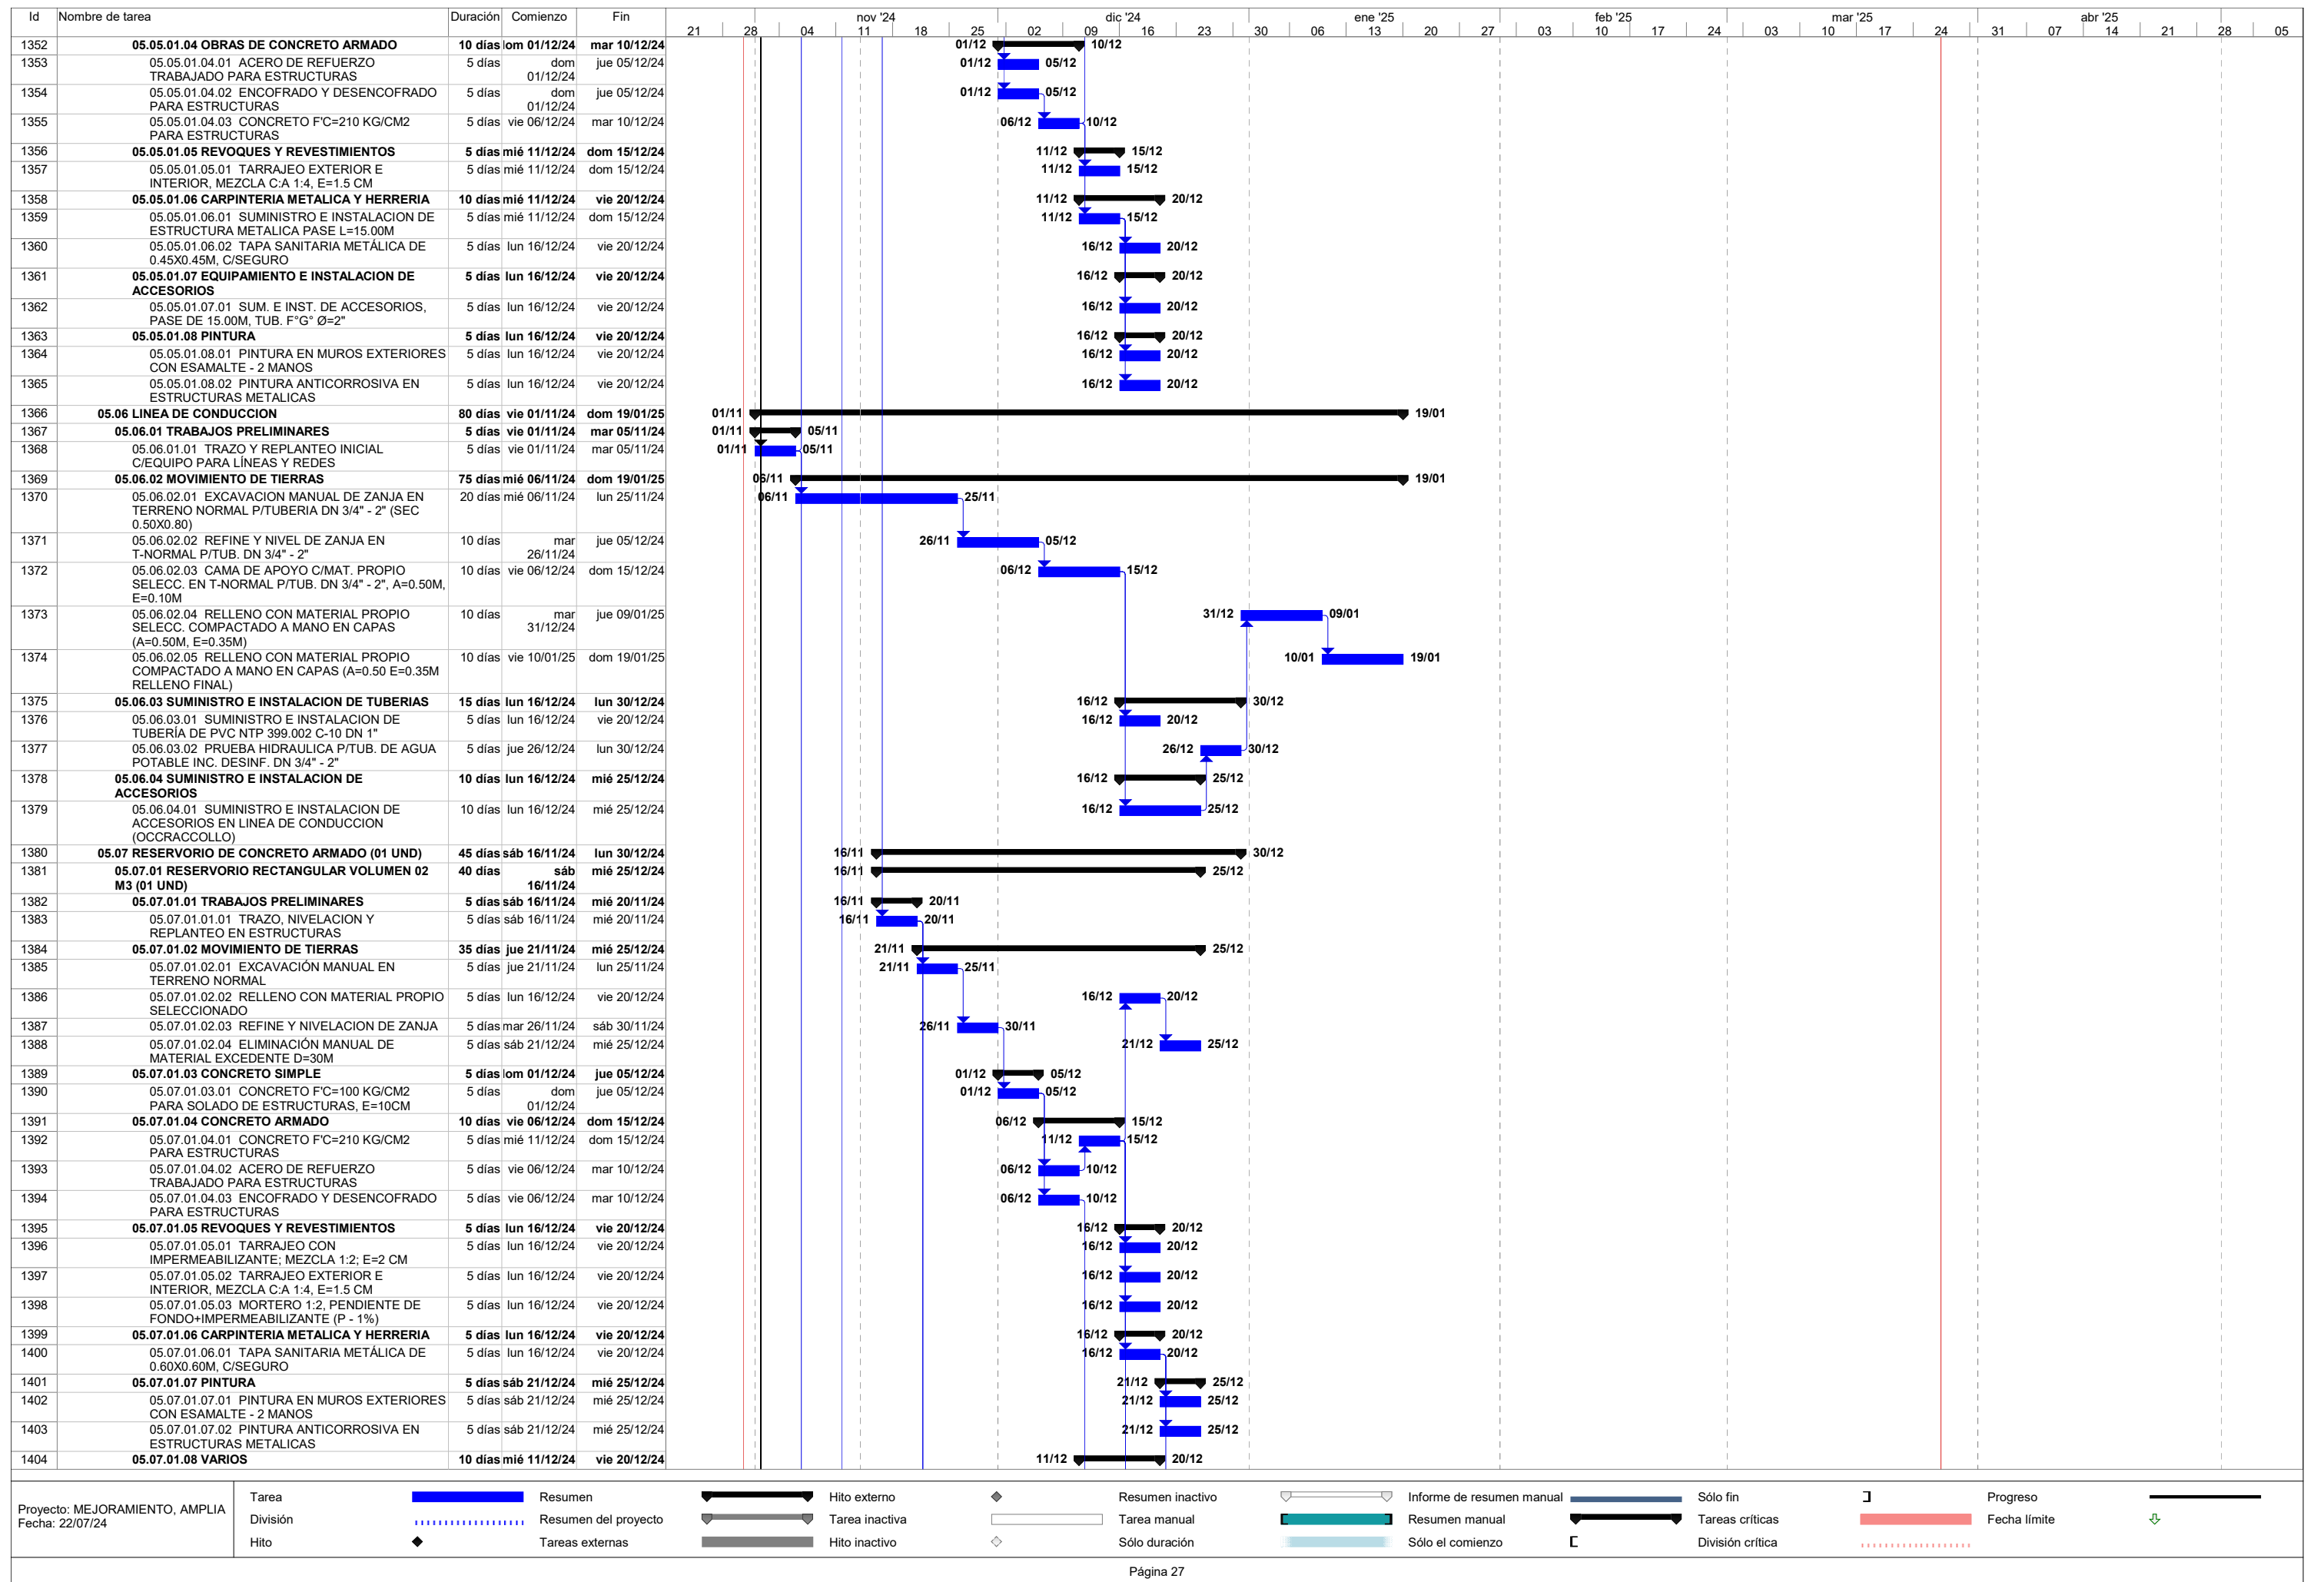


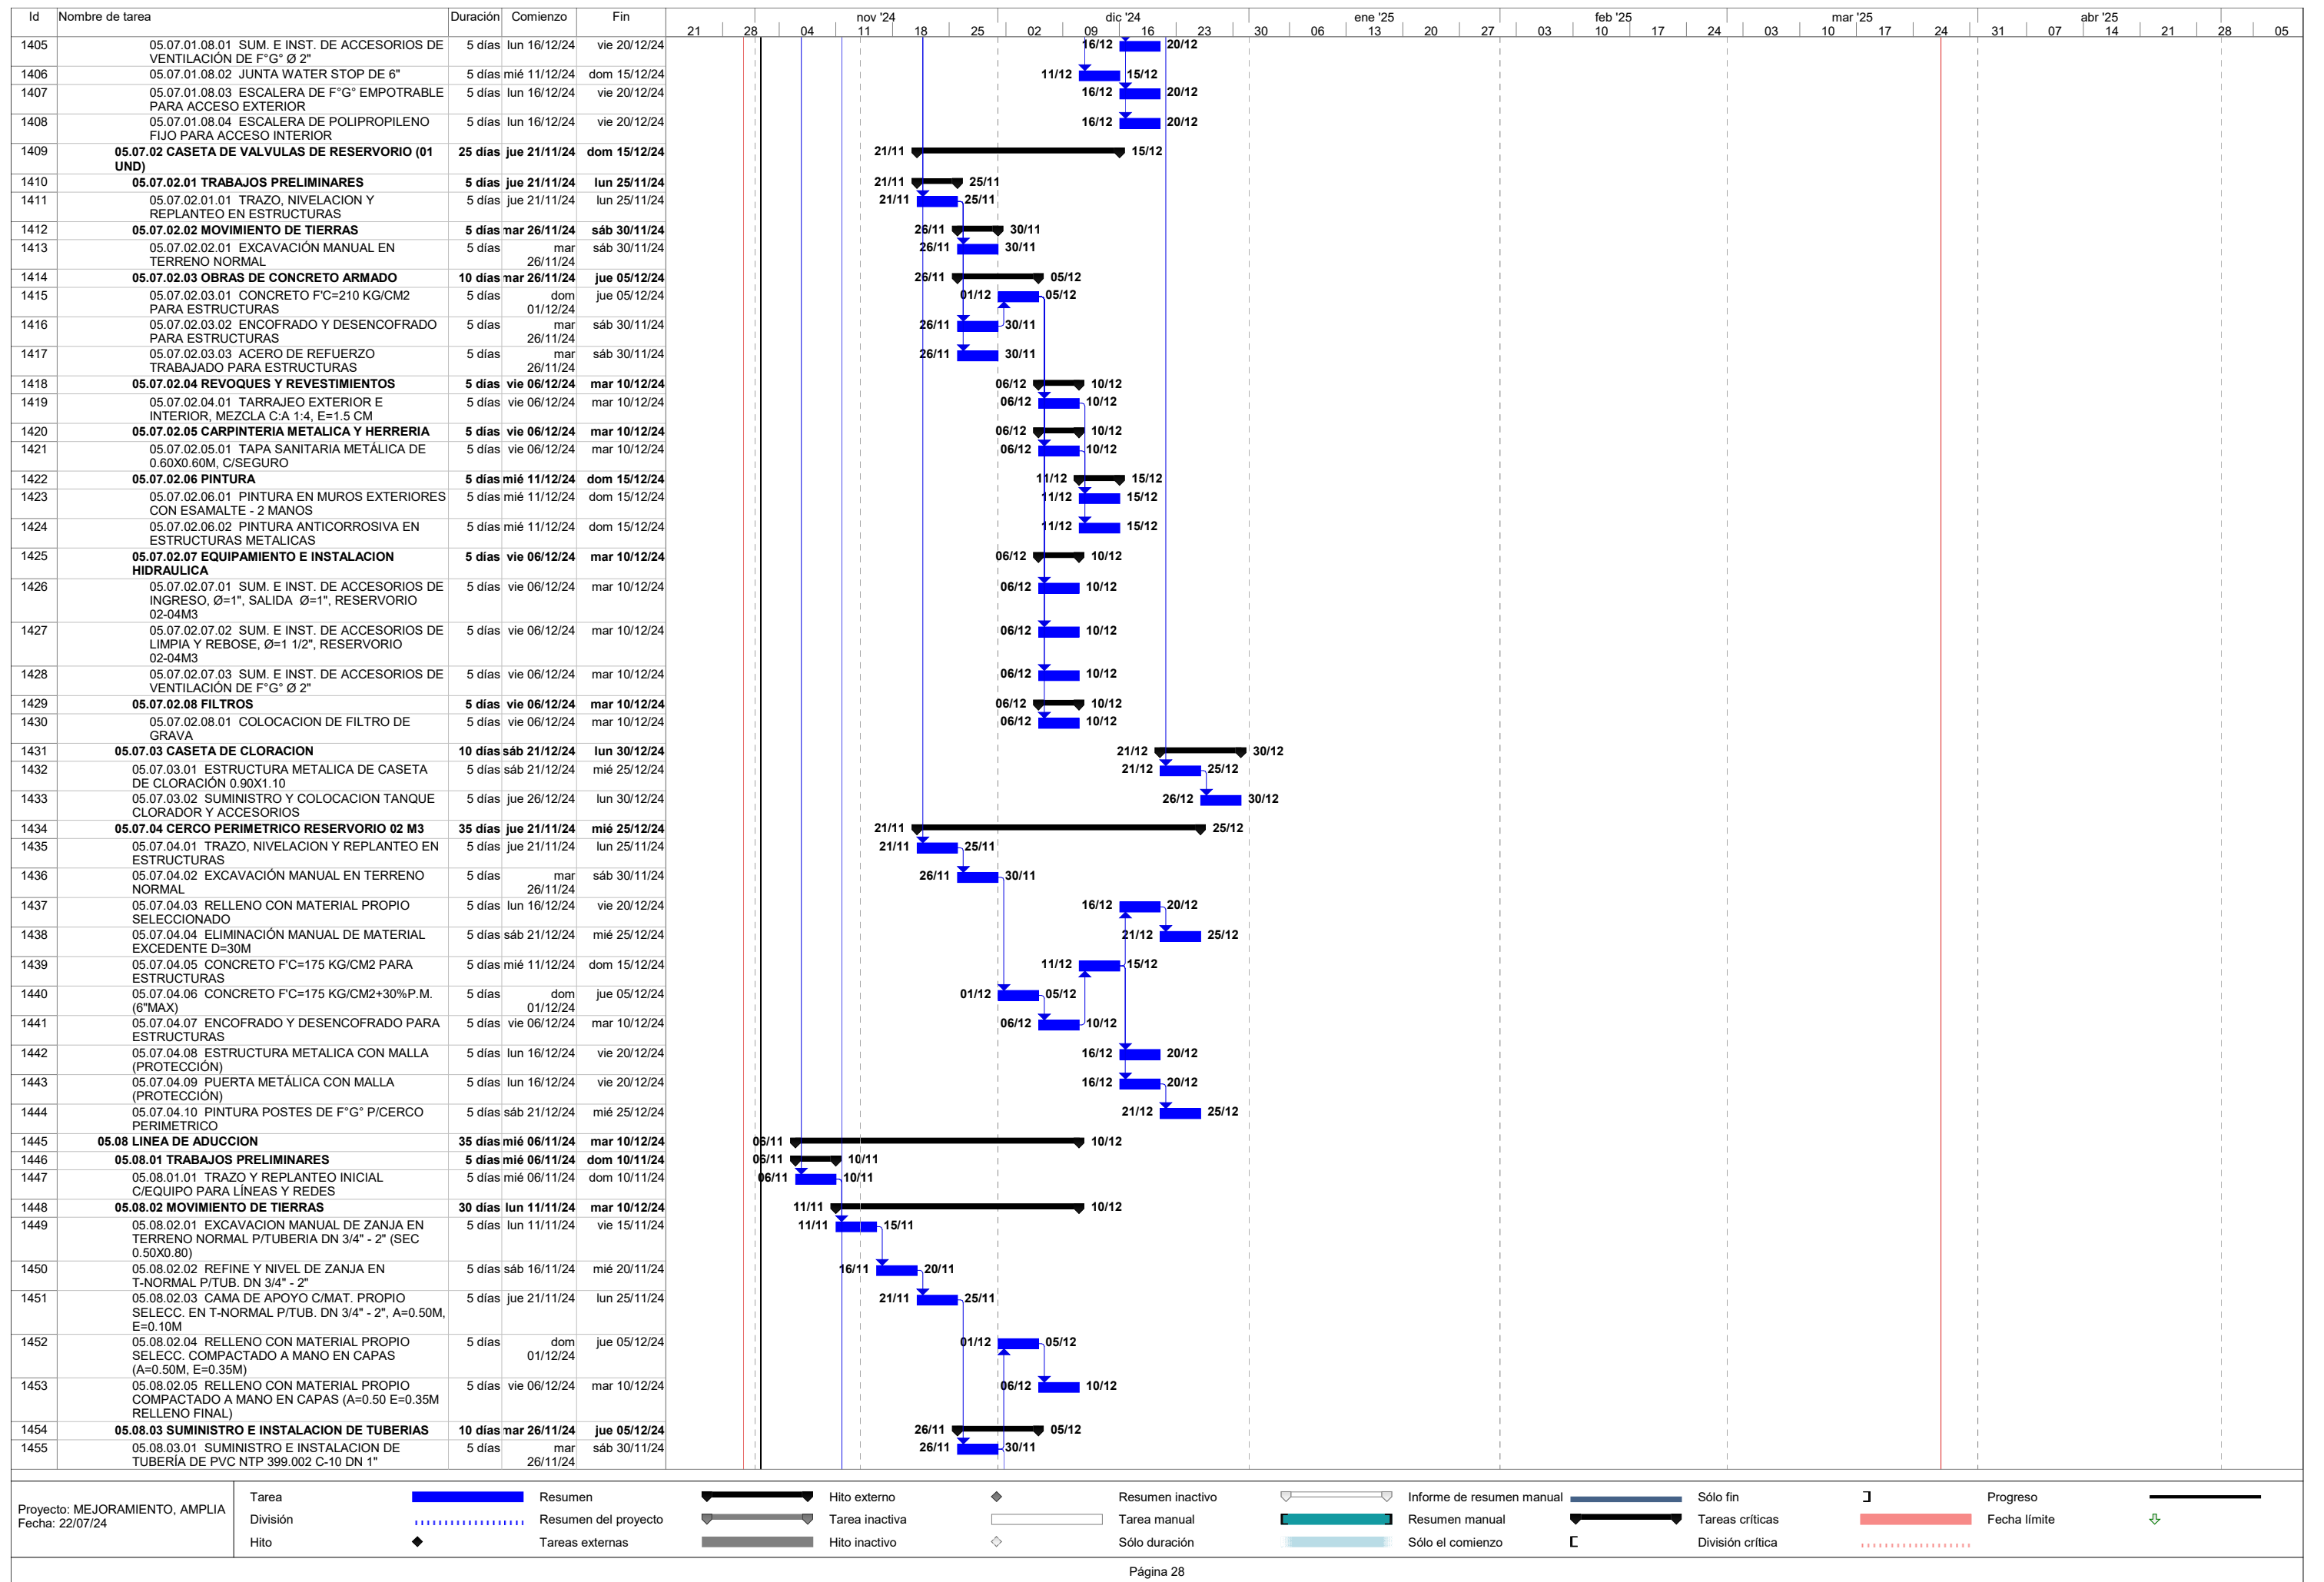

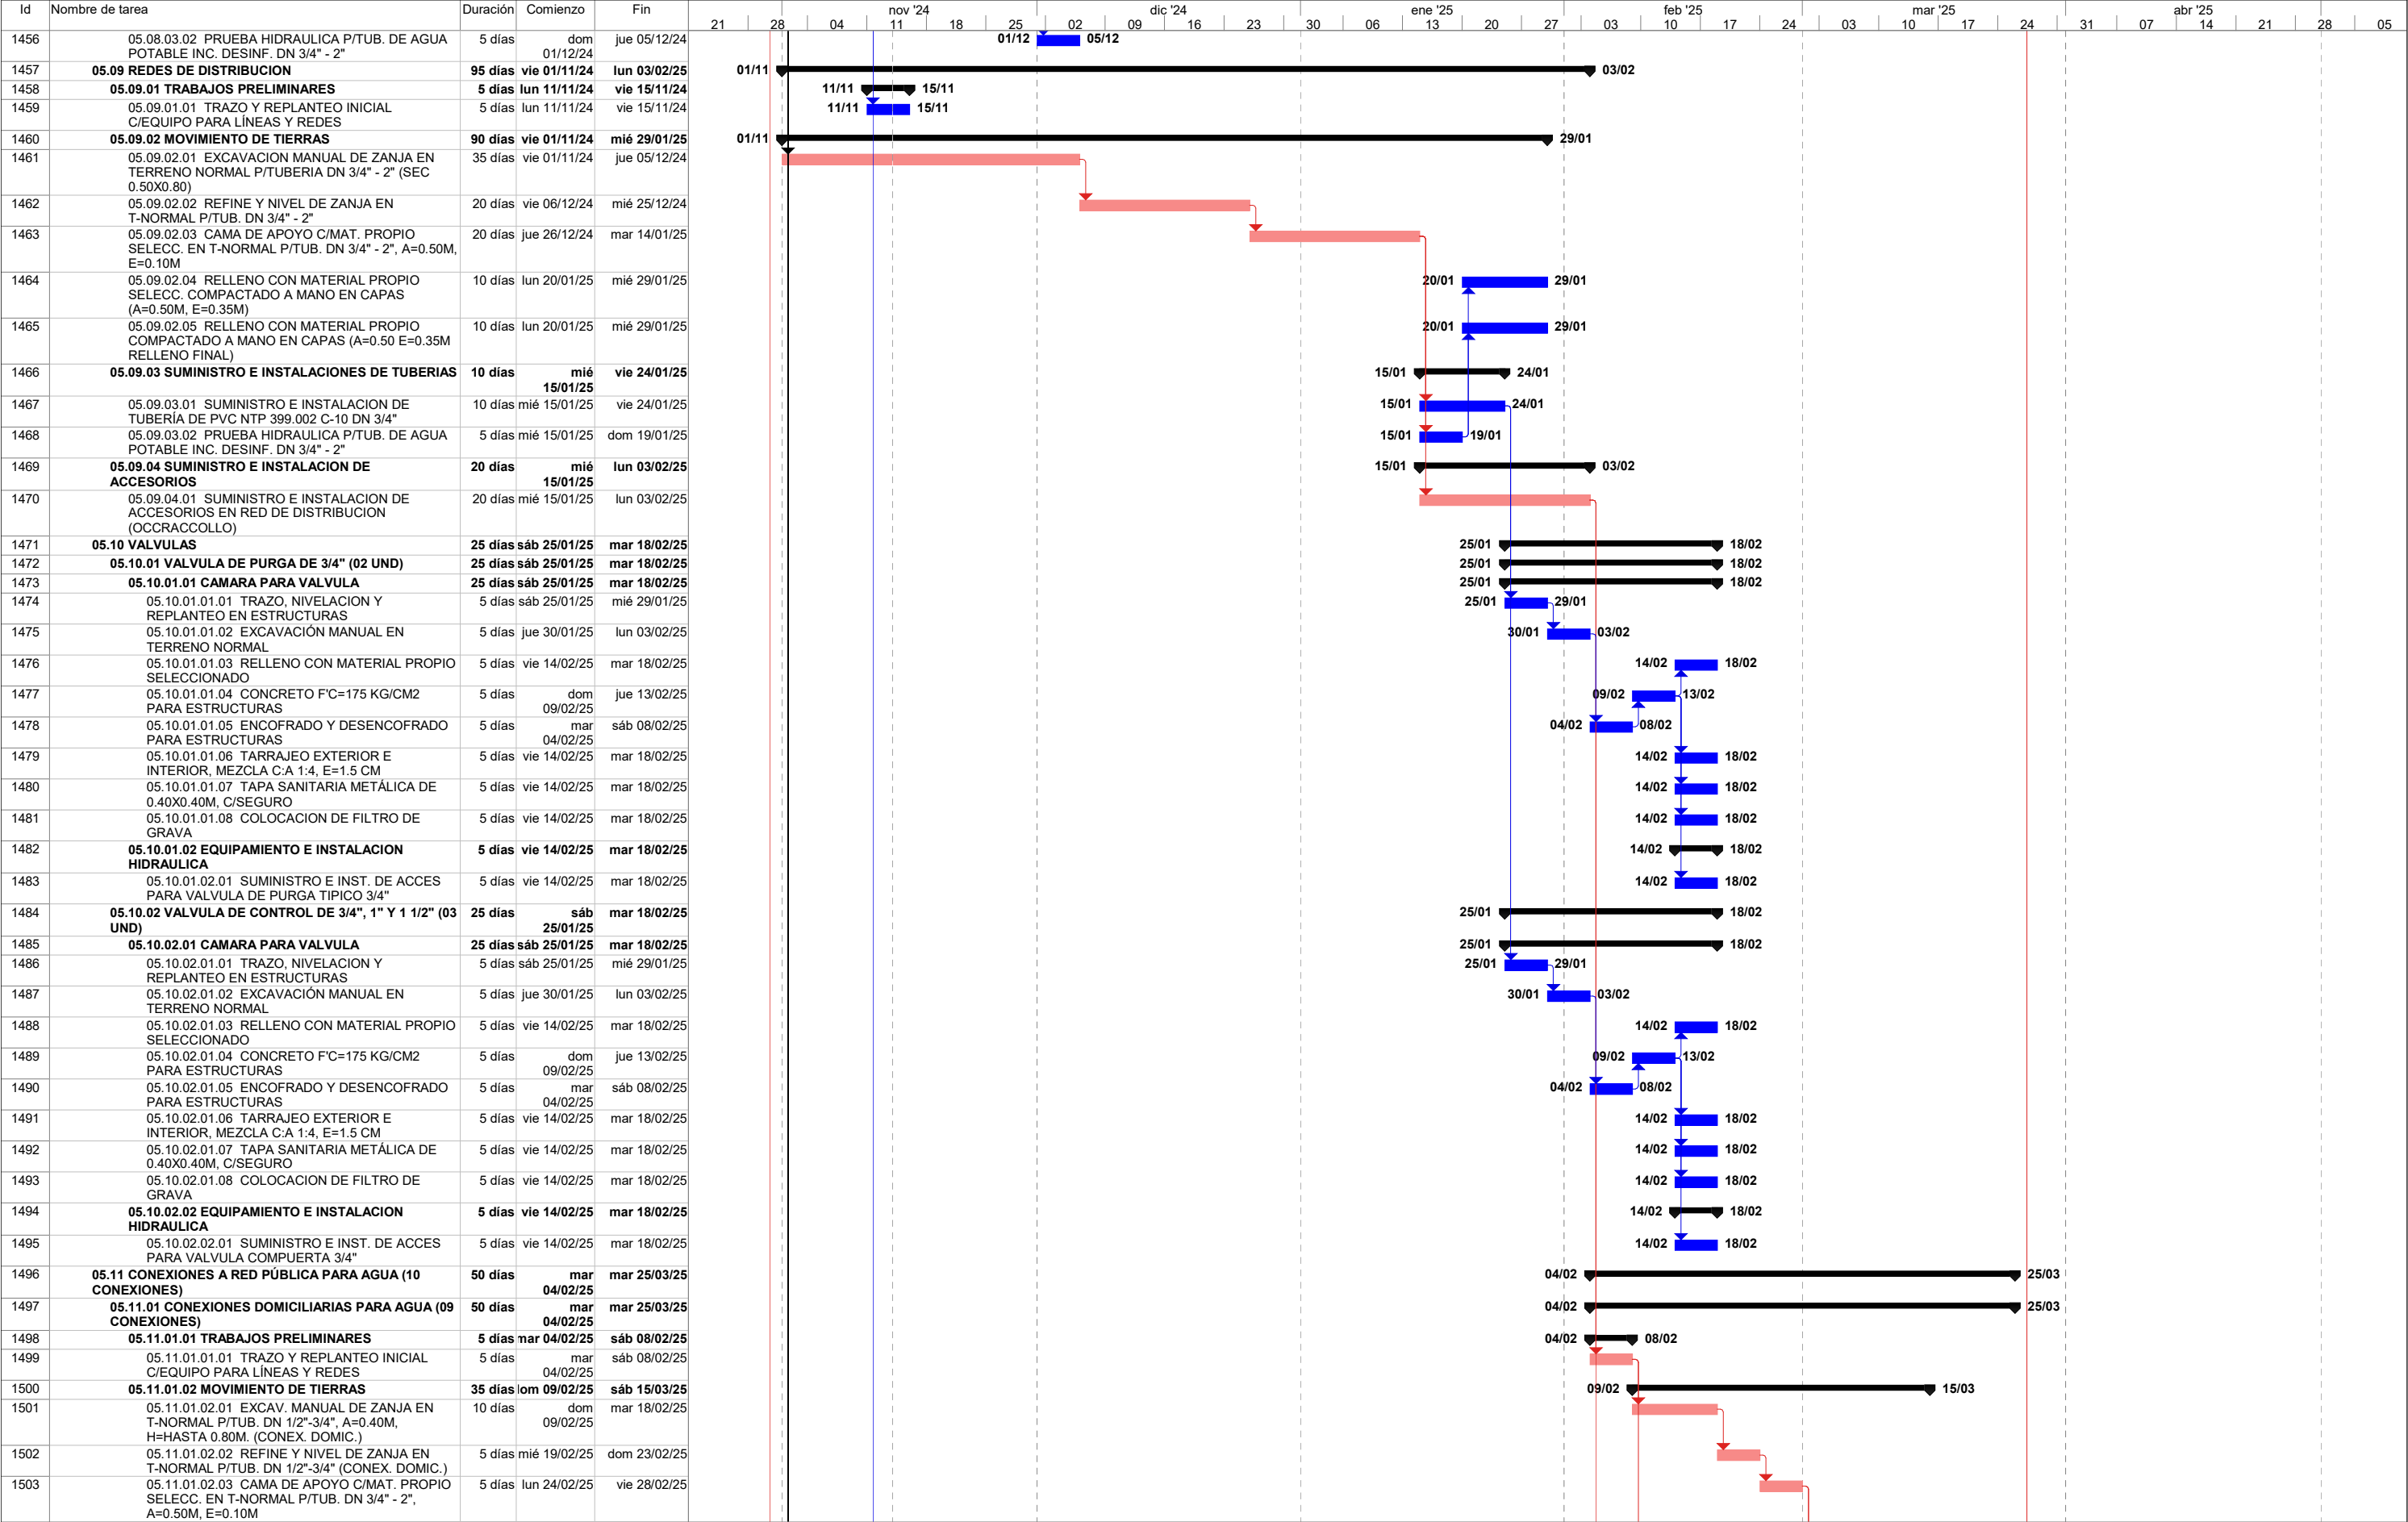

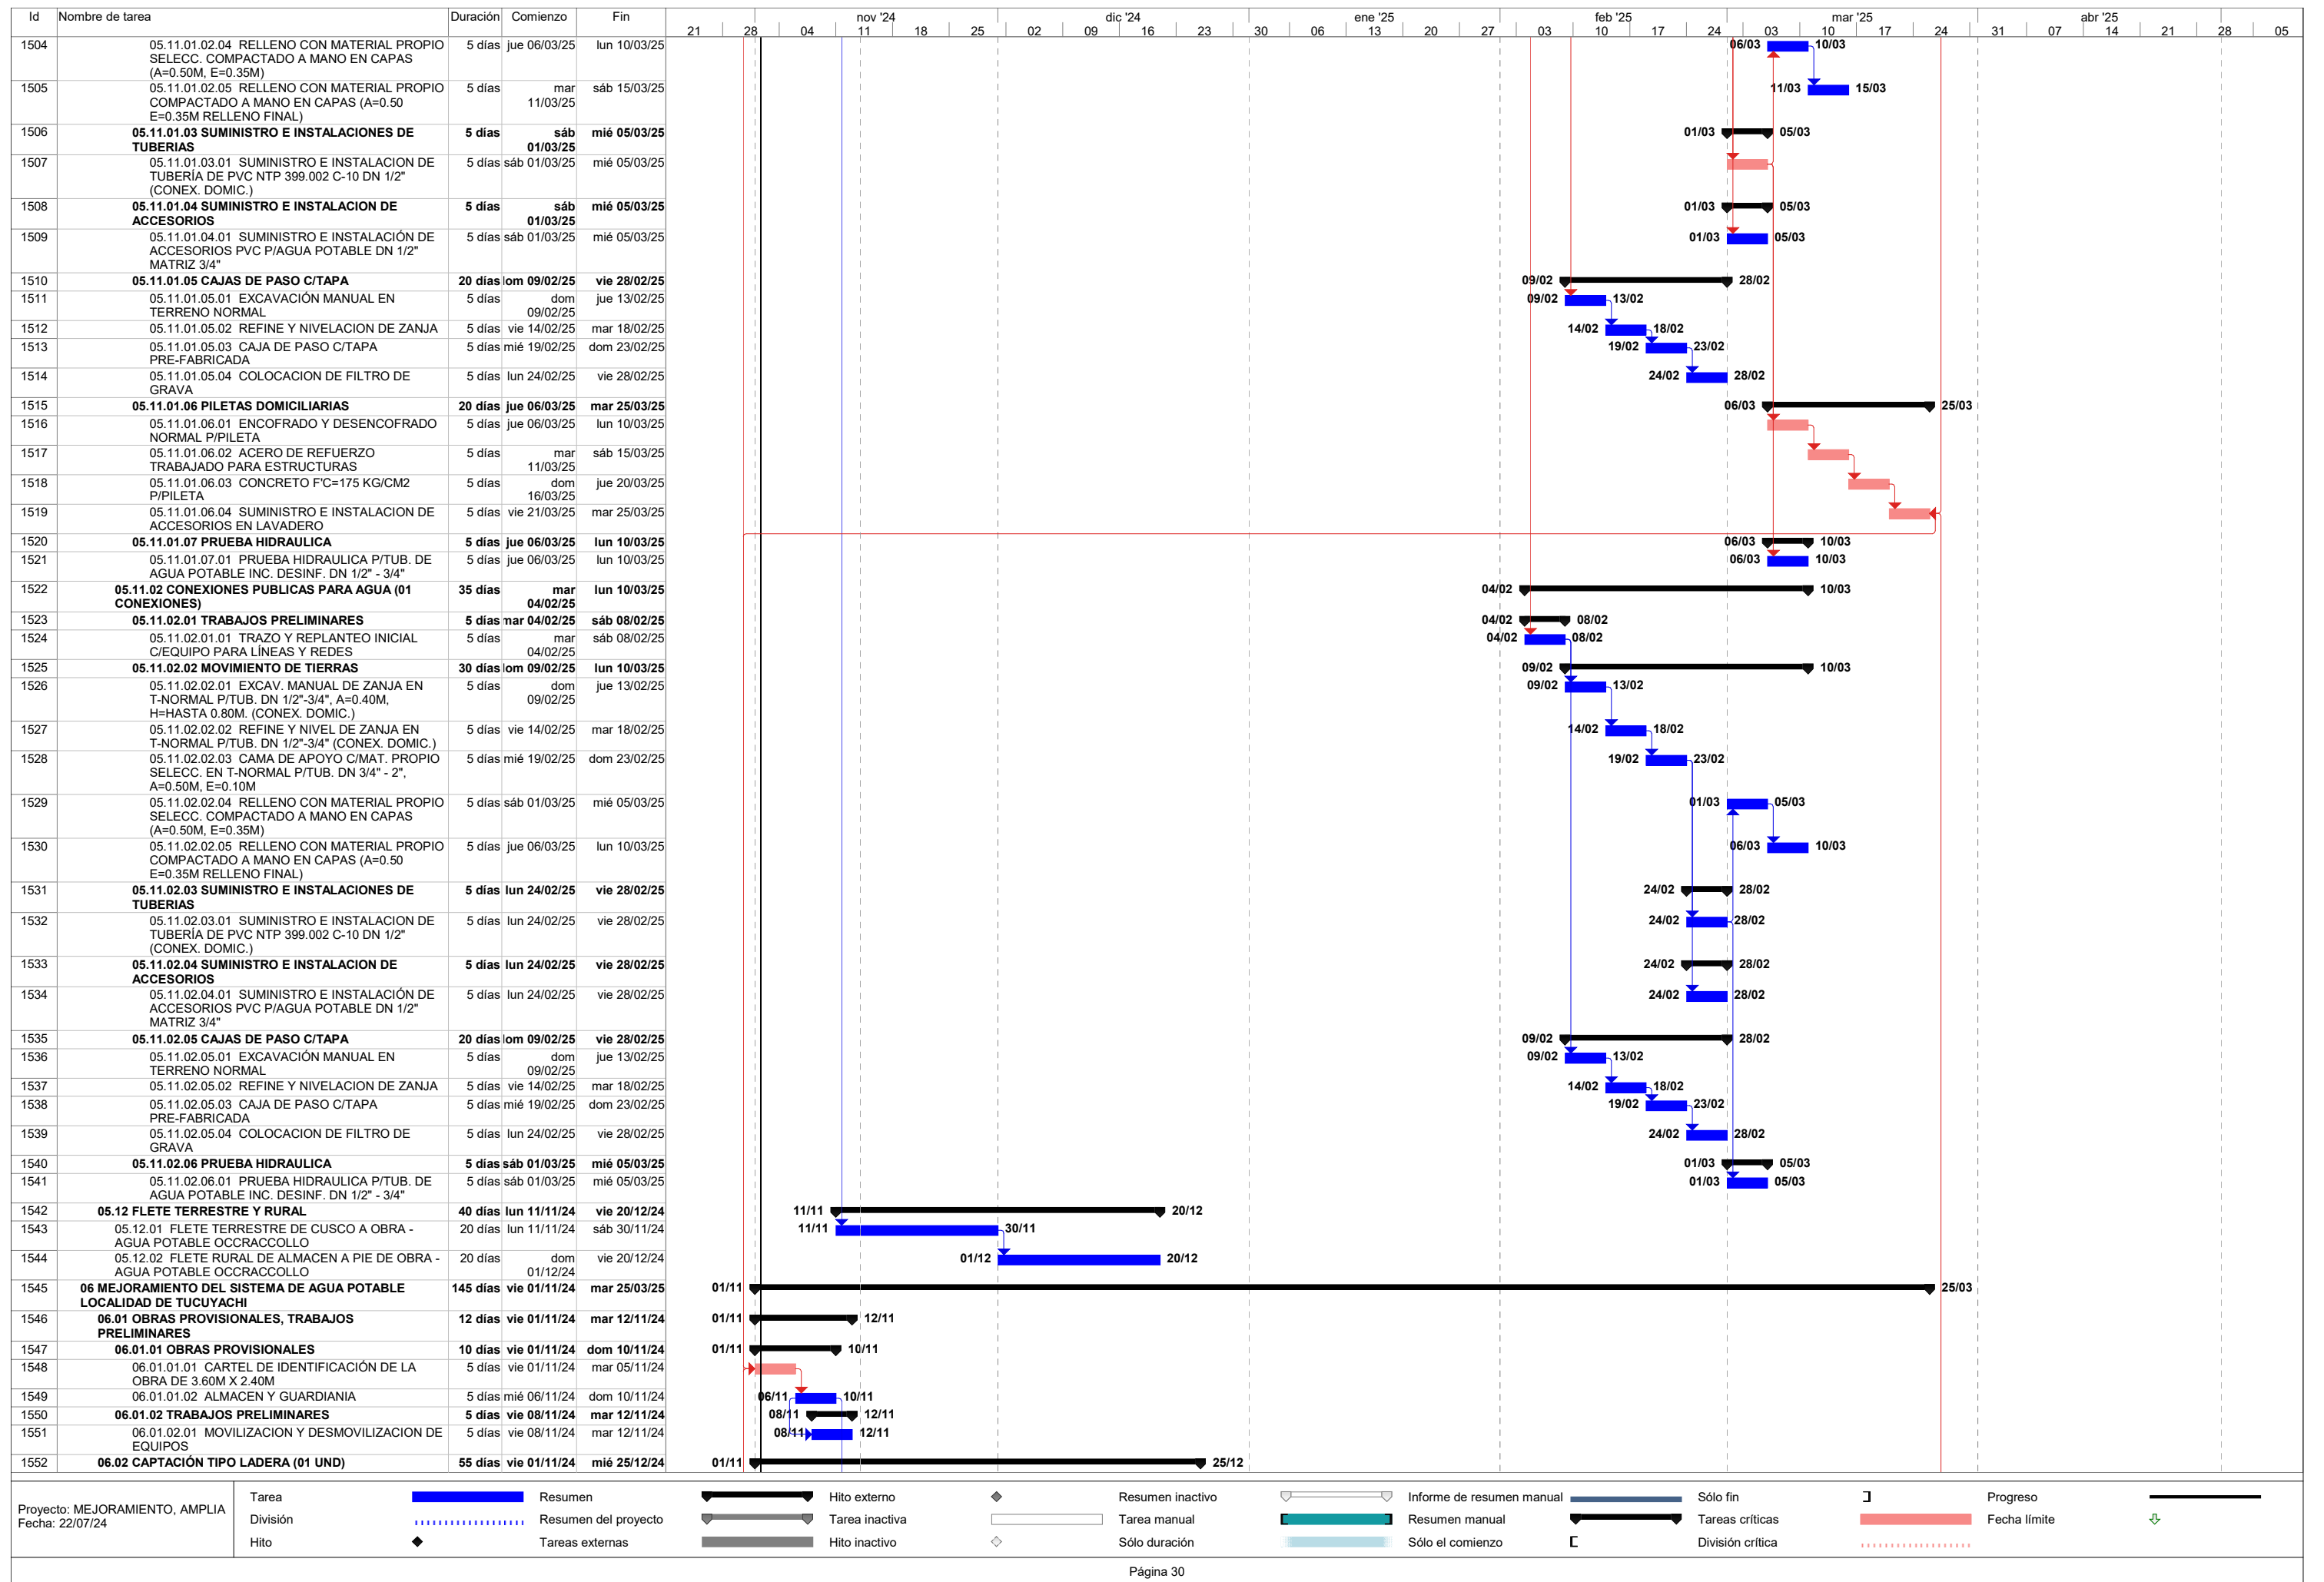

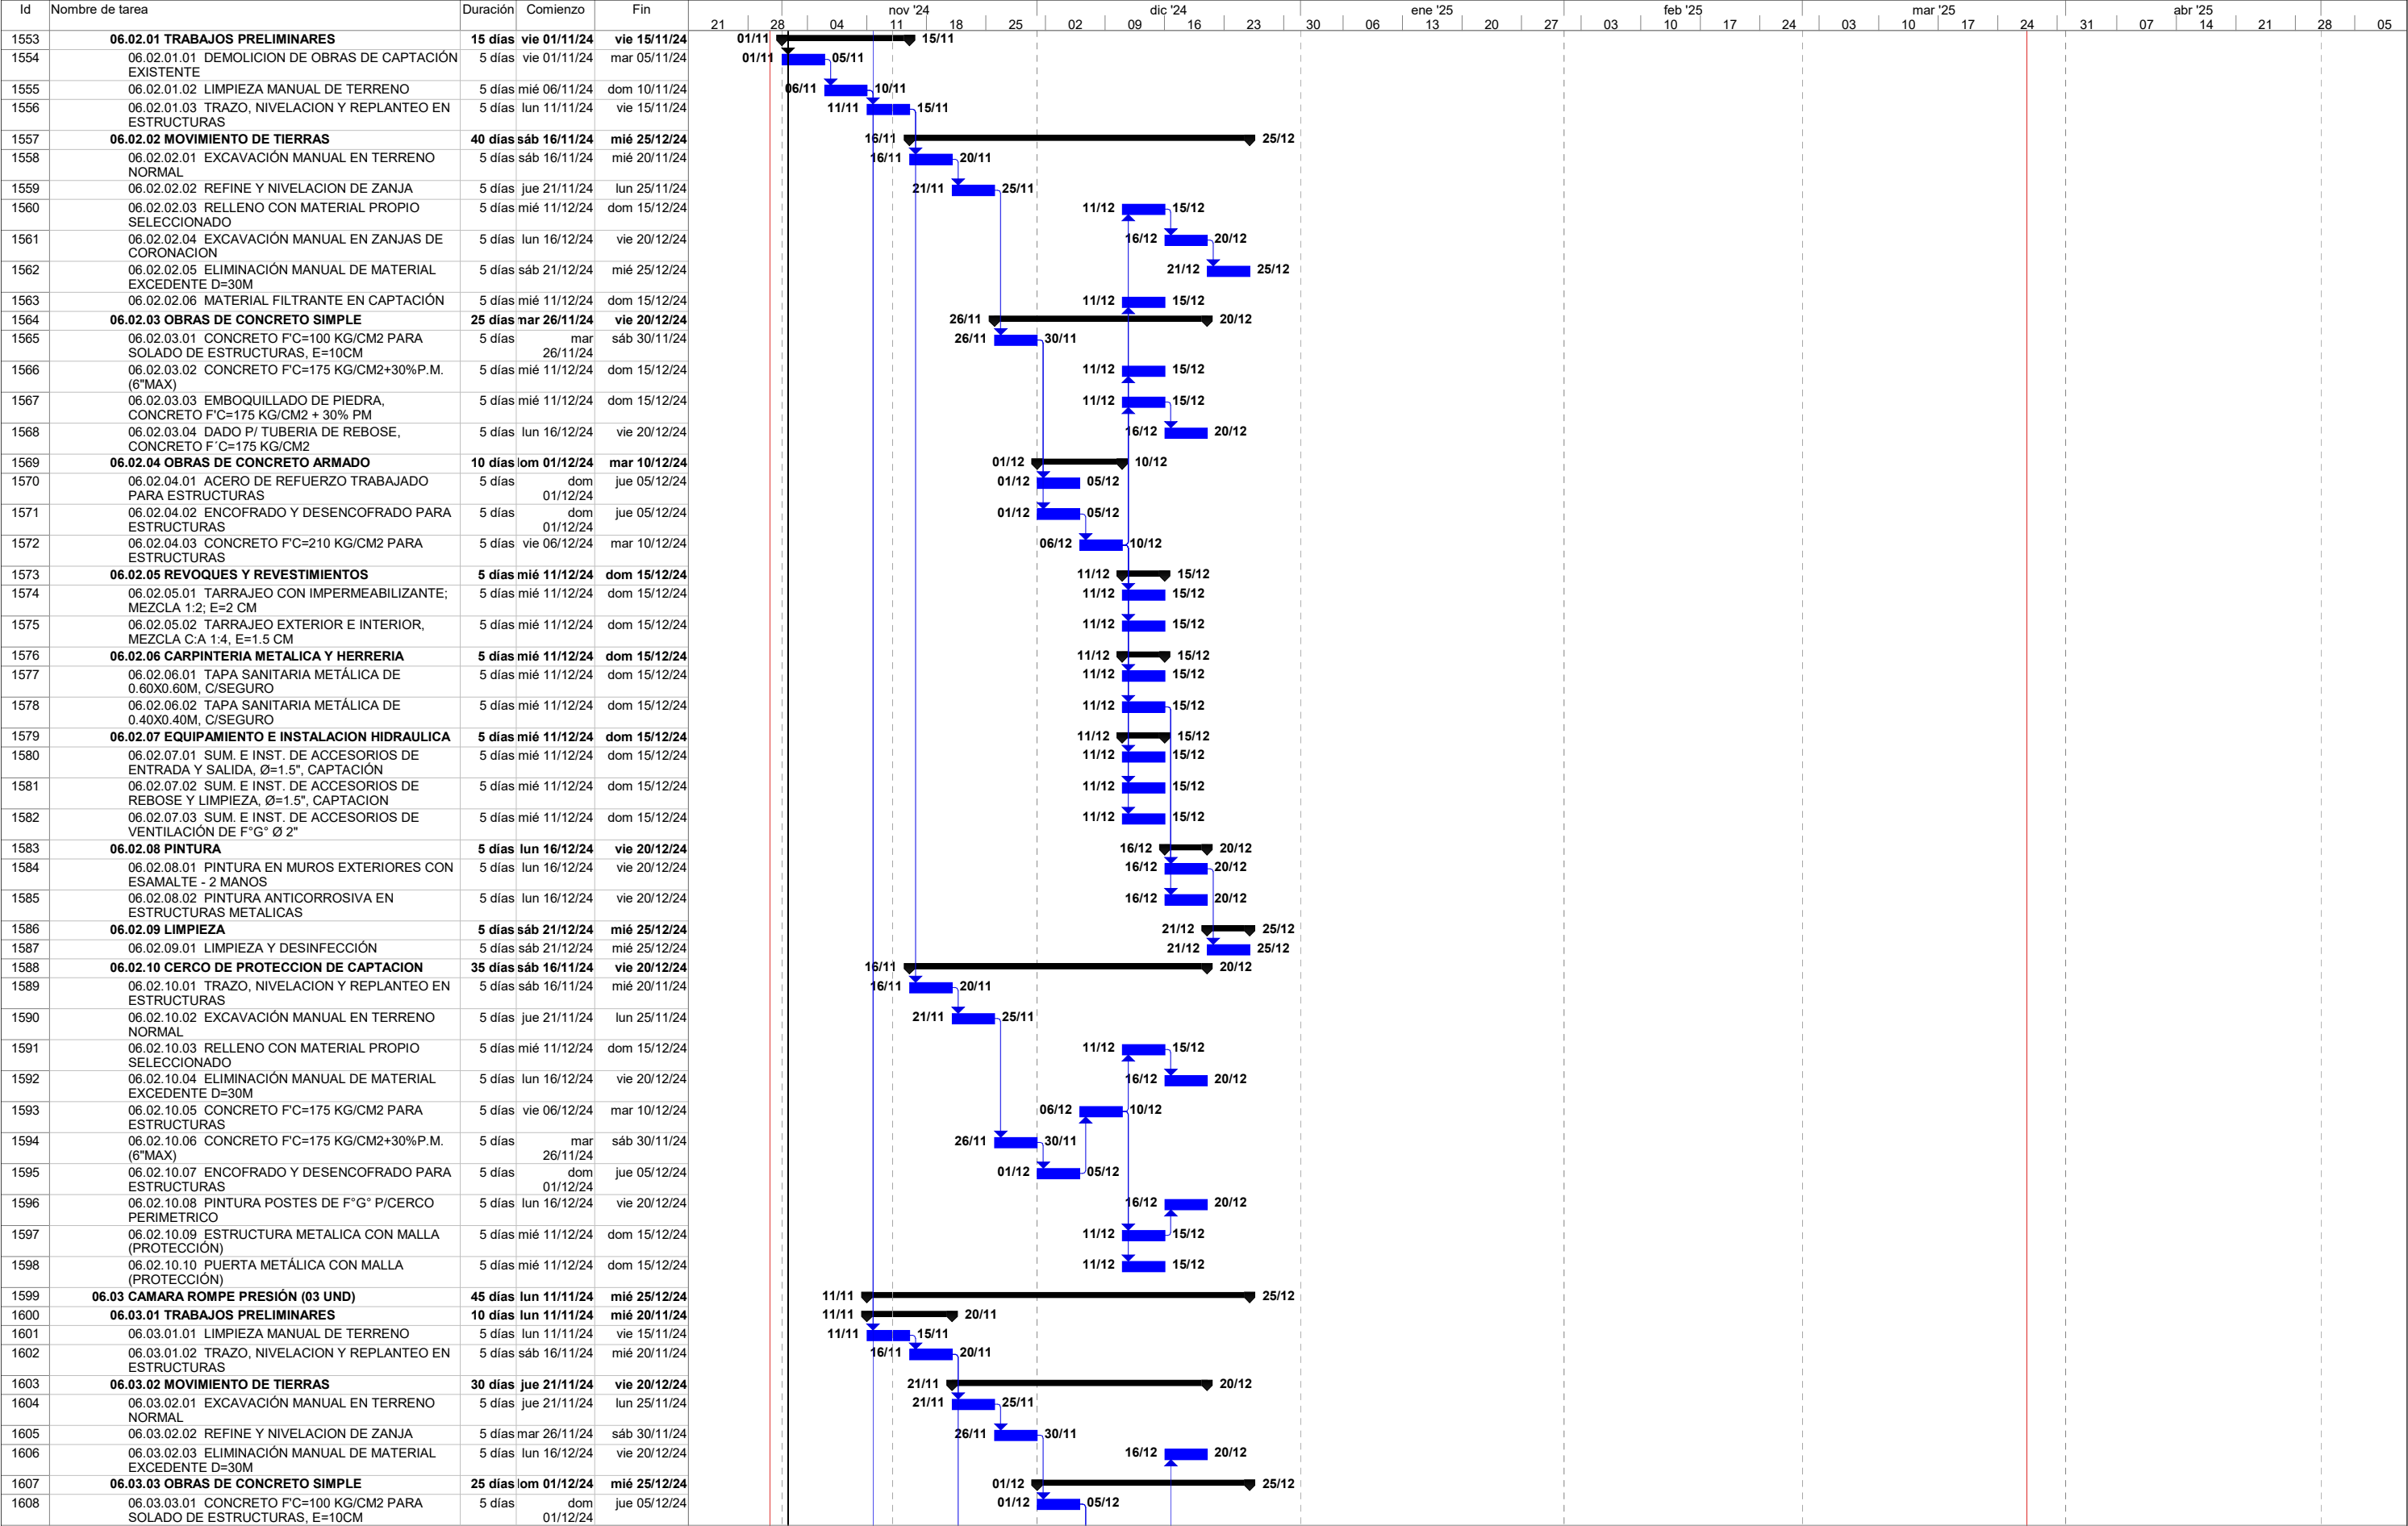

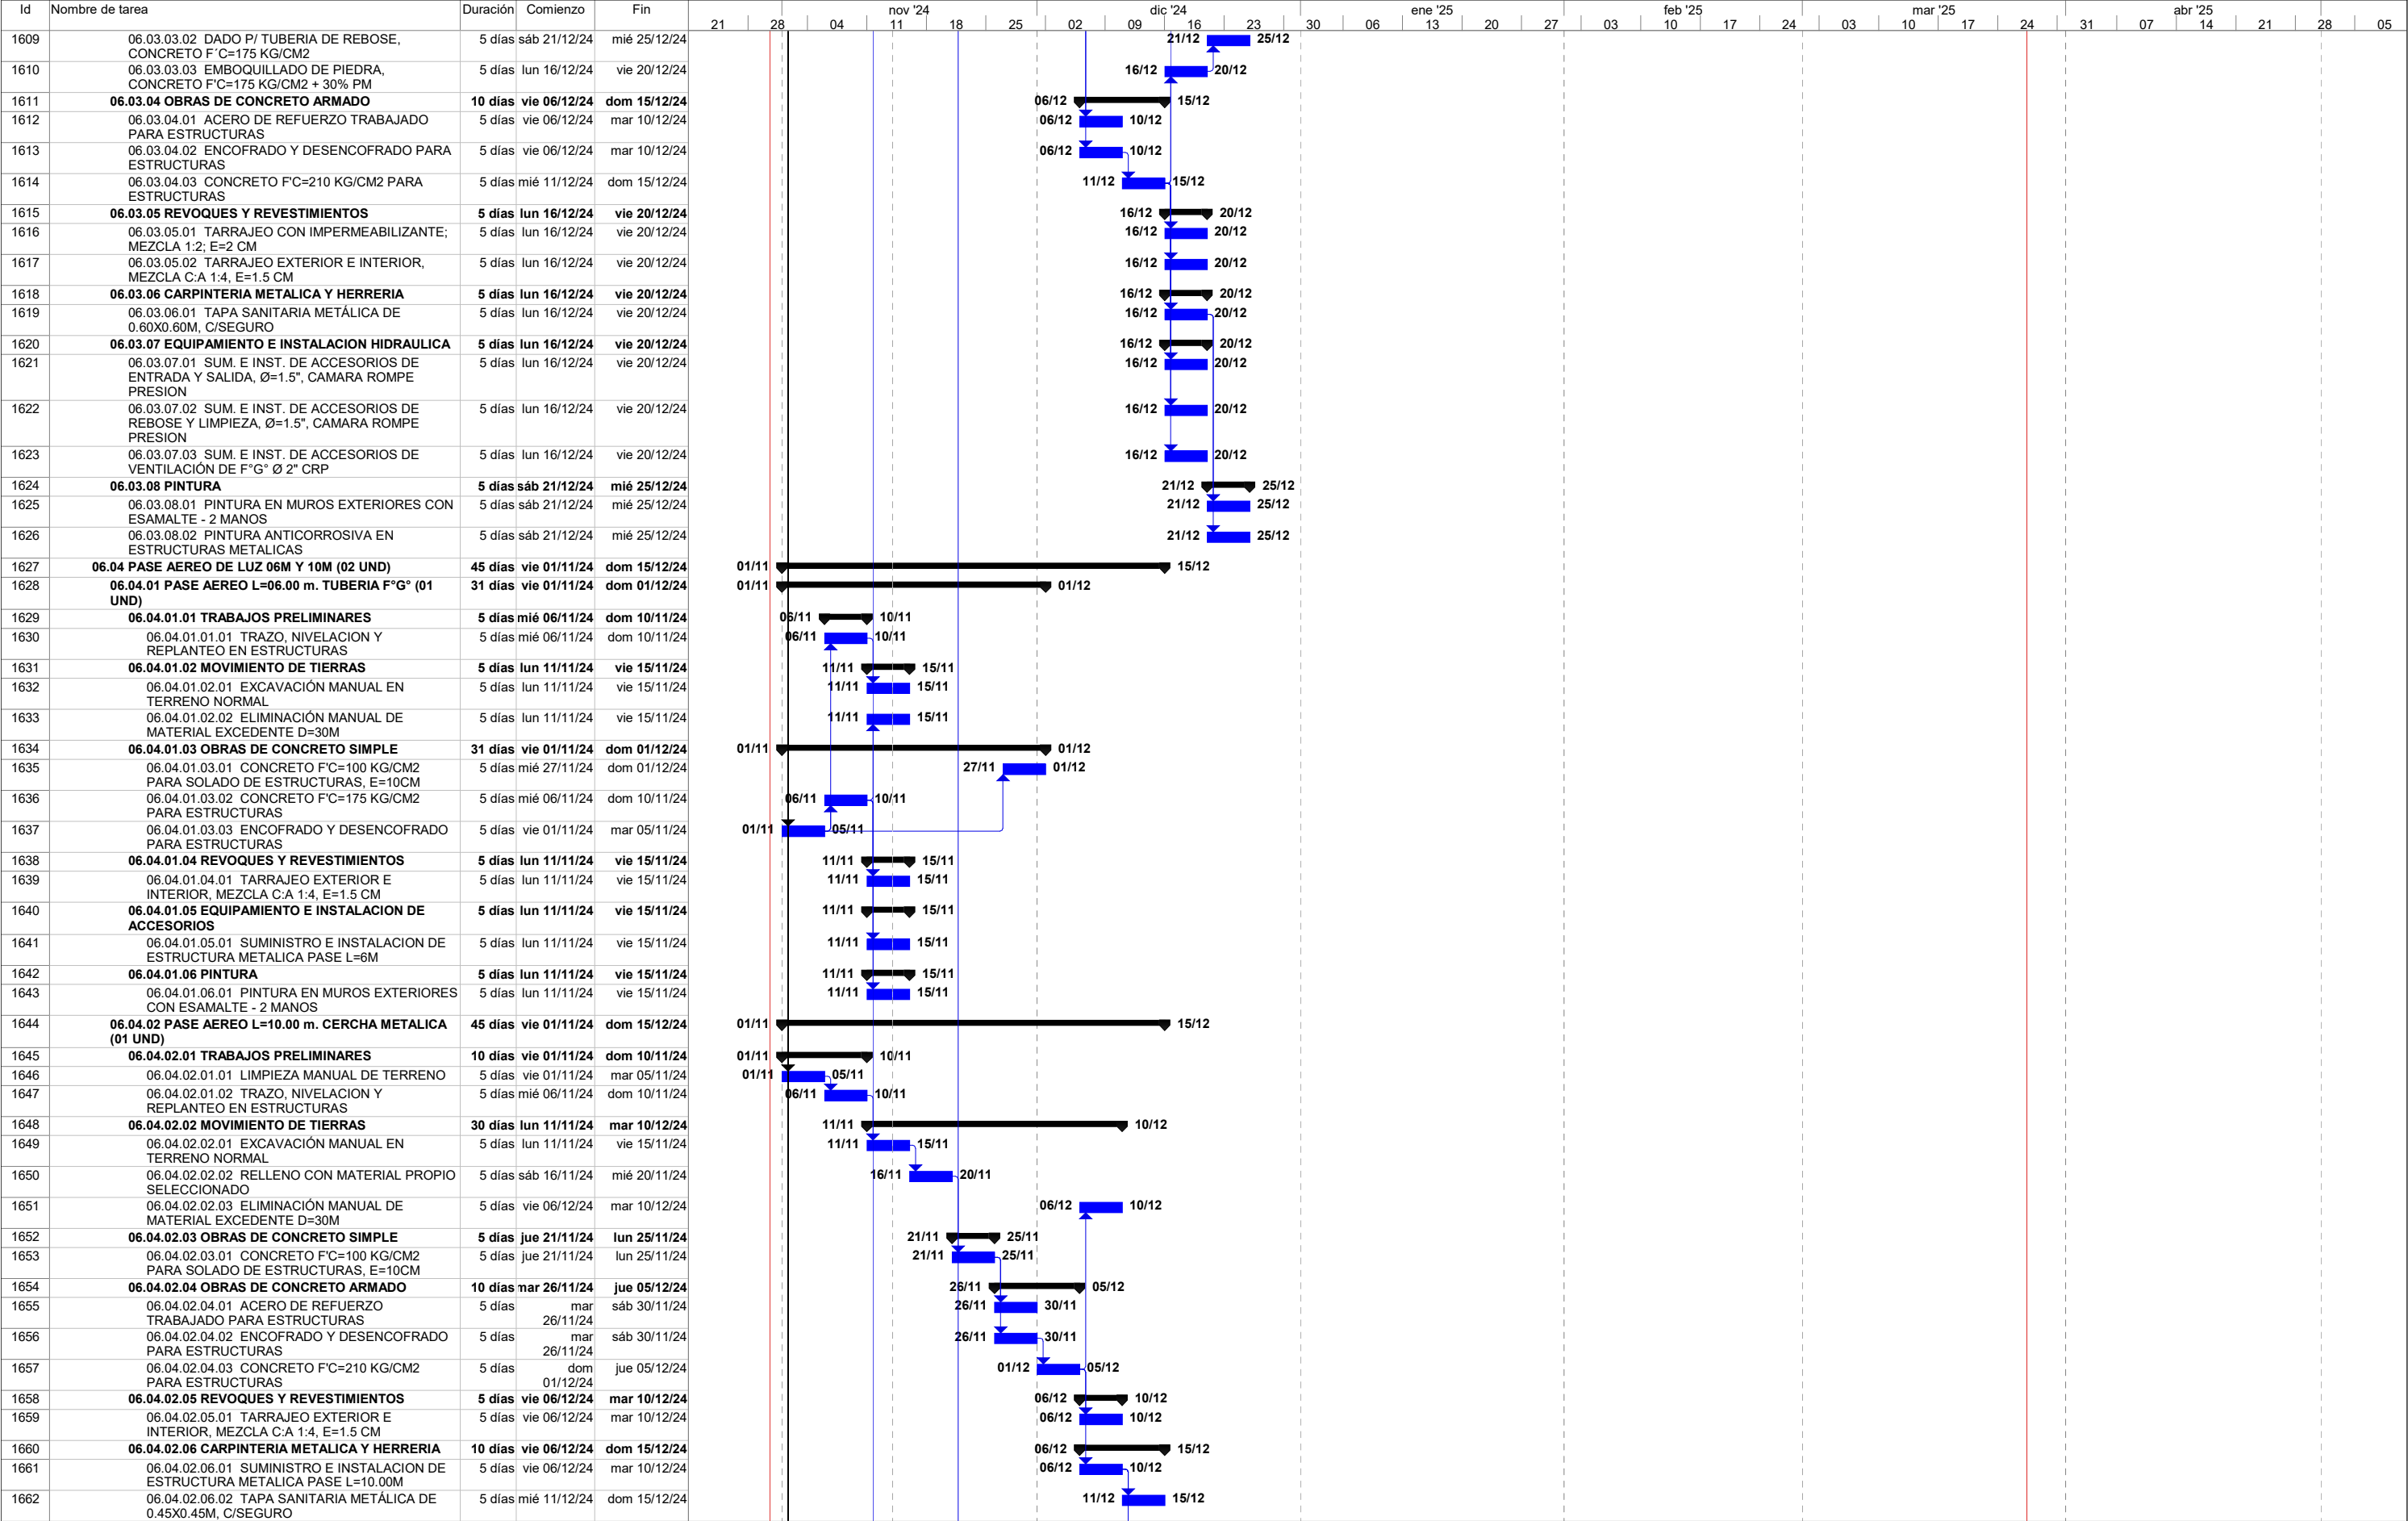

Proyecto: MEJORAMIENTO, AMPLIA
Fecha: 22/07/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin


Tareas críticas


División crítica


Progreso


Fecha límite

Página 32

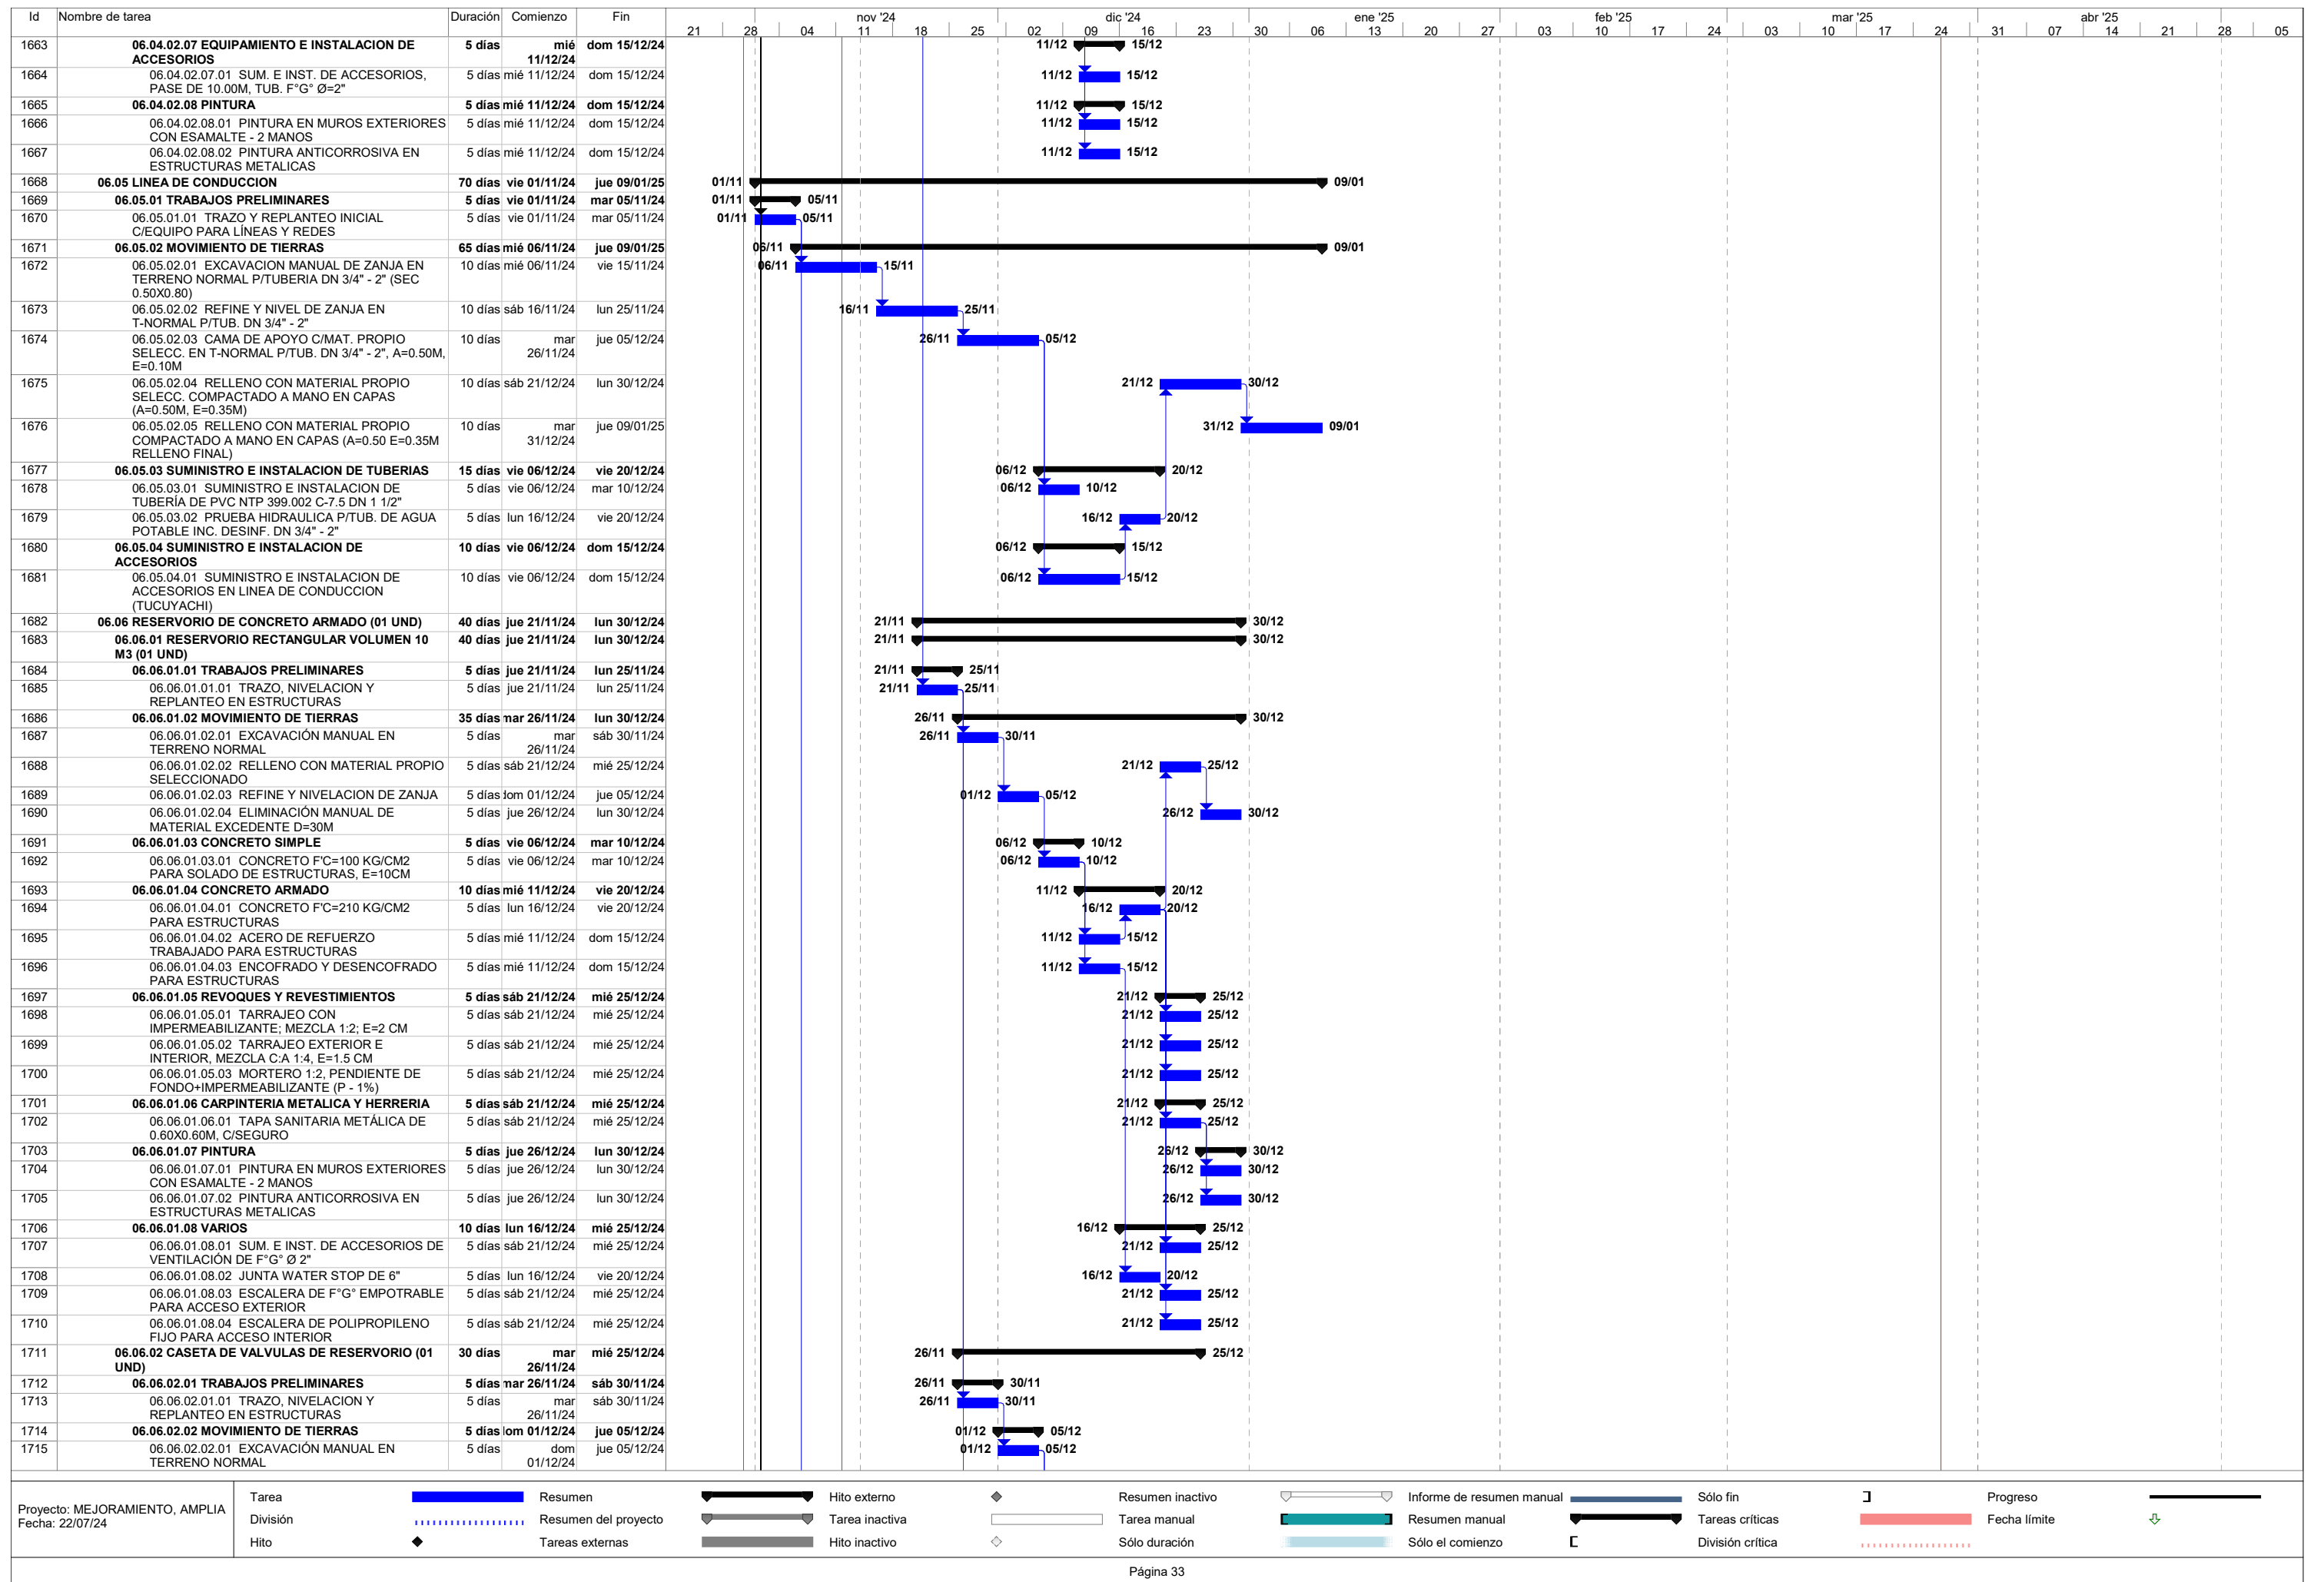


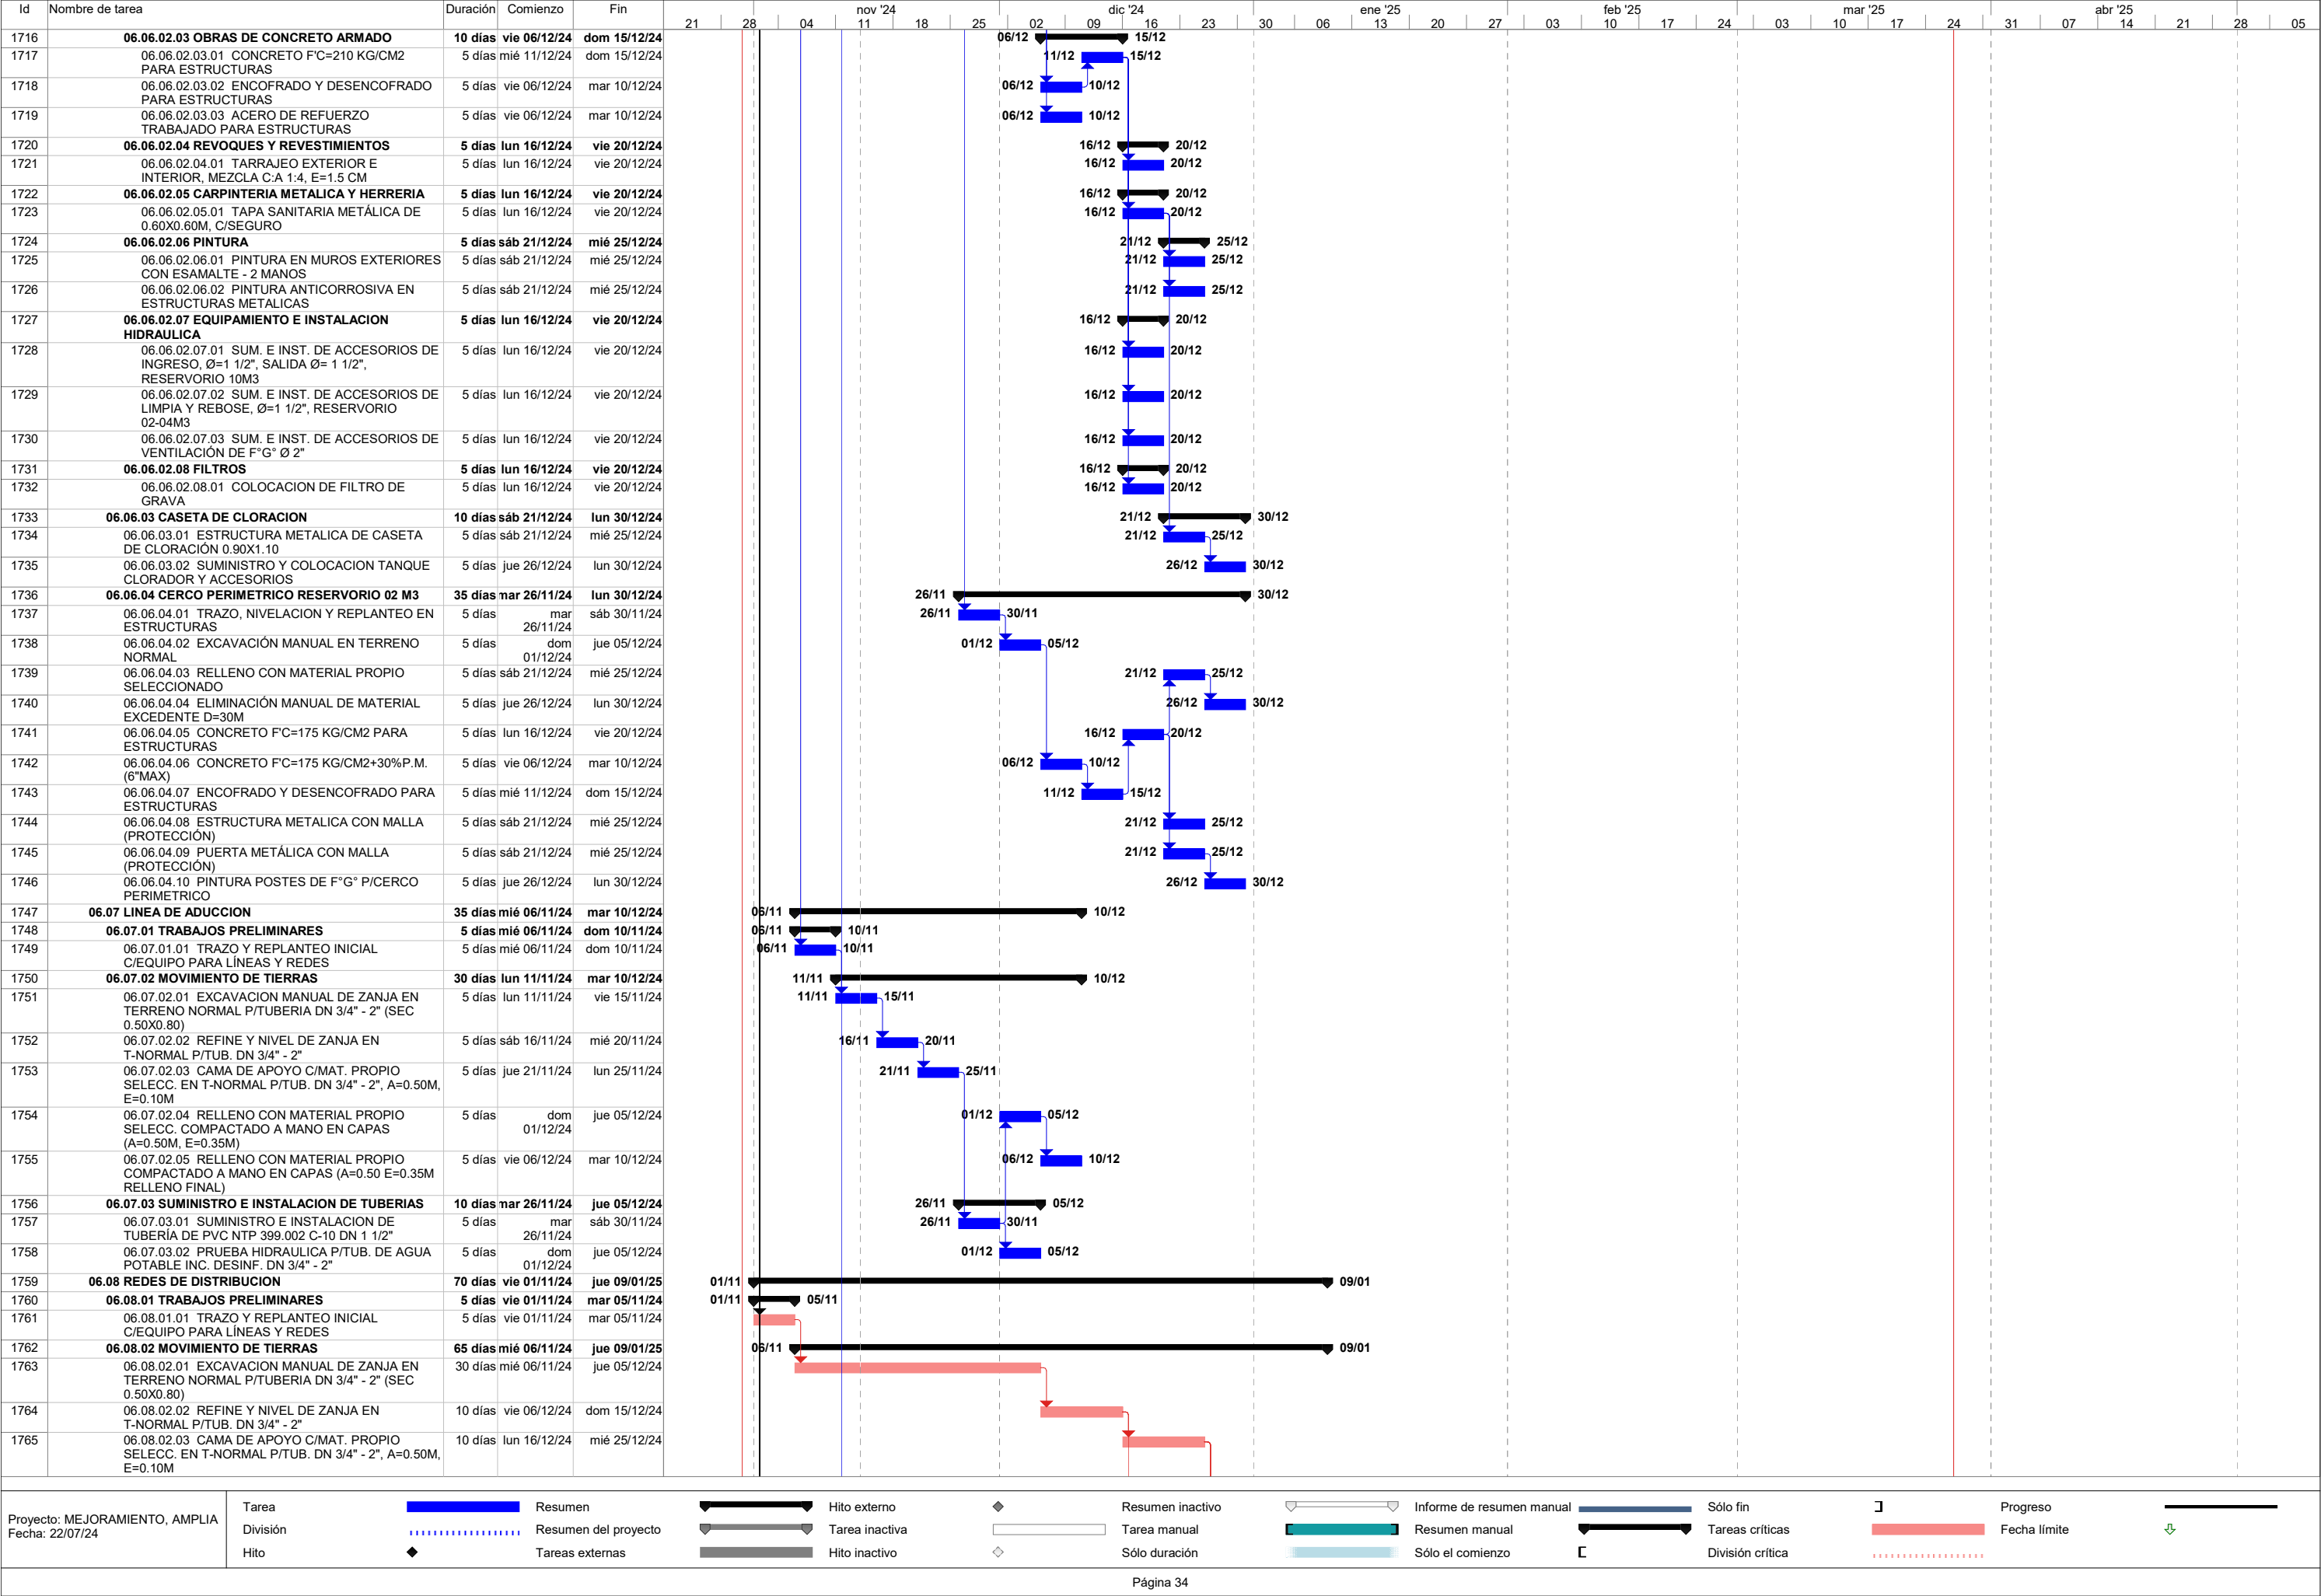

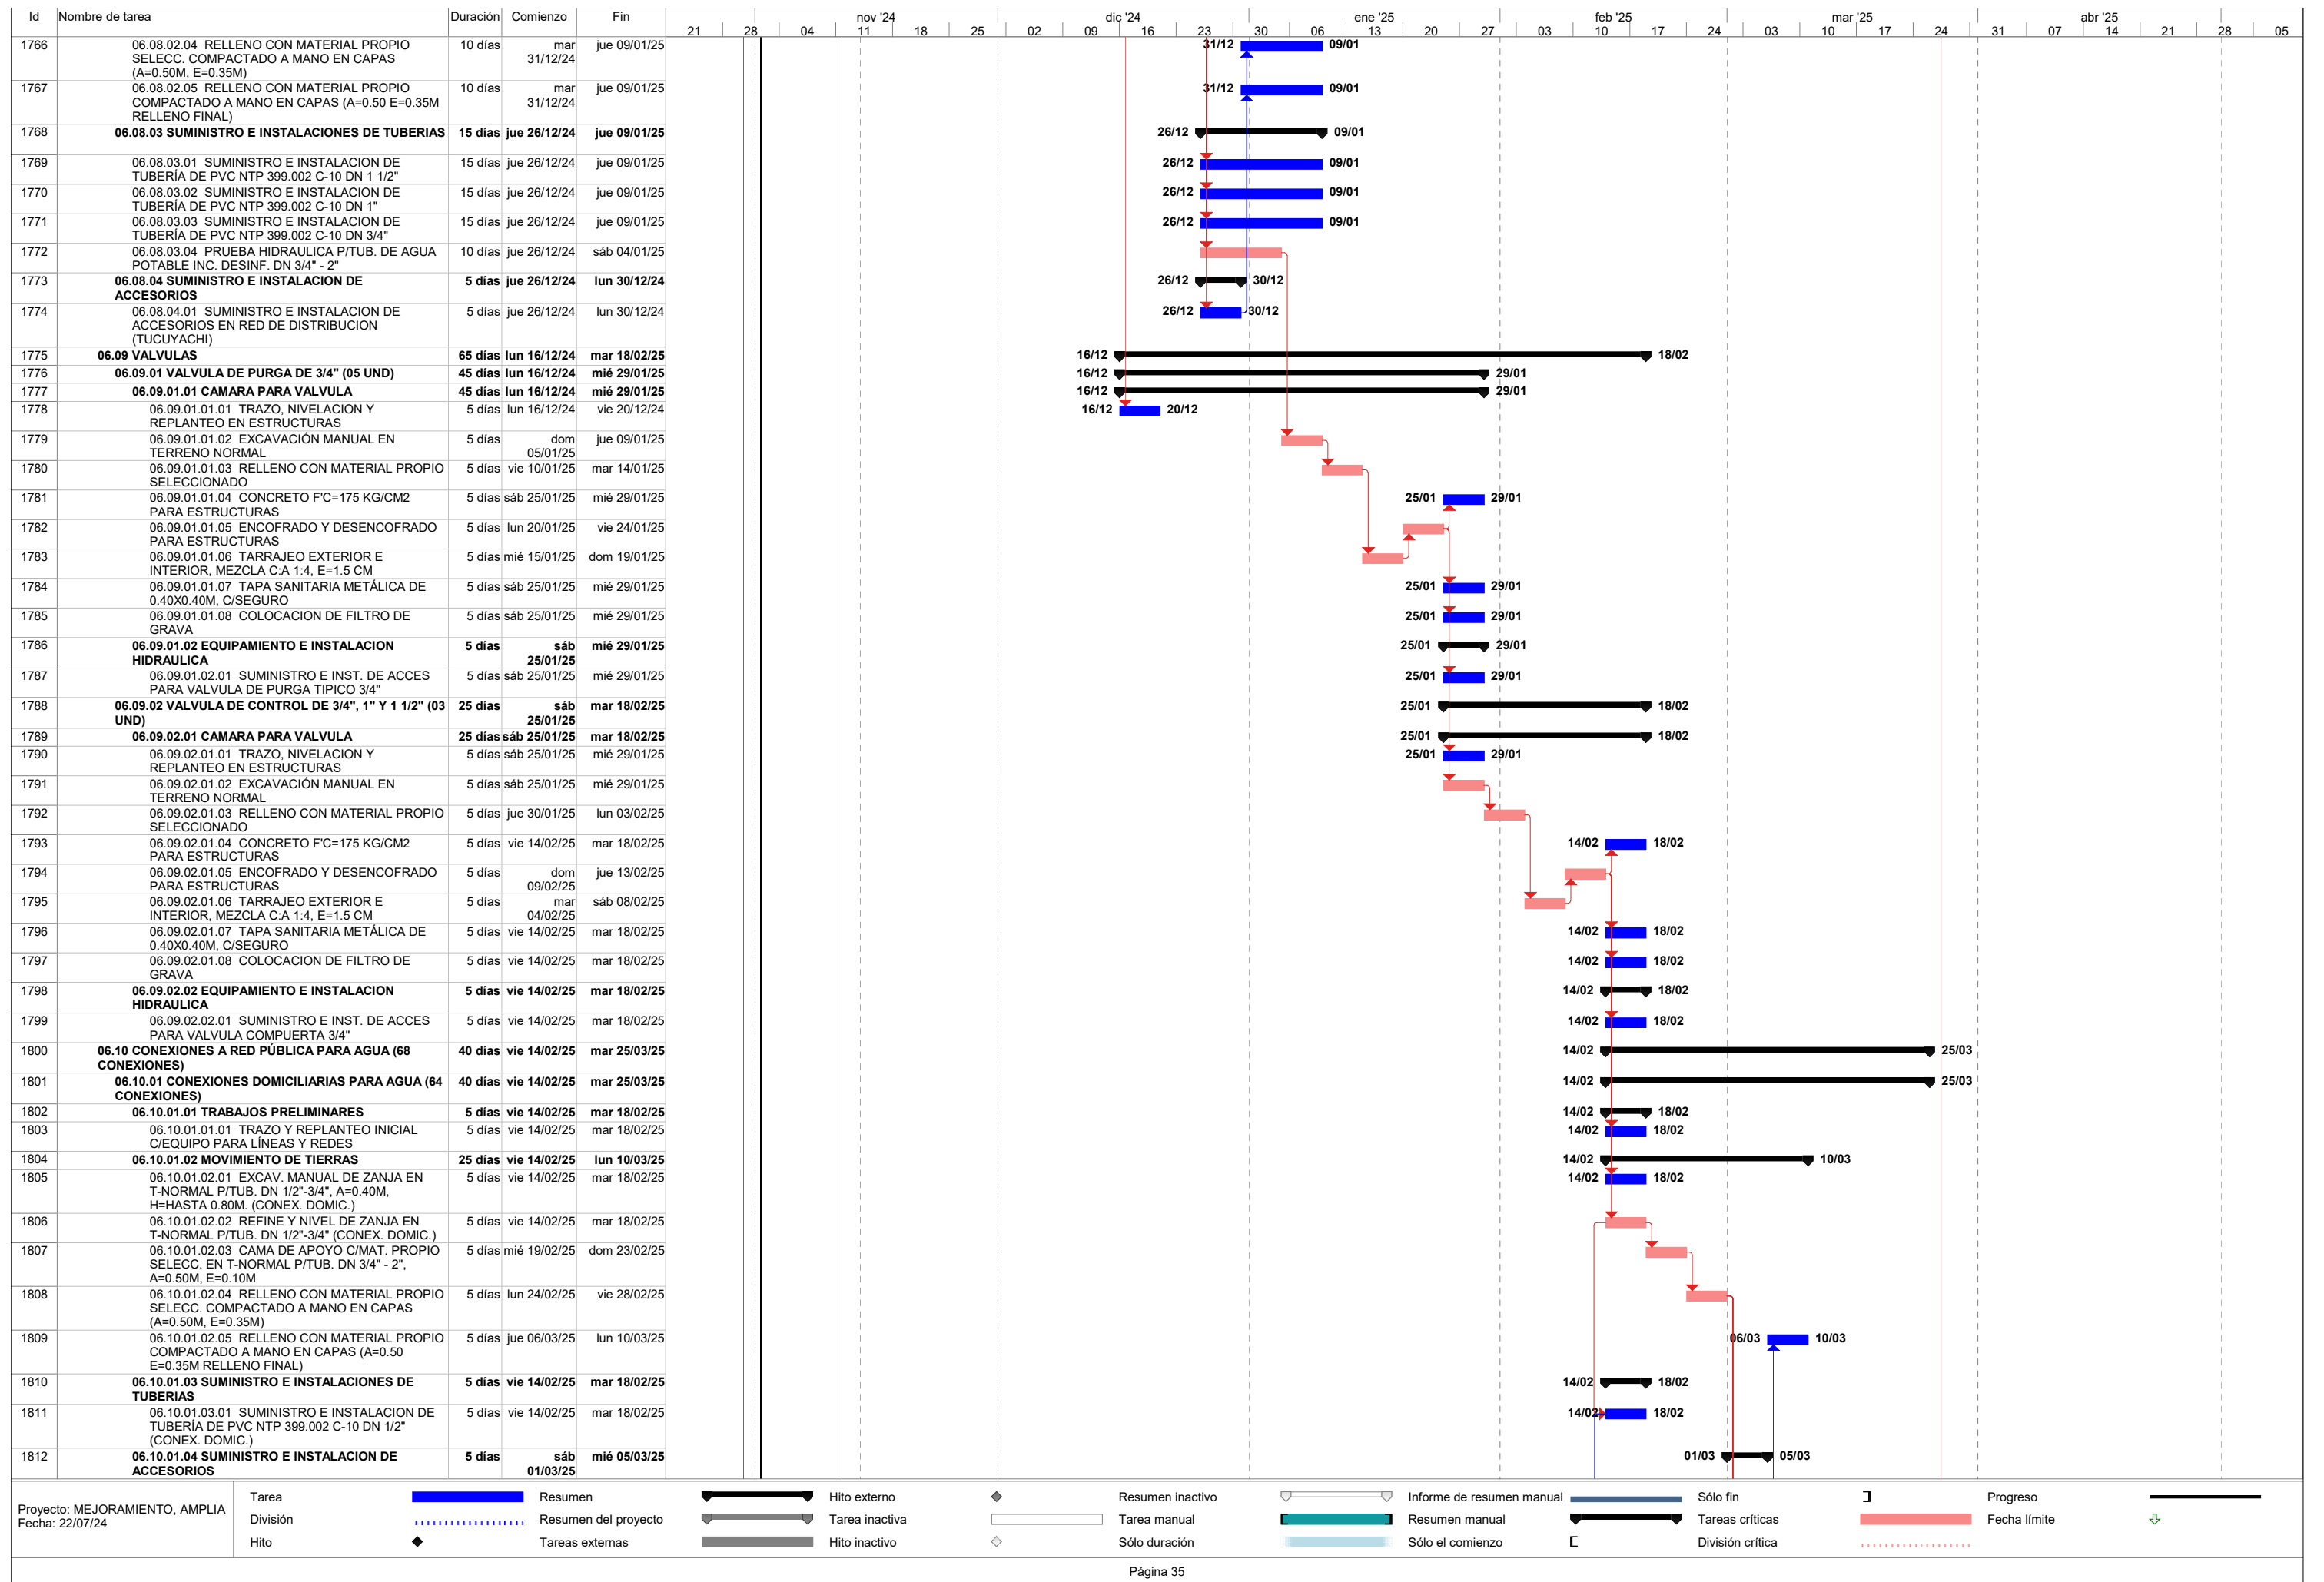


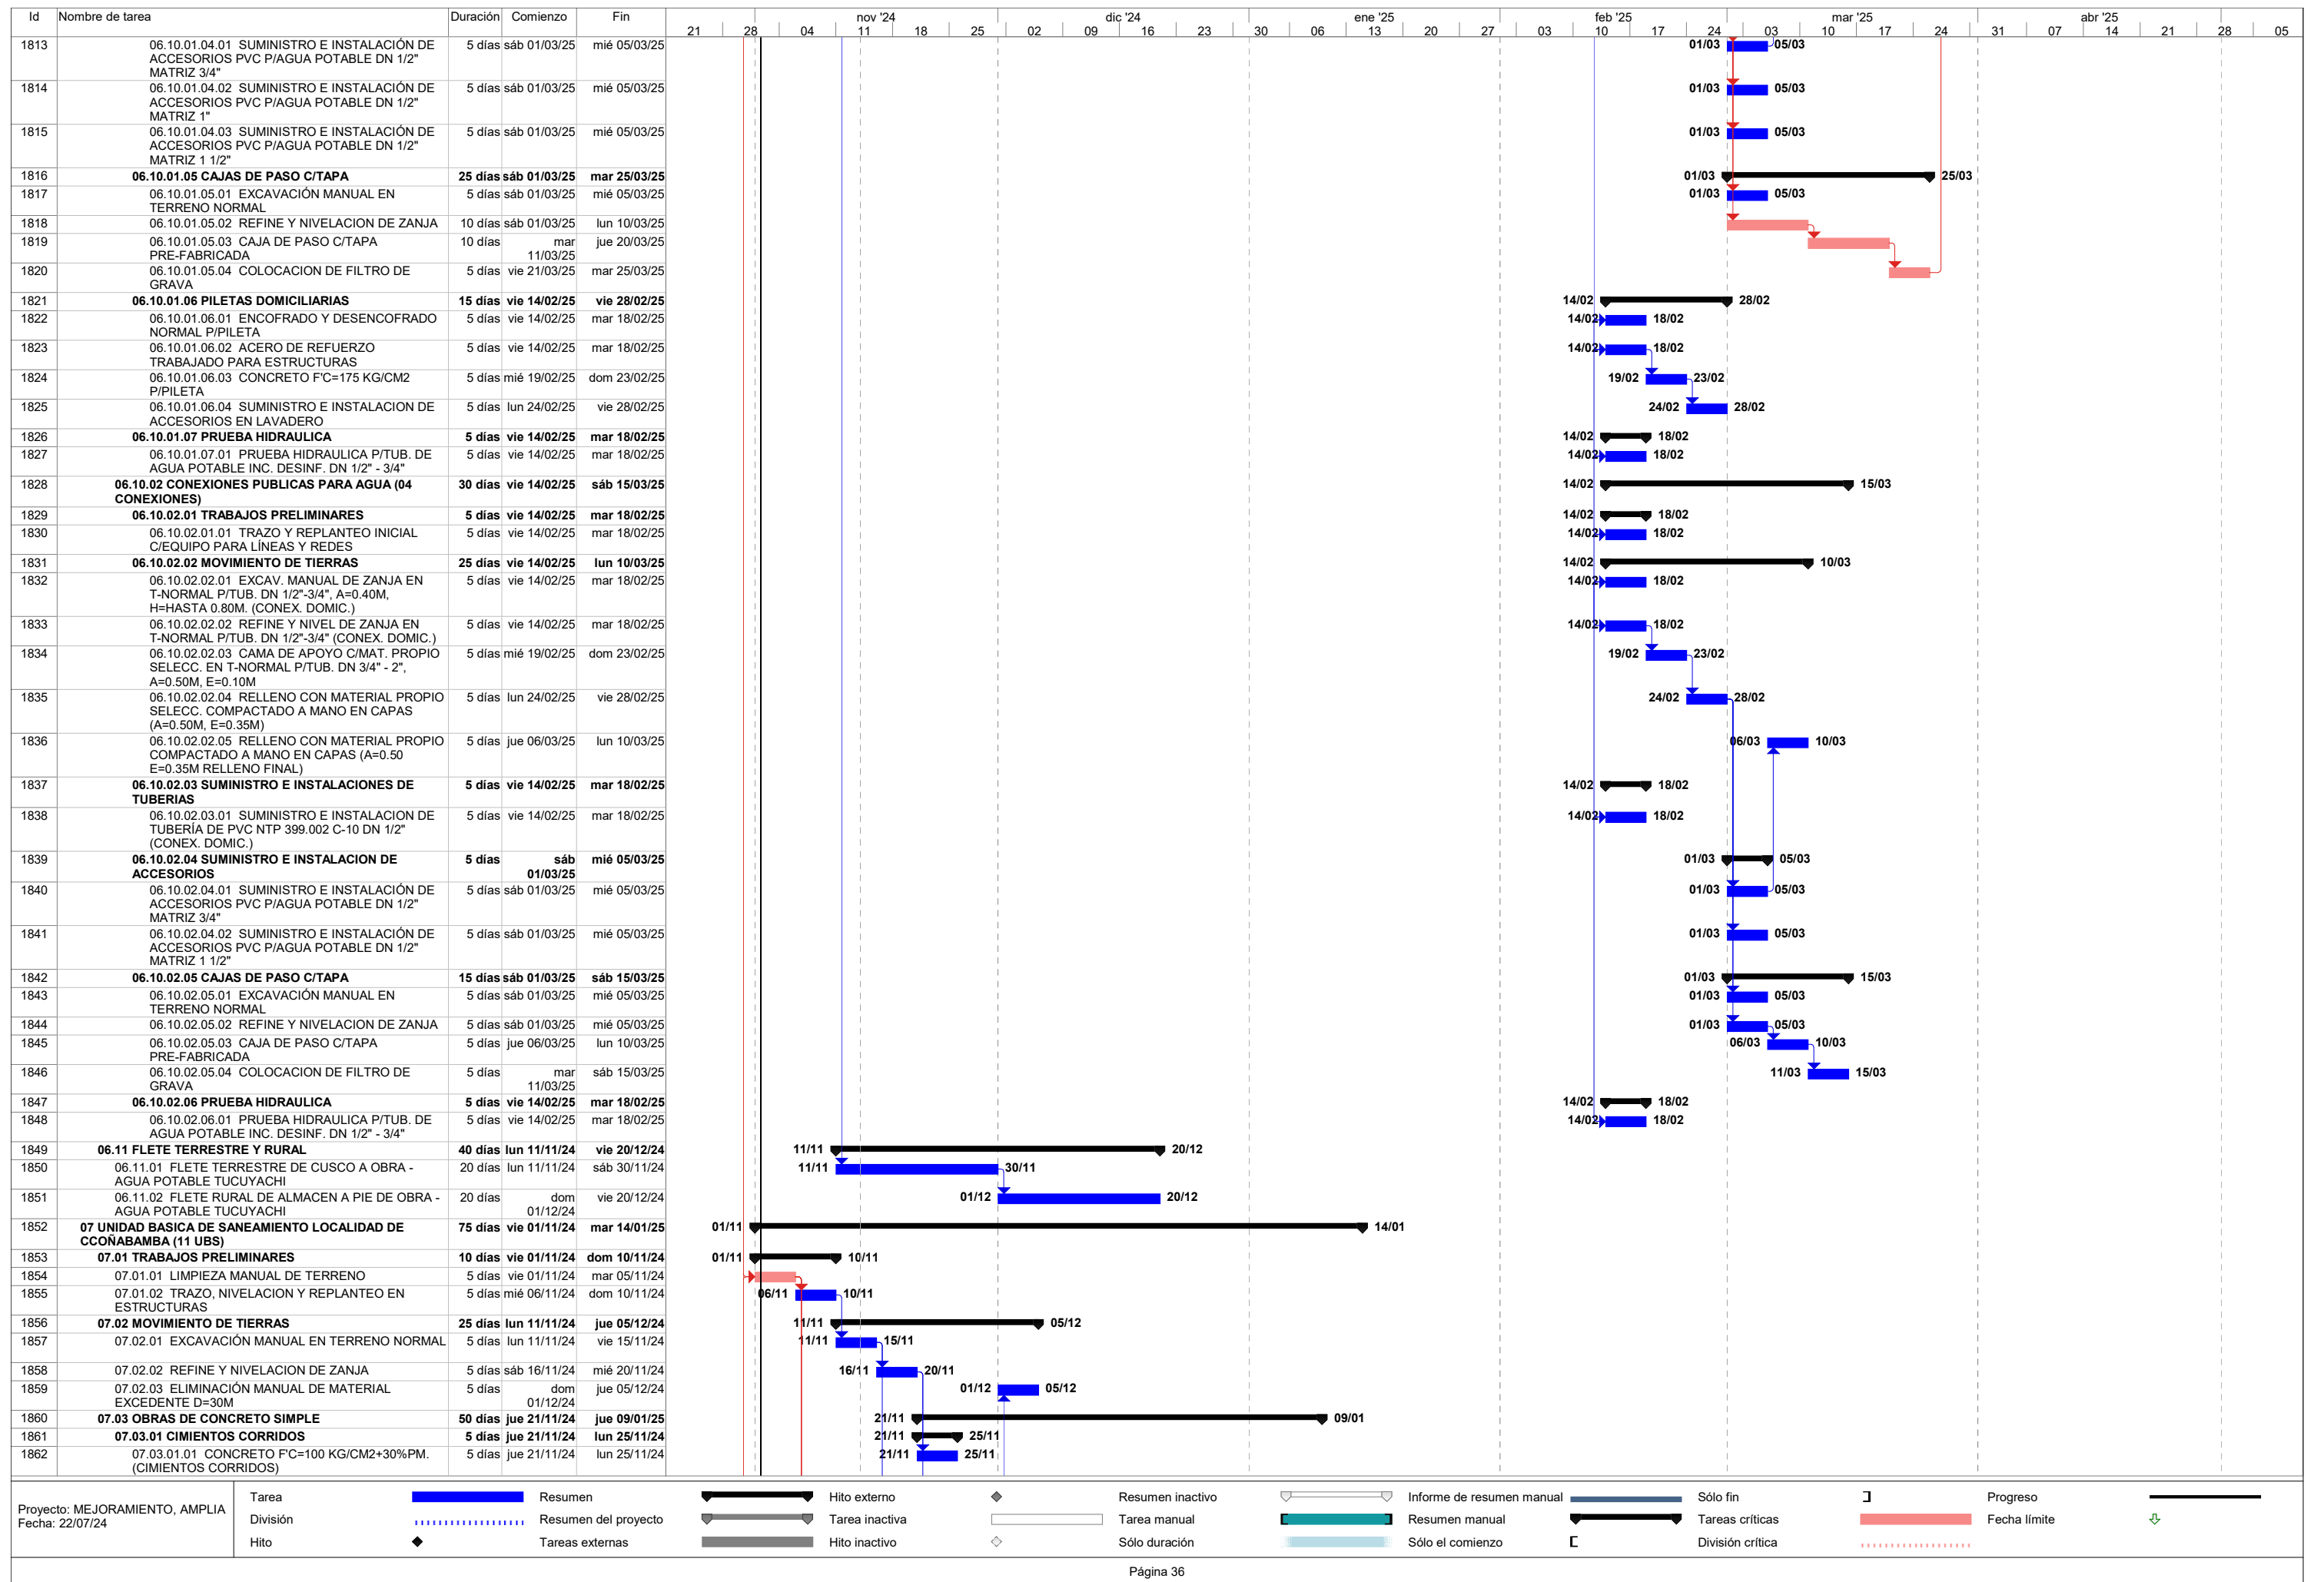



Id			Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21												28												04												11												nov '24												18												25												30/11												02												09												dic '24												16												23												30												06												ene '25												13												20												27												03												feb '25												10												17												24												03												mar '25												10												17												24												31												07												abr '25												14												21												28												05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1863	07.03.02 SOBRECIMENTOS			10 días	jue 21/11/24	sáb 30/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

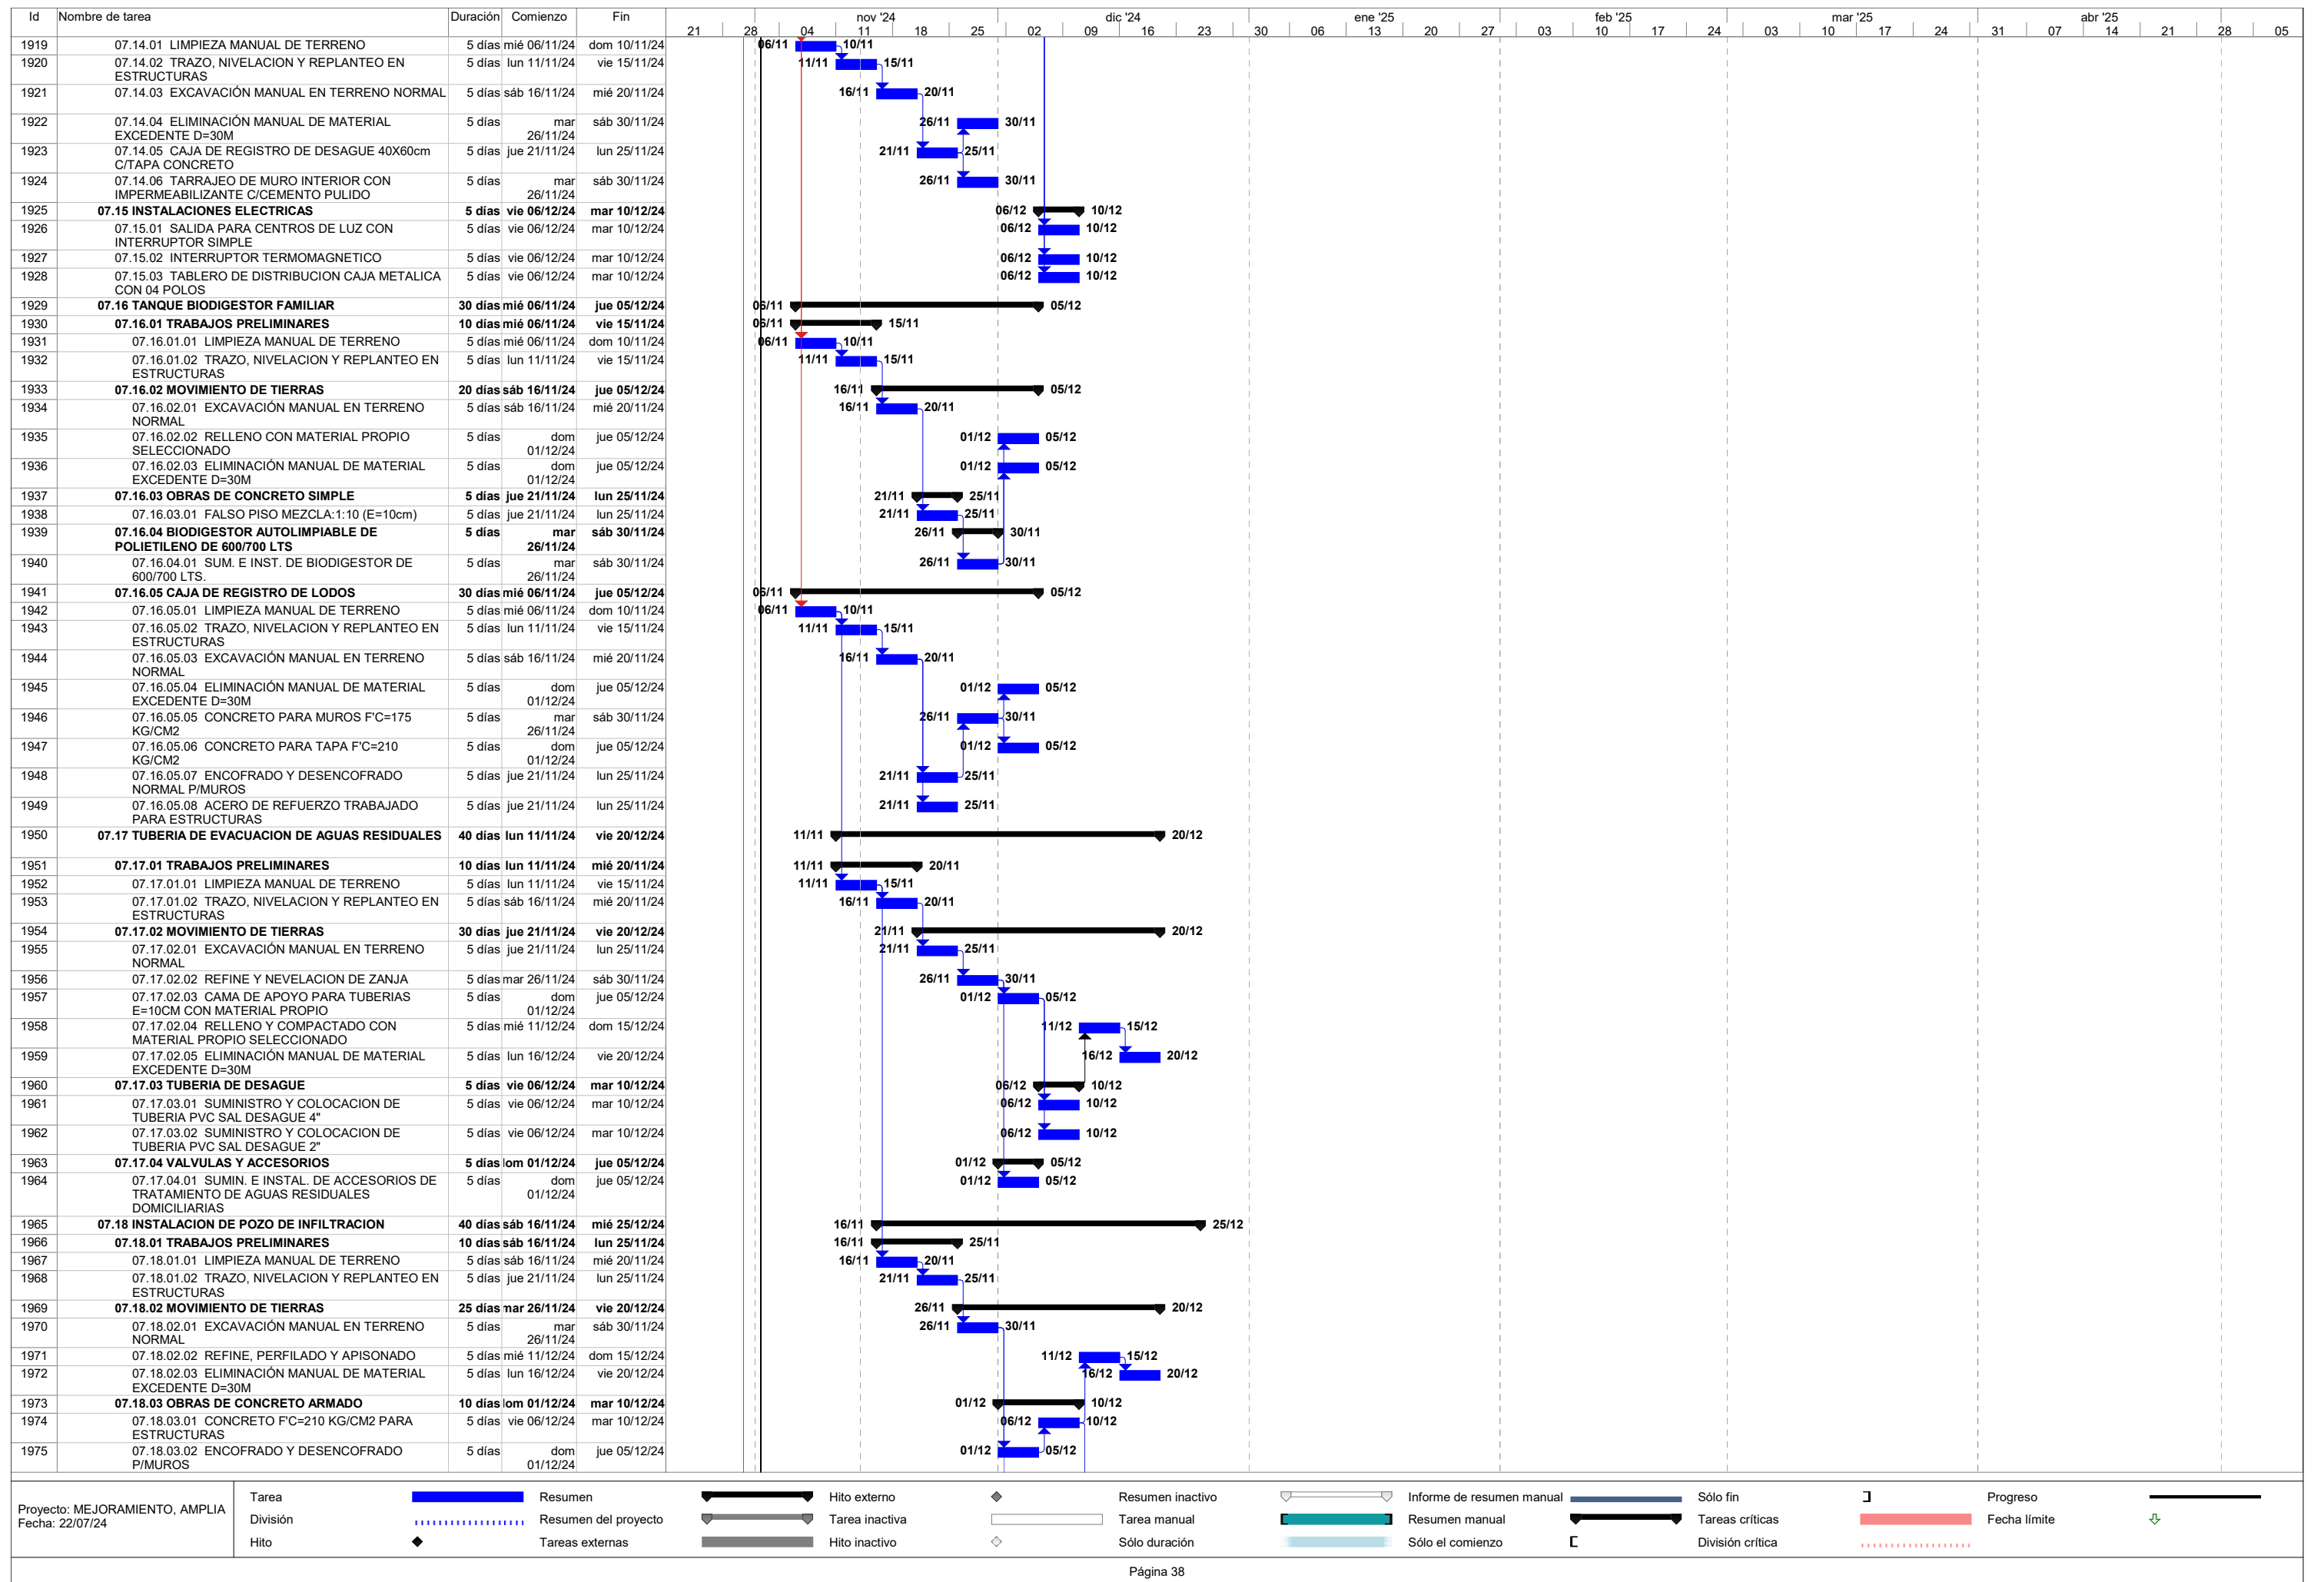



Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2032		08.09.03 COBERTURA DE FIBRA VEGETAL O CELULOSA DE 2.00m x 0.95m x 3mm	5 días	mar 31/12/24	sáb 04/01/25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2033		08.10 CERRAJERIA	5 días	dom 05/01/25	jue 09/01/25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2034		08.10.01 PICAPORTES EN PUERTA UBS	5 días	dom 05/01/25	jue 09/01/25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2035		08.11 PINTURA	15 días	jue 26/12/24	jue 09/01/25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2036		08.11.01 PINTURA LATEX ACRILICO SANITARIO EN MUROS 2 MANOS	5 días	jue 26/12/24	lun 30/12/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2037		08.11.02 PINTURA ANTICOROSIVA DE PUERTA Y VENTANA 2 MANOS	5 días	dom 05/01/25	jue 09/01/25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2038		08.12 INSTALACIONES SANITARIAS	50 días	sáb 16/11/24	sáb 04/01/25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2039		08.12.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	5 días	sáb 16/11/24	mié 20/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2040		08.12.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2041		08.12.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA SIST. DE AGUA UBS	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2042		08.12.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA SIST. DE DESAGUE UBS	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2043		08.12.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS UBS	5 días	mar 31/12/24	sáb 04/01/25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2044		08.13 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X60CM	25 días	mié 06/11/24	sáb 30/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2045		08.13.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	5 días	mié 06/11/24	dom 10/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2046		08.13.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS	5 días	lun 11/11/24	vie 15/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2047		08.13.03 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	5 días	sáb 16/11/24	mié 20/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2048		08.13.04 ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2049		08.13.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 40X60cm C/TAPA CONCRETO	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2050		08.13.06 TARRAJEO DE MURO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C/CEMENTO PULIDO	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2051		08.14 TRAMPA DE NATAS Y SOLIDOS	25 días	mié 06/11/24	sáb 30/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2052		08.14.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	5 días	mié 06/11/24	dom 10/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2053		08.14.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS	5 días	lun 11/11/24	vie 15/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2054		08.14.03 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	5 días	sáb 16/11/24	mié 20/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2055		08.14.04 ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2056		08.14.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 40X60cm C/TAPA CONCRETO	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2057		08.14.06 TARRAJEO DE MURO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C/CEMENTO PULIDO	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2058		08.15 INSTALACIONES ELECTRICAS	5 días	vie 06/12/24	mar 10/12/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2059		08.15.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ CON INTERRUPTOR SIMPLE	5 días	vie 06/12/24	mar 10/12/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2060		08.15.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	5 días	vie 06/12/24	mar 10/12/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2061		08.15.03 TABLERO DE DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 04 POLOS	5 días	vie 06/12/24	mar 10/12/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2062		08.16 TANQUE BIODIGESTOR FAMILIAR	30 días	mié 06/11/24	jue 05/12/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2063		08.16.01 TRABAJOS PRELIMINARES	10 días	mié 06/11/24	vie 15/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2064		08.16.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	5 días	mié 06/11/24	dom 10/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2065		08.16.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS	5 días	lun 11/11/24	vie 15/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2066		08.16.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS	20 días	sáb 16/11/24	jue 05/12/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2067		08.16.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	5 días	sáb 16/11/24	mié 20/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2068		08.16.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	5 días	dom 01/12/24	jue 05/12/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2069		08.16.02.03 ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M	5 días	dom 01/12/24	jue 05/12/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2070		08.16.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2071		08.16.03.01 FALSO PISO MEZCLA:1:10 (E=10cm)	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2072		08.16.04 BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE POLIETILENO DE 600/700 LTS	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2073		08.16.04.01 SUM. E INST. DE BIODIGESTOR DE 600/700 LTS.	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2074		08.16.05 CAJA DE REGISTRO DE LODOS	30 días	mié 06/11/24	jue 05/12/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2075		08.16.05.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	5 días	mié 06/11/24	dom 10/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2076		08.16.05.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS	5 días	lun 11/11/24	vie 15/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2077		08.16.05.03 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	5 días	sáb 16/11/24	mié 20/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2078		08.16.05.04 ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M	5 días	dom 01/12/24	jue 05/12/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2079		08.16.05.05 CONCRETO PARA MUROS F'C=175 KG/CM2	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2080		08.16.05.06 CONCRETO PARA TAPA F'C=210 KG/CM2	5 días	dom 01/12/24	jue 05/12/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2081		08.16.05.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/MUROS	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2082		08.16.05.08 ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCTURAS	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2083		08.17 TUBERIA DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES	40 días	lun 11/11/24	vie 20/12/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2084		08.17.01 TRABAJOS PRELIMINARES	10 días	lun 11/11/24	mié 20/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2085		08.17.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	5 días	lun 11/11/24	vie 15/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2086		08.17.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS	5 días	sáb 16/11/24	mié 20/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2087		08.17.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS	30 días	jue 21/11/24	vie 20/12/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2088		08.17.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Proyecto: MEJORAMIENTO, AMPLIA		Tarea		Resumen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

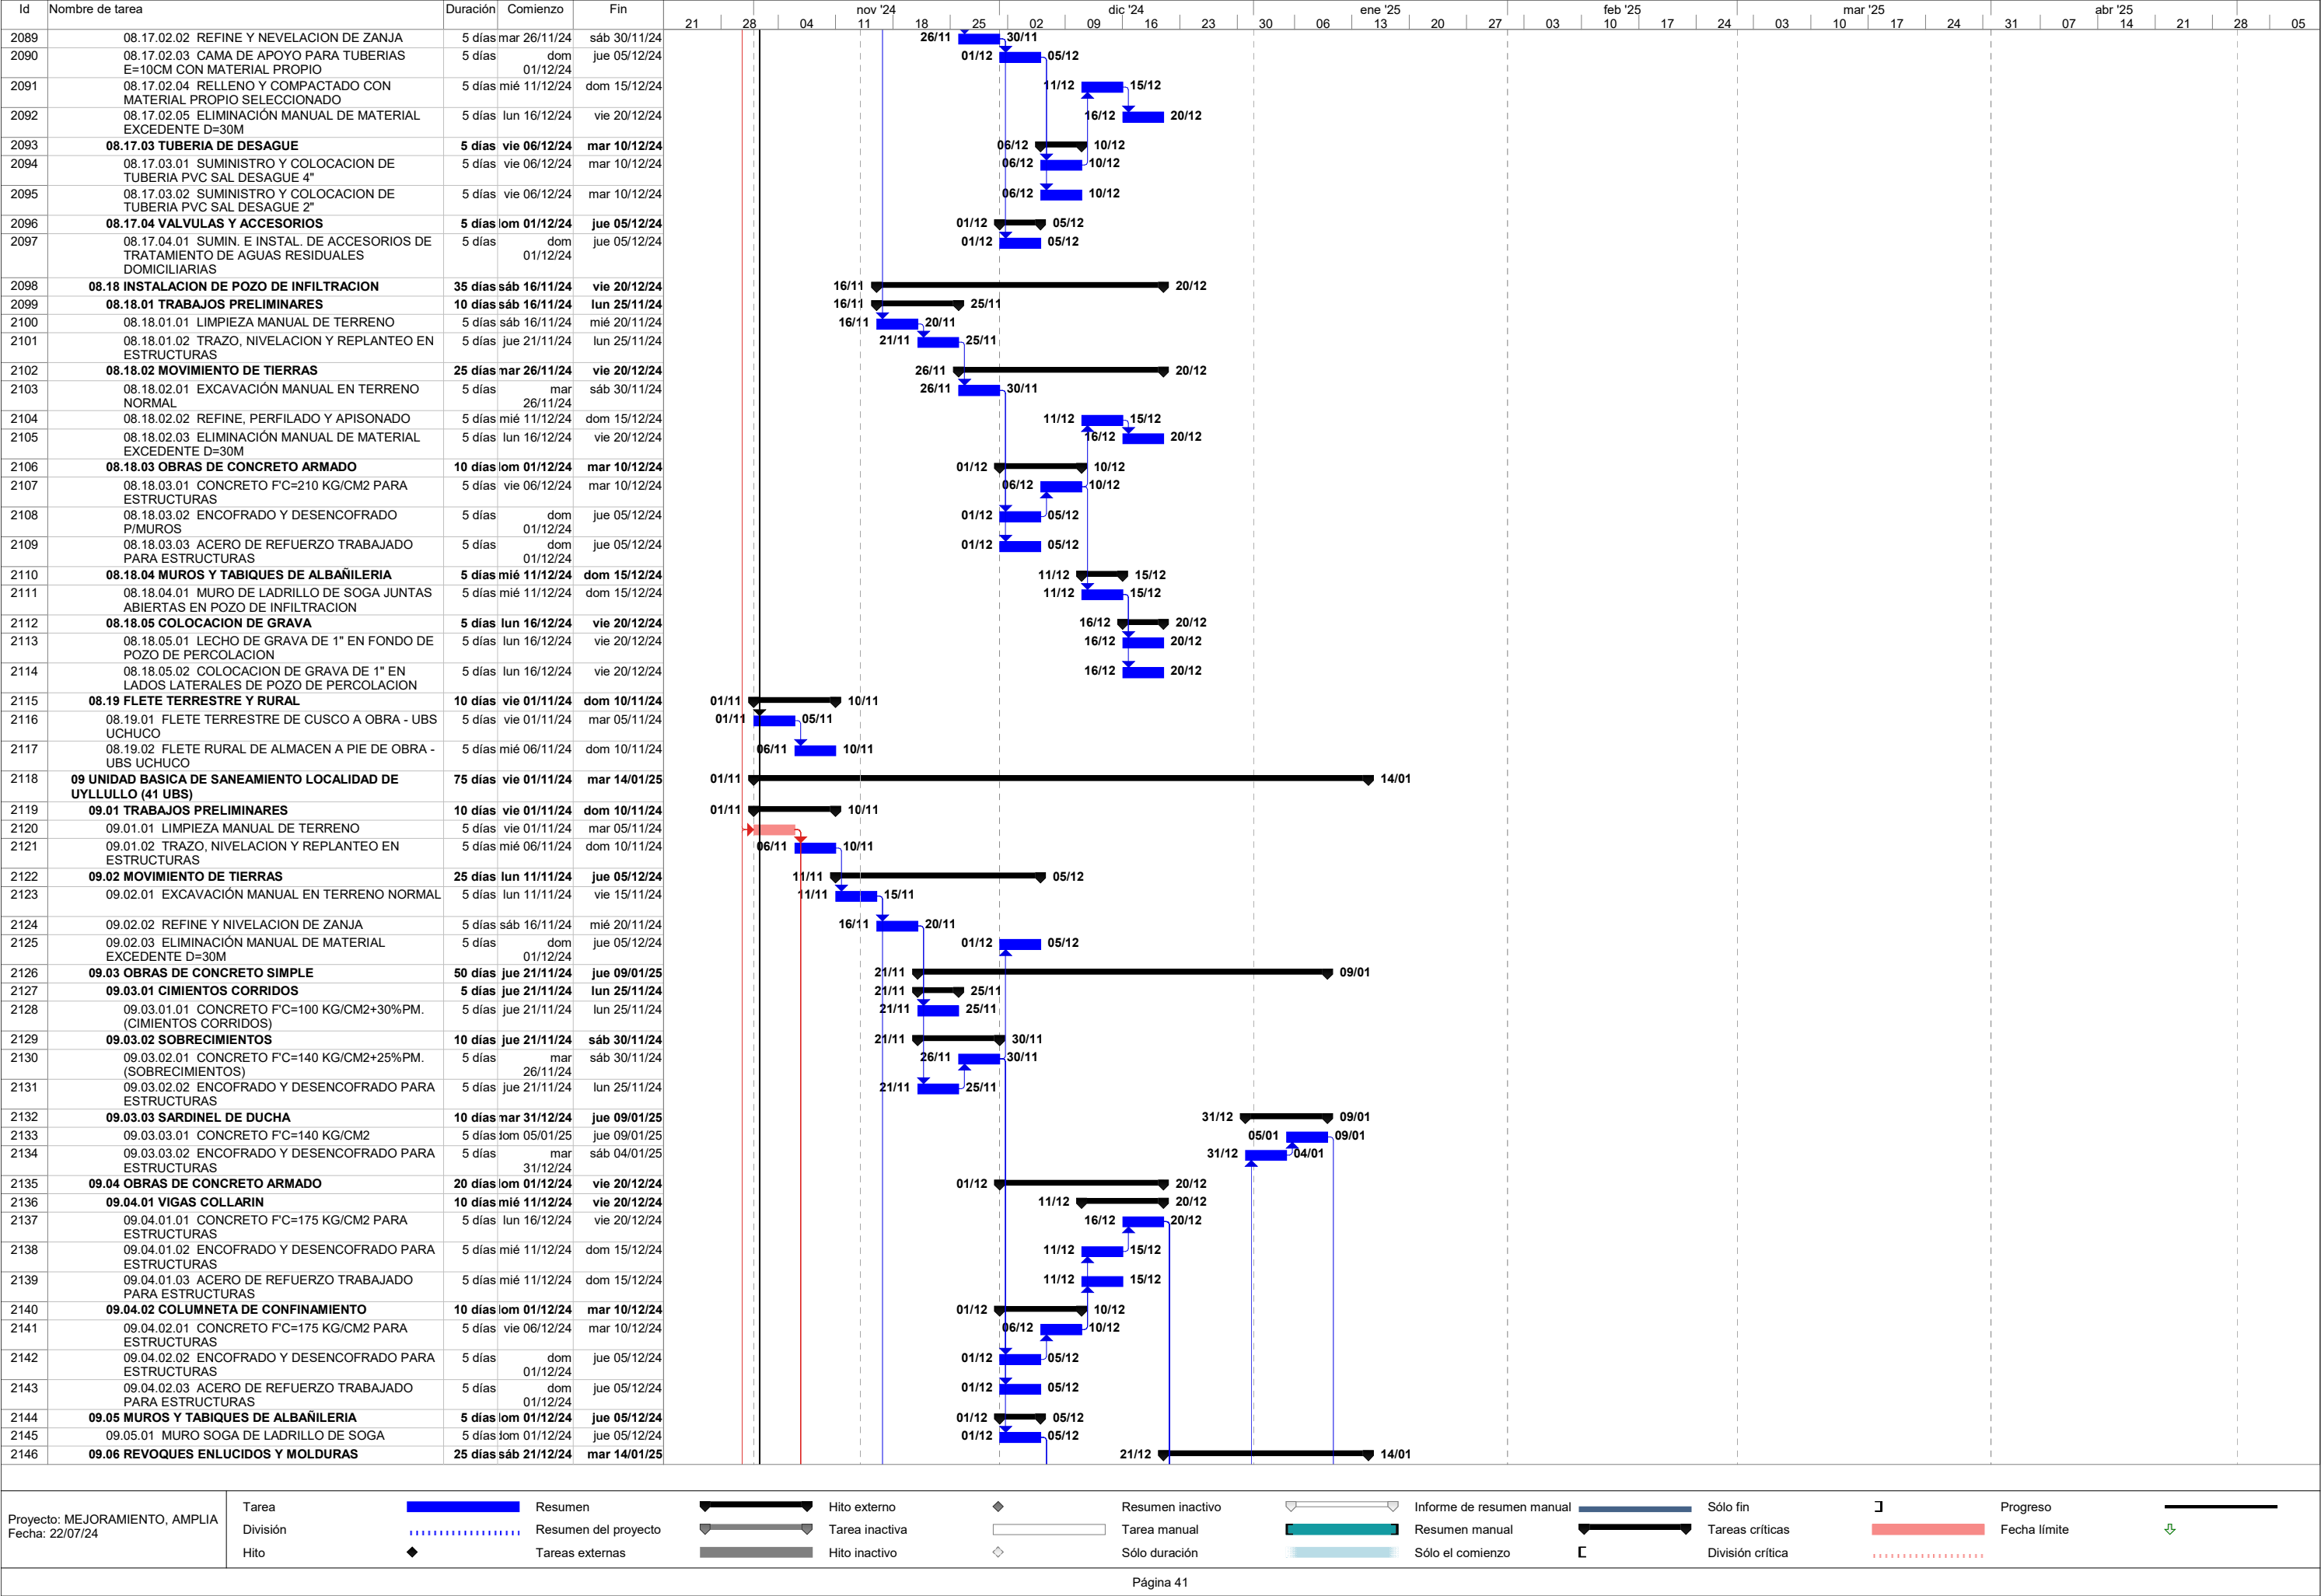


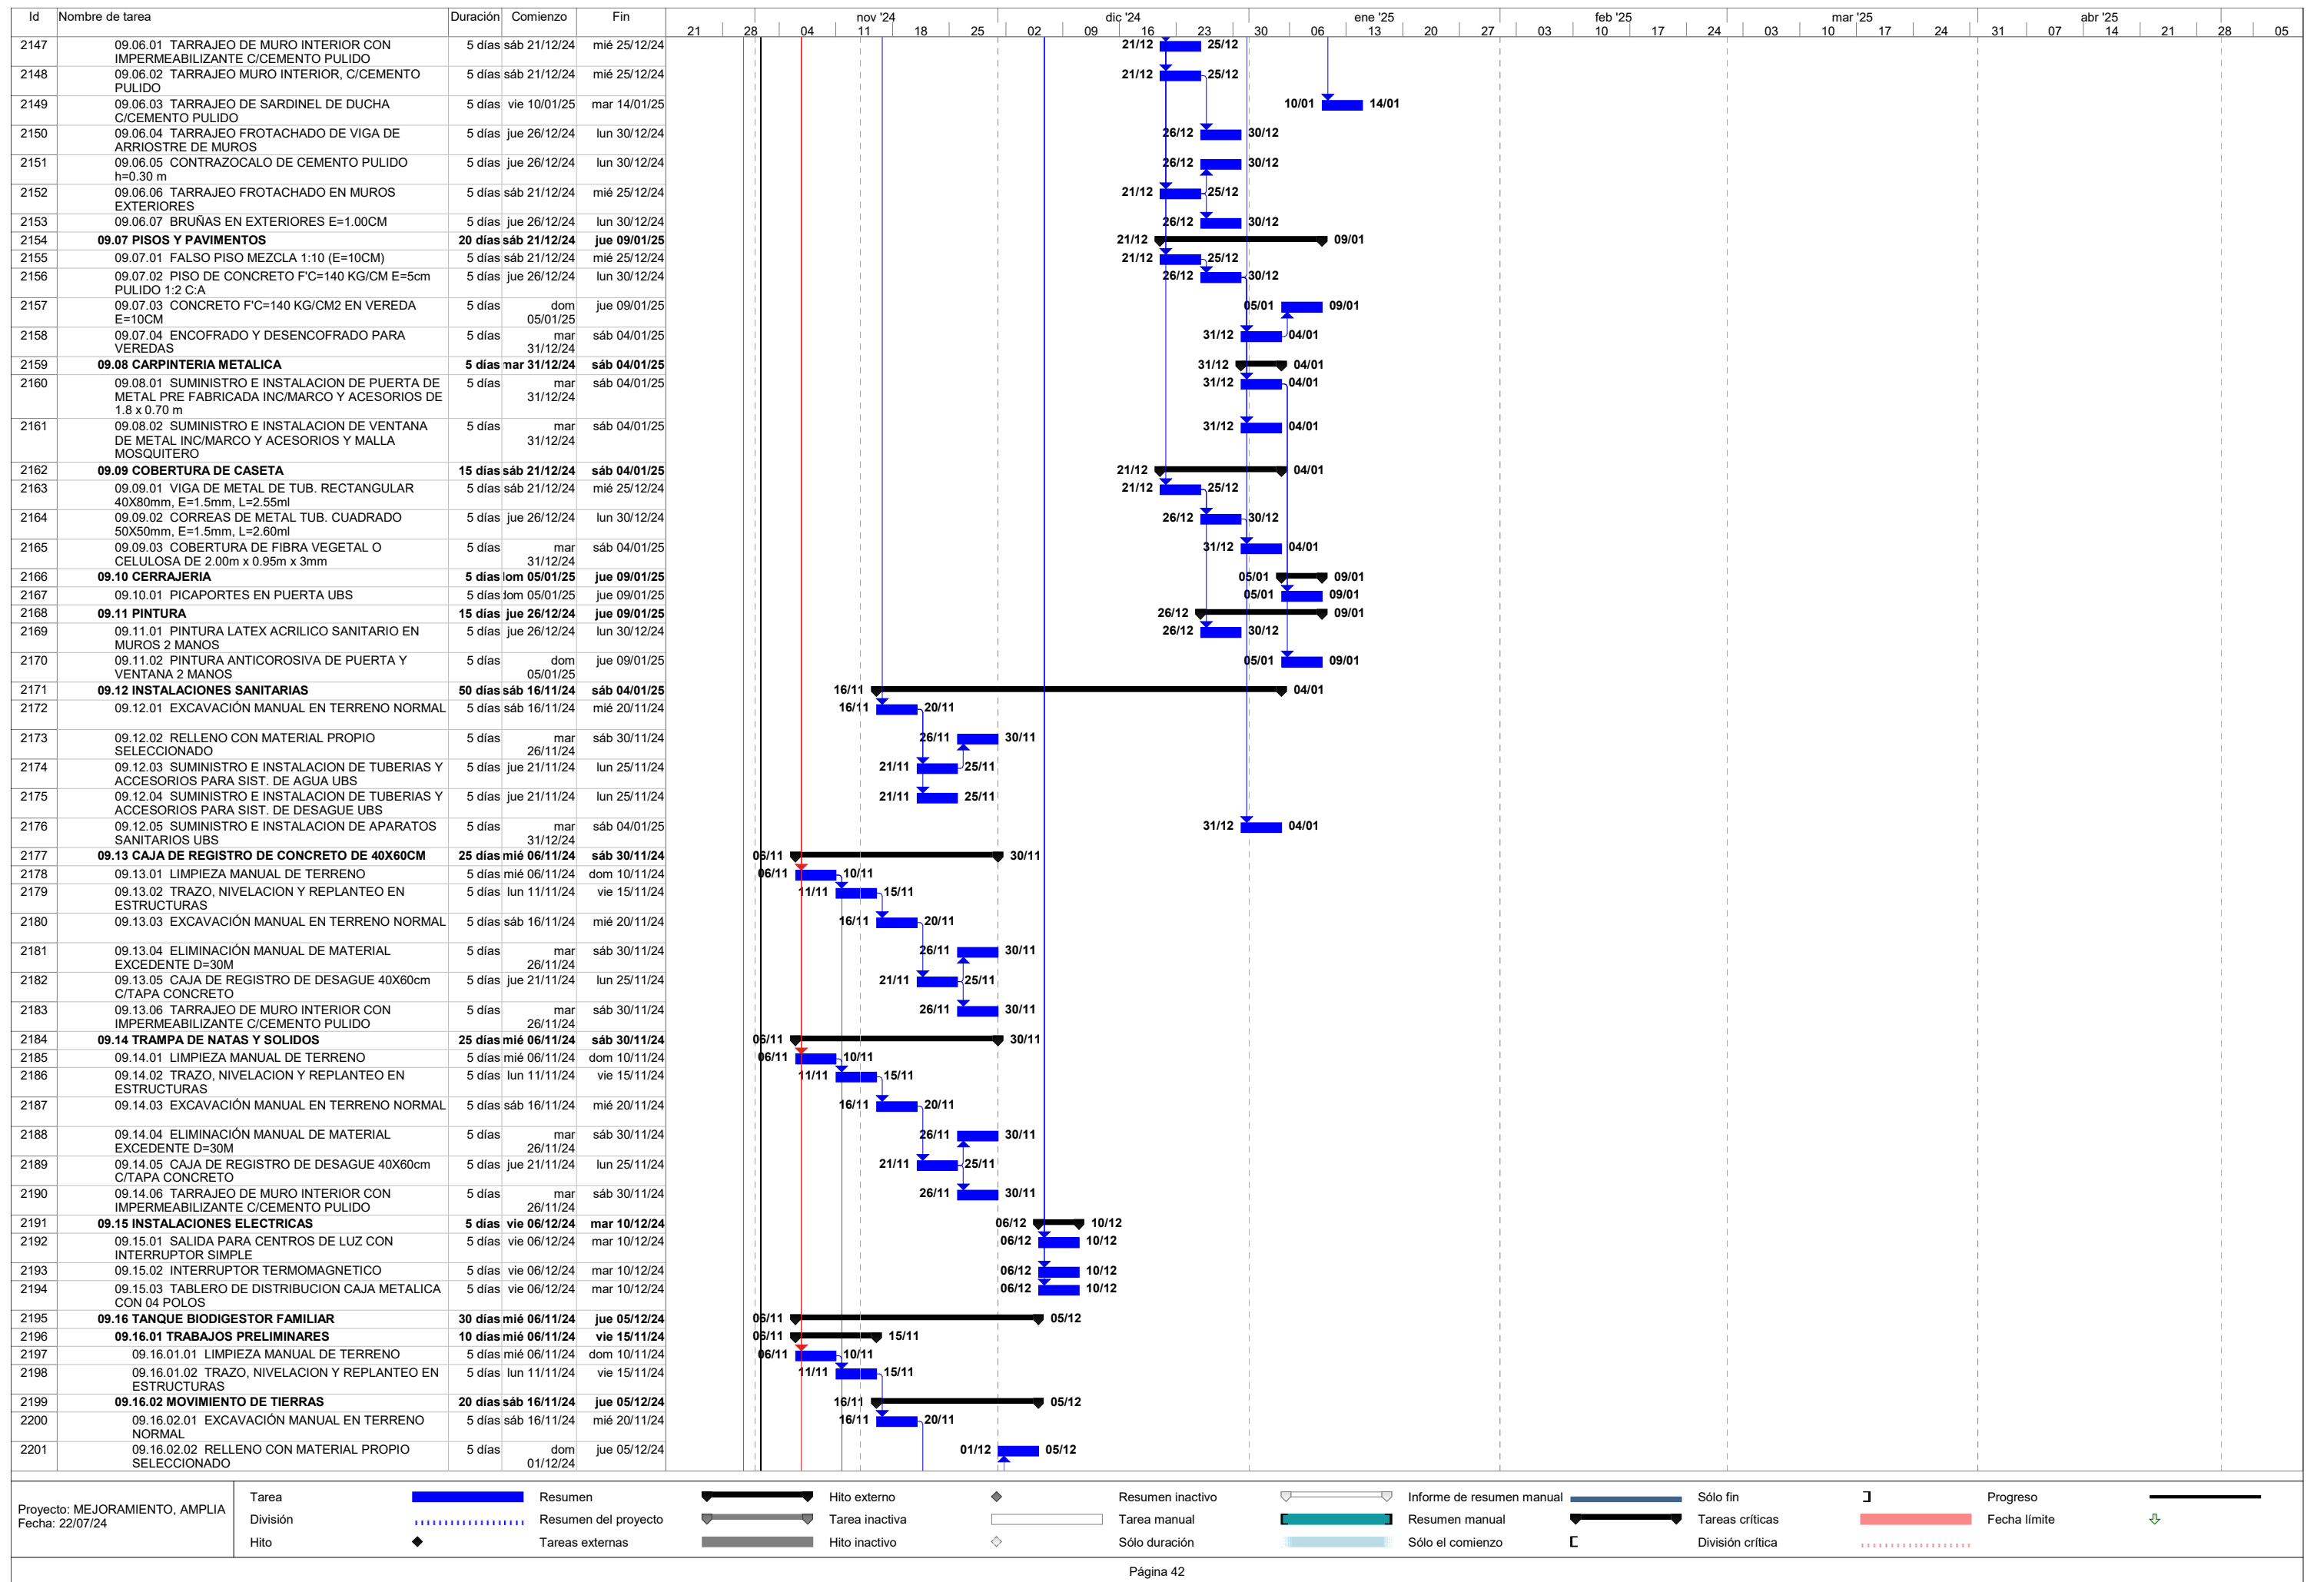

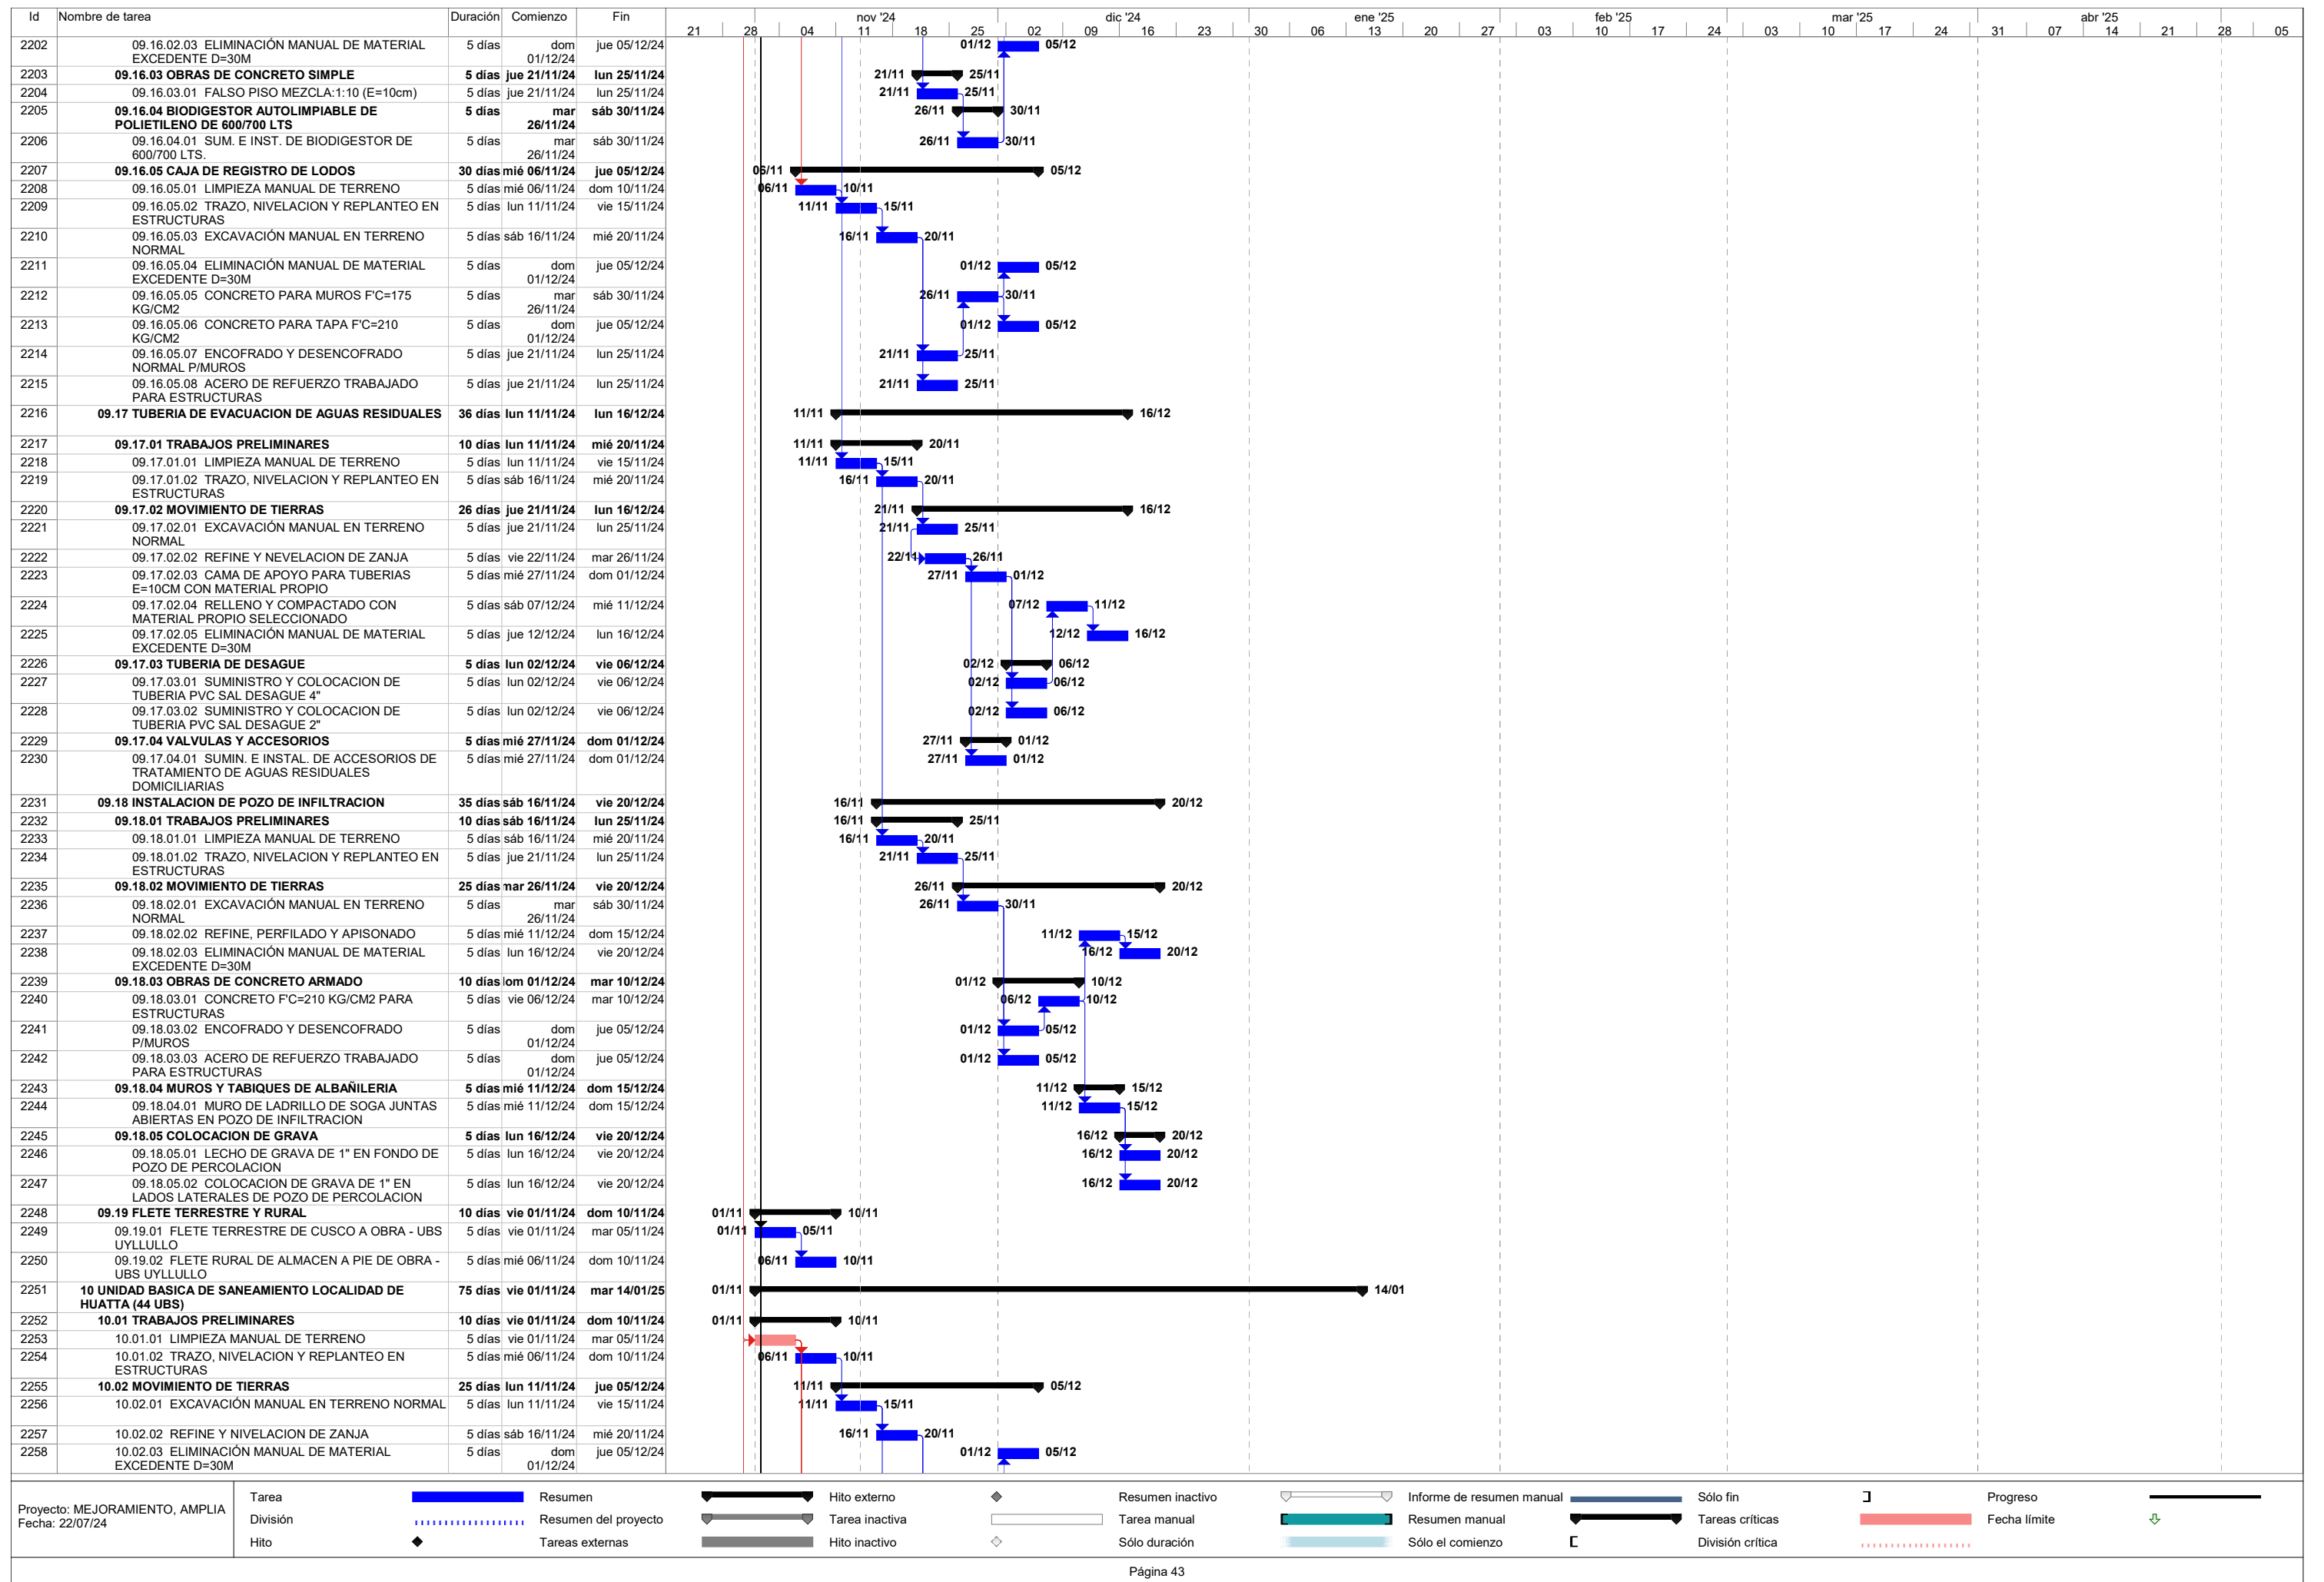

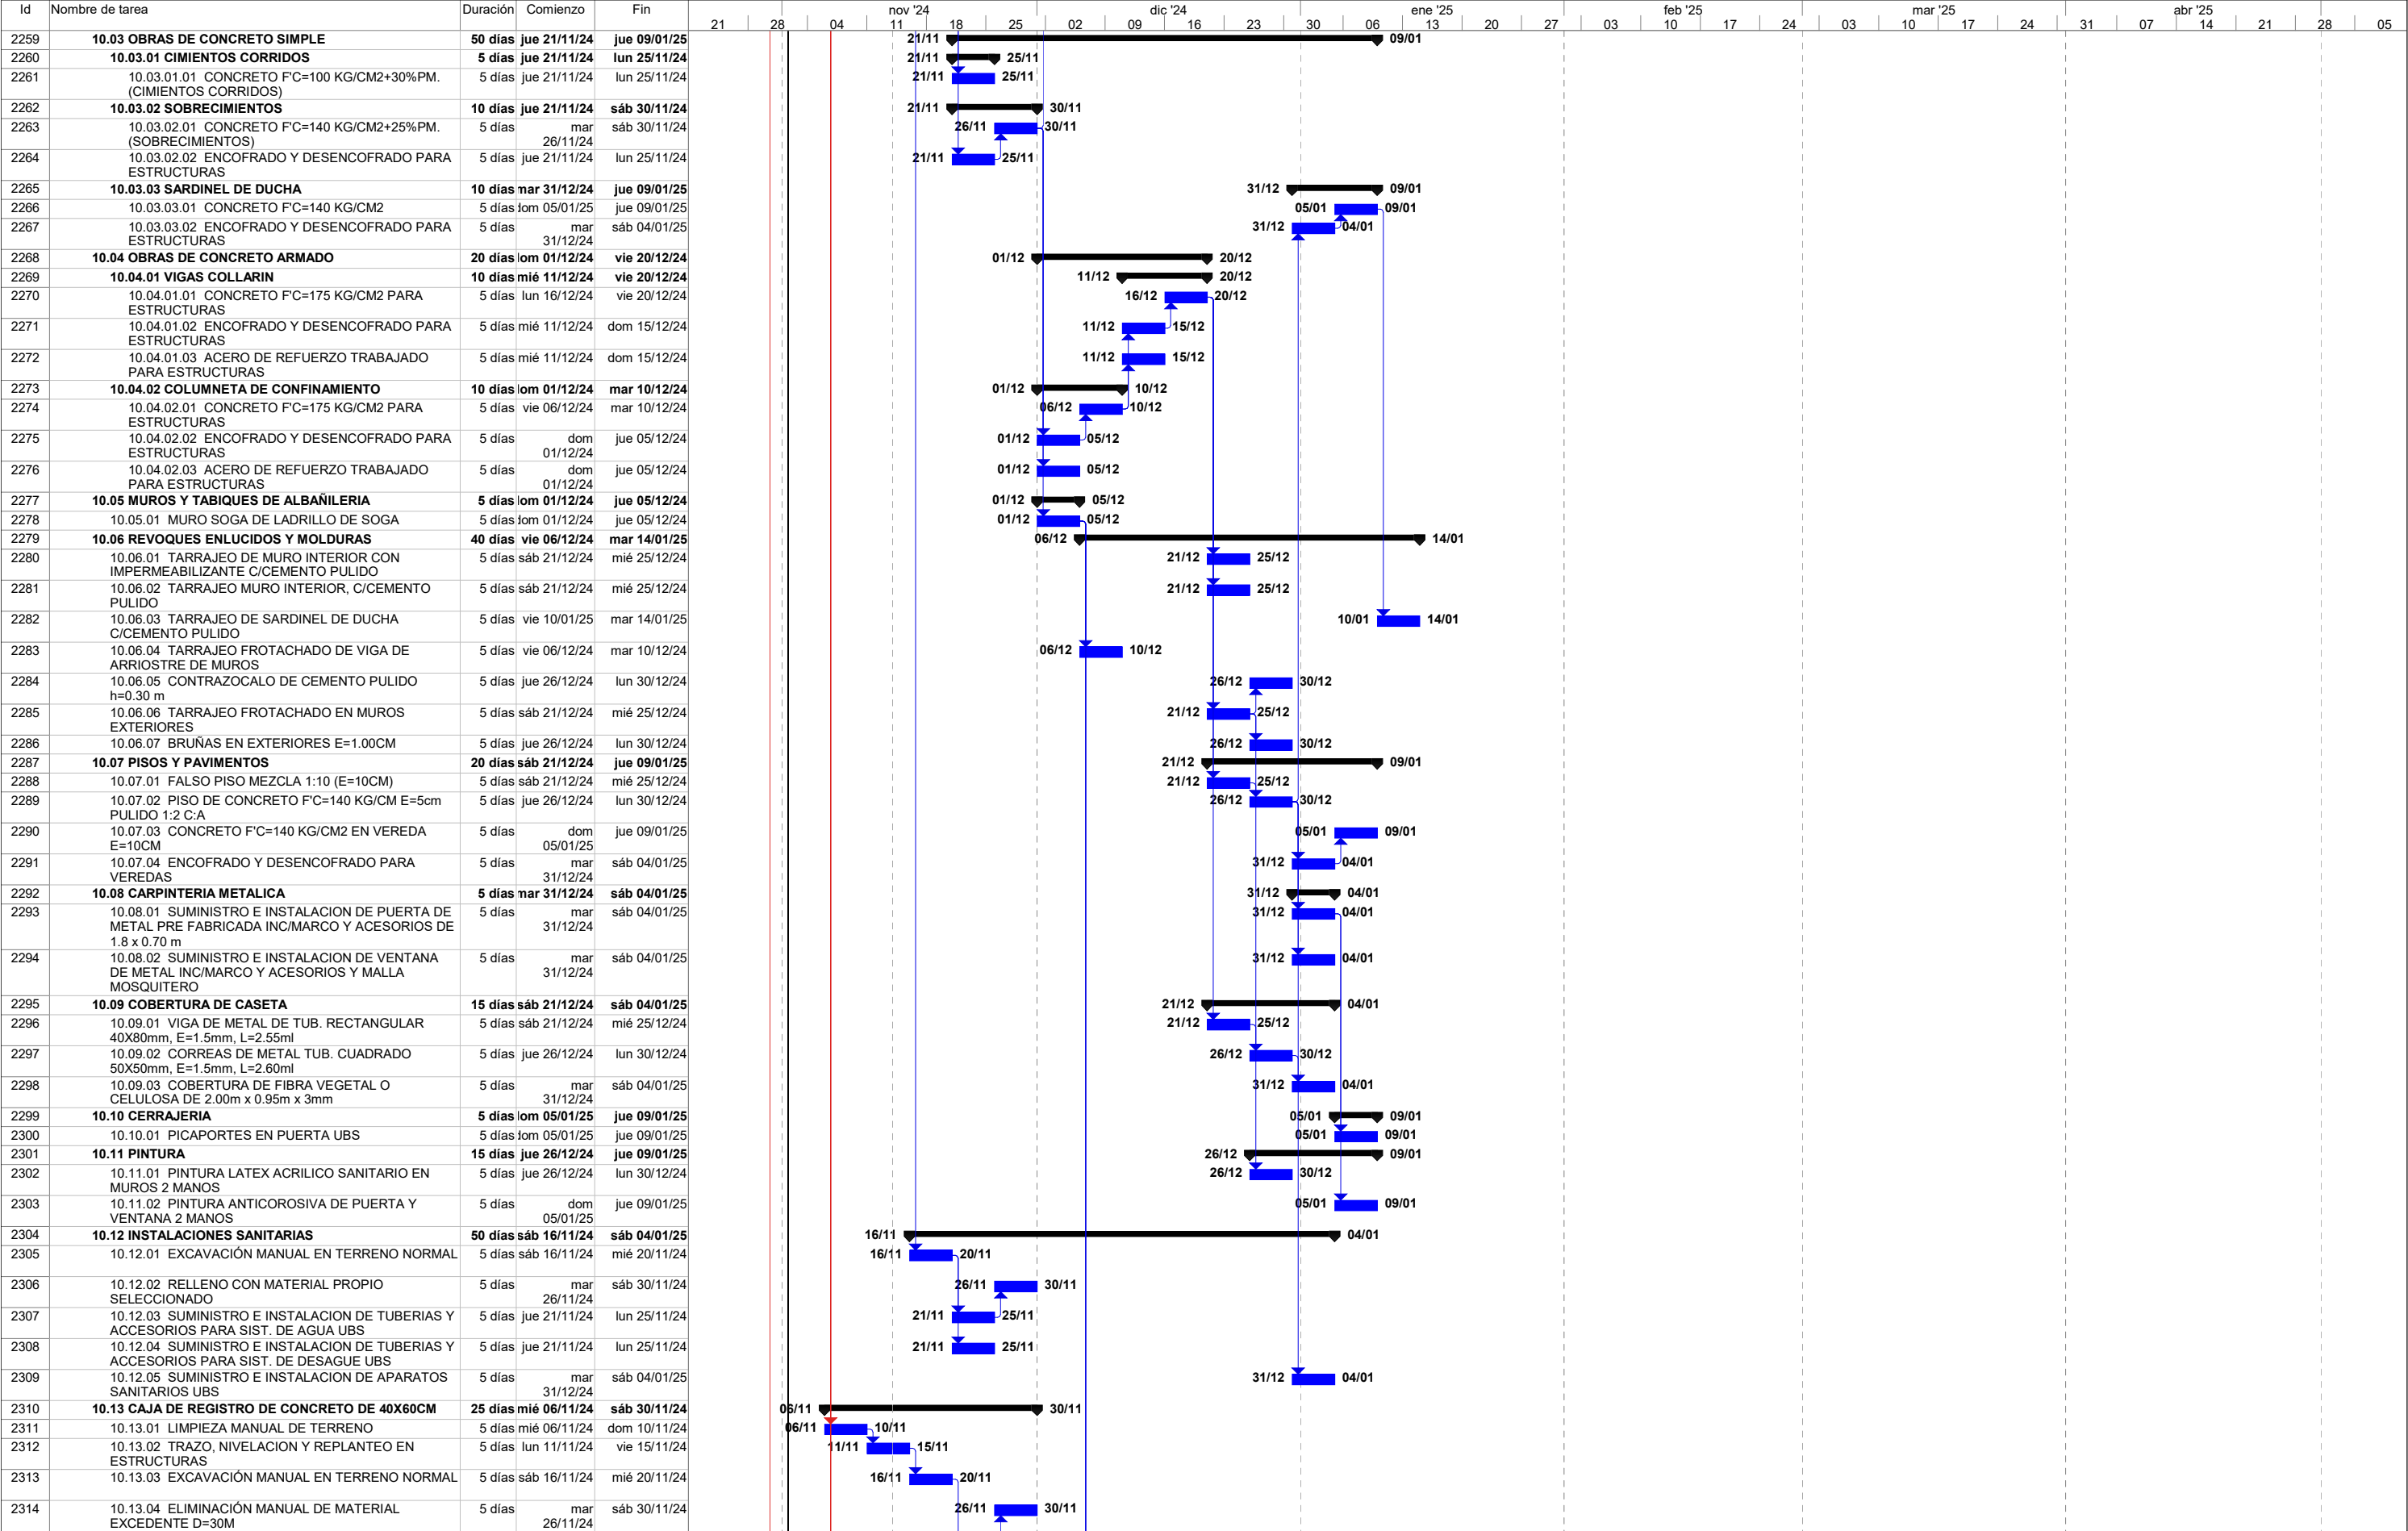

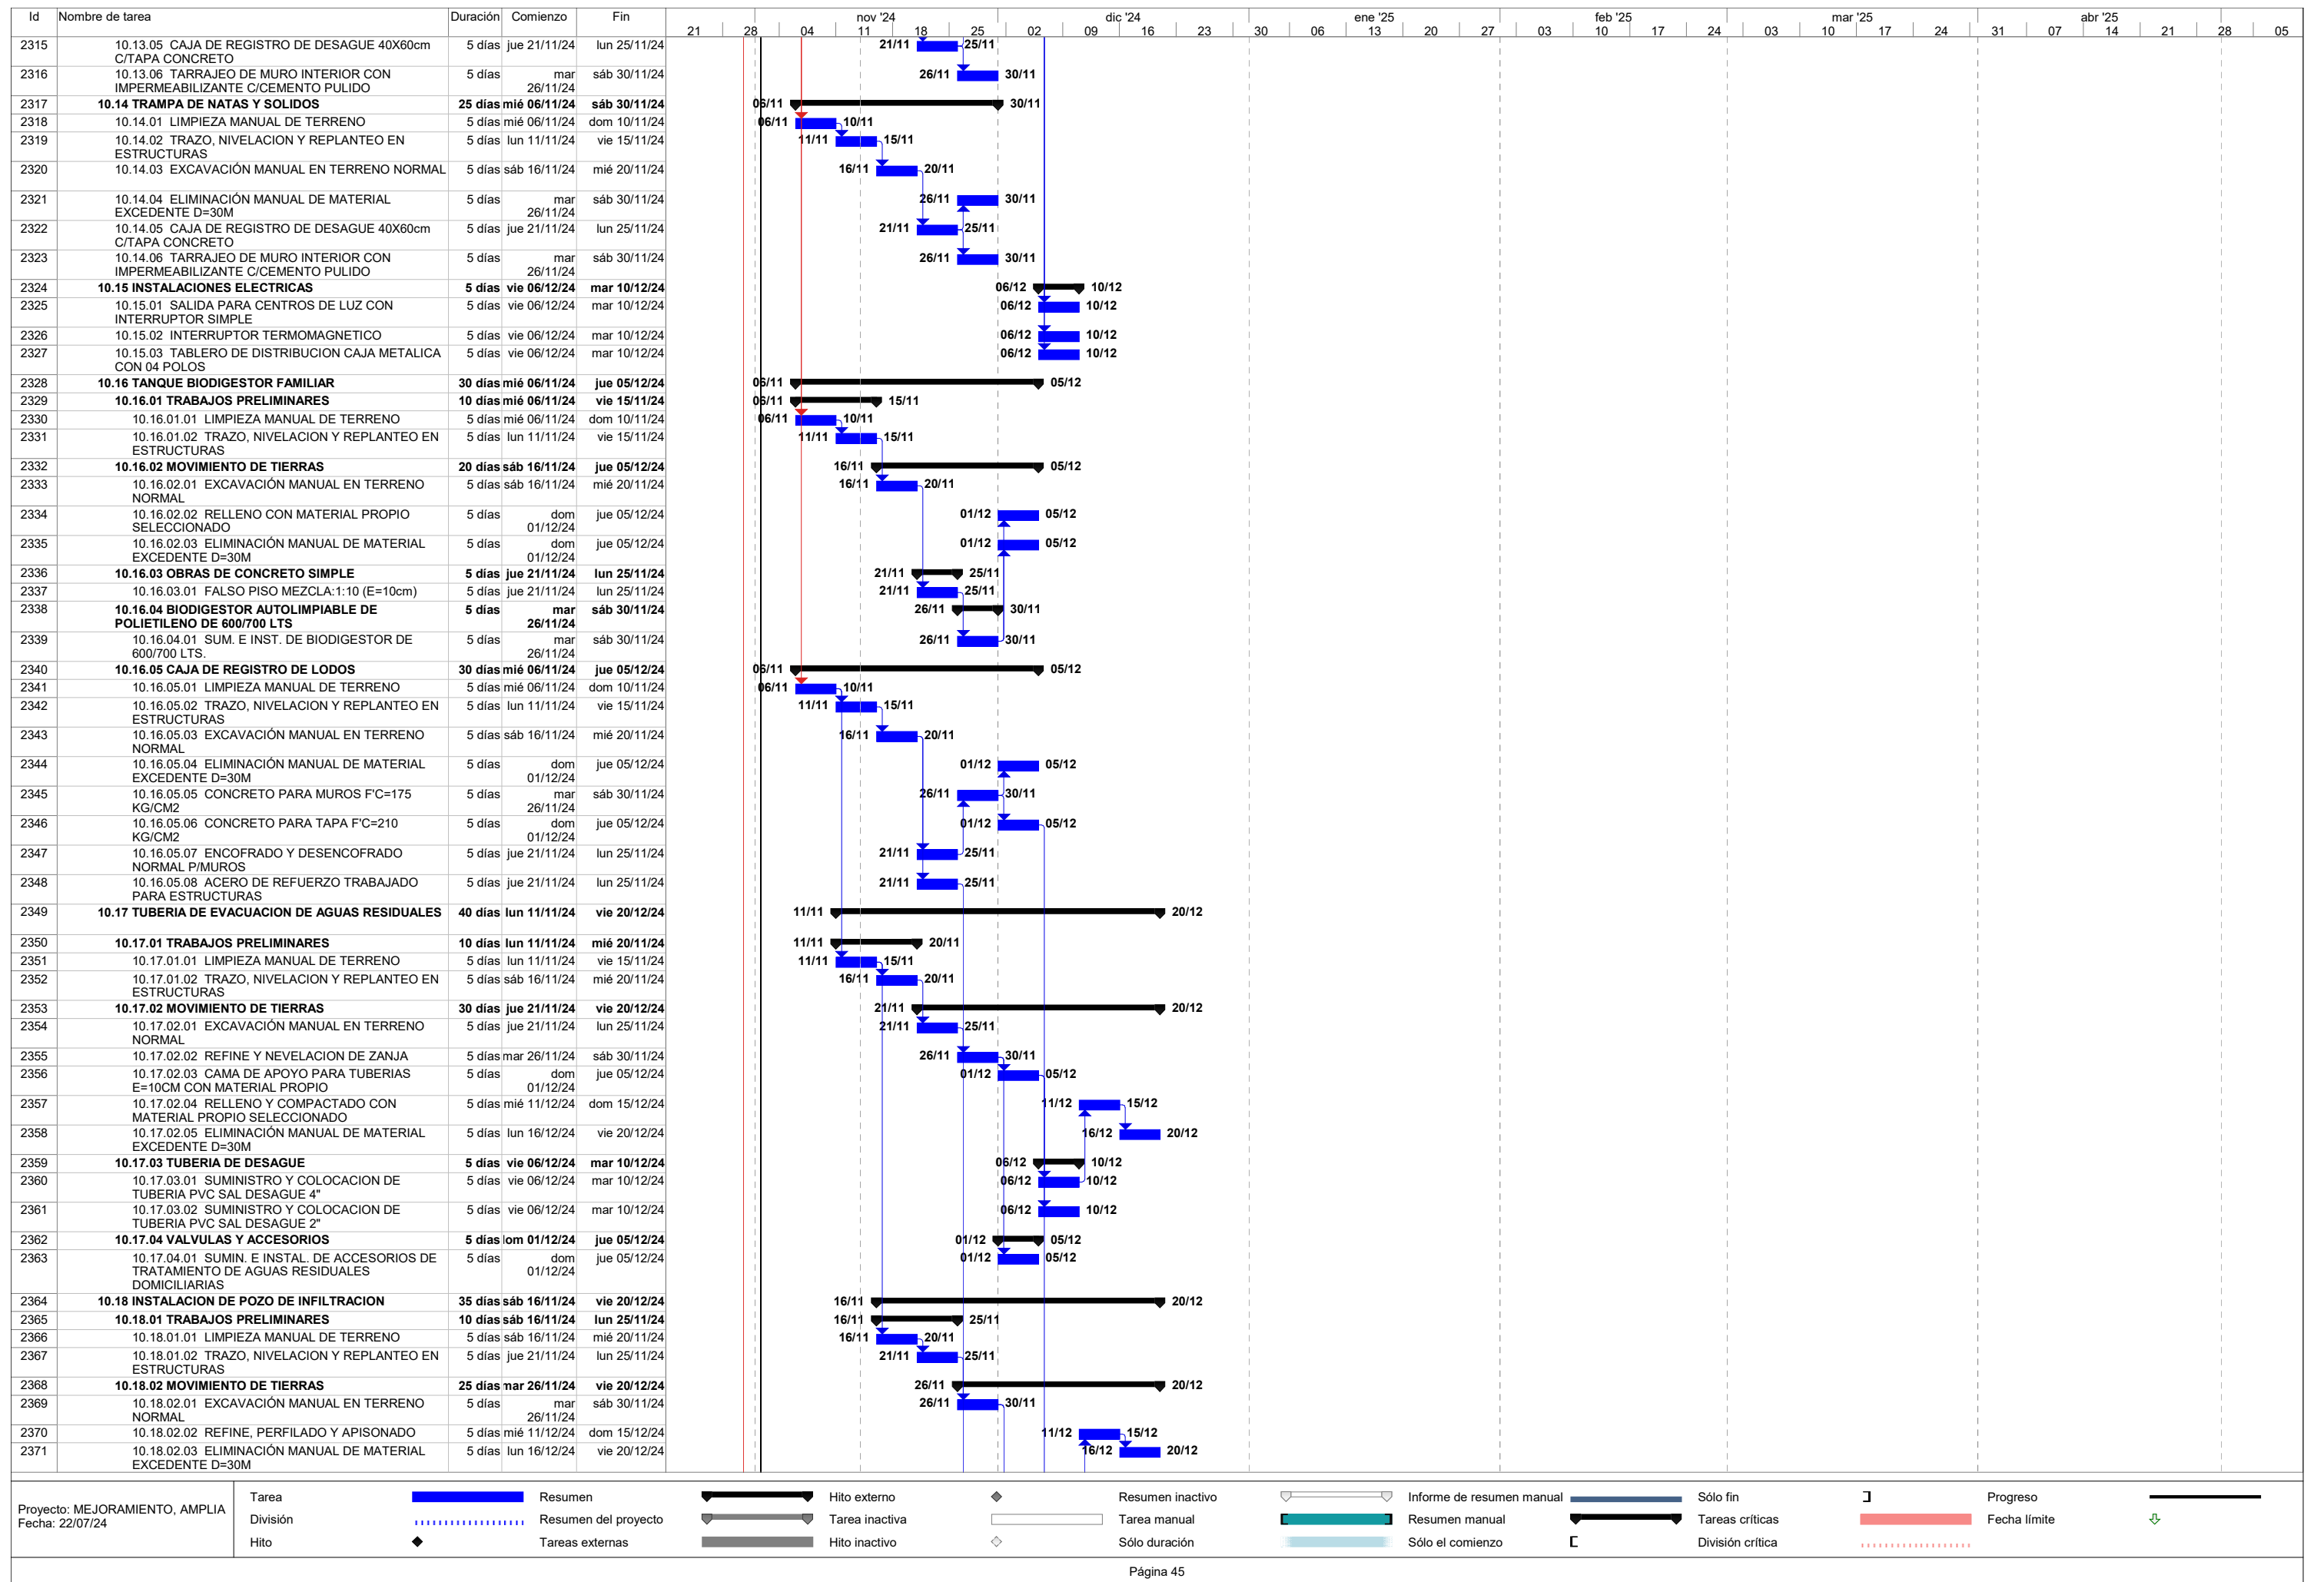

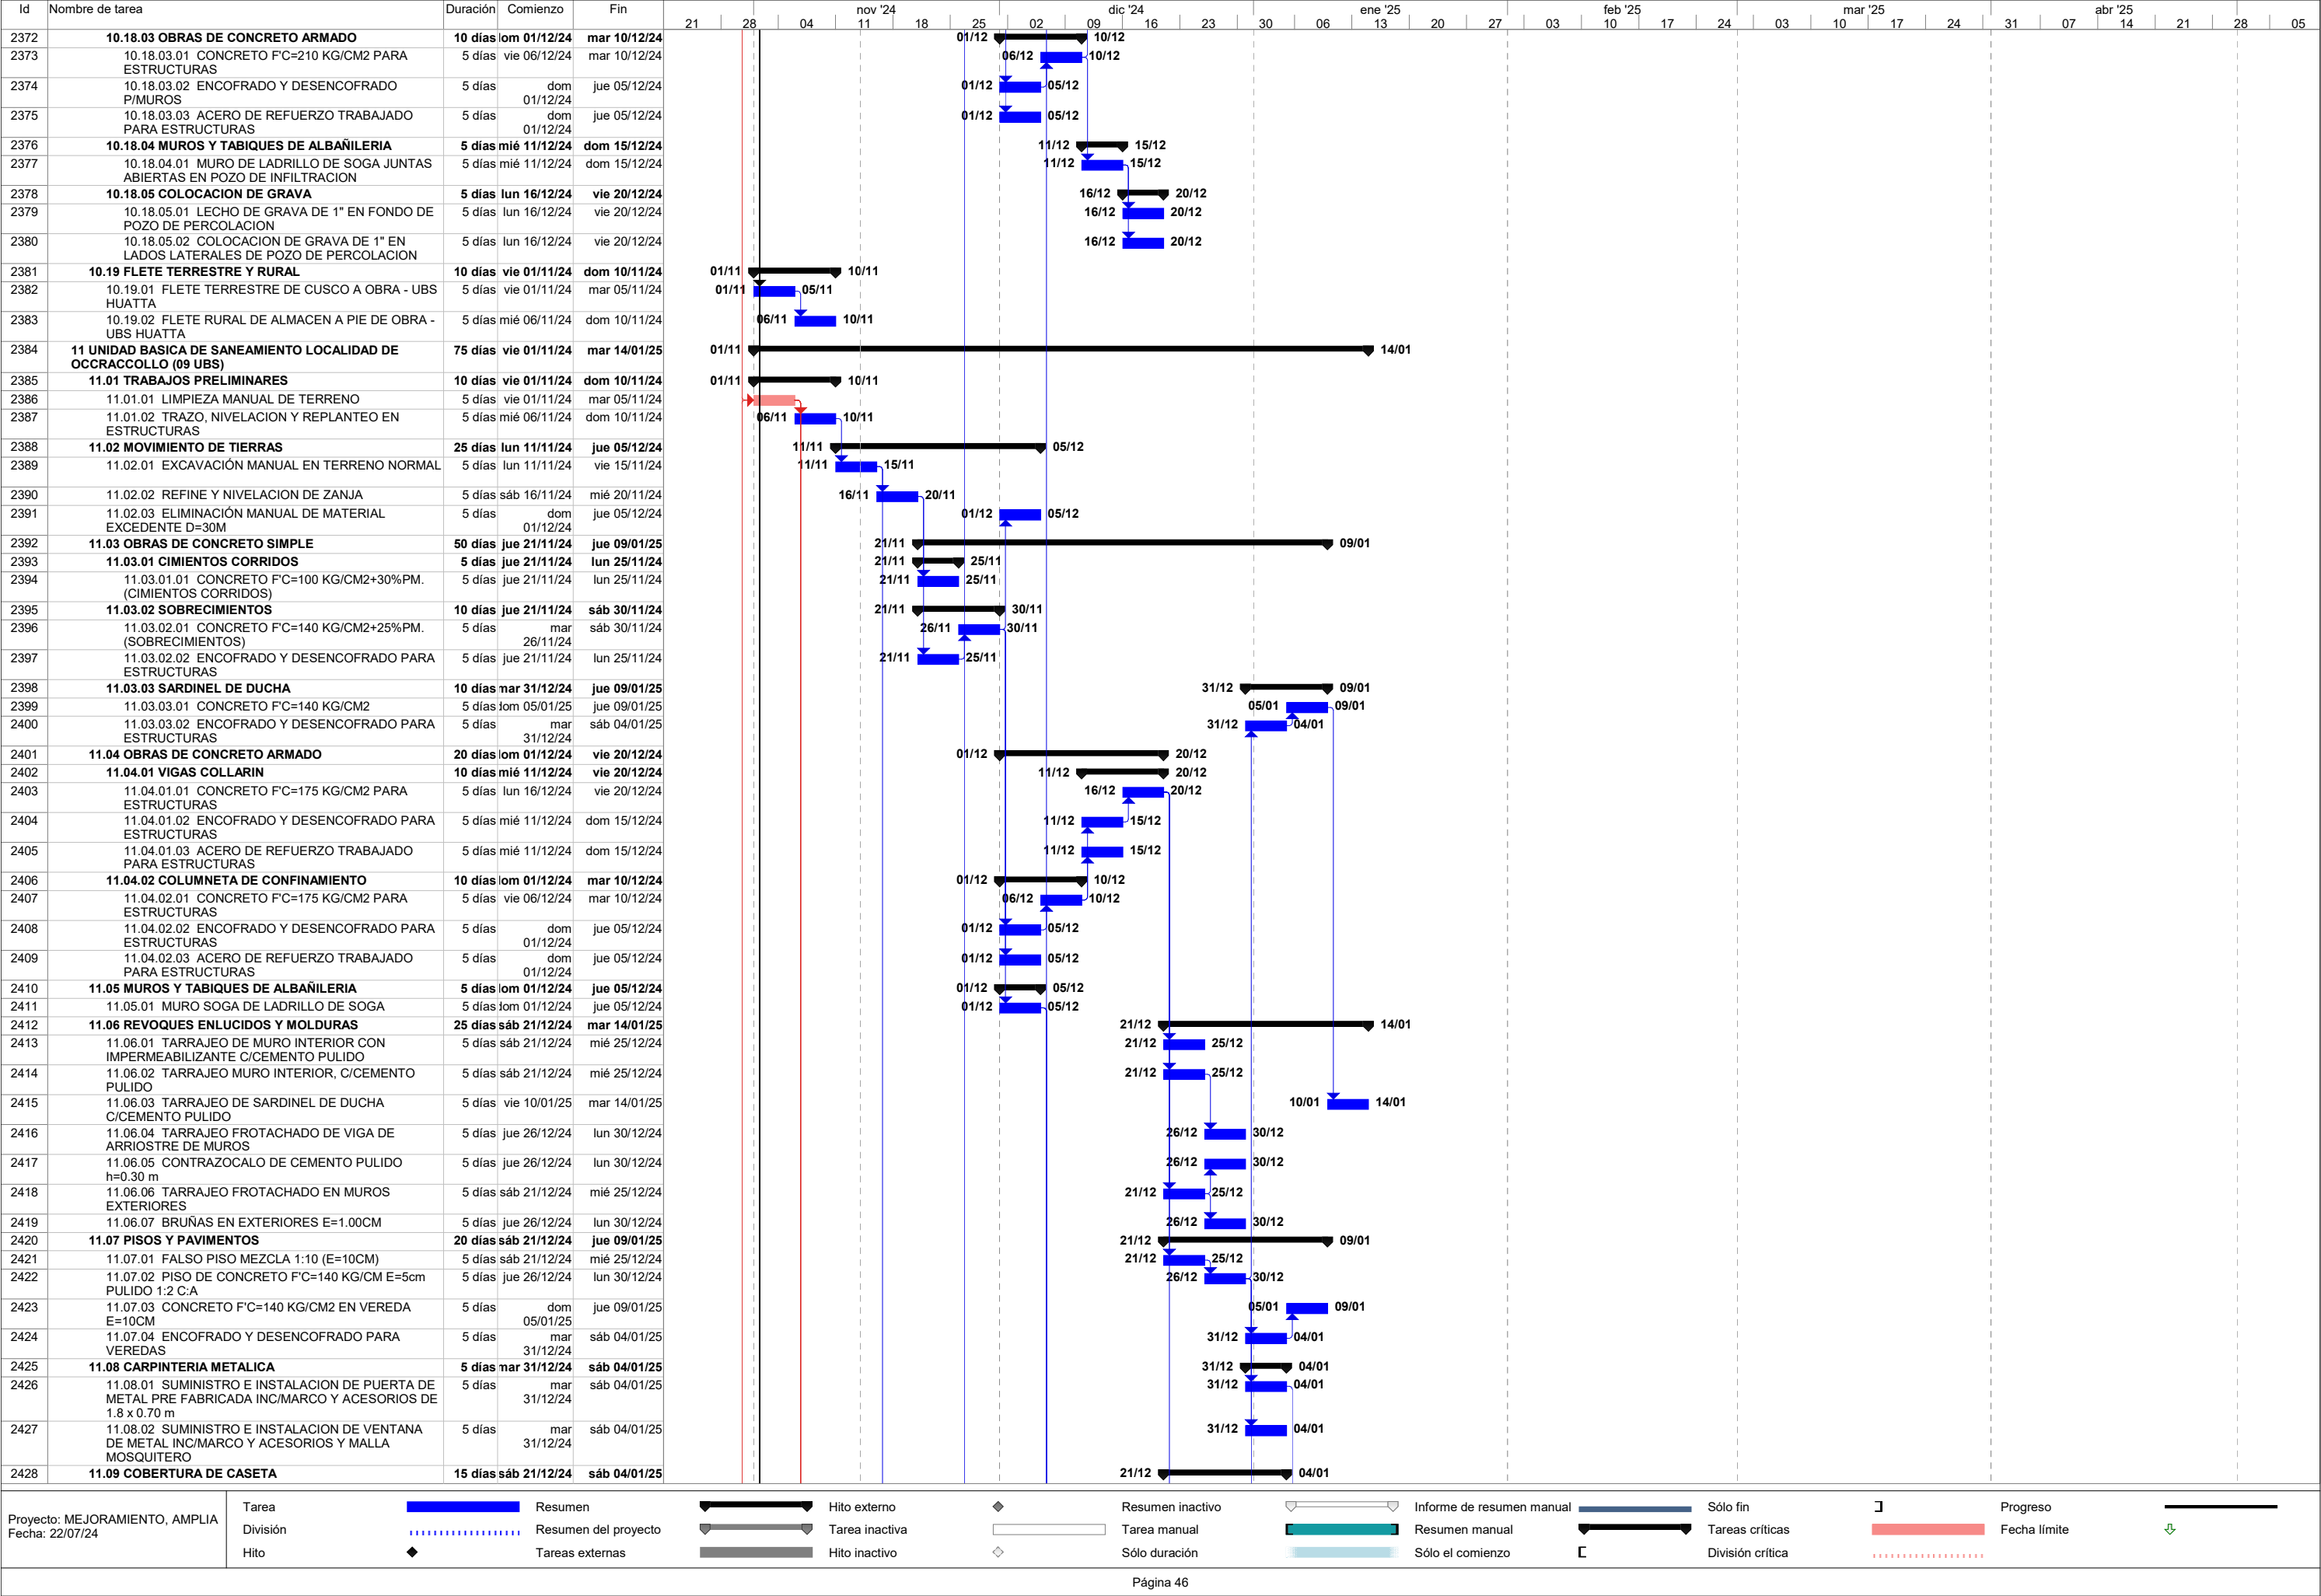

Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin
2429	11.09.01 VIGA DE METAL DE TUB. RECTANGULAR 40X80mm, E=1.5mm, L=2.55ml	5 días	sáb 21/12/24	mié 25/12/24
2430	11.09.02 CORREAS DE METAL TUB. CUADRADO 50X50mm, E=1.5mm, L=2.60ml	5 días	jue 26/12/24	lun 30/12/24
2431	11.09.03 COBERTURA DE FIBRA VEGETAL O CELULOSA DE 2.00m x 0.95m x 3mm	5 días	mar 31/12/24	sáb 04/01/25
2432	11.10 CERRAJERIA	5 días	dom 05/01/25	jue 09/01/25
2433	11.10.01 PICAPORTES EN PUERTA UBS	5 días	dom 05/01/25	jue 09/01/25
2434	11.11 PINTURA	15 días	jue 26/12/24	jue 09/01/25
2435	11.11.01 PINTURA LATEX ACRILICO SANITARIO EN MUROS 2 MANOS	5 días	jue 26/12/24	lun 30/12/24
2436	11.11.02 PINTURA ANTICOROSIVA DE PUERTA Y VENTANA 2 MANOS	5 días	dom 05/01/25	jue 09/01/25
2437	11.12 INSTALACIONES SANITARIAS	50 días	sáb 16/11/24	sáb 04/01/25
2438	11.12.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	5 días	sáb 16/11/24	mié 20/11/24
2439	11.12.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24
2440	11.12.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA SIST. DE AGUA UBS	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24
2441	11.12.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA SIST. DE DESAGUE UBS	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24
2442	11.12.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS UBS	5 días	mar 31/12/24	sáb 04/01/25
2443	11.13 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X60CM	40 días	mié 06/11/24	dom 15/12/24
2444	11.13.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	5 días	mié 06/11/24	dom 10/11/24
2445	11.13.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS	5 días	lun 11/11/24	vie 15/11/24
2446	11.13.03 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	5 días	sáb 16/11/24	mié 20/11/24
2447	11.13.04 ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24
2448	11.13.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 40X60cm C/TAPA CONCRETO	5 días	vie 06/12/24	mar 10/12/24
2449	11.13.06 TARRAJEO DE MURO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C/CEMENTO PULIDO	5 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24
2450	11.14 TRAMPA DE NATAS Y SOLIDOS	25 días	mié 06/11/24	sáb 30/11/24
2451	11.14.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	5 días	mié 06/11/24	dom 10/11/24
2452	11.14.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS	5 días	lun 11/11/24	vie 15/11/24
2453	11.14.03 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	5 días	sáb 16/11/24	mié 20/11/24
2454	11.14.04 ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24
2455	11.14.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 40X60cm C/TAPA CONCRETO	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24
2456	11.14.06 TARRAJEO DE MURO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C/CEMENTO PULIDO	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24
2457	11.15 INSTALACIONES ELECTRICAS	5 días	vie 06/12/24	mar 10/12/24
2458	11.15.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ CON INTERRUPTOR SIMPLE	5 días	vie 06/12/24	mar 10/12/24
2459	11.15.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	5 días	vie 06/12/24	mar 10/12/24
2460	11.15.03 TABLERO DE DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 04 POLOS	5 días	vie 06/12/24	mar 10/12/24
2461	11.16 TANQUE BIODIGESTOR FAMILIAR	30 días	mié 06/11/24	jue 05/12/24
2462	11.16.01 TRABAJOS PRELIMINARES	10 días	mié 06/11/24	vie 15/11/24
2463	11.16.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	5 días	mié 06/11/24	dom 10/11/24
2464	11.16.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS	5 días	lun 11/11/24	vie 15/11/24
2465	11.16.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS	20 días	sáb 16/11/24	jue 05/12/24
2466	11.16.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	5 días	sáb 16/11/24	mié 20/11/24
2467	11.16.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	5 días	dom 01/12/24	jue 05/12/24
2468	11.16.02.03 ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M	5 días	dom 01/12/24	jue 05/12/24
2469	11.16.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24
2470	11.16.03.01 FALSO PISO MEZCLA:1:10 (E=10cm)	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24
2471	11.16.04 BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE POLIETILENO DE 600/700 LTS	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24
2472	11.16.04.01 SUM. E INST. DE BIODIGESTOR DE 600/700 LTS.	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24
2473	11.16.05 CAJA DE REGISTRO DE LODOS	30 días	mié 06/11/24	jue 05/12/24
2474	11.16.05.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	5 días	mié 06/11/24	dom 10/11/24
2475	11.16.05.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS	5 días	lun 11/11/24	vie 15/11/24
2476	11.16.05.03 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	5 días	sáb 16/11/24	mié 20/11/24
2477	11.16.05.04 ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M	5 días	dom 01/12/24	jue 05/12/24
2478	11.16.05.05 CONCRETO PARA MUROS F'C=175 KG/CM2	5 días	mar 26/11/24	sáb 30/11/24
2479	11.16.05.06 CONCRETO PARA TAPA F'C=210 KG/CM2	5 días	dom 01/12/24	jue 05/12/24
2480	11.16.05.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/MUROS	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24
2481	11.16.05.08 ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCTURAS	5 días	jue 21/11/24	lun 25/11/24
2482	11.17 TUBERIA DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES	40 días	lun 11/11/24	vie 20/12/24
2483	11.17.01 TRABAJOS PRELIMINARES	10 días	lun 11/11/24	mié 20/11/24
2484	11.17.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	5 días	lun 11/11/24	vie 15/11/24

</

