





03 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALID.  
CT: 01/11/24 Laborables: 145 días TT: 25/03/25  
CTA: vie 01/11/24 Holgura: 0 días TTA: mié 30/04/25

02.10 FLETE TERRESTRE Y RURAL  
CT: 11/11/24 Laborables: 40 días TT: 20/12/24  
CTA: sáb 22/03/25 Holgura: 131 días TTA: mié 30/04/25

03.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES  
CT: 01/11/24 Laborables: 15 días TT: 15/11/24  
CTA: vie 01/11/24 Holgura: 0 días TTA: mié 30/04/25

03.02 CAPTACIÓN TIPO LADERA (01 UNO)  
CT: 01/11/24 Laborables: 55 días TT: 25/12/24  
CTA: vie 07/03/25 Holgura: 126 días TTA: mié 30/04/25

03.01.01 OBRAS PROVISIONALES  
CT: 01/11/24 Laborables: 10 días TT: 10/11/24  
CTA: vie 01/11/24 Holgura: 0 días TTA: vie 21/03/25

03.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES  
CT: 11/11/24 Laborables: 5 días TT: 15/11/24  
CTA: sáb 26/04/25 Holgura: 166 días TTA: mié 30/04/25

03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
CT: 01/11/24 Laborables: 15 días TT: 15/11/24  
CTA: vie 07/03/25 Holgura: 126 días TTA: vie 21/03/25

03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
CT: 16/11/24 Laborables: 40 días TT: 25/12/24  
CTA: sáb 22/03/25 Holgura: 126 días TTA: mié 30/04/25

03.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
CT: 26/11/24 Laborables: 25 días TT: 20/12/24  
CTA: mar 01/04/25 Holgura: 126 días TTA: mié 30/04/25

03.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
CT: 01/12/24 Laborables: 10 días TT: 10/12/24  
CTA: dom 05/04/25 Holgura: 126 días TTA: mié 30/04/25

03.02.05 REVOCOS Y REVESTIMIENTOS  
CT: 11/12/24 Laborables: 5 días TT: 15/12/24  
CTA: mié 16/04/25 Holgura: 126 días TTA: mié 30/04/25

03.02.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA  
CT: 11/12/24 Laborables: 5 días TT: 15/12/24  
CTA: sáb 26/04/25 Holgura: 136 días TTA: mié 30/04/25

03.02.07 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA  
CT: 11/12/24 Laborables: 5 días TT: 15/12/24  
CTA: sáb 26/04/25 Holgura: 136 días TTA: mié 30/04/25

03.02.08 PINTURA  
CT: 16/12/24 Laborables: 5 días TT: 20/12/24  
CTA: lun 21/04/25 Holgura: 126 días TTA: mié 30/04/25

02.09.01.05 CAJAS DE PASO C/TAPA  
CT: 09/02/25 Laborables: 20 días TT: 28/03/25  
CTA: vie 11/04/25 Holgura: 61 días TTA: mié 30/04/25

02.09.01.06 PILETAS DOMICILIARIAS  
CT: 01/03/25 Laborables: 20 días TT: 20/03/25  
CTA: vie 11/04/25 Holgura: 41 días TTA: mié 30/04/25

02.09.01.07 PRUEBA HIDRAULICA  
CT: 01/03/25 Laborables: 5 días TT: 05/03/25  
CTA: sáb 26/04/25 Holgura: 56 días TTA: mié 30/04/25

02.09.02 CONEXIONES PUBLICAS PARA AGUA (01 CONEXIONES)  
CT: 04/02/25 Laborables: 35 días TT: 10/03/25  
CTA: jue 27/03/25 Holgura: 51 días TTA: mié 30/04/25

02.09.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
CT: 04/02/25 Laborables: 5 días TT: 08/02/25  
CTA: jue 27/03/25 Holgura: 51 días TTA: lun 31/03/25

02.09.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
CT: 09/02/25 Laborables: 30 días TT: 30/03/25  
CTA: mar 01/04/25 Holgura: 51 días TTA: mié 30/04/25

02.09.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERIAS  
CT: 24/02/25 Laborables: 5 días TT: 28/02/25  
CTA: mié 16/04/25 Holgura: 51 días TTA: dom 20/04/25

02.09.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS  
CT: 24/02/25 Laborables: 5 días TT: 28/02/25  
CTA: sáb 26/04/25 Holgura: 61 días TTA: mié 30/04/25

02.09.02.05 CAJAS DE PASO C/TAPA  
CT: 09/02/25 Laborables: 20 días TT: 28/02/25  
CTA: vie 11/04/25 Holgura: 61 días TTA: mié 30/04/25

02.09.02.06 PRUEBA HIDRAULICA  
CT: 01/03/25 Laborables: 5 días TT: 05/03/25  
CTA: sáb 26/04/25 Holgura: 56 días TTA: mié 30/04/25

03.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60m  
CT: 01/11/24 Laborables: 5 días TT: 05/11/24  
CTA: vie 01/11/24 Holgura: 0 días TTA: mar 05/11/24

03.01.01.02 ALMACÉN Y GUARDIANIA  
CT: 06/11/24 Laborables: 5 días TT: 10/11/24  
CTA: lun 17/03/25 Holgura: 131 días TTA: vie 21/03/25

03.01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS  
CT: 11/11/24 Laborables: 5 días TT: 15/11/24  
CTA: sáb 26/04/25 Holgura: 166 días TTA: mié 30/04/25

03.02.01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTUR  
CT: 11/11/24 Laborables: 5 días TT: 15/11/24  
CTA: lun 17/03/25 Holgura: 126 días TTA: vie 21/03/25

03.02.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL  
CT: 16/11/24 Laborables: 5 días TT: 20/11/24  
CTA: sáb 22/03/25 Holgura: 126 días TTA: mié 26/03/25

03.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANIA  
CT: 21/11/24 Laborables: 5 días TT: 25/11/24  
CTA: jue 27/03/25 Holgura: 126 días TTA: lun 31/03/25

03.02.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO DE ES  
CT: 26/11/24 Laborables: 5 días TT: 30/11/24  
CTA: mar 01/04/25 Holgura: 126 días TTA: sáb 05/04/25

02.10.01 FLETE TERRESTRE DE CUSCO A OBRA - AGUA POTABL  
CT: 11/11/24 Laborables: 20 días TT: 30/11/24  
CTA: sáb 22/03/25 Holgura: 131 días TTA: jue 10/04/25

02.10.02 FLETE RURAL DE ALMACEN A PIE DE OBRA - AGUA PC  
CT: 01/12/24 Laborables: 20 días TT: 20/12/24  
CTA: vie 11/04/25 Holgura: 131 días TTA: mié 30/04/25


02.09.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO PARA  
CT: 04/02/25 Laborables: 5 días TT: 08/02/25  
CTA: jue 27/03/25 Holgura: 51 días TTA: lun 31/03/25

02.09.02.02.01 EXCAV. MANUAL DE ZANIA EN T-NORMAL P/71  
CT: 09/02/25 Laborables: 5 días TT: 13/02/25  
CTA: mar 01/04/25 Holgura: 51 días TTA: sáb 05/04/25

02.09.02.05.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL  
CT: 09/02/25 Laborables: 5 días TT: 13/02/25  
CTA: vie 11/04/25 Holgura: 61 días TTA: mar 15/04/25

02.09.01.05.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL  
CT: 09/02/25 Laborables: 5 días TT: 13/02/25  
CTA: vie 11/04/25 Holgura: 61 días TTA: mar 15/04/25





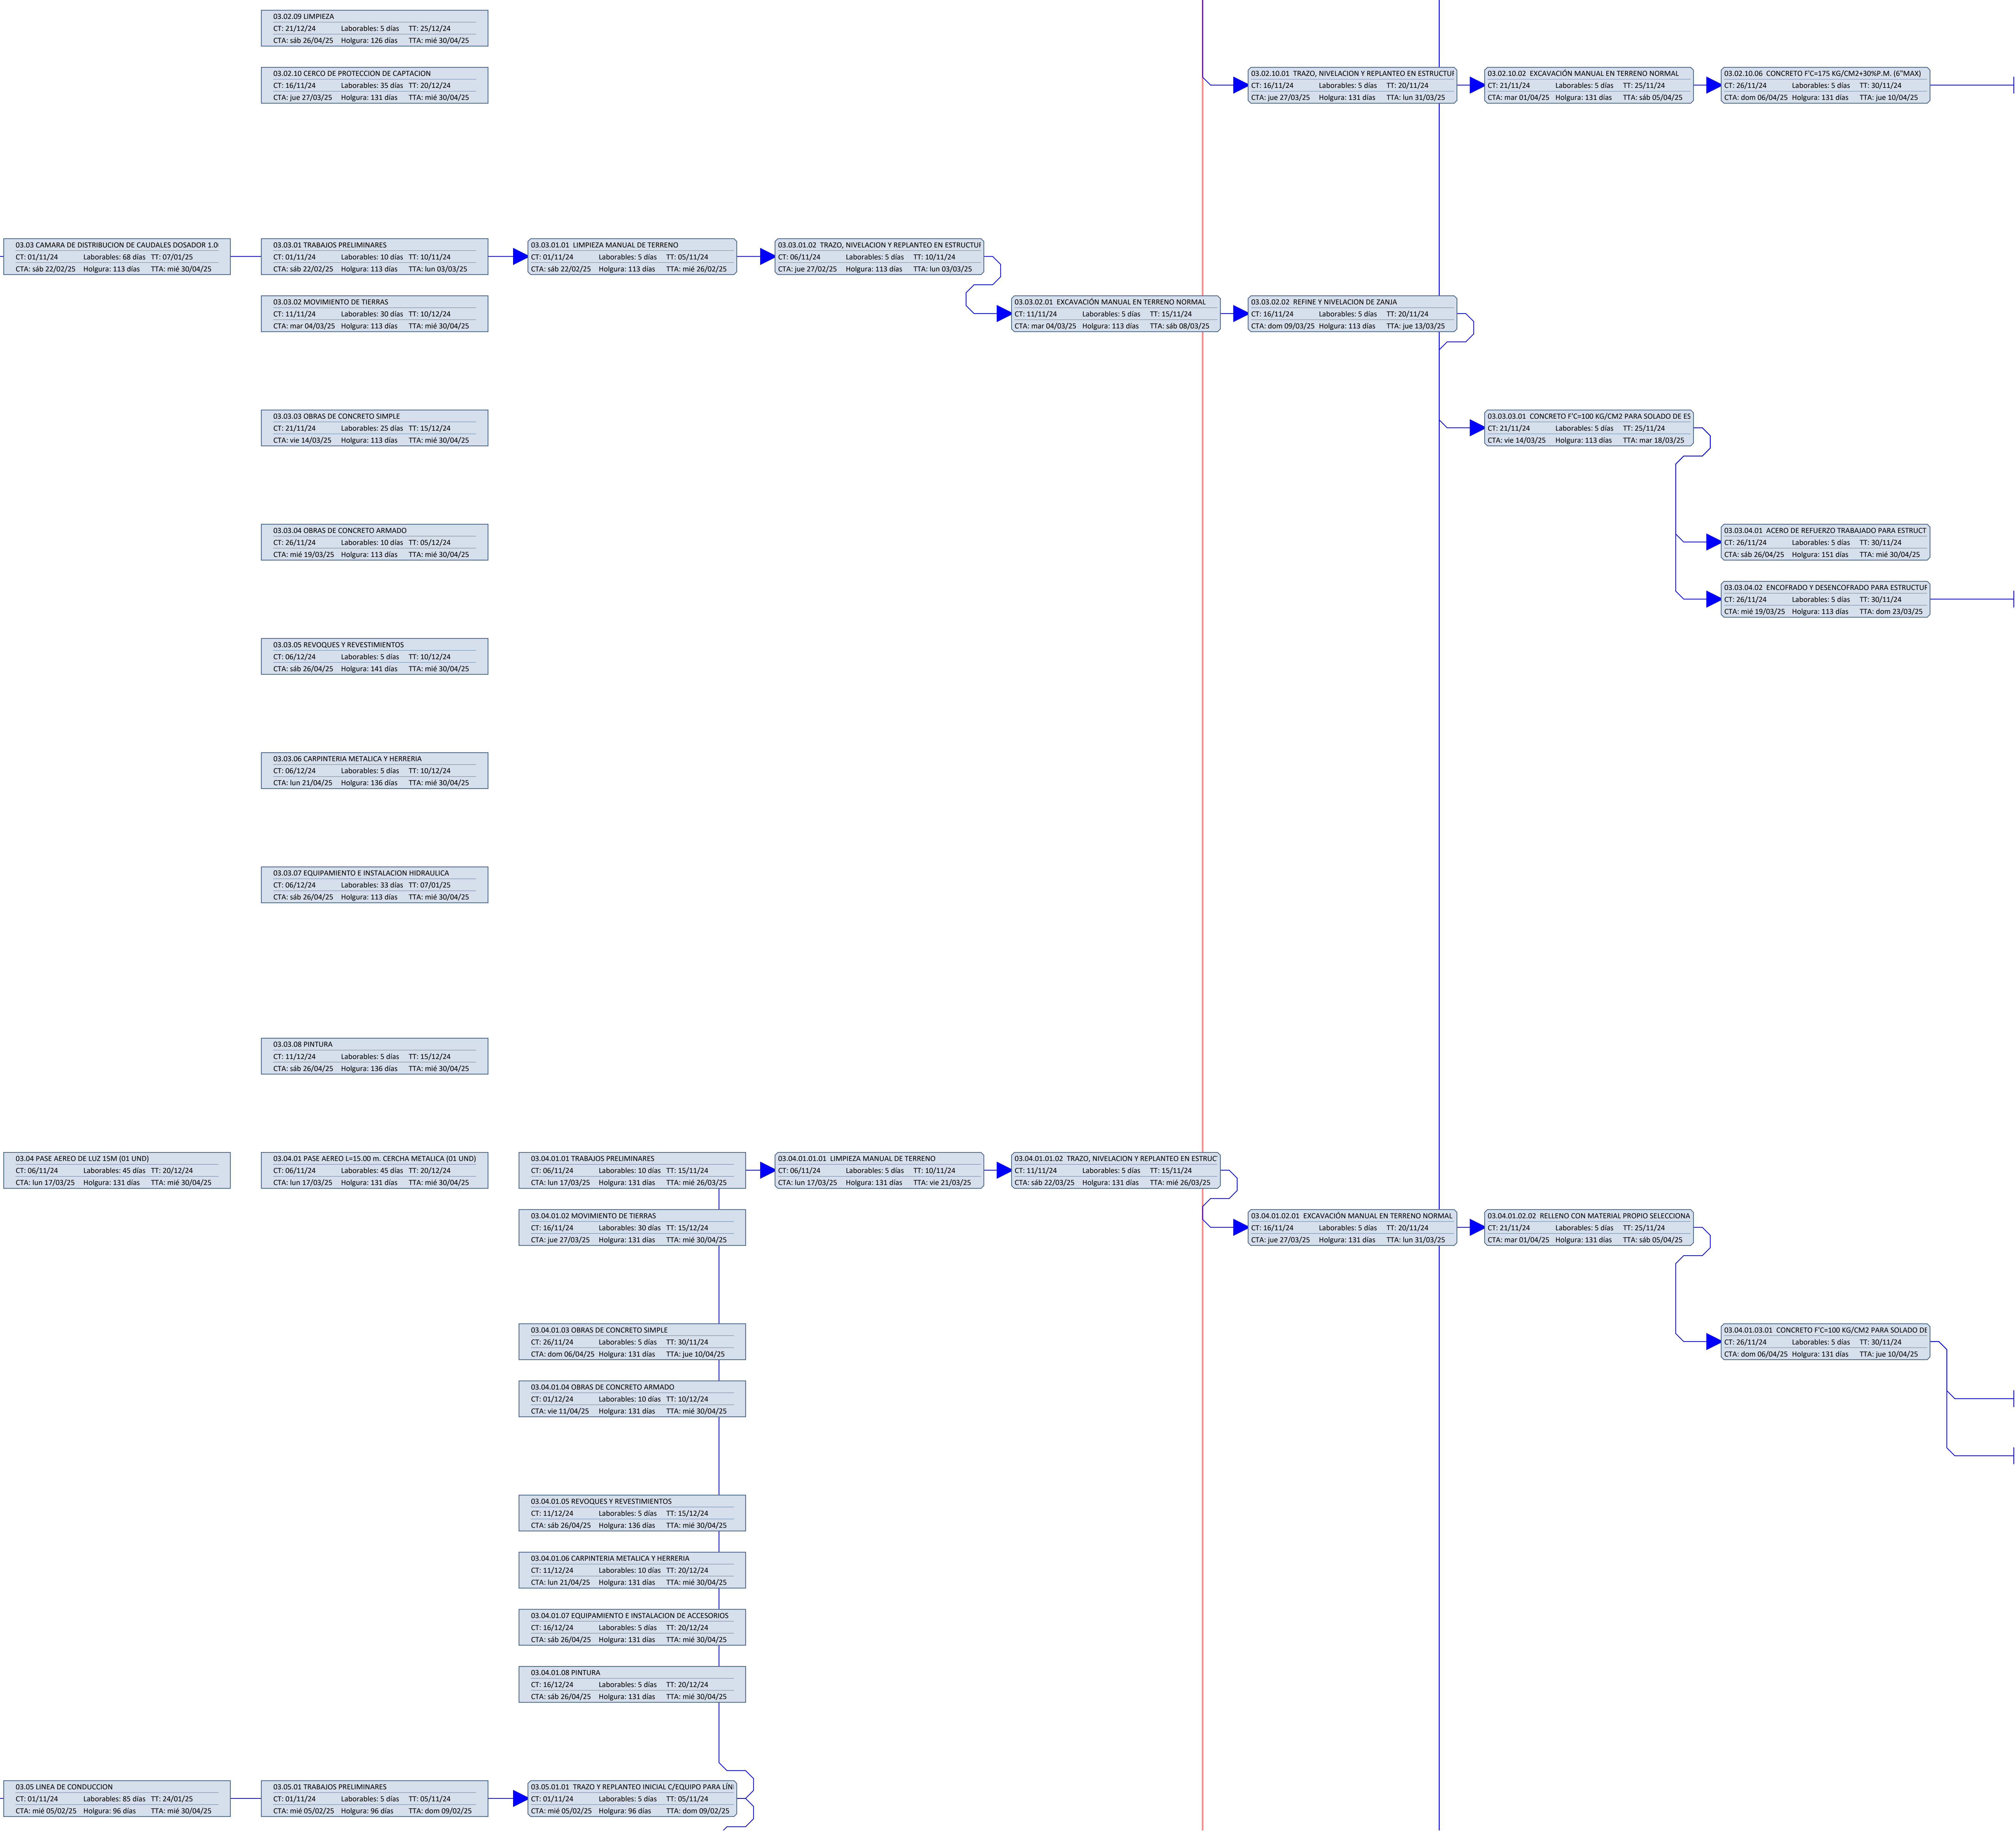







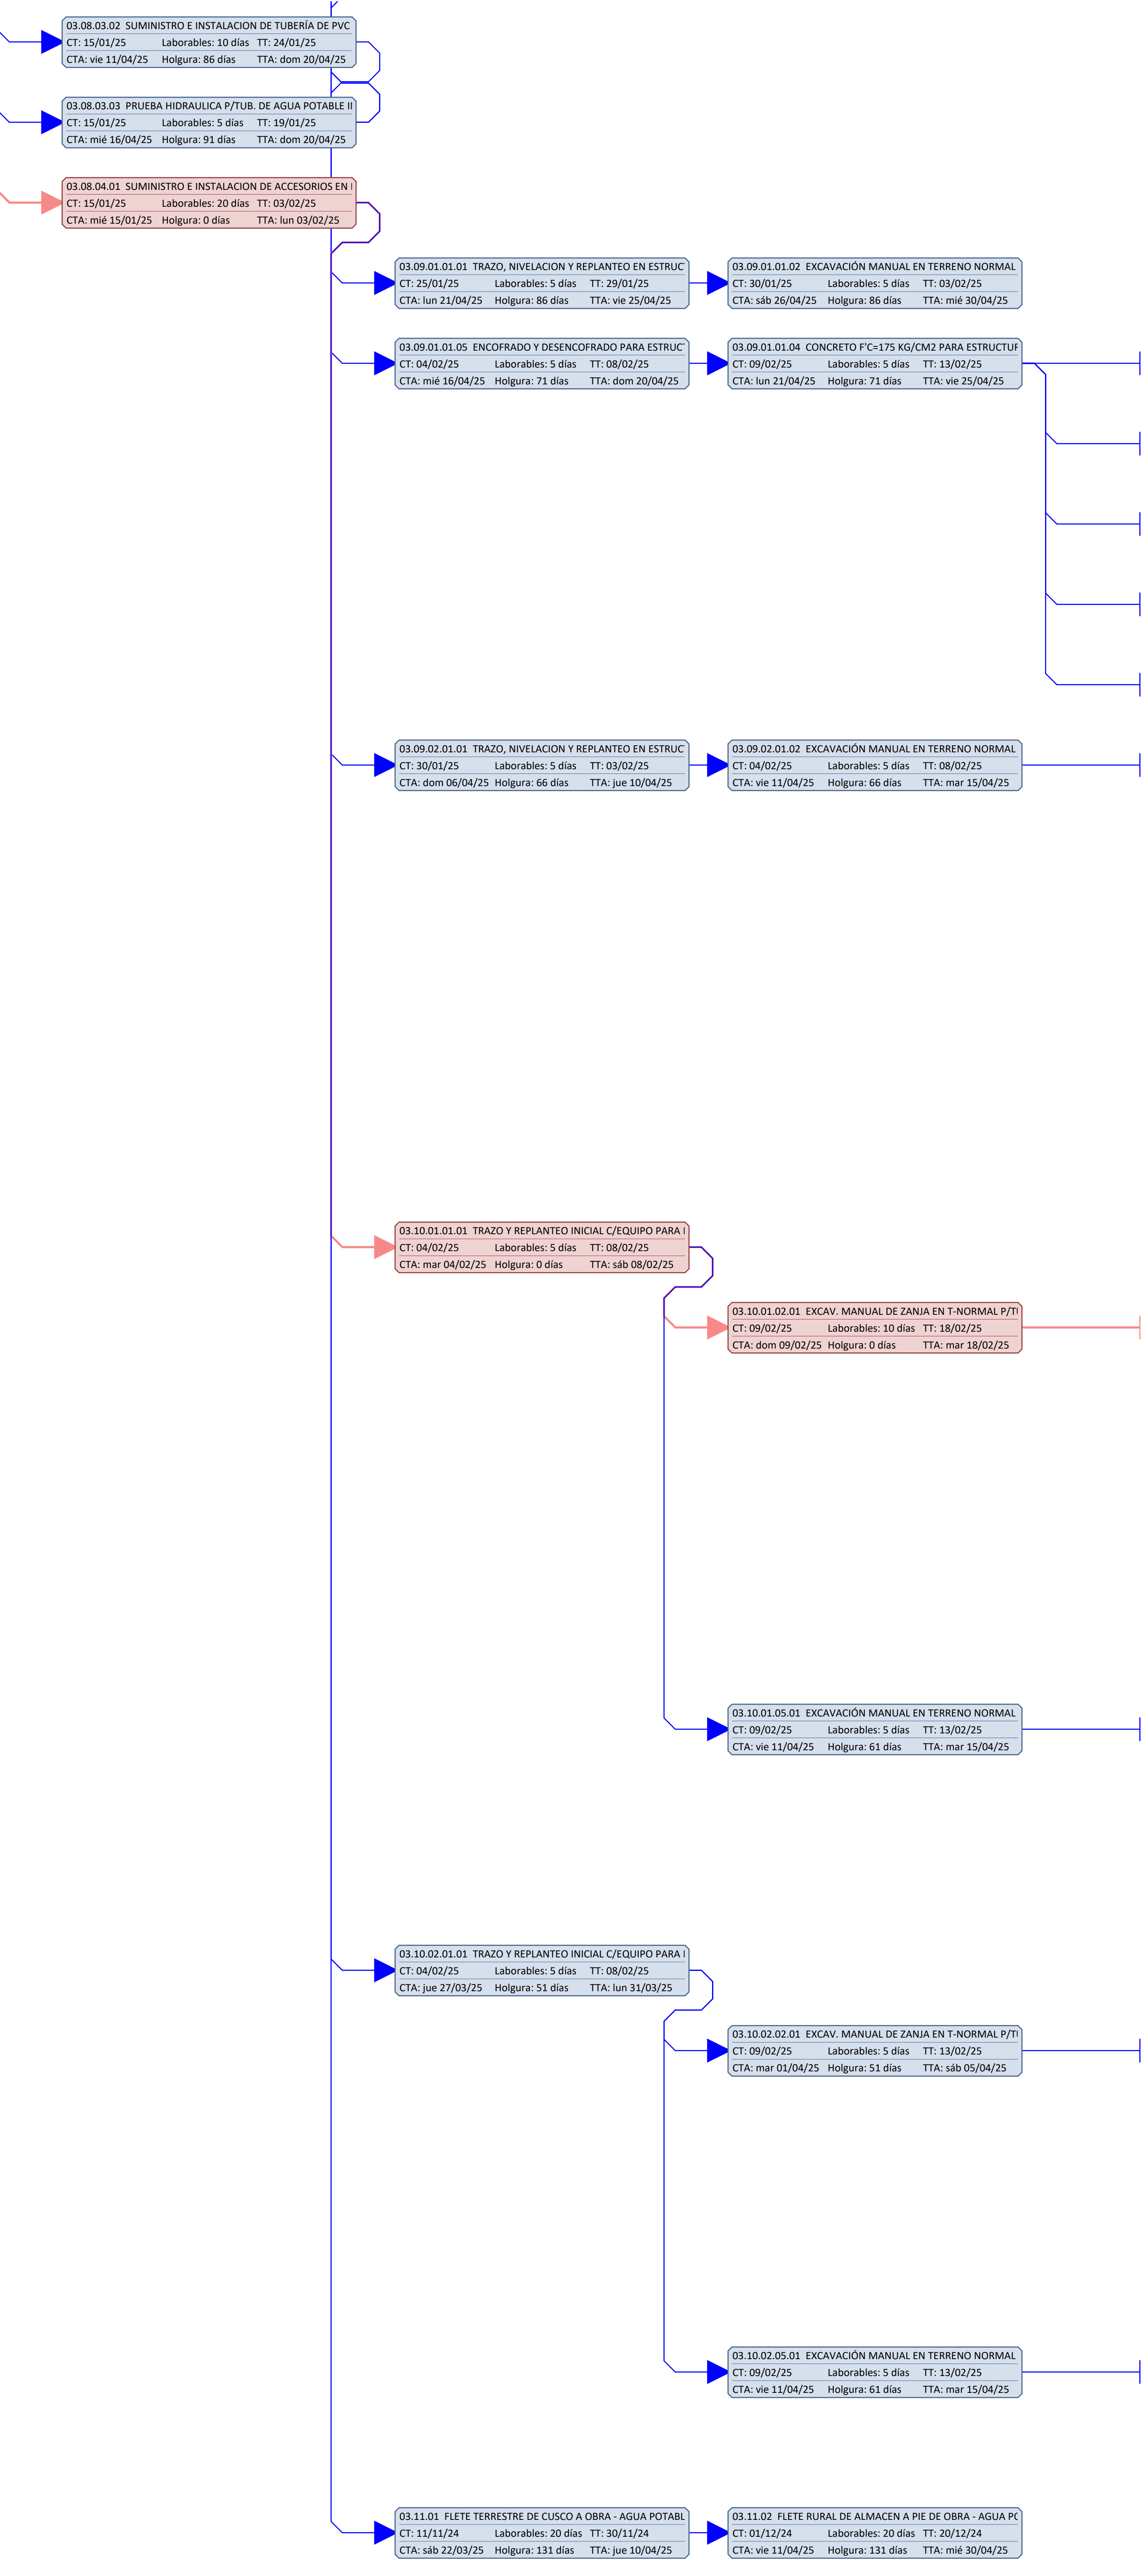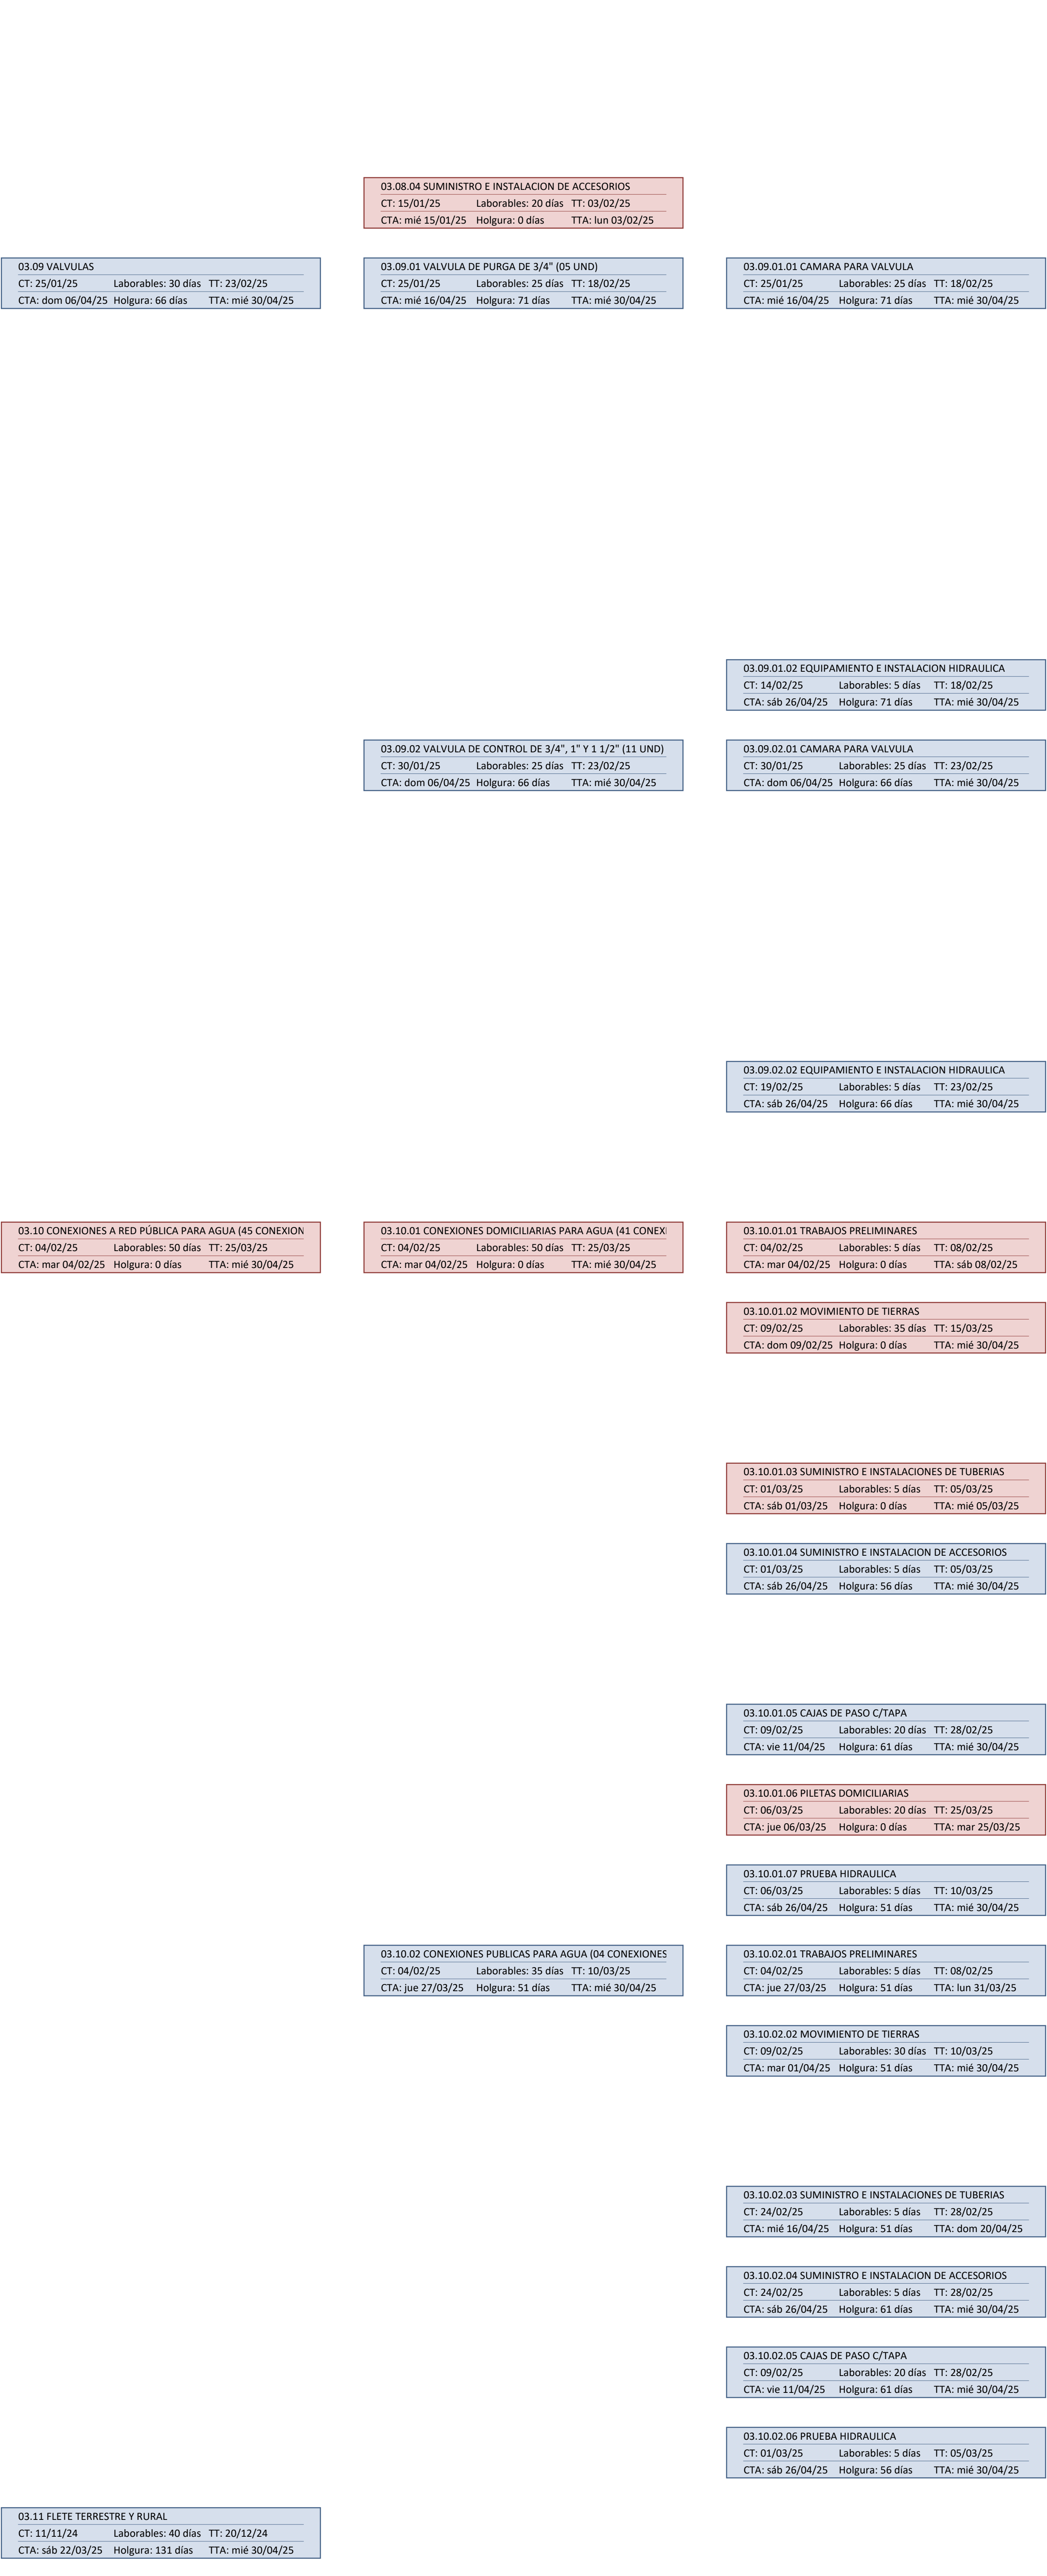

04 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALID.
CT: 01/11/24      Laborables: 136 días TT: 16/03/25
CTA: vie 01/11/24      Holgura: 0 días      TTA: mié 30/04/25

04.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES
CT: 01/11/24      Laborables: 15 días TT: 15/11/24
CTA: vie 01/11/24      Holgura: 0 días      TTA: mié 30/04/25

04.01.01 OBRAS PROVISIONALES
CT: 01/11/24      Laborables: 10 días TT: 10/11/24
CTA: vie 01/11/24      Holgura: 0 días      TTA: mar 11/03/25

04.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
CT: 11/11/24      Laborables: 5 días TT: 15/11/24
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 166 días      TTA: mié 30/04/25

04.02 CAPTACIÓN TIPO LADERA (01 UND)
CT: 01/11/24      Laborables: 55 días TT: 25/12/24
CTA: vie 07/03/25      Holgura: 126 días      TTA: mié 30/04/25

04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
CT: 01/11/24      Laborables: 15 días TT: 15/11/24
CTA: vie 07/03/25      Holgura: 126 días      TTA: vie 21/03/25

04.02.01.01 DEMOLUCION DE OBRAS DE CAPTACIÓN EXISTENT
CT: 01/11/24      Laborables: 5 días TT: 05/11/24
CTA: vie 07/03/25      Holgura: 126 días      TTA: mar 11/03/25

04.02.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
CT: 06/11/24      Laborables: 5 días TT: 10/11/24
CTA: mié 12/03/25      Holgura: 126 días      TTA: dom 16/03/25

04.02.01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTUR
CT: 11/11/24      Laborables: 5 días TT: 15/11/24
CTA: lun 17/03/25      Holgura: 126 días      TTA: vie 21/03/25

04.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60M
CT: 01/11/24      Laborables: 5 días TT: 05/11/24
CTA: vie 01/11/24      Holgura: 0 días      TTA: mar 06/11/24

04.01.01.02 ALMACEN Y GUARDIANIA.
CT: 06/11/24      Laborables: 5 días TT: 10/11/24
CTA: vie 07/03/25      Holgura: 121 días      TTA: mar 11/03/25

04.01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
CT: 11/11/24      Laborables: 5 días TT: 15/11/24
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 166 días      TTA: mié 30/04/25

04.02.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL
CT: 16/11/24      Laborables: 5 días TT: 20/11/24
CTA: sáb 22/03/25      Holgura: 126 días      TTA: mié 26/03/25

04.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA
CT: 21/11/24      Laborables: 5 días TT: 25/11/24
CTA: jue 27/03/25      Holgura: 126 días      TTA: lun 31/03/25

04.02.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO DE ES
CT: 26/11/24      Laborables: 5 días TT: 30/11/24
CTA: mar 01/04/25      Holgura: 126 días      TTA: sáb 05/04/25

04.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CT: 26/11/24      Laborables: 25 días TT: 20/12/24
CTA: mar 01/04/25      Holgura: 126 días      TTA: mié 30/04/25

04.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CT: 01/12/24      Laborables: 10 días TT: 10/12/24
CTA: dom 06/04/25      Holgura: 126 días      TTA: mié 30/04/25

04.02.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
CT: 11/12/24      Laborables: 5 días TT: 15/12/24
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 136 días      TTA: mié 30/04/25

04.02.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
CT: 11/12/24      Laborables: 5 días TT: 15/12/24
CTA: mié 16/04/25      Holgura: 126 días      TTA: mié 30/04/25

04.02.07 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA
CT: 11/12/24      Laborables: 5 días TT: 15/12/24
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 136 días      TTA: mié 30/04/25

04.02.08 PINTURA
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días TT: 20/12/24
CTA: lun 21/04/25      Holgura: 126 días      TTA: mié 30/04/25

04.02.09 LIMPIEZA
CT: 21/12/24      Laborables: 5 días TT: 25/12/24
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 126 días      TTA: mié 30/04/25

04.02.10 CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION
CT: 16/11/24      Laborables: 35 días TT: 20/12/24
CTA: jue 27/03/25      Holgura: 131 días      TTA: mié 30/04/25

04.02.10.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTUR
CT: 16/11/24      Laborables: 5 días TT: 20/11/24
CTA: jue 27/03/25      Holgura: 131 días      TTA: lun 31/03/25

04.02.10.02 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL
CT: 21/11/24      Laborables: 5 días TT: 25/11/24
CTA: mar 01/04/25      Holgura: 131 días      TTA: sáb 05/04/25

04.02.10.06 CONCRETO F'C=175 KG/CM2+30%P.M. (6"MAX)
CT: 26/11/24      Laborables: 5 días TT: 30/11/24
CTA: dom 06/04/25      Holgura: 131 días      TTA: jue 10/04/25

04.03 CAMARA ROMPE PRESIÓN (02 UND)
CT: 11/11/24      Laborables: 45 días TT: 25/12/24
CTA: mié 12/03/25      Holgura: 121 días      TTA: mié 30/04/25

04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
CT: 11/11/24      Laborables: 10 días TT: 20/11/24
CTA: mié 12/03/25      Holgura: 121 días      TTA: vie 21/03/25


04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CT: 21/11/24      Laborables: 30 días TT: 20/12/24
CTA: jue 27/03/25      Holgura: 126 días      TTA: mié 30/04/25

04.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CT: 01/12/24      Laborables: 25 días TT: 25/12/24
CTA: dom 06/04/25      Holgura: 126 días      TTA: mié 30/04/25

04.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CT: 06/12/24      Laborables: 10 días TT: 15/12/24
CTA: vie 11/04/25      Holgura: 126 días      TTA: mié 30/04/25


04.03.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días TT: 20/12/24
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 131 días      TTA: mié 30/04/25

04.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
CT: 11/11/24      Laborables: 5 días TT: 15/11/24
CTA: mié 12/03/25      Holgura: 121 días      TTA: dom 16/03/25

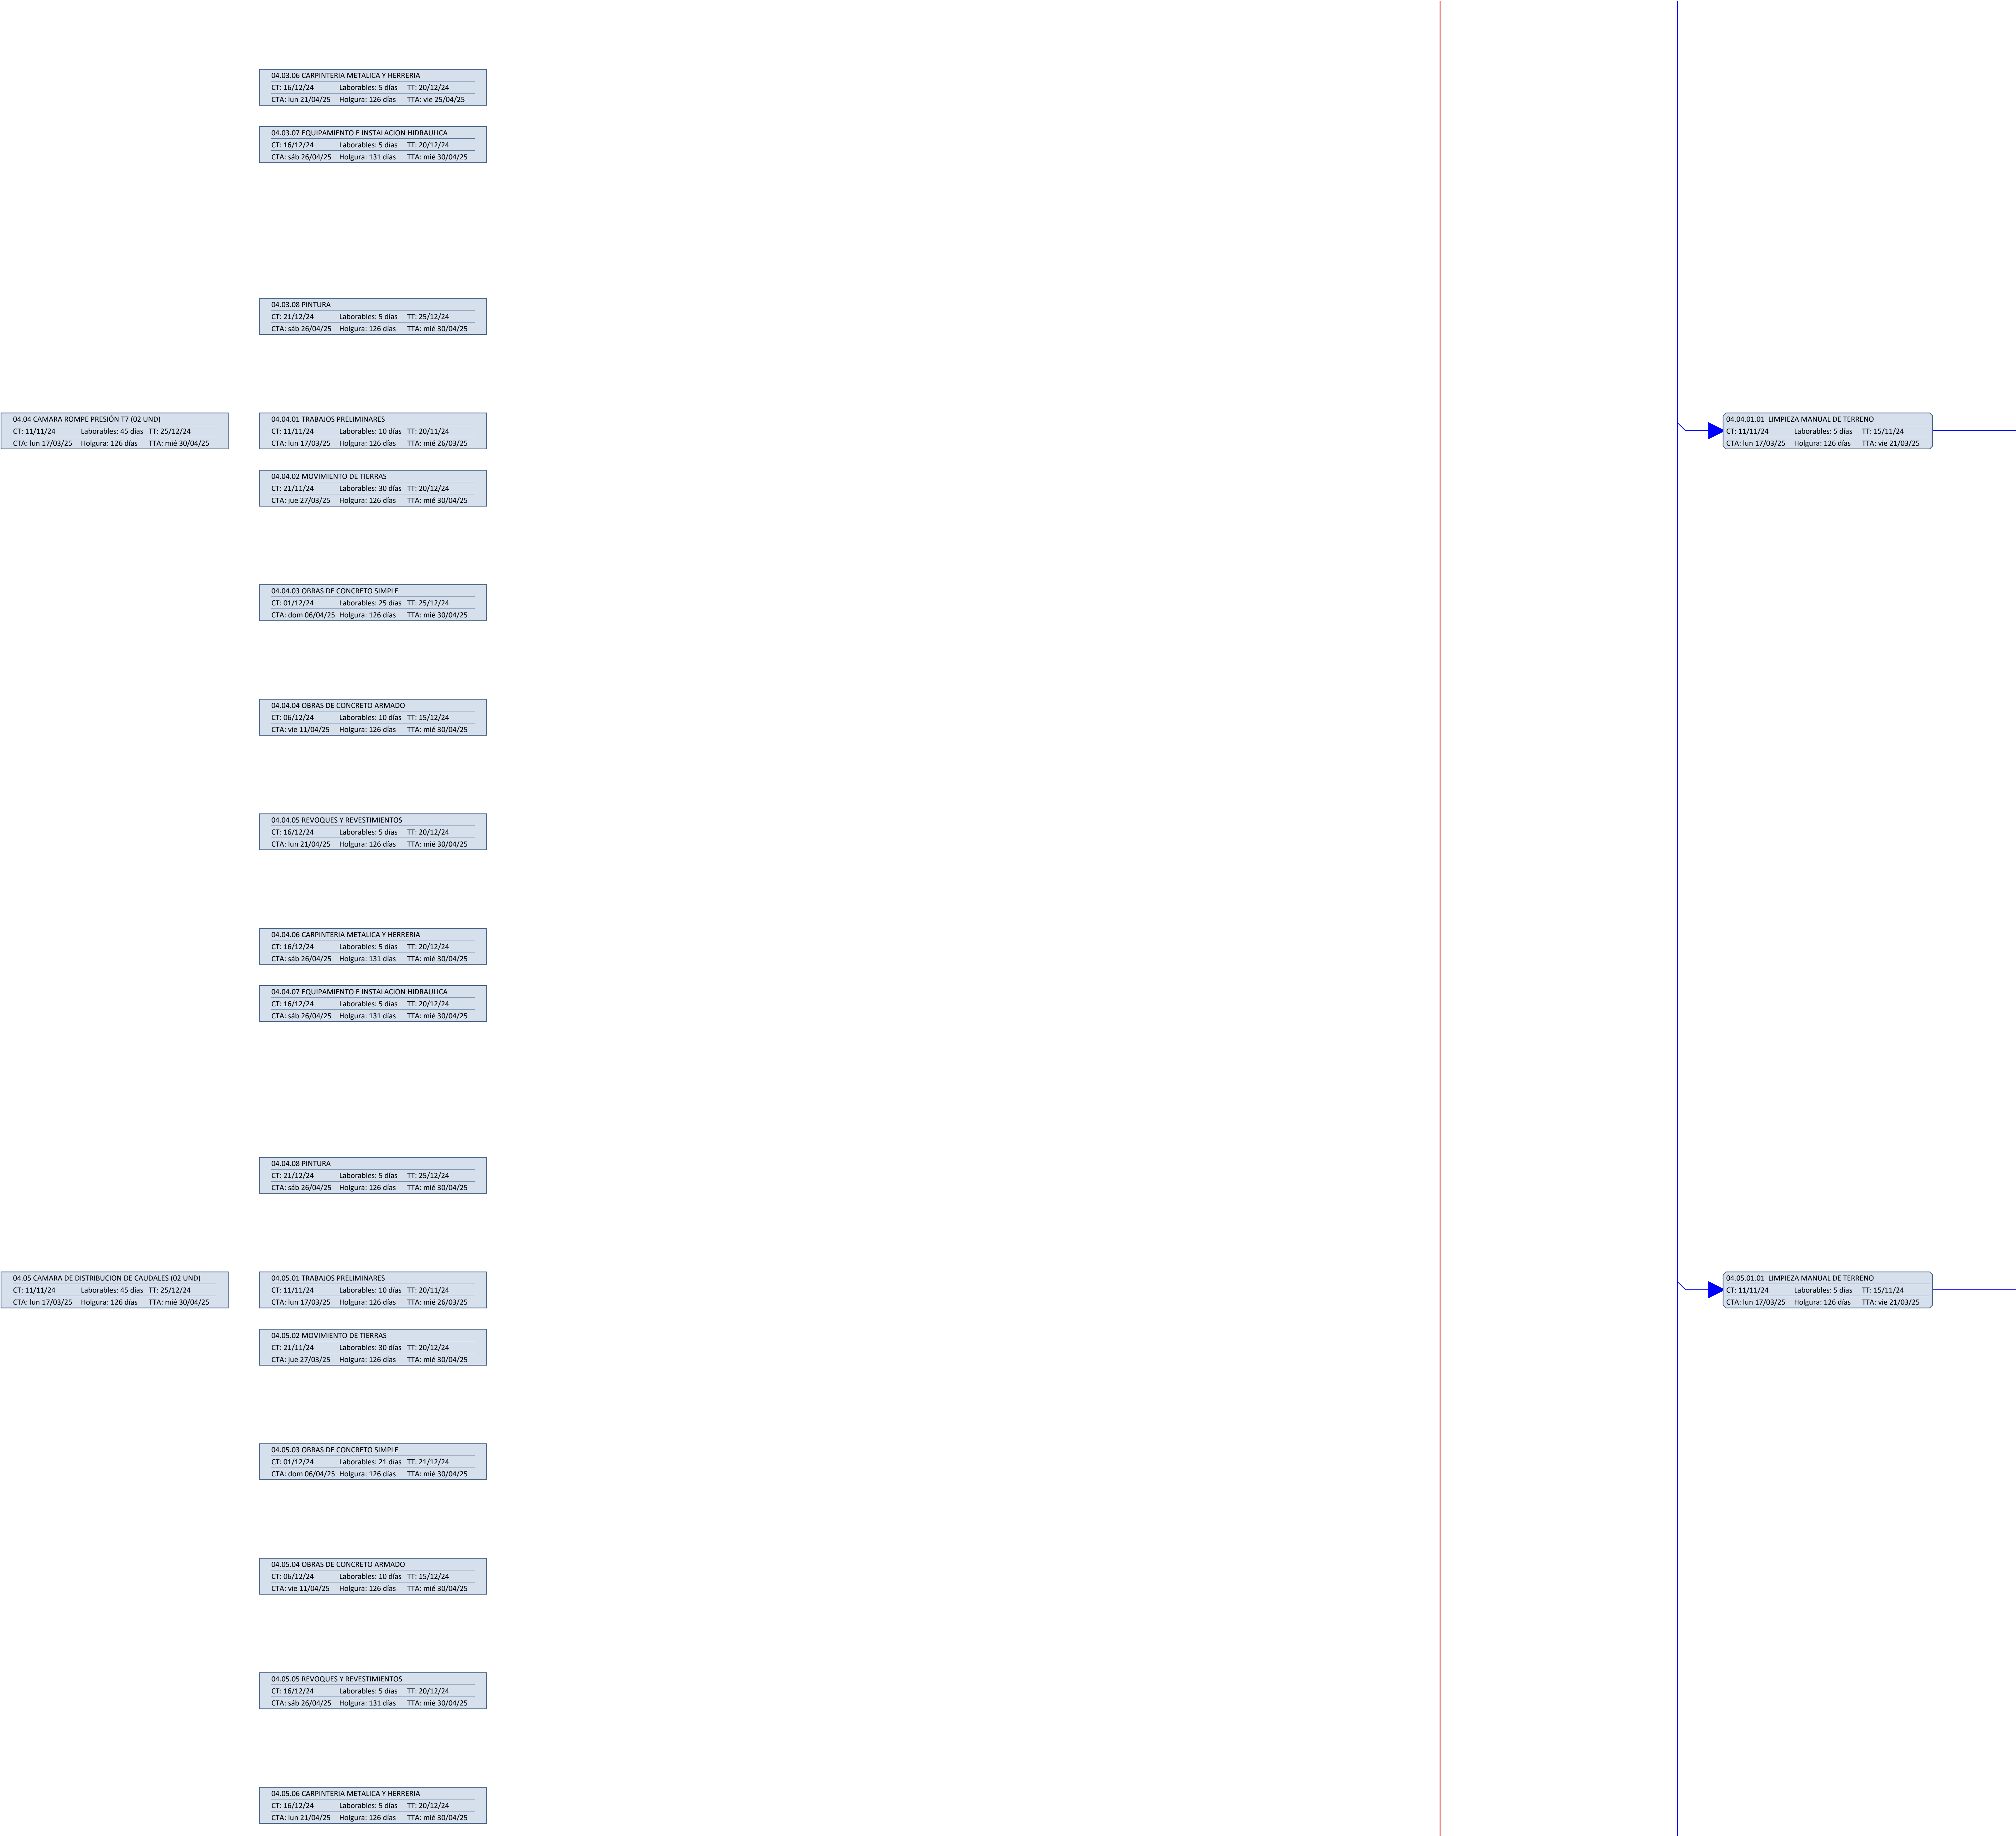






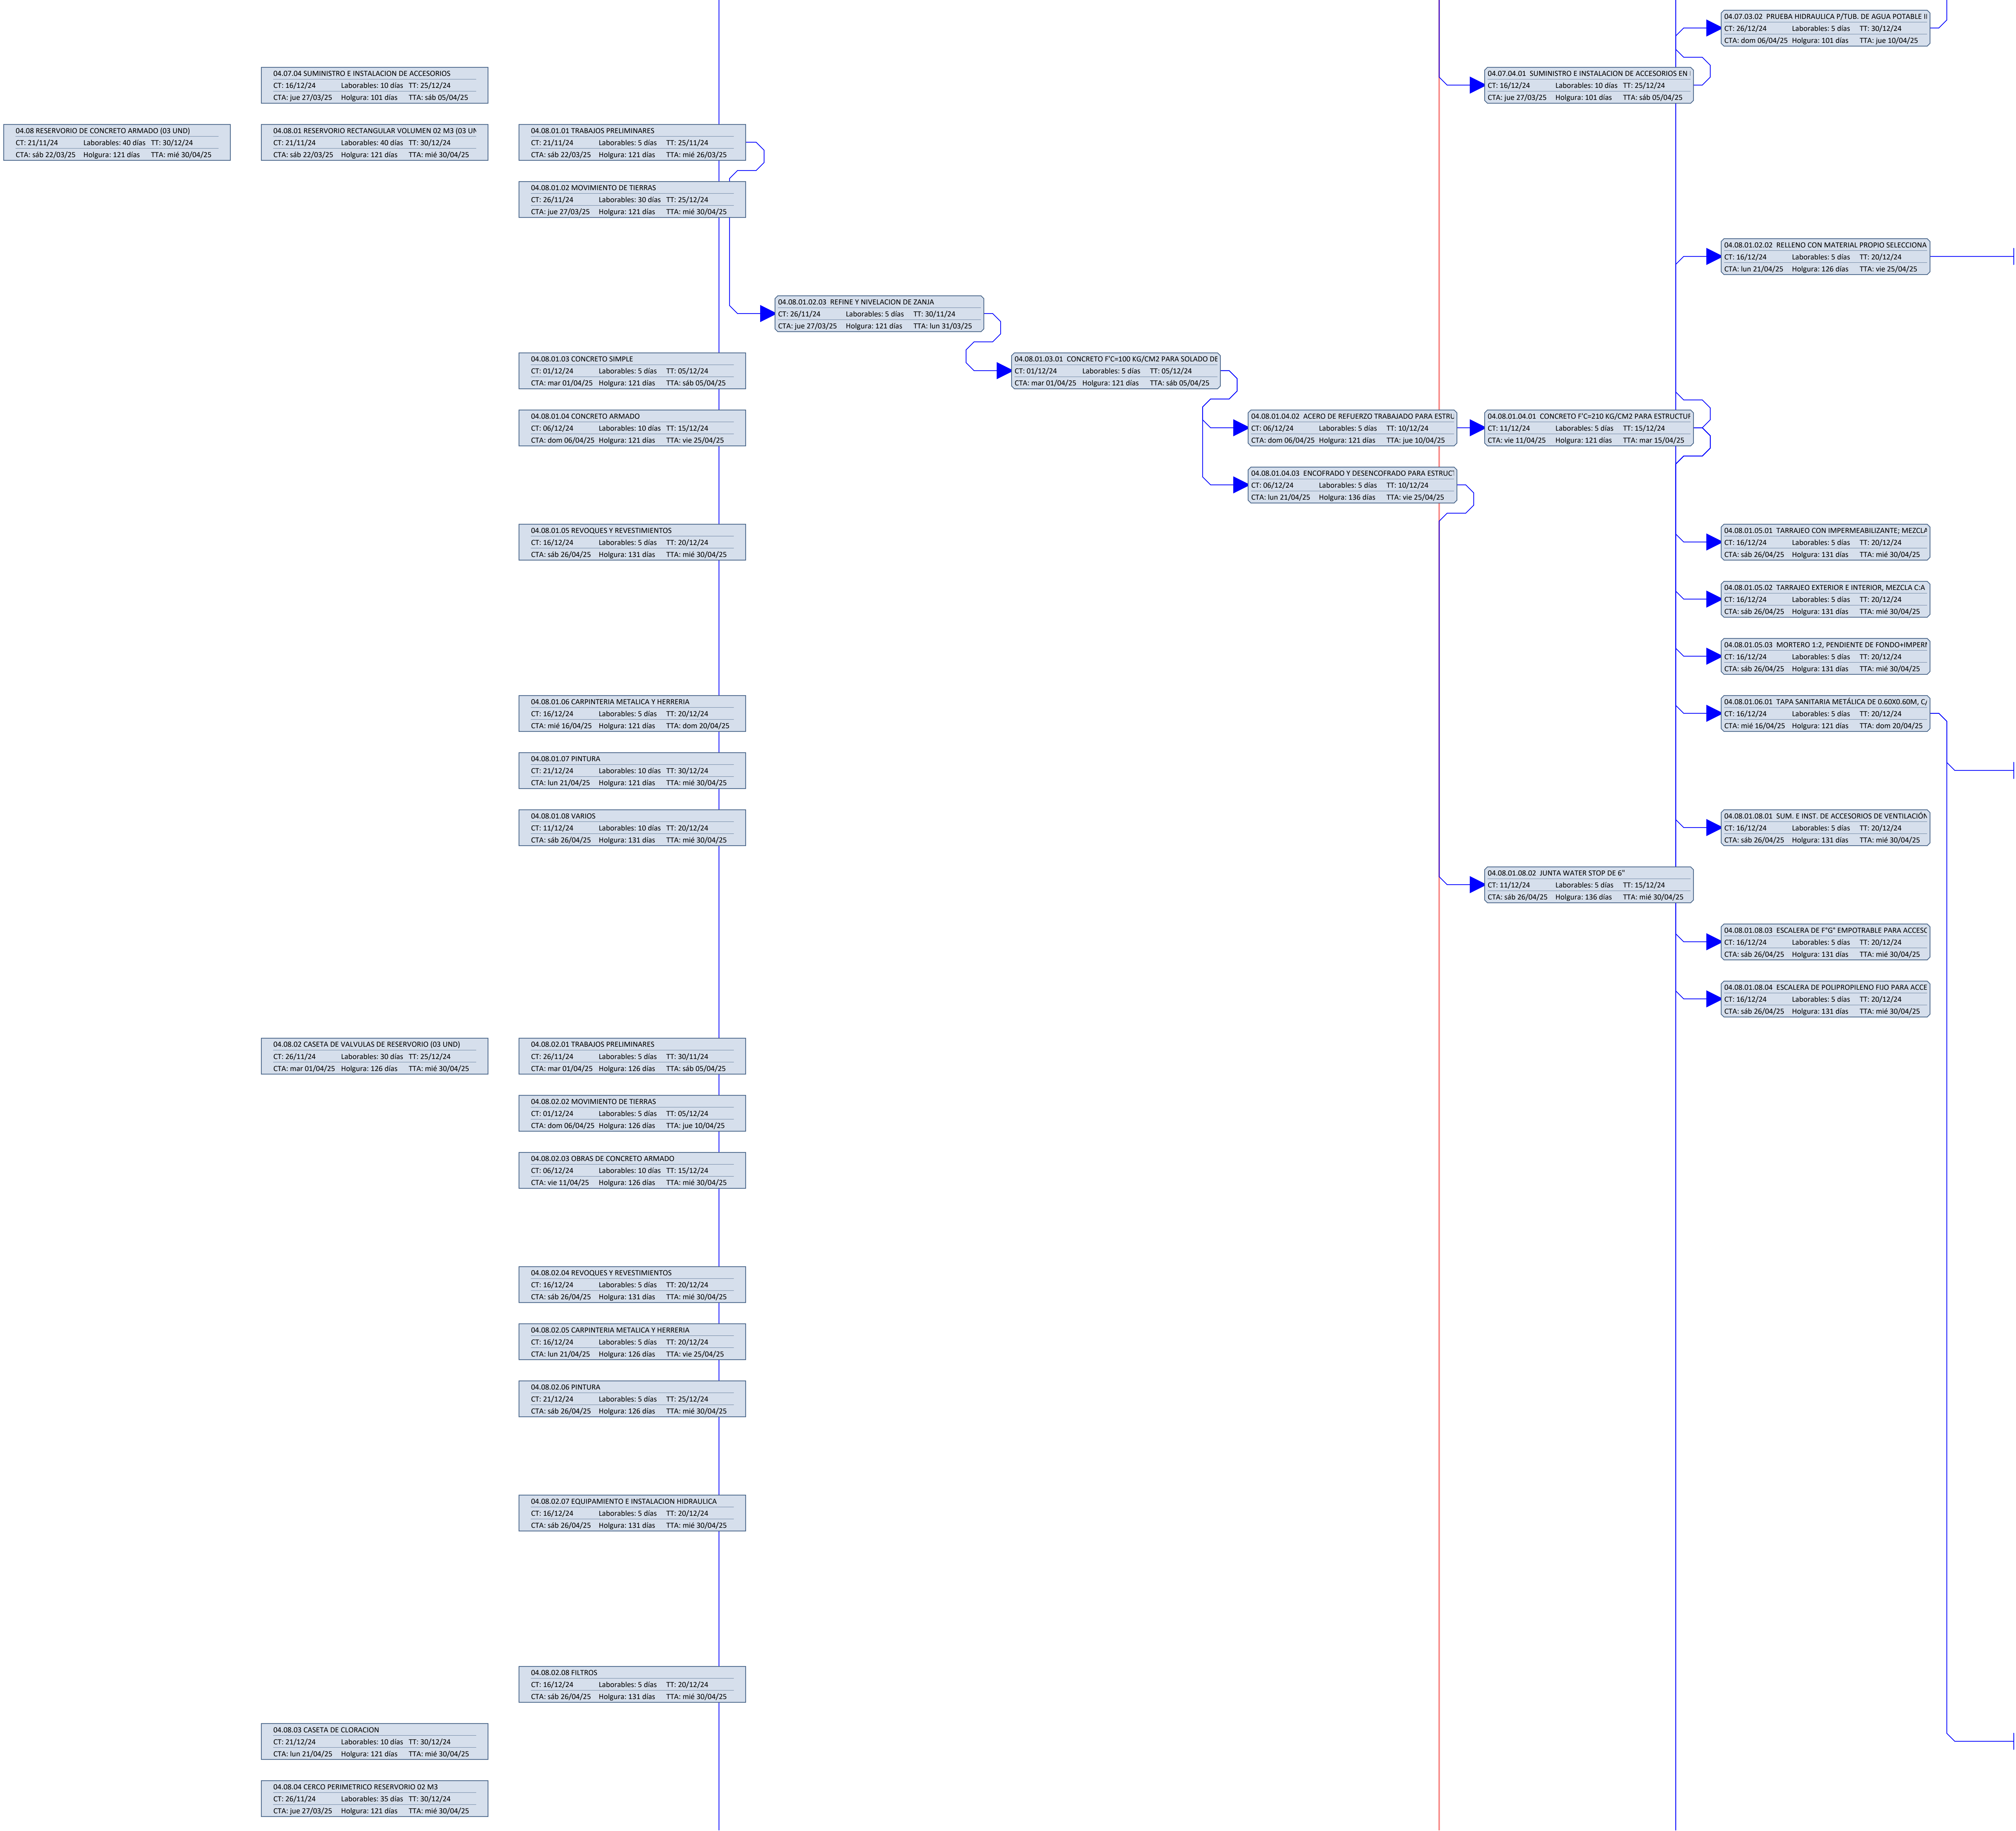





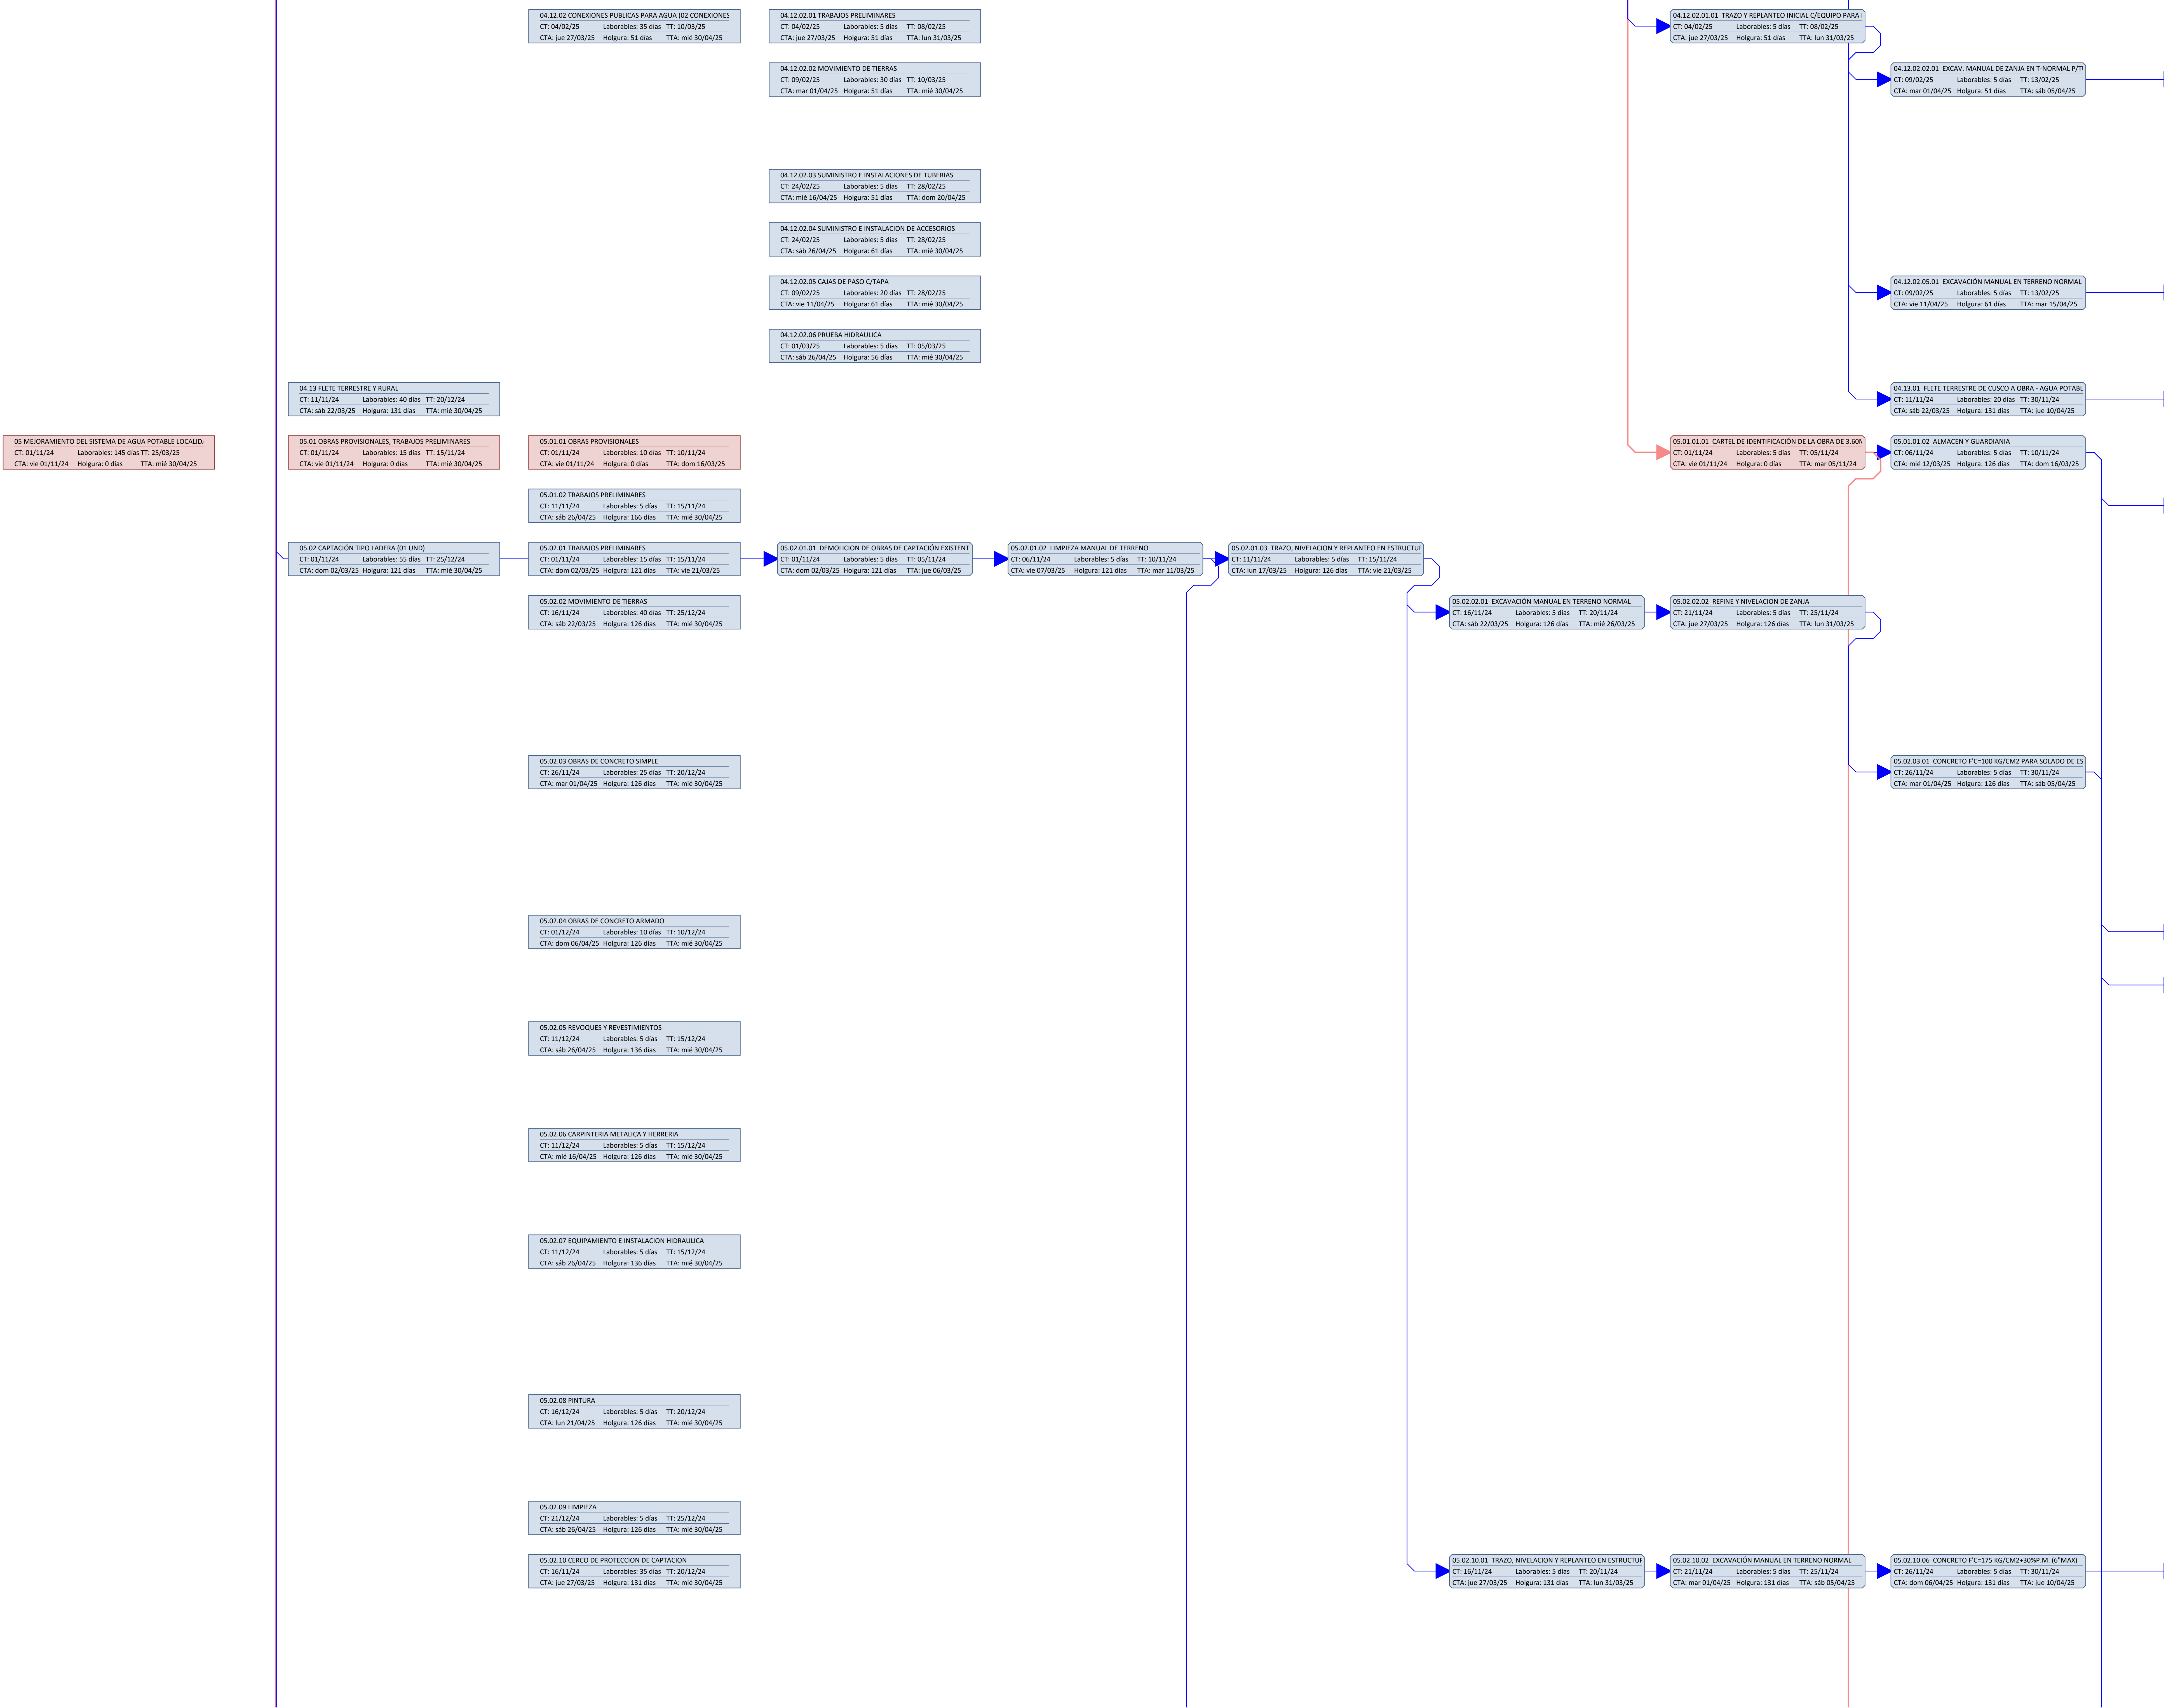

05.03 CAMARA ROMPE PRESIÓN (05 UND)			
CT: 11/11/24	Laborables: 45 días	TT: 25/12/24	
CTA: mié 12/03/25	Holgura: 121 días	TTA: mié 30/04/25	

05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES			
CT: 11/11/24	Laborables: 10 días	TT: 20/11/24	
CTA: mié 12/03/25	Holgura: 121 días	TTA: mié 26/03/25	

05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
CT: 21/11/24	Laborables: 30 días	TT: 20/12/24	
CTA: jue 27/03/25	Holgura: 126 días	TTA: mié 30/04/25	

05.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
CT: 01/12/24	Laborables: 25 días	TT: 25/12/24	
CTA: dom 06/04/25	Holgura: 126 días	TTA: mié 30/04/25	

05.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
CT: 06/12/24	Laborables: 10 días	TT: 15/12/24	
CTA: vie 11/04/25	Holgura: 126 días	TTA: mié 30/04/25	

05.03.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS			
CT: 16/12/24	Laborables: 5 días	TT: 20/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

05.03.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA			
CT: 16/12/24	Laborables: 5 días	TT: 20/12/24	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 126 días	TTA: vie 25/04/25	

05.03.07 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA			
CT: 16/12/24	Laborables: 5 días	TT: 20/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

05.03.08 PINTURA			
CT: 21/12/24	Laborables: 5 días	TT: 25/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 126 días	TTA: mié 30/04/25	

05.04 CAMARA ROMPE PRESIÓN T7 (02 UND)			
CT: 11/11/24	Laborables: 45 días	TT: 25/12/24	
CTA: lun 17/03/25	Holgura: 126 días	TTA: mié 30/04/25	

05.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES			
CT: 11/11/24	Laborables: 10 días	TT: 20/11/24	
CTA: lun 17/03/25	Holgura: 126 días	TTA: mié 26/03/25	

05.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
CT: 21/11/24	Laborables: 30 días	TT: 20/12/24	
CTA: jue 27/03/25	Holgura: 126 días	TTA: mié 30/04/25	

05.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
CT: 01/12/24	Laborables: 25 días	TT: 25/12/24	
CTA: dom 06/04/25	Holgura: 126 días	TTA: mié 30/04/25	

05.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
CT: 06/12/24	Laborables: 10 días	TT: 15/12/24	
CTA: vie 11/04/25	Holgura: 126 días	TTA: mié 30/04/25	

05.04.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS			
CT: 16/12/24	Laborables: 5 días	TT: 20/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

05.04.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA			
CT: 16/12/24	Laborables: 5 días	TT: 20/12/24	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 126 días	TTA: vie 25/04/25	

05.04.07 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA			
CT: 16/12/24	Laborables: 5 días	TT: 20/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

05.04.08 PINTURA			
CT: 21/12/24	Laborables: 5 días	TT: 25/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 126 días	TTA: mié 30/04/25	

05.05 PASE AEREO DE LUZ 15M (01 UND)			
CT: 06/11/24	Laborables: 45 días	TT: 20/12/24	
CTA: lun 17/03/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

05.05.01 PASE AEREO L=15.00 m. CERCHA METALICA (01 UND)			
CT: 06/11/24	Laborables: 45 días	TT: 20/12/24	
CTA: lun 17/03/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

05.05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES			
CT: 06/11/24	Laborables: 10 días	TT: 15/11/24	
CTA: lun 17/03/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 26/03/25	

05.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
CT: 16/11/24	Laborables: 30 días	TT: 15/12/24	
CTA: jue 27/03/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

05.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO			
CT: 11/11/24	Laborables: 5 días	TT: 15/11/24	
CTA: mié 12/03/25	Holgura: 121 días	TTA: dom 16/03/25	

05.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRUCTU			
CT: 16/11/24	Laborables: 5 días	TT: 20/11/24	
CTA: sáb 22/03/25	Holgura: 126 días	TTA: mié 26/03/25	

05.03.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL			
CT: 21/11/24	Laborables: 5 días	TT: 25/11/24	
CTA: jue 27/03/25	Holgura: 126 días	TTA: lun 31/03/25	

05.03.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA			
CT: 26/11/24	Laborables: 5 días	TT: 30/11/24	
CTA: mar 01/04/25	Holgura: 126 días	TTA: sáb 05/04/25	

05.05.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO			
CT: 06/11/24	Laborables: 5 días	TT: 10/11/24	
CTA: lun 17/03/25	Holgura: 131 días	TTA: vie 21/03/25	


05.05.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ESTRU			
CT: 11/11/24	Laborables: 5 días	TT: 15/11/24	
CTA: sáb 22/03/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 26/03/25	


05.05.01.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL			
CT: 16/11/24	Laborables: 5 días	TT: 20/11/24	
CTA: jue 27/03/25	Holgura: 131 días	TTA: lun 31/03/25	

05.05.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONA			
CT: 21/11/24	Laborables: 5 días	TT: 25/11/24	
CTA: mar 01/04/25	Holgura: 131 días	TTA: sáb 05/04/25	






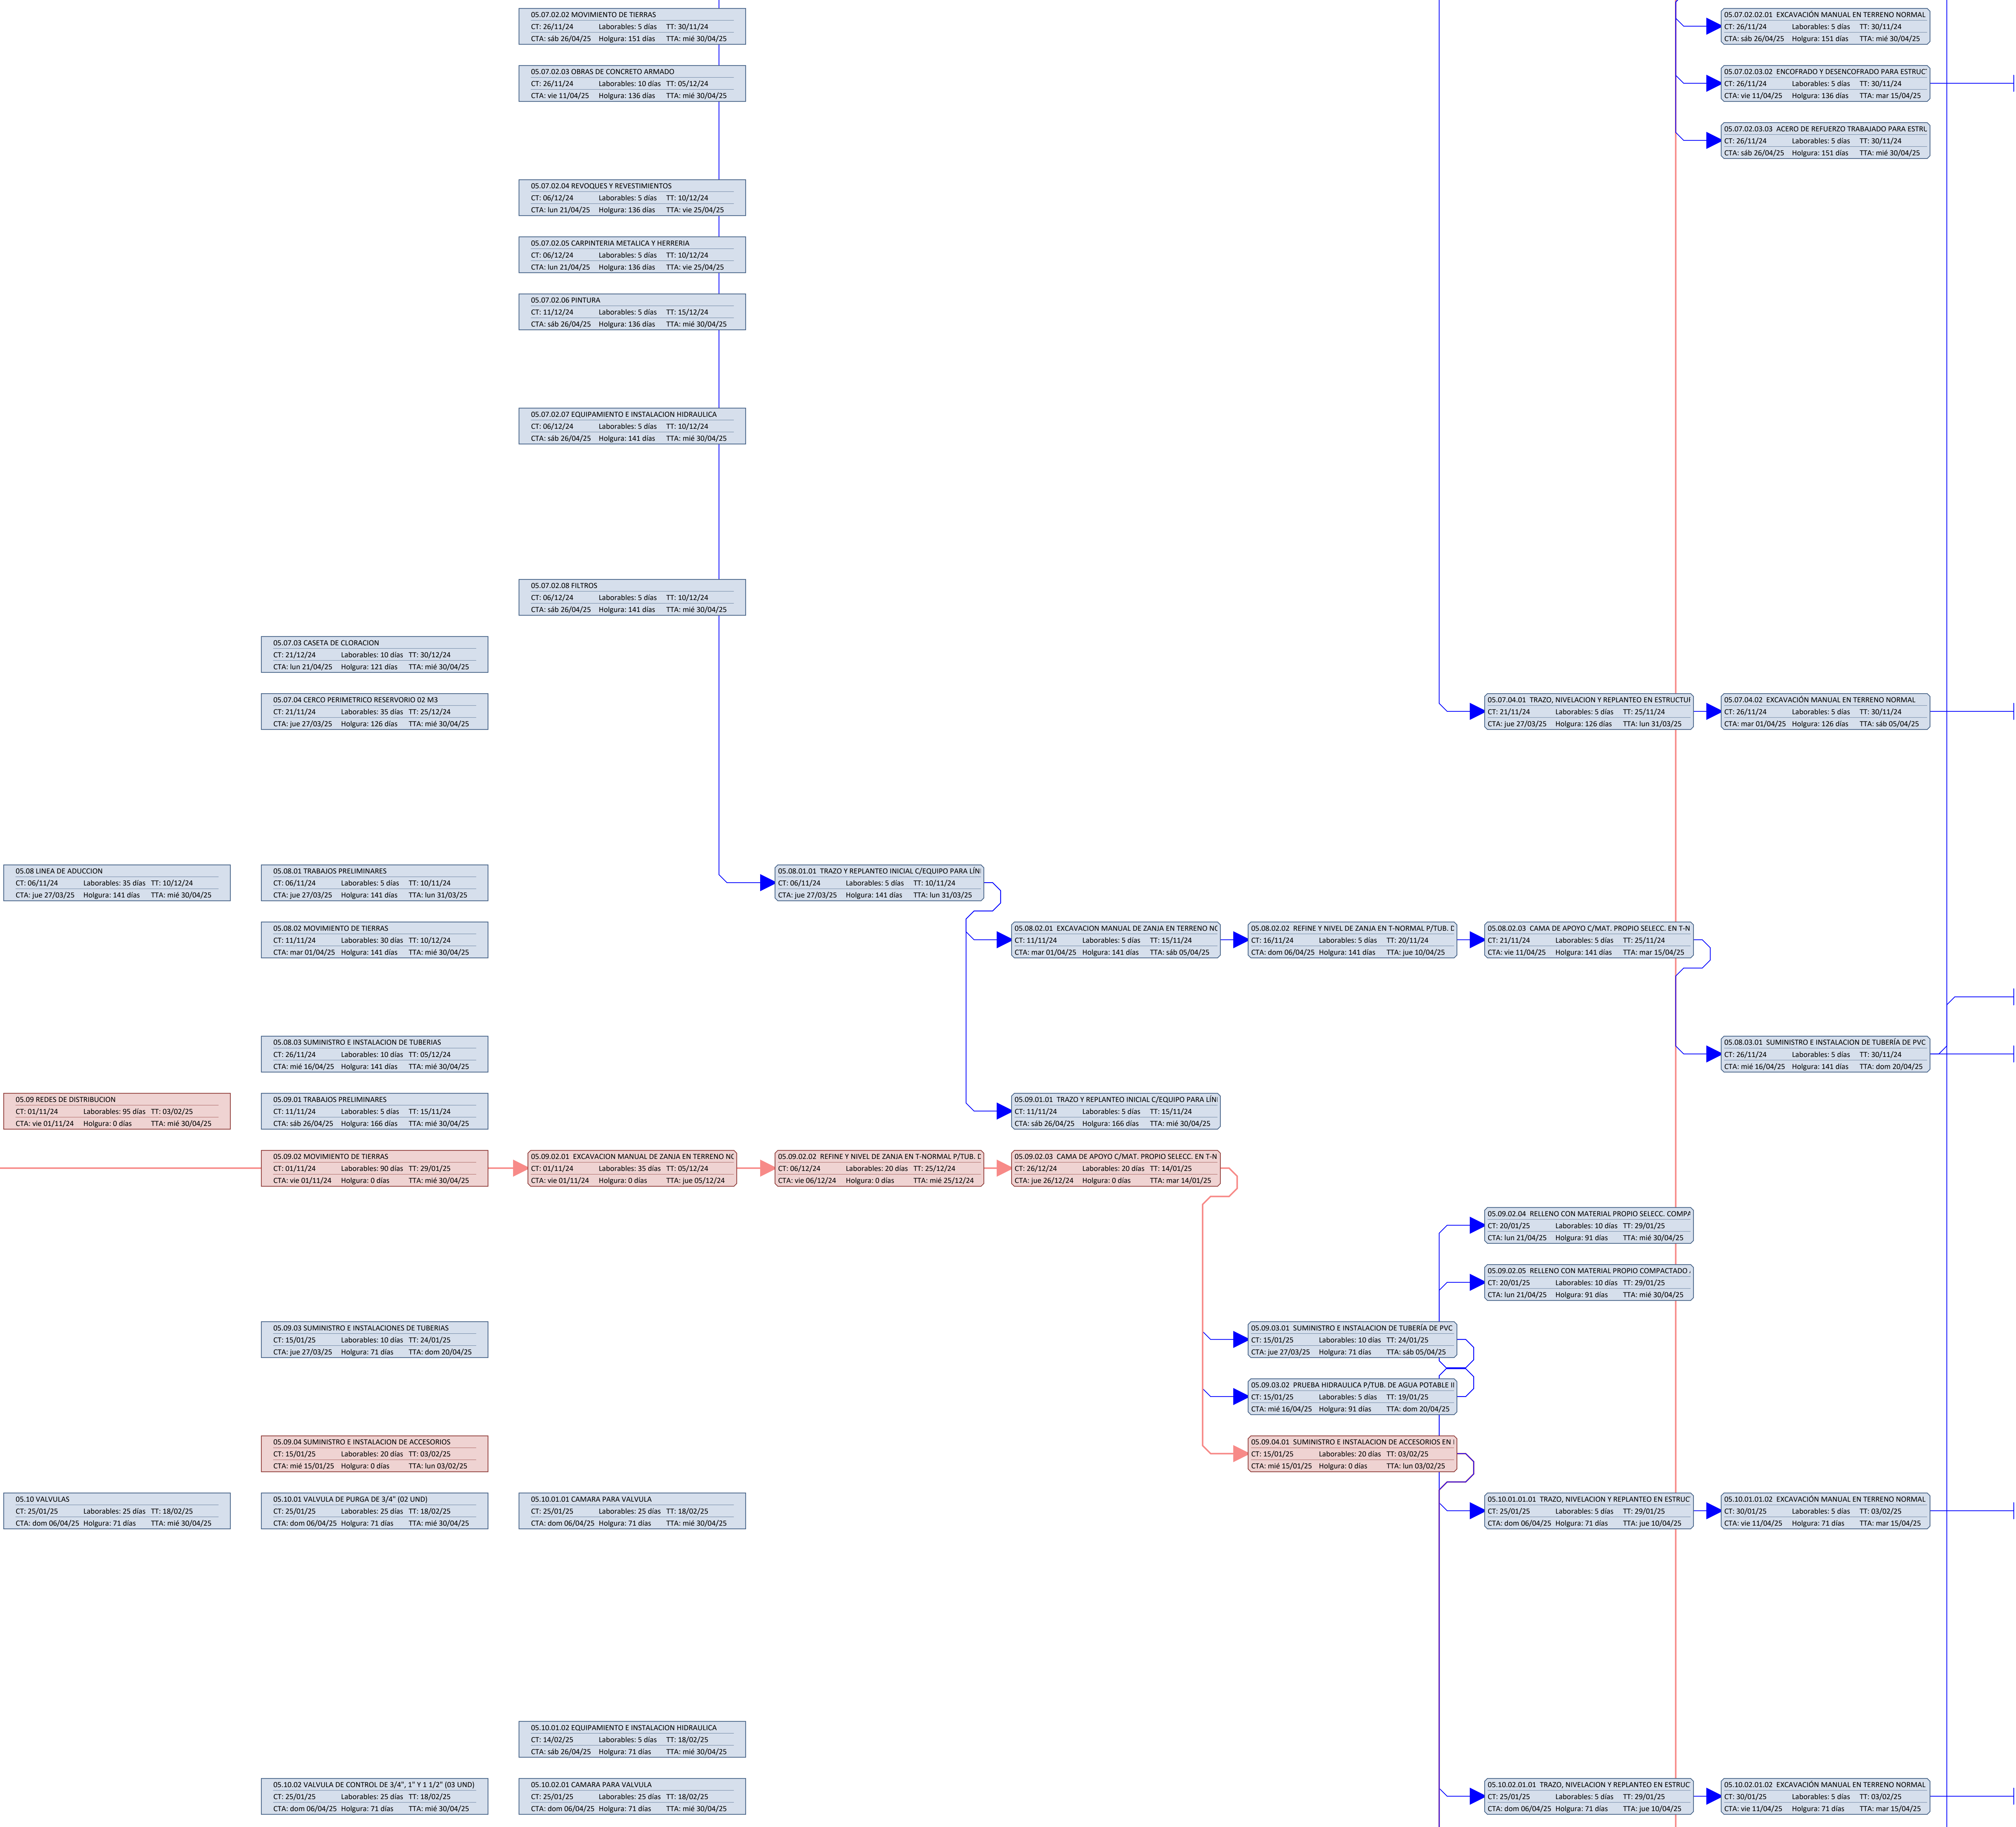


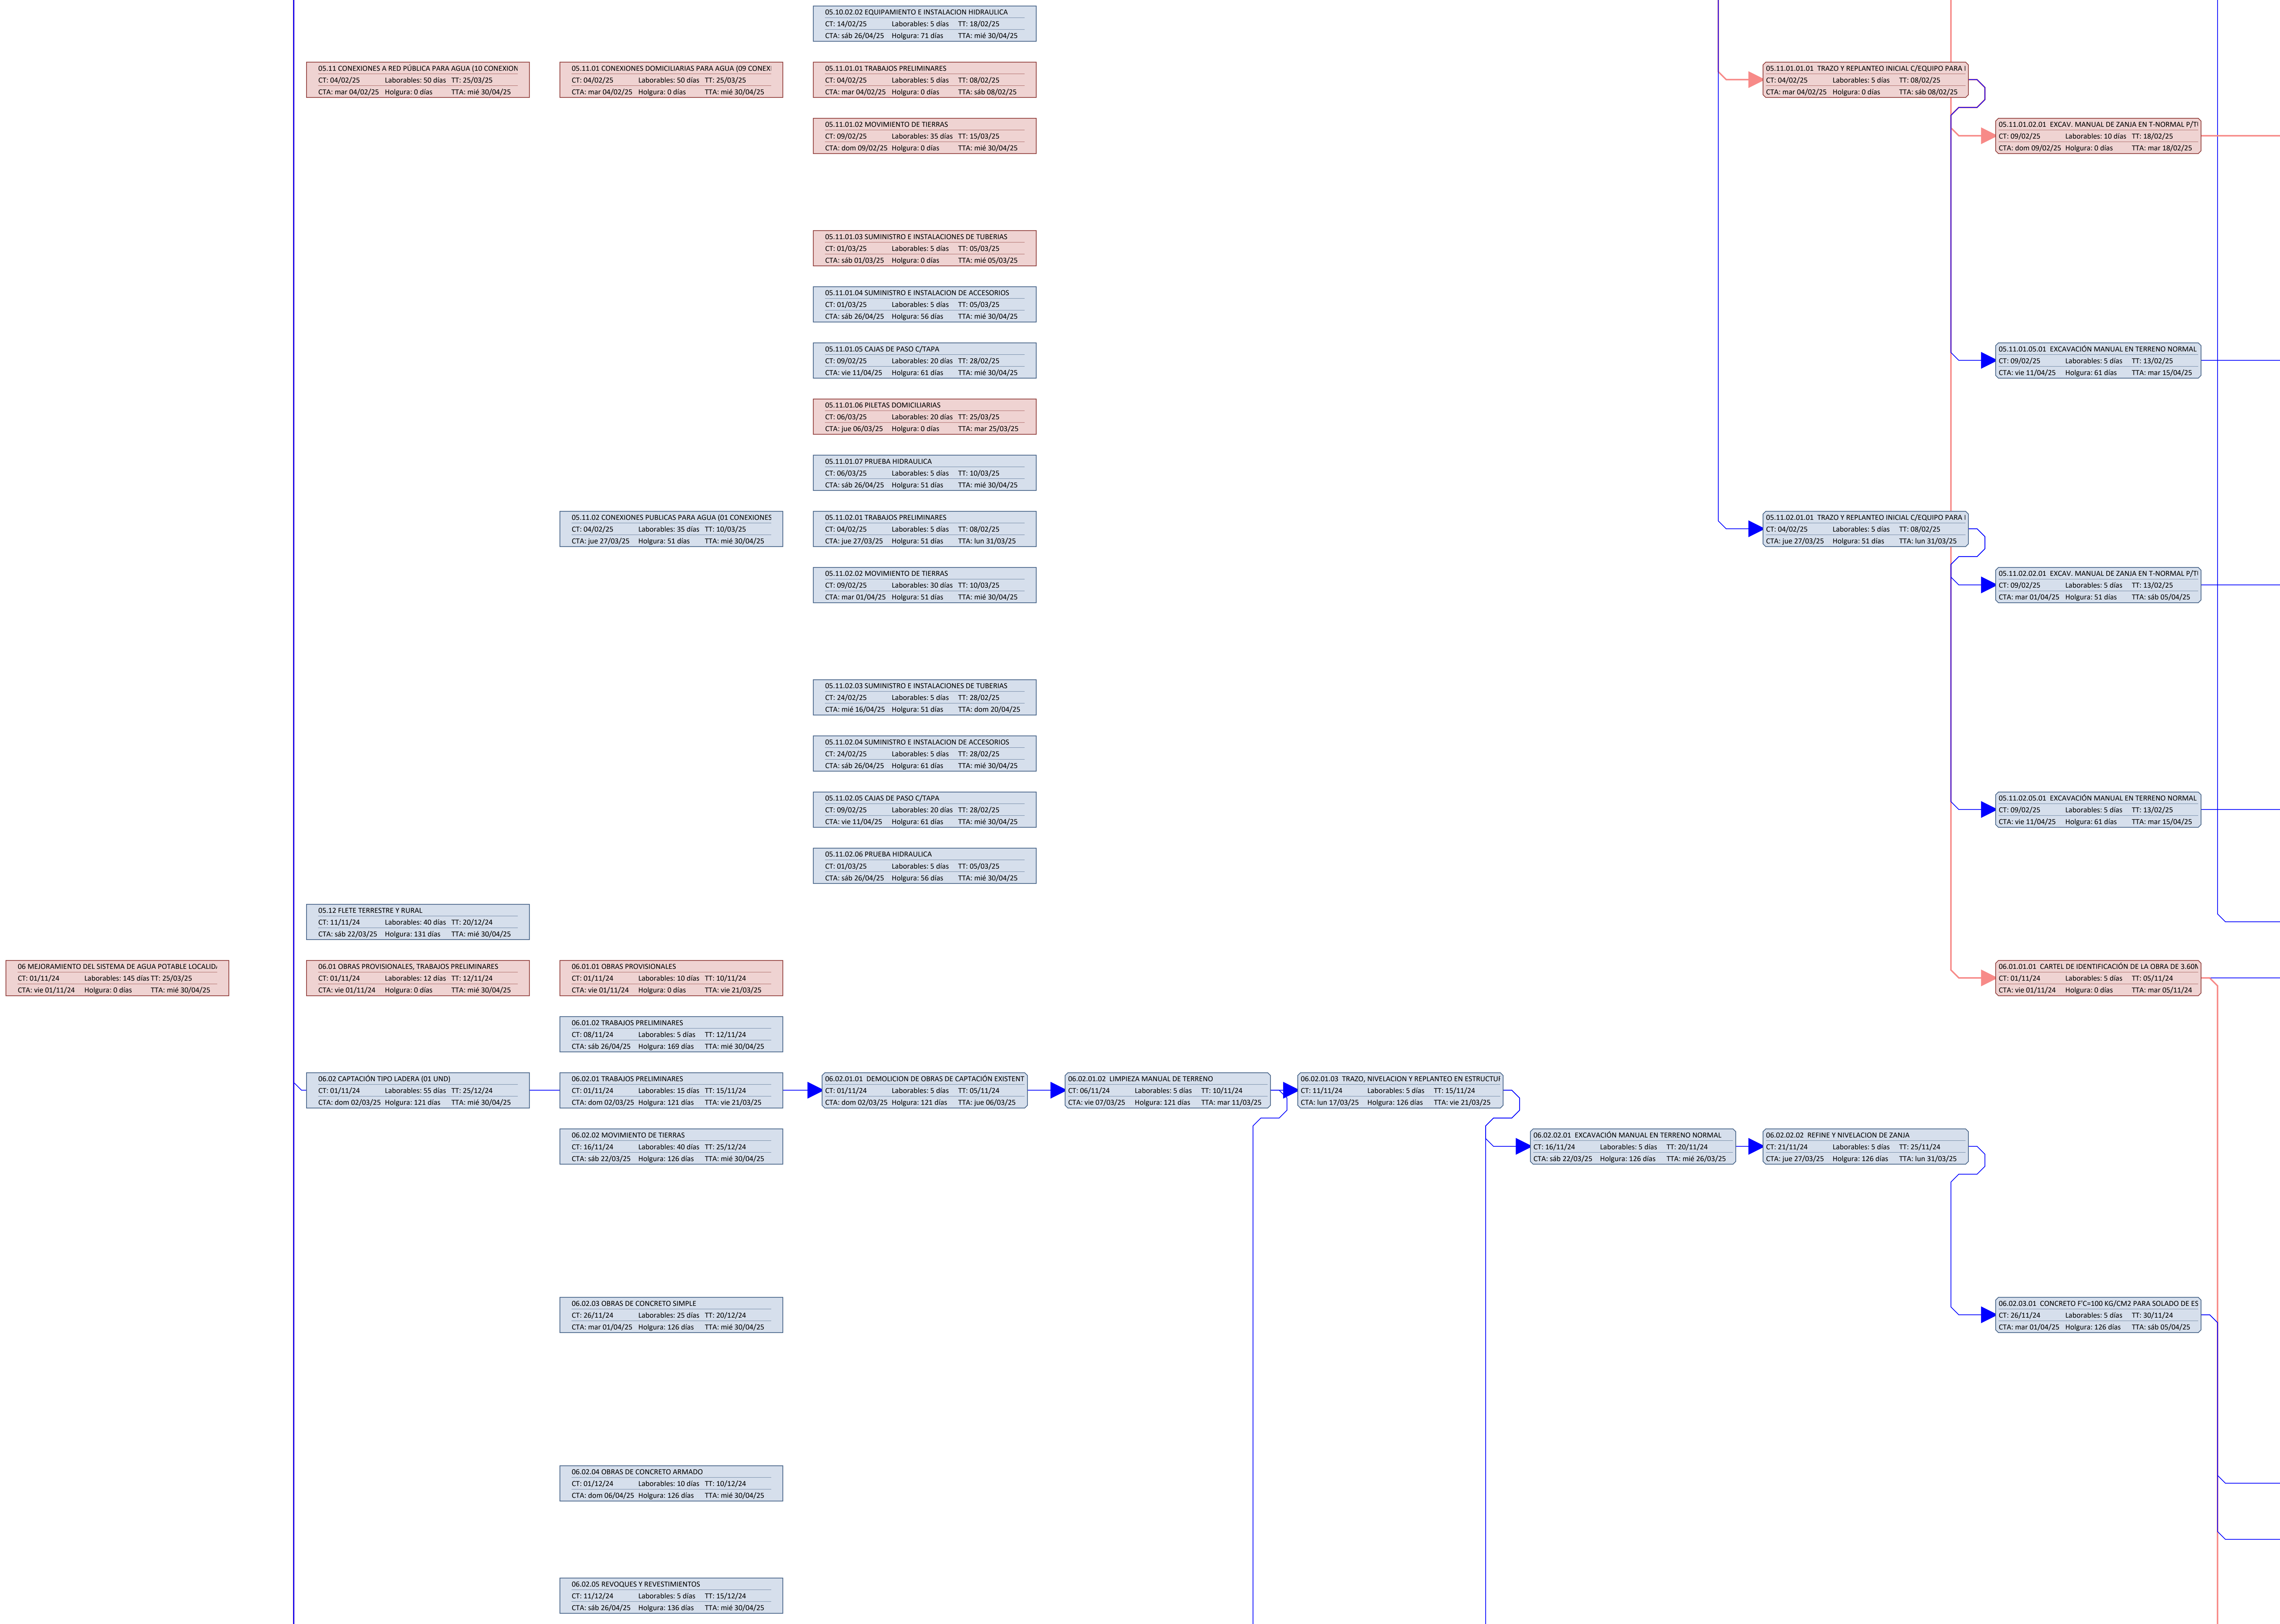






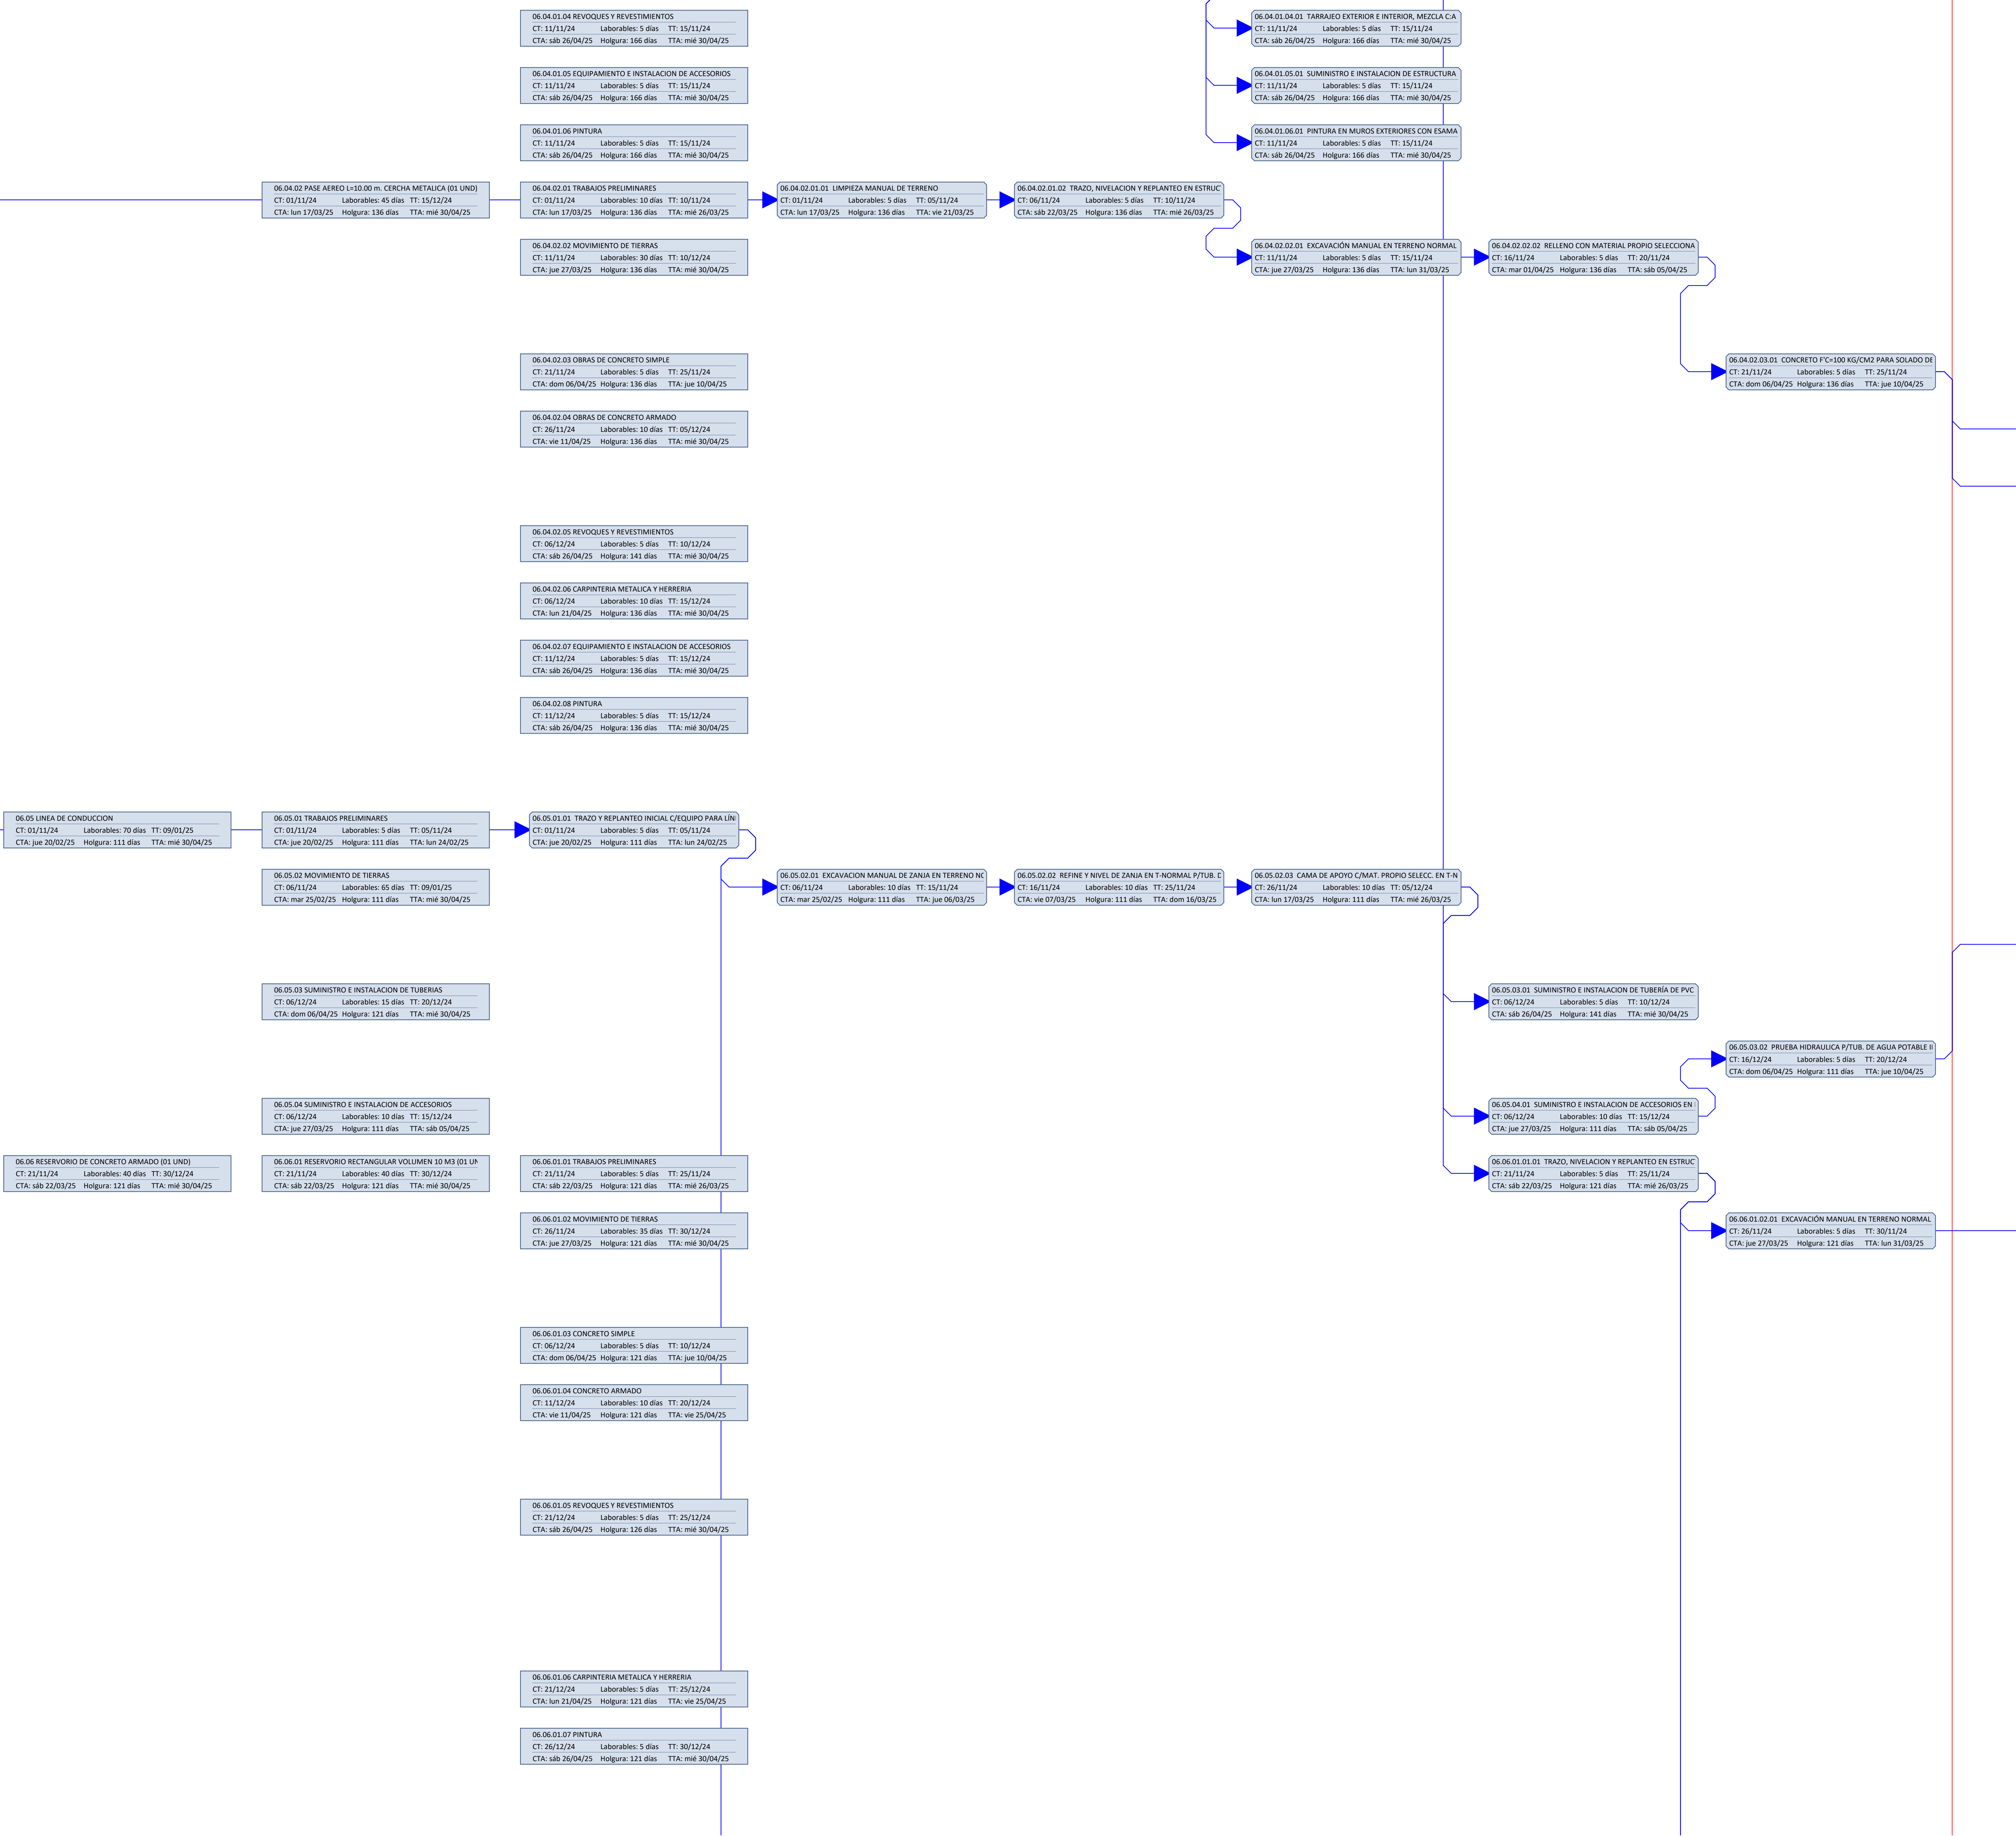

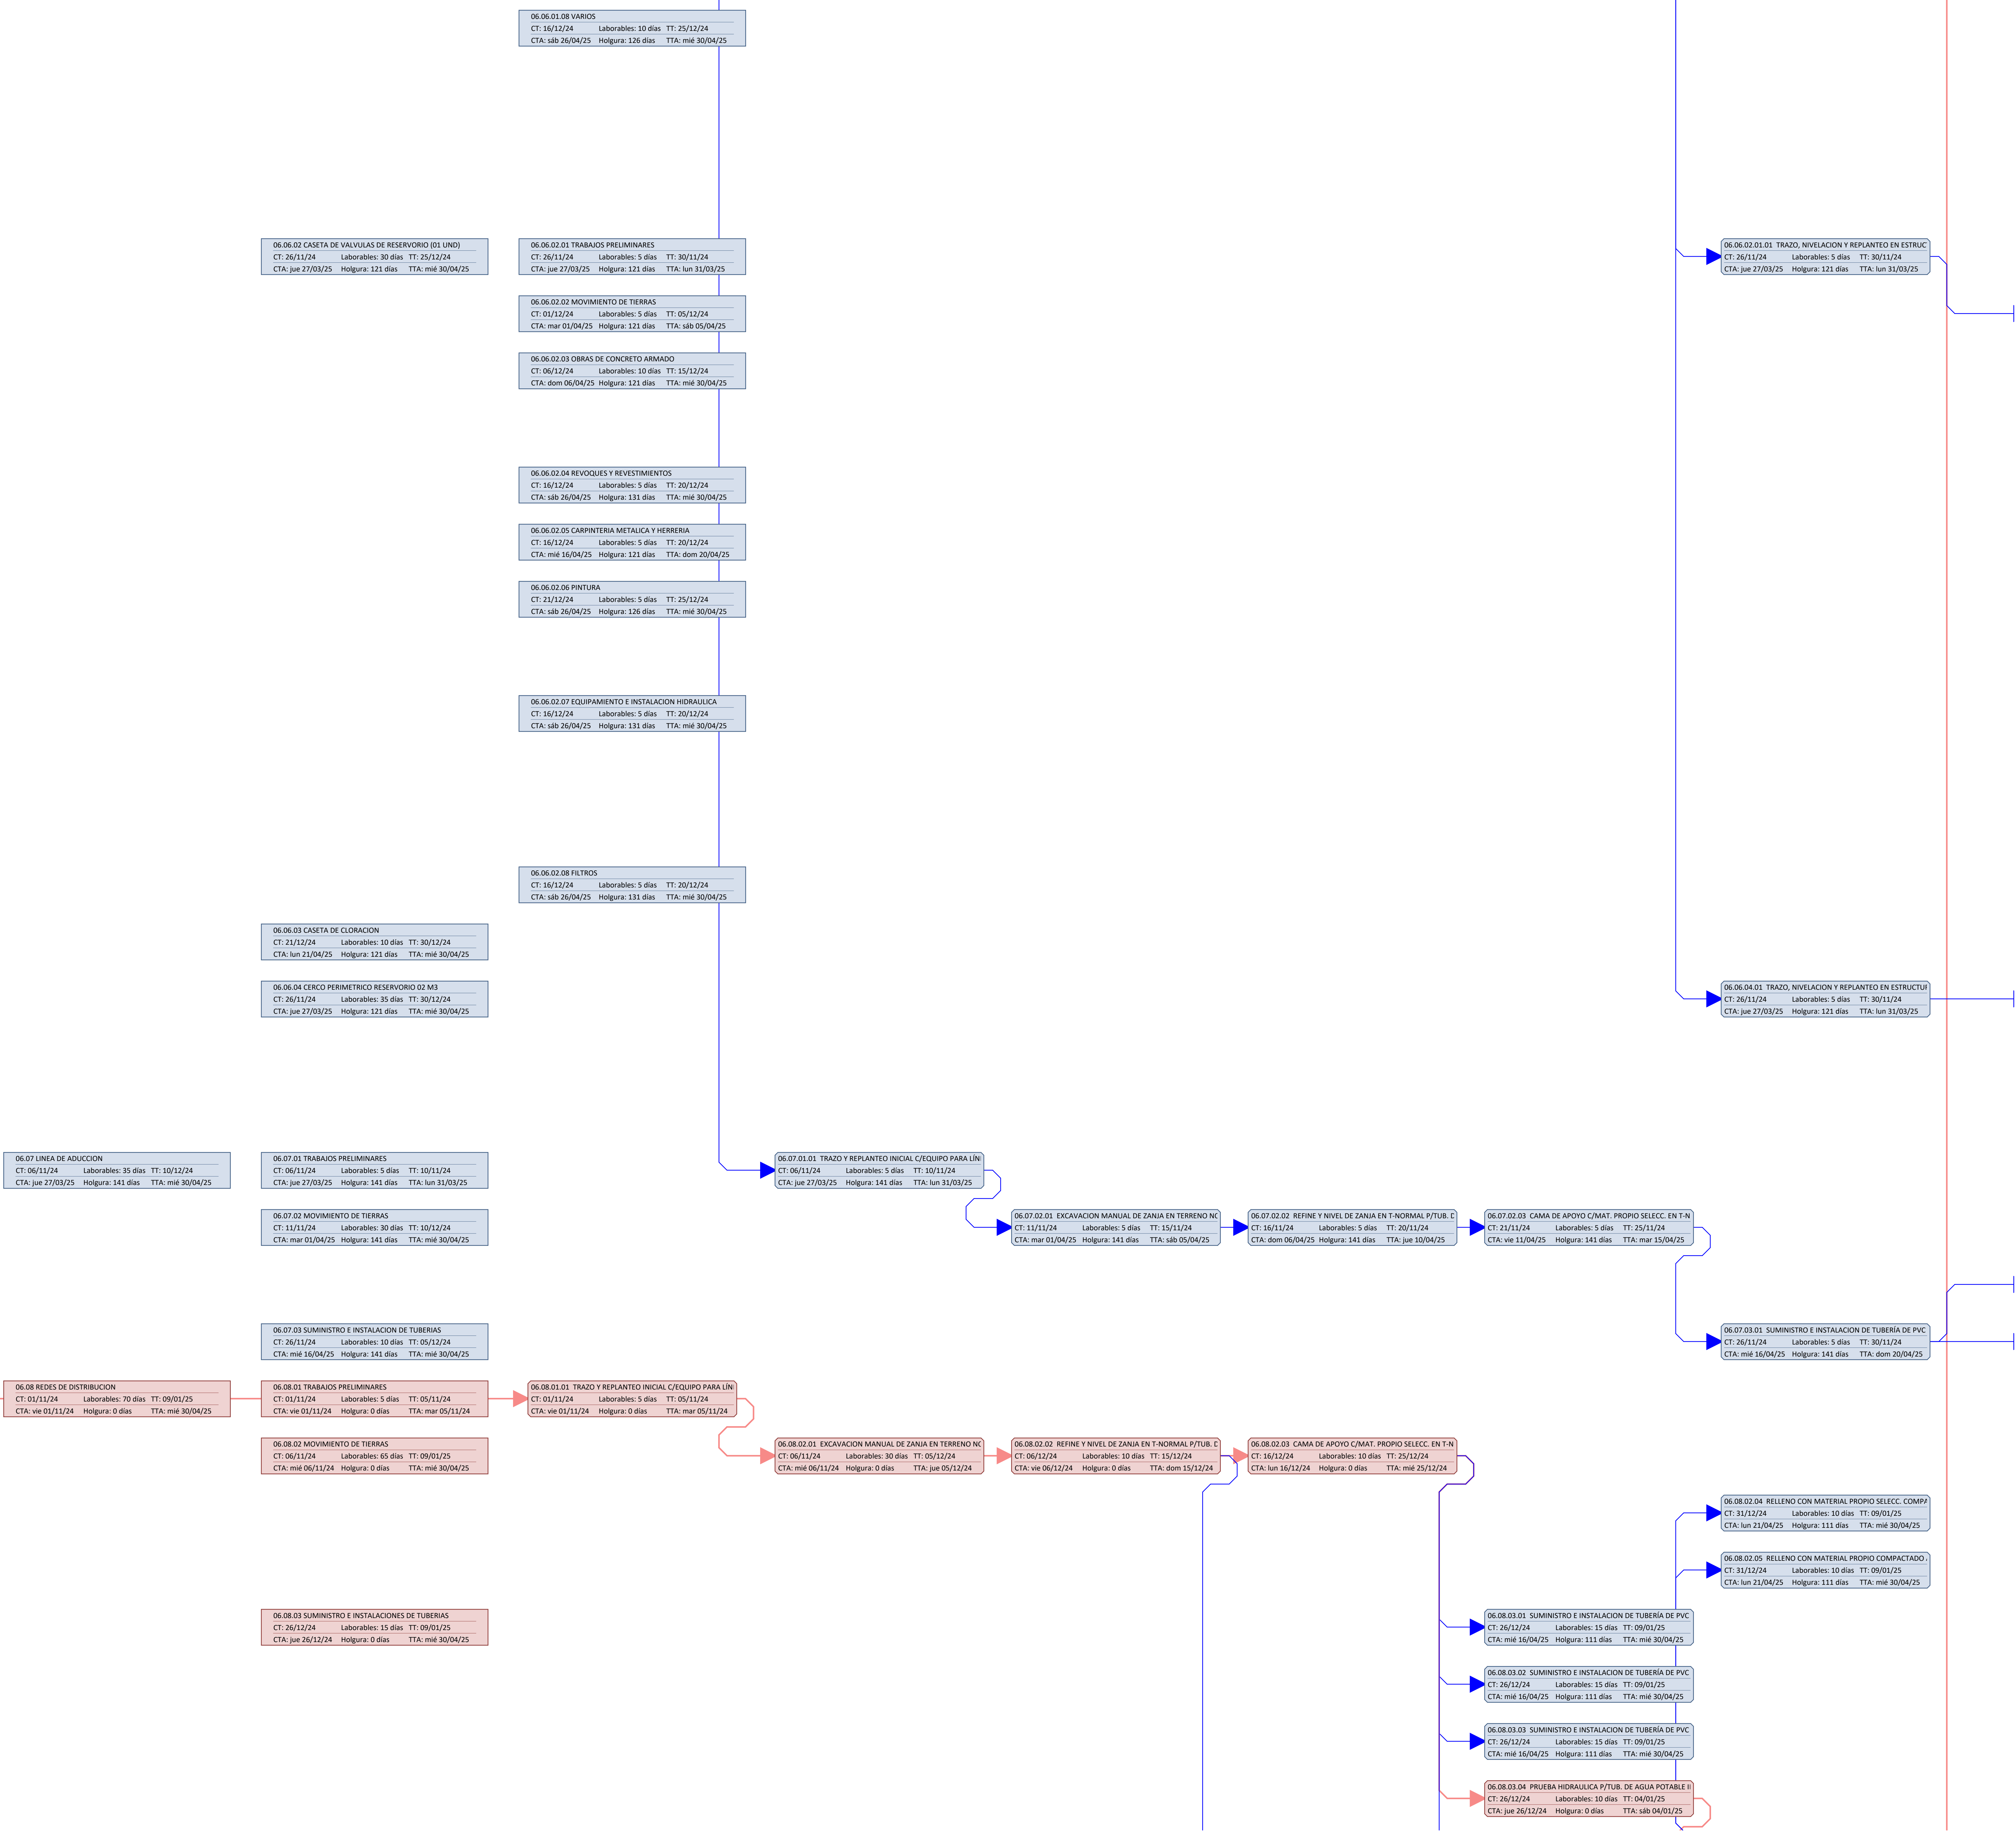

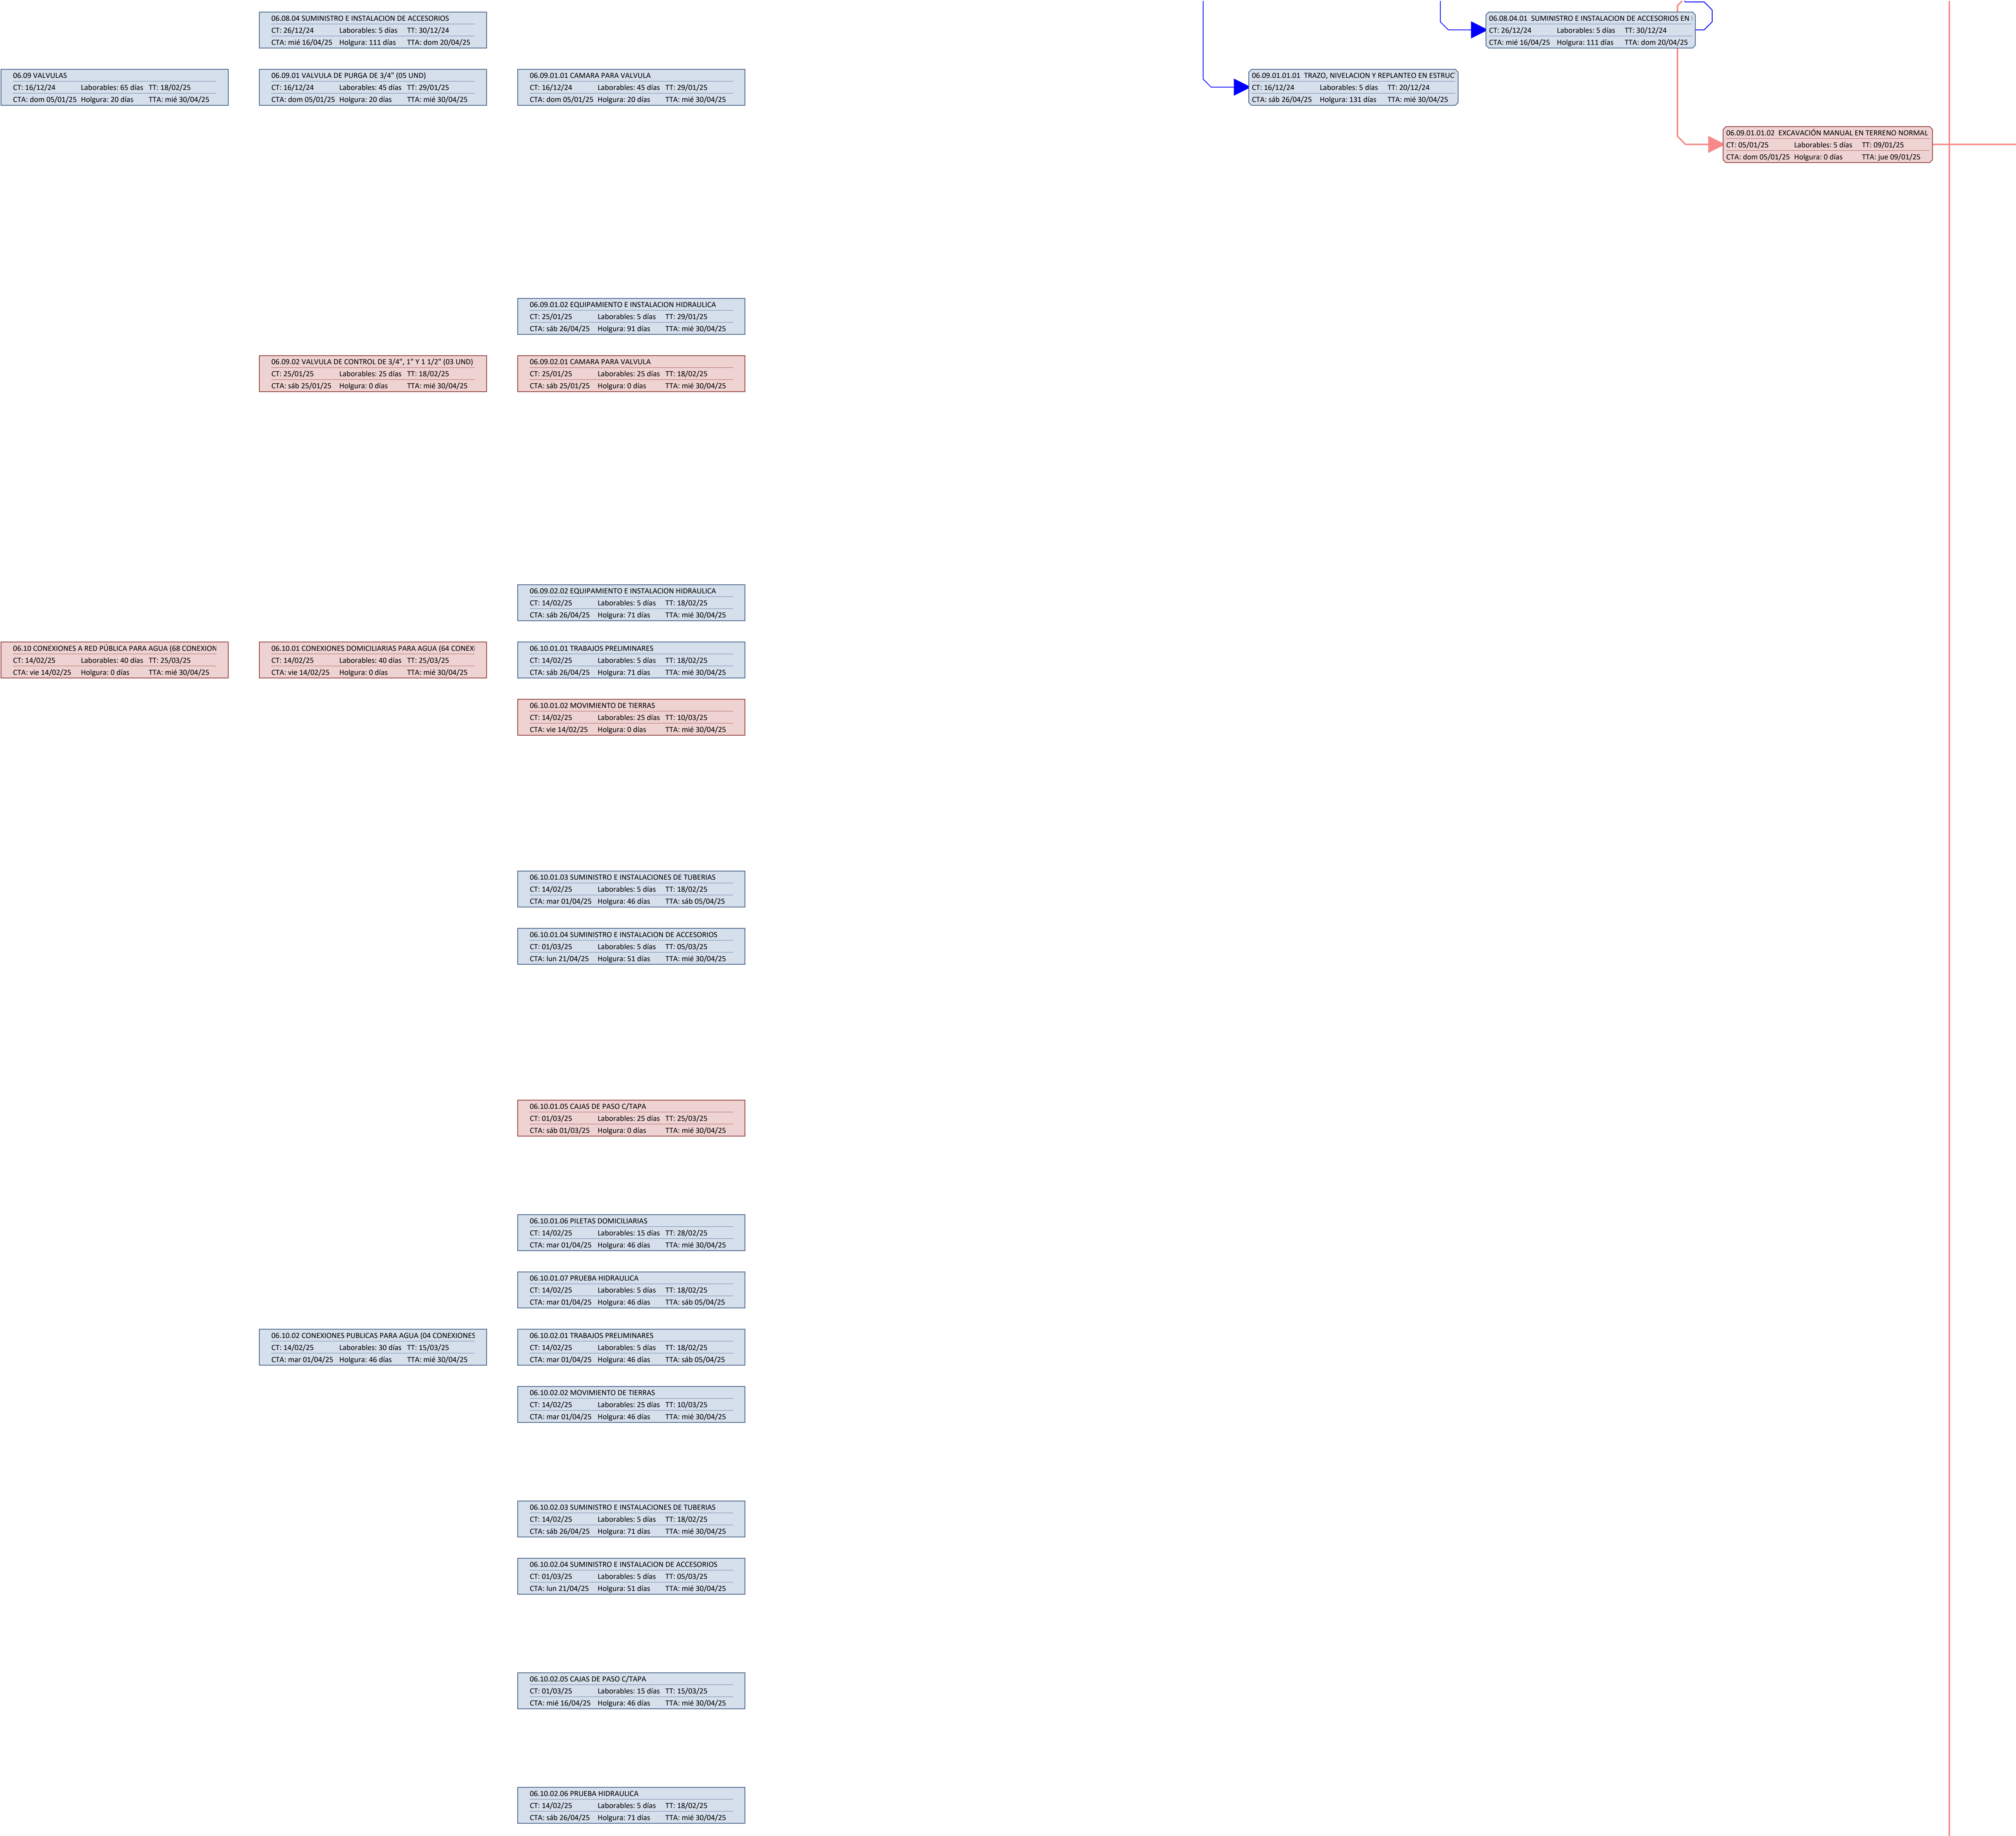



07 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO LOCALIDAD DE CCCOÑAB			
CT: 01/11/24	Laborables: 75 días	TT: 14/01/25	
CTA: vie 01/11/24	Holgura: 0 días	TTA: mié 30/04/25	

06.11 FLETE TERRESTRE Y RURAL			
CT: 11/11/24	Laborables: 40 días	TT: 20/12/24	
CTA: sáb 22/03/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

07.01 TRABAJOS PRELIMINARES			
CT: 01/11/24	Laborables: 10 días	TT: 10/11/24	
CTA: vie 01/11/24	Holgura: 0 días	TTA: lun 24/02/25	

07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
CT: 11/11/24	Laborables: 25 días	TT: 05/12/24	
CTA: mar 25/02/25	Holgura: 106 días	TTA: mié 30/04/25	

07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
CT: 21/11/24	Laborables: 50 días	TT: 09/01/25	
CTA: vie 07/03/25	Holgura: 106 días	TTA: mié 30/04/25	

07.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS			
CT: 21/11/24	Laborables: 5 días	TT: 25/11/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 156 días	TTA: mié 30/04/25	

07.03.02 SOBRECIMENTOS			
CT: 21/11/24	Laborables: 10 días	TT: 30/11/24	
CTA: vie 07/03/25	Holgura: 106 días	TTA: dom 16/03/25	

07.03.03 SARDINEL DE DUCHA			
CT: 31/12/24	Laborables: 10 días	TT: 09/01/25	
CTA: mié 16/04/25	Holgura: 106 días	TTA: vie 25/04/25	

07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
CT: 01/12/24	Laborables: 20 días	TT: 20/12/24	
CTA: lun 17/03/25	Holgura: 106 días	TTA: mié 30/04/25	

07.04.01 VIGAS COLLARIN			
CT: 11/12/24	Laborables: 10 días	TT: 20/12/24	
CTA: jue 27/03/25	Holgura: 106 días	TTA: mié 30/04/25	

07.04.02 COLUMNETA DE CONFINAMIENTO			
CT: 01/12/24	Laborables: 10 días	TT: 10/12/24	
CTA: lun 17/03/25	Holgura: 106 días	TTA: vie 25/04/25	

07.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA			
CT: 01/12/24	Laborables: 5 días	TT: 05/12/24	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 141 días	TTA: vie 25/04/25	

07.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS			
CT: 21/12/24	Laborables: 25 días	TT: 14/01/25	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 106 días	TTA: mié 30/04/25	

07.07 PISOS Y PAVIMENTOS			
CT: 21/12/24	Laborables: 20 días	TT: 09/01/25	
CTA: dom 06/04/25	Holgura: 106 días	TTA: mié 30/04/25	

07.08 CARPINTERIA METALICA			
CT: 31/12/24	Laborables: 5 días	TT: 04/01/25	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 111 días	TTA: mié 30/04/25	

07.09 COBERTURA DE CASETA			
CT: 21/12/24	Laborables: 15 días	TT: 04/01/25	
CTA: vie 11/04/25	Holgura: 111 días	TTA: vie 25/04/25	

07.10 CERRAJERIA			
CT: 05/01/25	Laborables: 5 días	TT: 09/01/25	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 111 días	TTA: mié 30/04/25	

07.11 PINTURA			
CT: 30/12/24	Laborables: 15 días	TT: 09/01/25	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 111 días	TTA: mié 30/04/25	


07.12 INSTALACIONES SANITARIAS			
CT: 16/11/24	Laborables: 25 días	TT: 10/12/24	
CTA: mié 16/04/25	Holgura: 141 días	TTA: mié 30/04/25	

07.13 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40x60CM			
CT: 06/11/24	Laborables: 25 días	TT: 30/11/24	
CTA: dom 06/04/25	Holgura: 151 días	TTA: mié 30/04/25	

07.14 TRAMPA DE NATAS Y SOLIDOS			
CT: 06/11/24	Laborables: 25 días	TT: 30/11/24	
CTA: dom 06/04/25	Holgura: 151 días	TTA: mié 30/04/25	

07.15 INSTALACIONES ELECTRICAS			
CT: 06/12/24	Laborables: 5 días	TT: 10/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 141 días	TTA: mié 30/04/25	

08 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO LOCALIDAD DE UCHUCCO  
CT: 01/11/24 Laborables: 75 días TT: 14/01/25  
CTA: vie 01/11/24 Holgura: 0 días TTA: mié 30/04/25

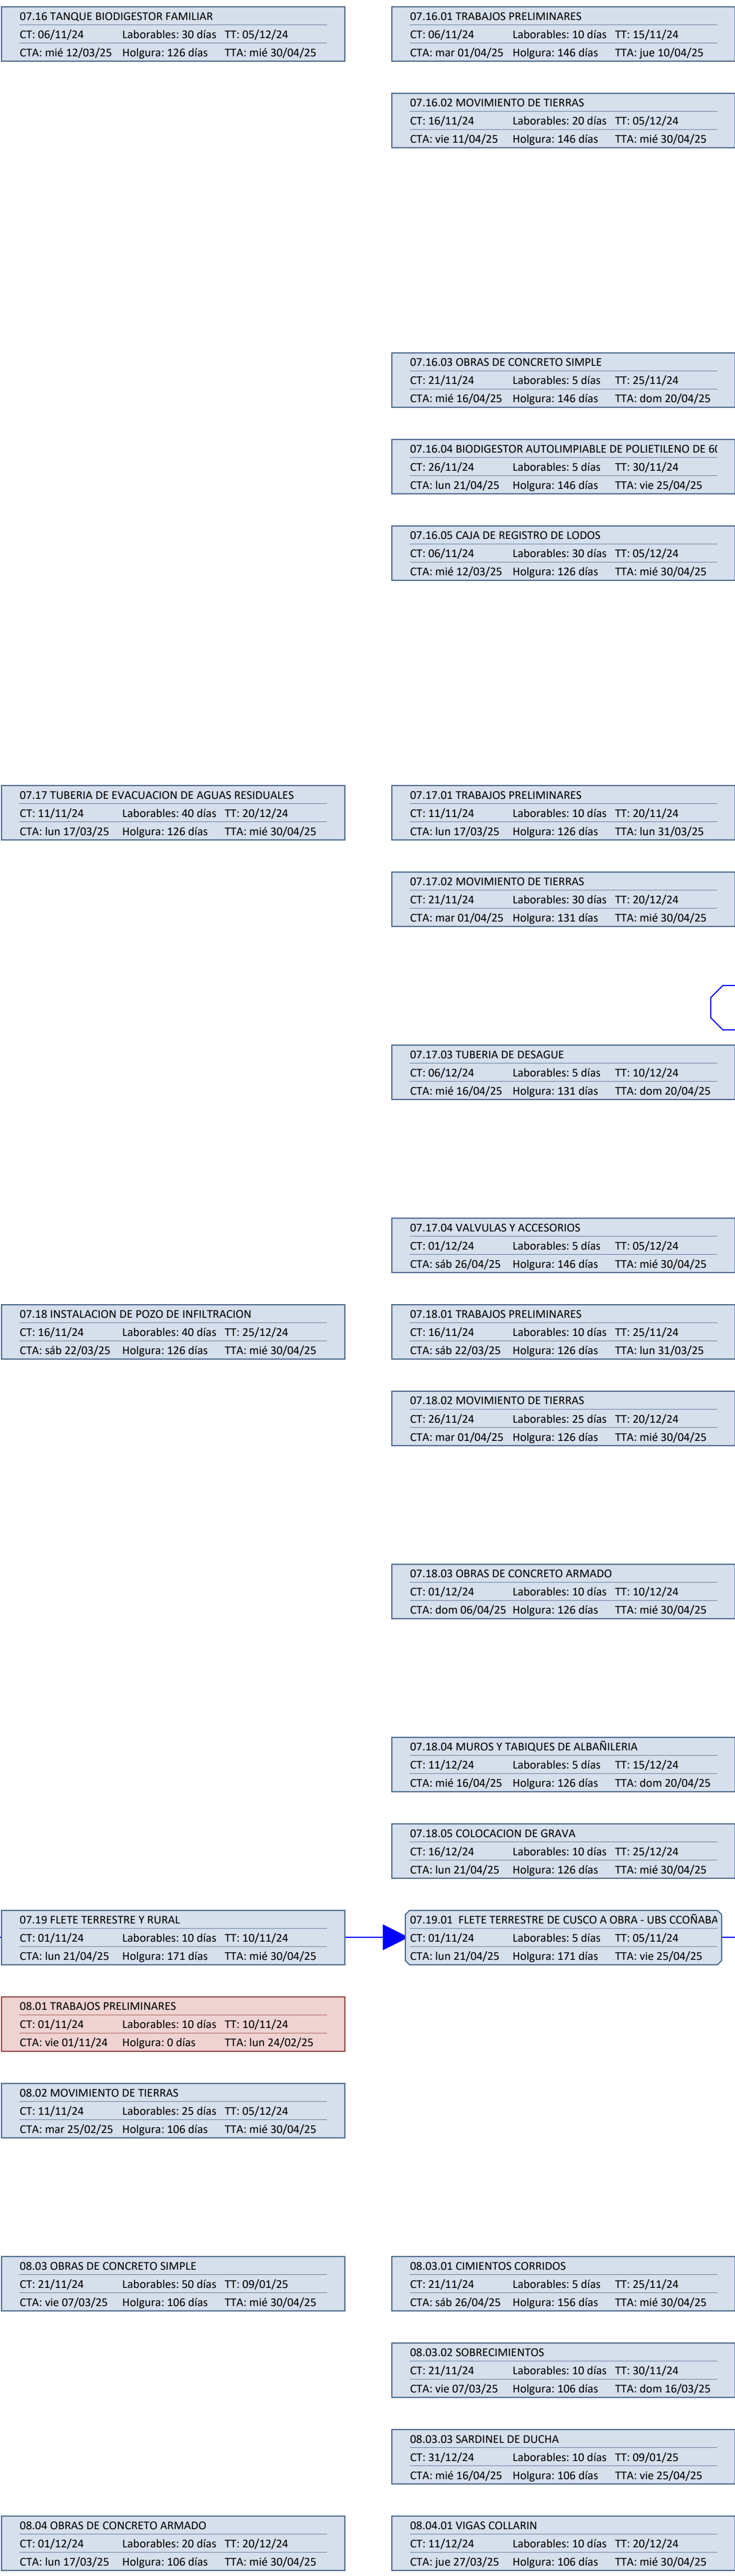

08.04.02 COLUMNETA DE CONFINAMIENTO
CT: 01/12/24      Laborables: 10 días    TT: 10/12/24
CTA: lun 17/03/25    Holgura: 106 días    TTA: mié 30/04/25

08.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA
CT: 01/12/24      Laborables: 5 días    TT: 05/12/24
CTA: lun 21/04/25    Holgura: 141 días    TTA: vie 25/04/25

08.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
CT: 21/12/24      Laborables: 25 días    TT: 14/01/25
CTA: lun 21/04/25    Holgura: 106 días    TTA: mié 30/04/25

08.07 PISOS Y PAVIMENTOS
CT: 21/12/24      Laborables: 20 días    TT: 09/01/25
CTA: dom 06/04/25    Holgura: 106 días    TTA: mié 30/04/25

08.08 CARPINTERÍA METÁLICA
CT: 31/12/24      Laborables: 5 días    TT: 04/01/25
CTA: lun 21/04/25    Holgura: 111 días    TTA: mié 30/04/25

08.09 COBERTURA DE CASETA
CT: 21/12/24      Laborables: 15 días    TT: 04/01/25
CTA: mié 16/04/25    Holgura: 116 días    TTA: mié 30/04/25

08.10 CERRAJERÍA
CT: 05/01/25      Laborables: 5 días    TT: 09/01/25
CTA: sáb 26/04/25    Holgura: 111 días    TTA: mié 30/04/25

08.11 PINTURA
CT: 26/12/24      Laborables: 15 días    TT: 09/01/25
CTA: sáb 26/04/25    Holgura: 111 días    TTA: mié 30/04/25

08.12 INSTALACIONES SANITARIAS
CT: 16/11/24      Laborables: 50 días    TT: 04/01/25
CTA: mié 16/04/25    Holgura: 116 días    TTA: mié 30/04/25

08.13 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X60CM
CT: 06/11/24      Laborables: 25 días    TT: 30/11/24
CTA: dom 06/04/25    Holgura: 151 días    TTA: mié 30/04/25

08.14 TRAMPA DE NATAS Y SÓLIDOS
CT: 06/11/24      Laborables: 25 días    TT: 30/11/24
CTA: dom 06/04/25    Holgura: 151 días    TTA: mié 30/04/25

08.15 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CT: 06/11/24      Laborables: 5 días    TT: 10/12/24
CTA: sáb 26/04/25    Holgura: 141 días    TTA: mié 30/04/25

08.16 TANQUE BIODIGESTOR FAMILIAR
CT: 06/11/24      Laborables: 30 días    TT: 05/12/24
CTA: lun 17/03/25    Holgura: 131 días    TTA: mié 30/04/25

08.16.01 TRABAJOS PRELIMINARES
CT: 06/11/24      Laborables: 10 días    TT: 15/11/24
CTA: mar 01/04/25    Holgura: 146 días    TTA: jue 10/04/25

08.16.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CT: 16/11/24      Laborables: 20 días    TT: 05/12/24
CTA: vie 11/04/25    Holgura: 146 días    TTA: mié 30/04/25

08.16.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CT: 21/11/24      Laborables: 5 días    TT: 25/11/24
CTA: mié 16/04/25    Holgura: 146 días    TTA: dom 20/04/25

08.16.04 BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE POLIÉTFENO DE 6l
CT: 26/11/24      Laborables: 5 días    TT: 30/11/24
CTA: lun 21/04/25    Holgura: 146 días    TTA: vie 25/04/25



09 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO LOCALIDAD DE UYLLULLI
CT: 01/11/24      Laborables: 75 días    TT: 14/01/25
CTA: vie 01/11/24    Holgura: 0 días      TTA: mié 30/04/25

08.17 TUBERIA DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES
CT: 11/11/24      Laborables: 40 días    TT: 20/12/24
CTA: sáb 22/03/25    Holgura: 131 días    TTA: mié 30/04/25

08.18 INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION
CT: 16/11/24      Laborables: 35 días    TT: 20/12/24
CTA: jue 27/03/25    Holgura: 131 días    TTA: mié 30/04/25

09.01 TRABAJOS PRELIMINARES
CT: 01/11/24      Laborables: 10 días    TT: 10/11/24
CTA: vie 01/11/24    Holgura: 0 días      TTA: lun 24/02/25

09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CT: 11/11/24      Laborables: 25 días    TT: 05/12/24
CTA: mar 25/03/25    Holgura: 106 días    TTA: mié 30/04/25

09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CT: 21/11/24      Laborables: 50 días    TT: 09/01/25
CTA: vie 07/03/25    Holgura: 106 días    TTA: mié 30/04/25

09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CT: 01/12/24      Laborables: 20 días    TT: 20/12/24
CTA: lun 17/03/25    Holgura: 106 días    TTA: mié 30/04/25

09.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
CT: 01/12/24      Laborables: 5 días    TT: 05/12/24
CTA: lun 21/04/25    Holgura: 141 días    TTA: vie 25/04/25

09.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
CT: 21/12/24      Laborables: 25 días    TT: 14/01/25
CTA: lun 21/04/25    Holgura: 106 días    TTA: mié 30/04/25

08.16.05 CAJA DE REGISTRO DE LODOS
CT: 06/11/24      Laborables: 30 días    TT: 05/12/24
CTA: lun 17/03/25    Holgura: 131 días    TTA: mié 30/04/25

08.17.01 TRABAJOS PRELIMINARES
CT: 11/11/24      Laborables: 10 días    TT: 20/11/24
CTA: sáb 22/03/25    Holgura: 131 días    TTA: lun 31/03/25

08.17.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CT: 21/11/24      Laborables: 30 días    TT: 20/12/24
CTA: mar 01/04/25    Holgura: 131 días    TTA: mié 30/04/25

08.17.03 TUBERIA DE DESAGUE
CT: 06/12/24      Laborables: 5 días    TT: 10/12/24
CTA: mié 16/04/25    Holgura: 131 días    TTA: mié 30/04/25

08.17.04 VALVULAS Y ACCESORIOS
CT: 01/12/24      Laborables: 5 días    TT: 05/12/24
CTA: sáb 26/04/25    Holgura: 146 días    TTA: mié 30/04/25

08.18.01 TRABAJOS PRELIMINARES
CT: 16/11/24      Laborables: 10 días    TT: 25/11/24
CTA: jue 27/03/25    Holgura: 131 días    TTA: sáb 05/04/25

08.18.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CT: 26/11/24      Laborables: 25 días    TT: 20/12/24
CTA: dom 06/04/25    Holgura: 131 días    TTA: mié 30/04/25

08.18.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CT: 01/12/24      Laborables: 10 días    TT: 10/12/24
CTA: vie 11/04/25    Holgura: 131 días    TTA: mié 30/04/25

08.18.04 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
CT: 11/12/24      Laborables: 5 días    TT: 15/12/24
CTA: lun 21/04/25    Holgura: 131 días    TTA: vie 25/04/25

08.18.05 COLOCACION DE GRAVA
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días    TT: 20/12/24
CTA: sáb 26/04/25    Holgura: 131 días    TTA: mié 30/04/25

08.19.01 FLETE TERRESTRE DE CUSCO A OBRA - UBS UCHUCO
CT: 01/11/24      Laborables: 5 días    TT: 05/11/24
CTA: lun 21/04/25    Holgura: 171 días    TTA: vie 25/04/25

08.19.02 FLETE RURAL DE ALMACEN A PIE DE OBRA - UBS UCHUCO
CT: 06/11/24      Laborables: 5 días    TT: 10/11/24
CTA: sáb 26/04/25    Holgura: 171 días    TTA: mié 30/04/25

09.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS
CT: 21/11/24      Laborables: 5 días    TT: 25/11/24
CTA: sáb 26/04/25    Holgura: 156 días    TTA: mié 30/04/25

09.03.02 SOBRECIMENTOS
CT: 21/11/24      Laborables: 10 días    TT: 30/11/24
CTA: vie 07/03/25    Holgura: 106 días    TTA: dom 16/03/25

09.03.03 SARDINEL DE DUCHA
CT: 31/12/24      Laborables: 10 días    TT: 09/01/25
CTA: mié 16/04/25    Holgura: 106 días    TTA: vie 25/04/25

09.04.01 VIGAS COLLARIN
CT: 11/12/24      Laborables: 10 días    TT: 20/12/24
CTA: jue 27/03/25    Holgura: 106 días    TTA: mié 30/04/25

09.04.02 COLUMNETA DE CONFINAMIENTO
CT: 01/12/24      Laborables: 10 días    TT: 10/12/24
CTA: lun 17/03/25    Holgura: 106 días    TTA: mié 30/04/25

09.07 PISOS Y PAVIMENTOS			
CT: 23/12/24	Laborables: 20 días	TT: 09/01/25	
CTA: dom 06/04/25	Holgura: 106 días	TTA: mié 30/04/25	

09.08 CARPINTERIA METALICA			
CT: 31/12/24	Laborables: 5 días	TT: 04/01/25	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 111 días	TTA: mié 30/04/25	

09.09 COBERTURA DE CASETA			
CT: 21/12/24	Laborables: 15 días	TT: 04/01/25	
CTA: mié 16/04/25	Holgura: 116 días	TTA: mié 30/04/25	

09.10 CERRAJERIA			
CT: 05/01/25	Laborables: 5 días	TT: 09/01/25	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 111 días	TTA: mié 30/04/25	

09.11 PINTURA			
CT: 26/12/24	Laborables: 15 días	TT: 09/01/25	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 111 días	TTA: mié 30/04/25	

09.12 INSTALACIONES SANITARIAS			
CT: 16/11/24	Laborables: 25 días	TT: 04/01/25	
CTA: mié 16/04/25	Holgura: 116 días	TTA: mié 30/04/25	

09.13 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40x60CM			
CT: 06/11/24	Laborables: 25 días	TT: 30/11/24	
CTA: lun 17/03/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

09.14 TRAMPA DE NATAS Y SOLIDOS			
CT: 06/11/24	Laborables: 25 días	TT: 30/11/24	
CTA: dom 06/04/25	Holgura: 151 días	TTA: mié 30/04/25	

09.15 INSTALACIONES ELECTRICAS			
CT: 06/12/24	Laborables: 5 días	TT: 10/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 141 días	TTA: mié 30/04/25	

09.16 TANQUE BIODIGESTOR FAMILIAR			
CT: 06/11/24	Laborables: 30 días	TT: 05/12/24	
CTA: mar 01/04/25	Holgura: 146 días	TTA: mié 30/04/25	

09.16.01 TRABAJOS PRELIMINARES			
CT: 06/11/24	Laborables: 10 días	TT: 15/11/24	
CTA: mar 01/04/25	Holgura: 146 días	TTA: jue 10/04/25	

09.16.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
CT: 16/11/24	Laborables: 20 días	TT: 05/12/24	
CTA: vie 11/04/25	Holgura: 146 días	TTA: mié 30/04/25	

09.16.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
CT: 21/11/24	Laborables: 5 días	TT: 25/11/24	
CTA: mié 16/04/25	Holgura: 146 días	TTA: dom 20/04/25	

09.16.04 BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE POLIETILENO DE 6l			
CT: 26/11/24	Laborables: 5 días	TT: 30/11/24	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 146 días	TTA: vie 25/04/25	

09.16.05 CAJA DE REGISTRO DE LODOS			
CT: 06/11/24	Laborables: 30 días	TT: 05/12/24	
CTA: mar 01/04/25	Holgura: 146 días	TTA: mié 30/04/25	

09.17 TUBERIA DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES			
CT: 11/11/24	Laborables: 36 días	TT: 16/12/24	
CTA: sáb 22/03/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

09.17.01 TRABAJOS PRELIMINARES			
CT: 11/11/24	Laborables: 10 días	TT: 20/11/24	
CTA: sáb 22/03/25	Holgura: 131 días	TTA: vie 04/04/25	

09.17.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
CT: 21/11/24	Laborables: 26 días	TT: 16/12/24	
CTA: sáb 05/04/25	Holgura: 135 días	TTA: mié 30/04/25	

09.17.03 TUBERIA DE DESAGUE			
CT: 02/12/24	Laborables: 5 días	TT: 06/12/24	
CTA: mié 16/04/25	Holgura: 135 días	TTA: mié 30/04/25	

10 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO LOCALIDAD DE HUATTA			
CT: 01/11/24	Laborables: 75 días	TT: 14/01/25	
CTA: vie 01/11/24	Holgura: 0 días	TTA: mié 30/04/25	

09.18 INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION			
CT: 18/11/24	Laborables: 35 días	TT: 20/12/24	
CTA: jue 27/03/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

09.17.04 VALVULAS Y ACCESORIOS			
CT: 27/11/24	Laborables: 5 días	TT: 01/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 150 días	TTA: mié 30/04/25	

09.18.01 TRABAJOS PRELIMINARES			
CT: 16/11/24	Laborables: 10 días	TT: 25/11/24	
CTA: jue 27/03/25	Holgura: 131 días	TTA: sáb 05/04/25	

09.18.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
CT: 26/11/24	Laborables: 25 días	TT: 20/12/24	
CTA: dom 06/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

09.18.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
CT: 01/12/24	Laborables: 10 días	TT: 10/12/24	
CTA: vie 11/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

09.18.04 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA			
CT: 11/12/24	Laborables: 5 días	TT: 15/12/24	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 131 días	TTA: vie 25/04/25	

09.18.05 COLOCACION DE GRAVA			
CT: 16/12/24	Laborables: 5 días	TT: 20/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

09.19 FLETE TERRESTRE Y RURAL			
CT: 01/11/24	Laborables: 10 días	TT: 10/11/24	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 171 días	TTA: mié 30/04/25	

09.19.01 FLETE TERRESTRE DE CUSCO A OBRA - UBS UYLLULLU			
CT: 01/11/24	Laborables: 5 días	TT: 05/11/24	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 171 días	TTA: vie 25/04/25	

09.19.02 FLETE RURAL DE ALMACEN A PIE DE OBRA - UBS UYL			
CT: 06/11/24	Laborables: 5 días	TT: 10/11/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 171 días	TTA: mié 30/04/25	

10.01 TRABAJOS PRELIMINARES			
CT: 01/11/24	Laborables: 10 días	TT: 10/11/24	
CTA: vie 01/11/24	Holgura: 0 días	TTA: lun 24/02/25	

10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
CT: 11/11/24	Laborables: 25 días	TT: 05/12/24	
CTA: mar 25/02/25	Holgura: 106 días	TTA: mié 30/04/25	

10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
CT: 21/11/24	Laborables: 50 días	TT: 09/01/25	
CTA: vie 07/03/25	Holgura: 106 días	TTA: mié 30/04/25	

10.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS			
CT: 21/11/24	Laborables: 5 días	TT: 25/11/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 156 días	TTA: mié 30/04/25	

10.03.02 SOBRECIMENTOS			
CT: 21/11/24	Laborables: 10 días	TT: 30/11/24	
CTA: vie 07/03/25	Holgura: 106 días	TTA: dom 16/03/25	

10.03.03 SARDINEL DE DUCHA			
CT: 31/12/24	Laborables: 10 días	TT: 09/01/25	
CTA: mié 16/04/25	Holgura: 106 días	TTA: vie 25/04/25	

10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
CT: 01/12/24	Laborables: 20 días	TT: 20/12/24	
CTA: lun 17/03/25	Holgura: 106 días	TTA: mié 30/04/25	

10.04.01 VIGAS COLLARIN			
CT: 11/12/24	Laborables: 10 días	TT: 20/12/24	
CTA: jue 27/03/25	Holgura: 106 días	TTA: mié 30/04/25	

10.04.02 COLUMNETA DE CONFINAMIENTO			
CT: 01/12/24	Laborables: 10 días	TT: 10/12/24	
CTA: lun 27/03/25	Holgura: 106 días	TTA: mié 30/04/25	

10.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA			
CT: 01/12/24	Laborables: 5 días	TT: 05/12/24	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 141 días	TTA: vie 25/04/25	

10.06 REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLDURAS			
CT: 06/12/24	Laborables: 40 días	TT: 14/01/25	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 106 días	TTA: mié 30/04/25	

10.07 PISOS Y PAVIMENTOS			
CT: 21/12/24	Laborables: 20 días	TT: 09/01/25	
CTA: dom 06/04/25	Holgura: 106 días	TTA: mié 30/04/25	

10.08 CARPINTERIA METALICA			
CT: 31/12/24	Laborables: 5 días	TT: 04/01/25	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 111 días	TTA: mié 30/04/25	

10.09 COBERTURA DE CASETA			
CT: 21/12/24	Laborables: 15 días	TT: 04/01/25	
CTA: mié 16/04/25	Holgura: 116 días	TTA: mié 30/04/25	



10.10 CERRAJERIA			
CT: 05/01/25	Laborables: 5 días	TT: 09/01/25	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 111 días	TTA: mié 30/04/25	

10.11 PINTURA			
CT: 36/12/24	Laborables: 15 días	TT: 09/01/25	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 111 días	TTA: mié 30/04/25	

10.12 INSTALACIONES SANITARIAS			
CT: 16/11/24	Laborables: 50 días	TT: 04/01/25	
CTA: mié 16/04/25	Holgura: 116 días	TTA: mié 30/04/25	

10.13 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40x60CM			
CT: 06/11/24	Laborables: 25 días	TT: 30/11/24	
CTA: dom 06/04/25	Holgura: 151 días	TTA: mié 30/04/25	

10.14 TRAMPA DE NATAS Y SOLIDOS			
CT: 06/11/24	Laborables: 25 días	TT: 30/11/24	
CTA: dom 06/04/25	Holgura: 151 días	TTA: mié 30/04/25	

10.15 INSTALACIONES ELECTRICAS			
CT: 06/12/24	Laborables: 5 días	TT: 10/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 141 días	TTA: mié 30/04/25	

10.16 TANQUE BIODIGESTOR FAMILIAR			
CT: 06/11/24	Laborables: 30 días	TT: 05/12/24	
CTA: lun 17/03/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

10.16.01 TRABAJOS PRELIMINARES			
CT: 06/11/24	Laborables: 10 días	TT: 15/11/24	
CTA: mar 01/04/25	Holgura: 146 días	TTA: jue 10/04/25	

10.16.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
CT: 16/11/24	Laborables: 20 días	TT: 05/12/24	
CTA: vie 11/04/25	Holgura: 146 días	TTA: mié 30/04/25	

10.16.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
CT: 21/11/24	Laborables: 5 días	TT: 25/11/24	
CTA: mié 16/04/25	Holgura: 146 días	TTA: dom 20/04/25	

10.16.04 BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE POLIETILENO DE 6l			
CT: 26/11/24	Laborables: 5 días	TT: 30/11/24	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 146 días	TTA: vie 25/04/25	

10.16.05 CAJA DE REGISTRO DE LODOS			
CT: 06/11/24	Laborables: 30 días	TT: 05/12/24	
CTA: lun 17/03/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

10.17 TUBERIA DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES			
CT: 11/11/24	Laborables: 40 días	TT: 20/12/24	
CTA: sáb 22/03/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

10.17.01 TRABAJOS PRELIMINARES			
CT: 11/11/24	Laborables: 10 días	TT: 20/11/24	
CTA: sáb 22/03/25	Holgura: 131 días	TTA: lun 31/03/25	

10.17.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
CT: 21/11/24	Laborables: 30 días	TT: 20/12/24	
CTA: mar 01/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

10.17.03 TUBERIA DE DESAGUE			
CT: 06/12/24	Laborables: 5 días	TT: 10/12/24	
CTA: mié 16/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

10.17.04 VALVULAS Y ACCESORIOS			
CT: 01/12/24	Laborables: 5 días	TT: 05/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 146 días	TTA: mié 30/04/25	

10.18 INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION			
CT: 16/11/24	Laborables: 35 días	TT: 20/12/24	
CTA: jue 27/03/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

10.18.01 TRABAJOS PRELIMINARES			
CT: 16/11/24	Laborables: 10 días	TT: 25/11/24	
CTA: jue 27/03/25	Holgura: 131 días	TTA: sáb 05/04/25	

10.18.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
CT: 26/11/24	Laborables: 25 días	TT: 20/12/24	
CTA: dom 06/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

10.18.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
CT: 01/12/24	Laborables: 10 días	TT: 10/12/24	
CTA: vie 11/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

11 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO LOCALIDAD DE OCCORAC			
CT: 01/11/24	Laborables: 75 días	TT: 14/01/25	
CTA: vie 01/11/24	Holgura: 0 días	TTA: mié 30/04/25	



11.14 TRAMPA DE NATAS Y SÓLIDOS			
CT: 06/11/24	Laborables: 25 días	TT: 30/11/24	
CTA: dom 06/04/25	Holgura: 151 días	TTA: mié 30/04/25	

11.15 INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
CT: 06/12/24	Laborables: 5 días	TT: 10/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 141 días	TTA: mié 30/04/25	

11.16 TANQUE BIODIGESTOR FAMILIAR			
CT: 06/11/24	Laborables: 30 días	TT: 05/12/24	
CTA: lun 17/03/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

11.16.01 TRABAJOS PRELIMINARES			
CT: 06/11/24	Laborables: 10 días	TT: 15/11/24	
CTA: mar 01/04/25	Holgura: 146 días	TTA: jue 10/04/25	

11.16.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
CT: 16/11/24	Laborables: 20 días	TT: 05/12/24	
CTA: vie 11/04/25	Holgura: 146 días	TTA: mié 30/04/25	

11.16.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
CT: 21/11/24	Laborables: 5 días	TT: 25/11/24	
CTA: mié 16/04/25	Holgura: 146 días	TTA: dom 20/04/25	

11.16.04 BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE POLIÉTFLENO DE 6l			
CT: 26/11/24	Laborables: 5 días	TT: 30/11/24	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 146 días	TTA: vie 25/04/25	

11.16.05 CAJA DE REGISTRO DE LODOS			
CT: 06/11/24	Laborables: 30 días	TT: 05/12/24	
CTA: lun 17/03/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

11.17 TUBERÍA DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES			
CT: 11/11/24	Laborables: 40 días	TT: 20/12/24	
CTA: sáb 22/03/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

11.17.01 TRABAJOS PRELIMINARES			
CT: 11/11/24	Laborables: 10 días	TT: 20/11/24	
CTA: sáb 22/03/25	Holgura: 131 días	TTA: lun 31/03/25	

11.17.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
CT: 21/11/24	Laborables: 30 días	TT: 20/12/24	
CTA: mar 01/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

11.17.03 TUBERÍA DE DESAGUE			
CT: 06/12/24	Laborables: 5 días	TT: 10/12/24	
CTA: mié 16/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

11.17.04 VALVULAS Y ACCESORIOS			
CT: 01/12/24	Laborables: 5 días	TT: 05/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 146 días	TTA: mié 30/04/25	

11.18 INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION			
CT: 16/11/24	Laborables: 35 días	TT: 20/12/24	
CTA: jue 27/03/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

11.18.01 TRABAJOS PRELIMINARES			
CT: 16/11/24	Laborables: 10 días	TT: 25/11/24	
CTA: jue 27/03/25	Holgura: 131 días	TTA: sáb 05/04/25	

11.18.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
CT: 26/11/24	Laborables: 25 días	TT: 20/12/24	
CTA: dom 06/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

11.18.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
CT: 01/12/24	Laborables: 10 días	TT: 10/12/24	
CTA: vie 11/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

11.18.04 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA			
CT: 11/12/24	Laborables: 5 días	TT: 15/12/24	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 131 días	TTA: vie 25/04/25	

11.18.05 COLOCACION DE GRAVA			
CT: 16/12/24	Laborables: 5 días	TT: 20/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

11.19 FLETE TERRESTRE Y RURAL			
CT: 01/11/24	Laborables: 85 días	TT: 10/11/24	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 0 días	TTA: mié 30/04/25	

11.19.01 FLETE TERRESTRE DE CUSCO A OBRA - UBS HUATTA			
CT: 01/11/24	Laborables: 5 días	TT: 05/11/24	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 171 días	TTA: vie 25/04/25	

11.19.02 FLETE RURAL DE ALMACEN A PIE DE OBRA - UBS OCC			
CT: 06/11/24	Laborables: 5 días	TT: 10/11/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 171 días	TTA: mié 30/04/25	

12 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO LOCALIDAD DE TUCUYA			
CT: 01/11/24	Laborables: 85 días	TT: 24/01/25	
CTA: vie 01/11/24	Holgura: 0 días	TTA: mié 30/04/25	

12.01 TRABAJOS PRELIMINARES			
CT: 01/11/24	Laborables: 10 días	TT: 10/11/24	
CTA: vie 01/11/24	Holgura: 0 días	TTA: vie 14/02/25	



12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
CT: 11/11/24	Laborables: 20 días	TT: 30/11/24	
CTA: sáb 15/02/25	Holgura: 96 días	TTA: mié 30/04/25	

12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
CT: 21/11/24	Laborables: 45 días	TT: 04/01/25	
CTA: mar 25/02/25	Holgura: 96 días	TTA: mié 30/04/25	

12.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS			
CT: 21/11/24	Laborables: 5 días	TT: 25/11/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 156 días	TTA: mié 30/04/25	

12.03.02 SOBRECIMENTOS			
CT: 21/11/24	Laborables: 5 días	TT: 25/11/24	
CTA: mar 25/02/25	Holgura: 96 días	TTA: sáb 01/03/25	

12.03.03 SARDINEL DE DUCHA			
CT: 26/12/24	Laborables: 10 días	TT: 04/01/25	
CTA: mar 01/04/25	Holgura: 96 días	TTA: vie 25/04/25	

12.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
CT: 26/11/24	Laborables: 20 días	TT: 15/12/24	
CTA: dom 02/03/25	Holgura: 96 días	TTA: mié 30/04/25	

12.04.01 VIGAS COLLARIN			
CT: 06/12/24	Laborables: 10 días	TT: 15/12/24	
CTA: mié 12/03/25	Holgura: 96 días	TTA: mié 30/04/25	

12.04.02 COLUMNETA DE CONFINAMIENTO			
CT: 26/11/24	Laborables: 10 días	TT: 05/12/24	
CTA: dom 02/03/25	Holgura: 96 días	TTA: mié 30/04/25	

12.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA			
CT: 26/11/24	Laborables: 5 días	TT: 30/11/24	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 146 días	TTA: vie 25/04/25	

12.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS			
CT: 16/12/24	Laborables: 25 días	TT: 09/01/25	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 111 días	TTA: mié 30/04/25	

12.07 PISOS Y PAVIMENTOS			
CT: 16/12/24	Laborables: 20 días	TT: 04/01/25	
CTA: sáb 22/03/25	Holgura: 96 días	TTA: mié 30/04/25	

12.08 CARPINTERIA METALICA			
CT: 26/12/24	Laborables: 5 días	TT: 30/12/24	
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 116 días	TTA: mié 30/04/25	

12.09 COBERTURA DE CASETA			
CT: 16/12/24	Laborables: 15 días	TT: 30/12/24	
CTA: vie 11/04/25	Holgura: 116 días	TTA: vie 25/04/25	

12.10 CERRAJERIA			
CT: 31/12/24	Laborables: 5 días	TT: 04/01/25	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 116 días	TTA: mié 30/04/25	


12.11 PINTURA			
CT: 21/12/24	Laborables: 15 días	TT: 04/01/25	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 116 días	TTA: mié 30/04/25	

12.12 INSTALACIONES SANITARIAS			
CT: 16/11/24	Laborables: 45 días	TT: 20/12/24	
CTA: mié 16/04/25	Holgura: 121 días	TTA: mié 30/04/25	

12.13 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40x60CM			
CT: 06/11/24	Laborables: 25 días	TT: 30/11/24	
CTA: dom 06/04/25	Holgura: 151 días	TTA: mié 30/04/25	

12.14 TRAMPA DE NATAS Y SOLIDOS			
CT: 06/11/24	Laborables: 25 días	TT: 30/11/24	
CTA: dom 06/04/25	Holgura: 151 días	TTA: mié 30/04/25	

12.15 INSTALACIONES ELECTRICAS			
CT: 01/12/24	Laborables: 5 días	TT: 05/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 146 días	TTA: mié 30/04/25	

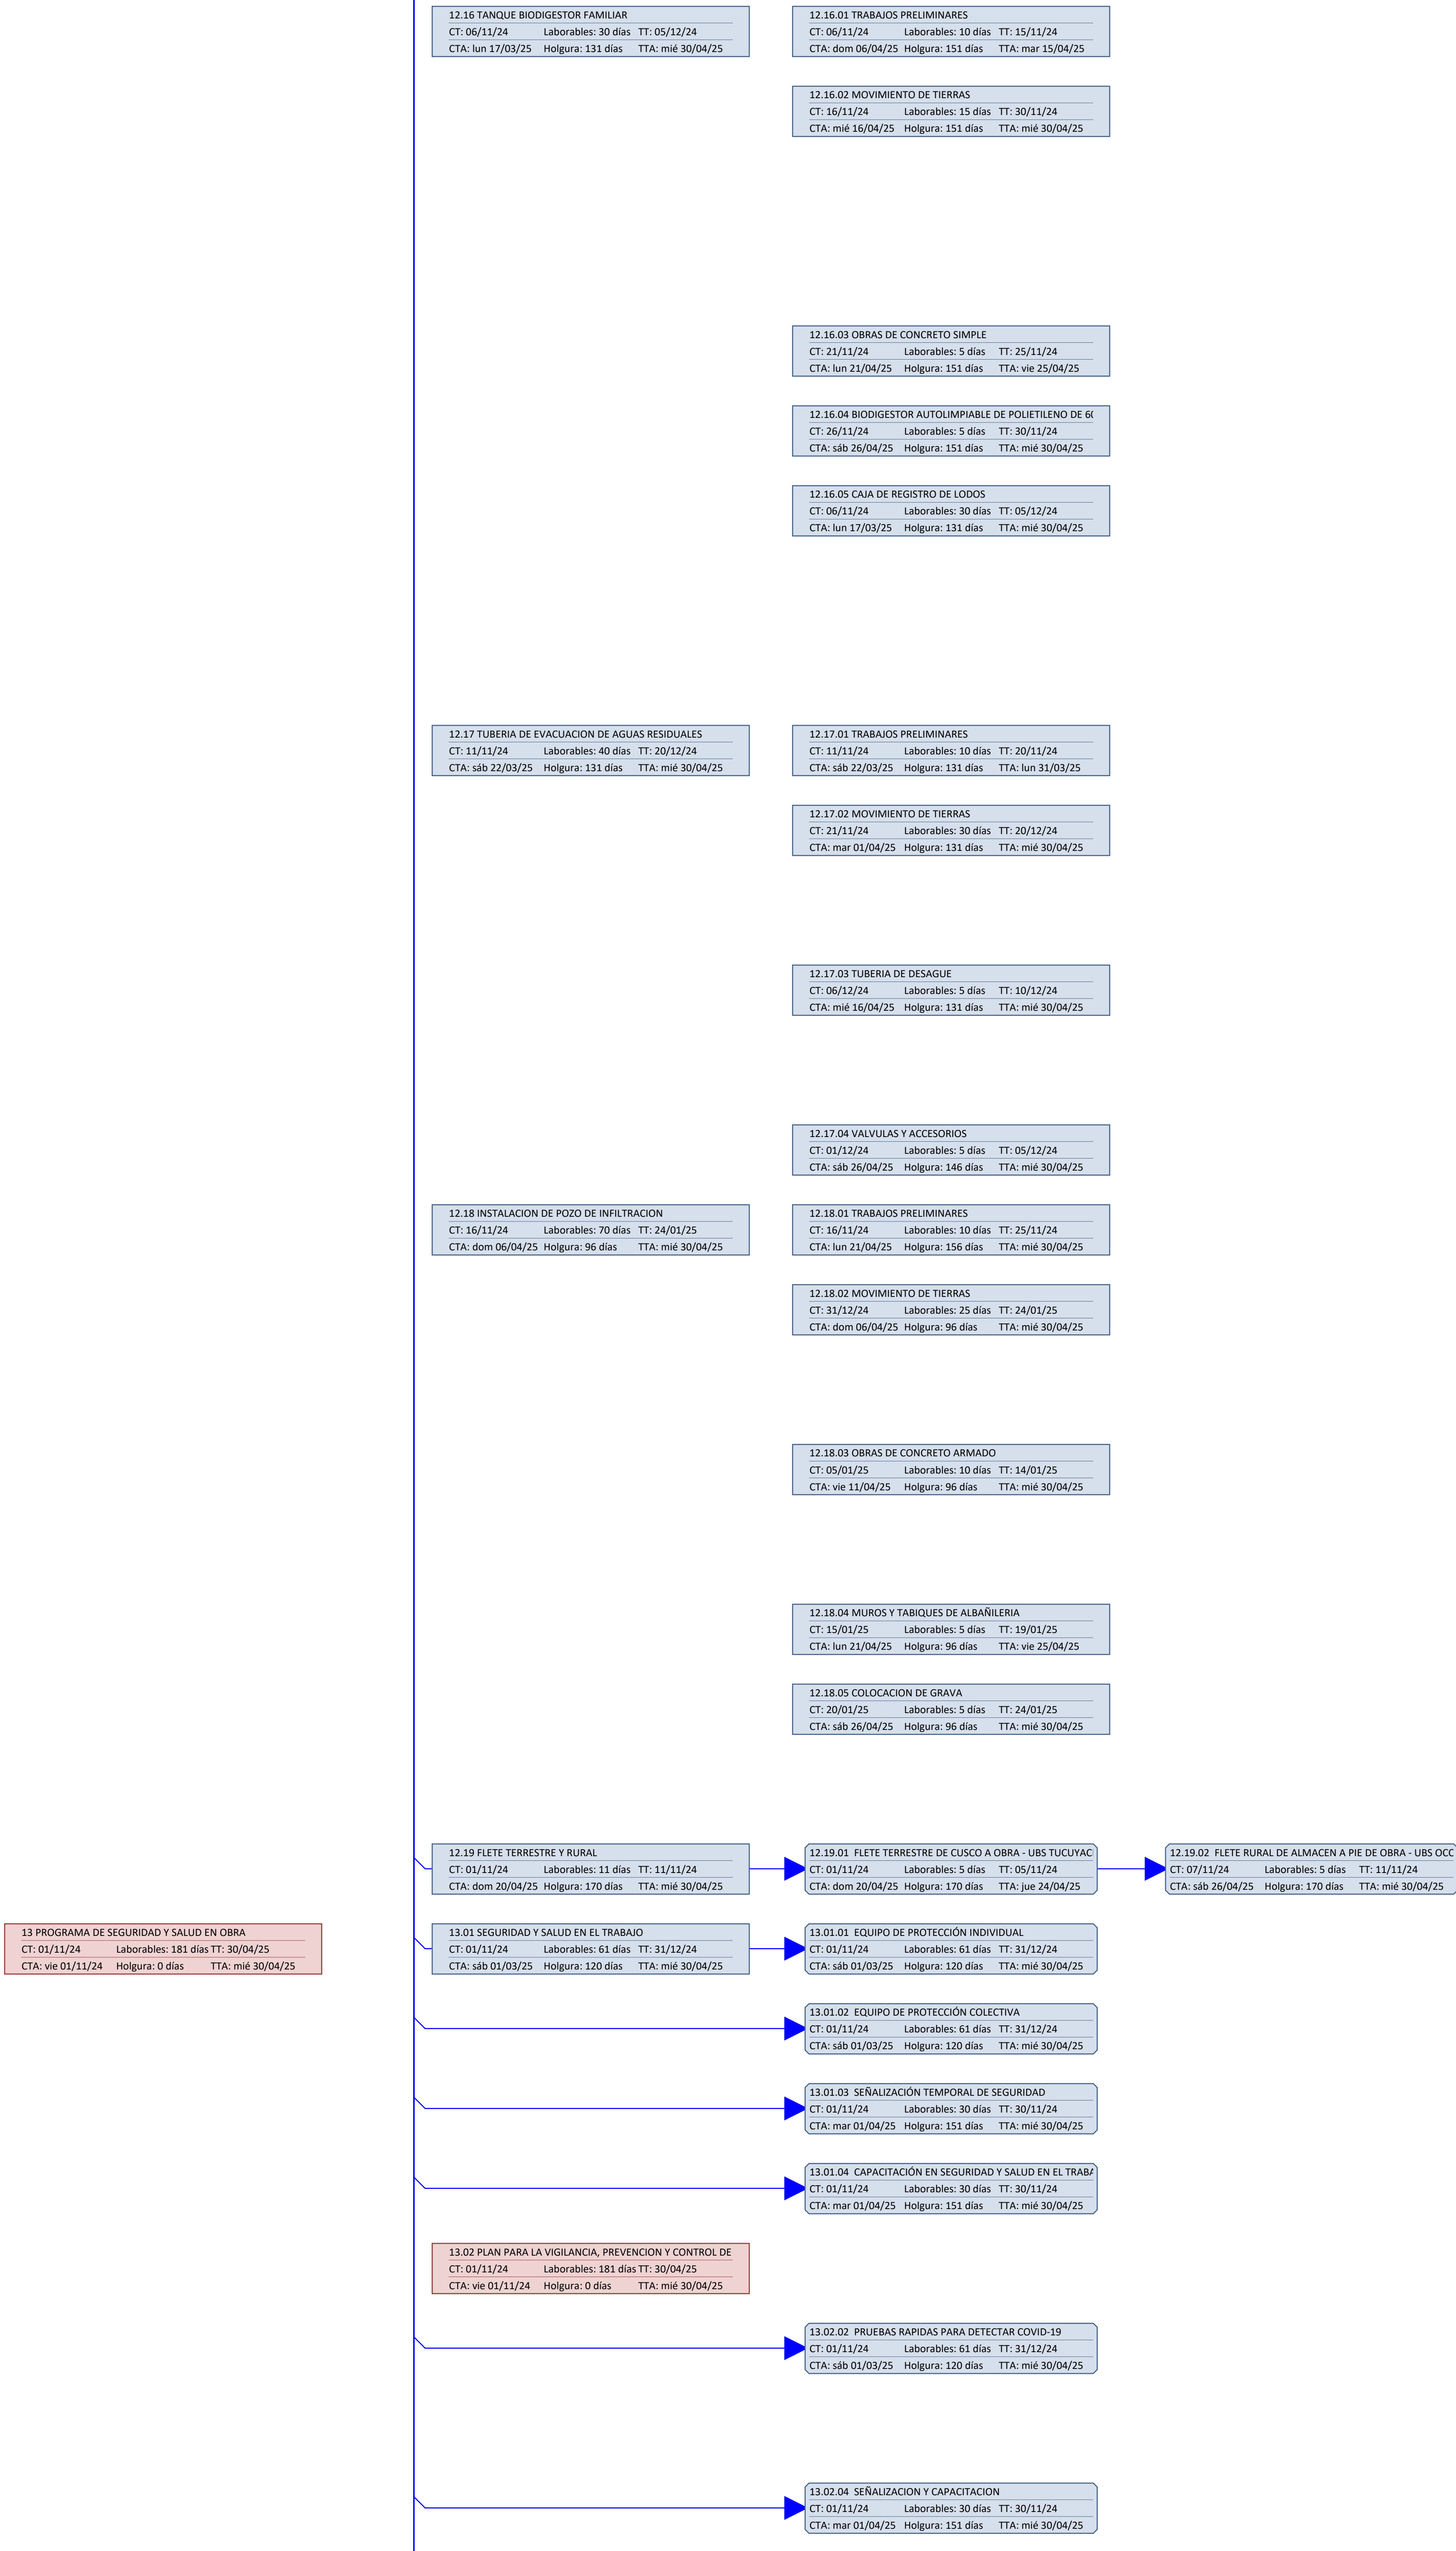

14 PROGRAMA DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL			
CT: 01/11/24	Laborables: 181 días	TT: 30/04/25	
CTA: vie 31/01/25	Holgura: 0 días	TTA: mié 30/04/25	

14.01 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA			
CT: 01/11/24	Laborables: 90 días	TT: 29/01/25	
CTA: vie 31/01/25	Holgura: 91 días	TTA: mié 30/04/25	

14.01.01 CAPACITACIÓN AMBIENTAL			
CT: 01/11/24	Laborables: 90 días	TT: 29/01/25	
CTA: vie 31/01/25	Holgura: 91 días	TTA: mié 30/04/25	

14.01.02 LETREROS INFORMATIVOS			
CT: 01/11/24	Laborables: 60 días	TT: 30/12/24	
CTA: dom 02/03/25	Holgura: 121 días	TTA: mié 30/04/25	

14.01.03 MATERIAL INFORMATIVO			
CT: 01/11/24	Laborables: 60 días	TT: 30/12/24	
CTA: dom 02/03/25	Holgura: 121 días	TTA: mié 30/04/25	

14.02 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			
CT: 01/11/24	Laborables: 60 días	TT: 30/12/24	
CTA: dom 02/03/25	Holgura: 121 días	TTA: mié 30/04/25	

14.02.01 CONTENEDORES			
CT: 01/11/24	Laborables: 60 días	TT: 30/12/24	
CTA: dom 02/03/25	Holgura: 121 días	TTA: mié 30/04/25	

14.02.02 BAÑO PERSONAL OBRERO			
CT: 01/11/24	Laborables: 60 días	TT: 30/12/24	
CTA: dom 02/03/25	Holgura: 121 días	TTA: mié 30/04/25	

14.03 PLAN DE CONTINGENCIAS			
CT: 01/11/24	Laborables: 30 días	TT: 30/11/24	
CTA: mar 01/04/25	Holgura: 151 días	TTA: mié 30/04/25	

14.03.01 EQUIPO CONTRA INCENDIOS			
CT: 01/11/24	Laborables: 30 días	TT: 30/11/24	
CTA: mar 01/04/25	Holgura: 151 días	TTA: mié 30/04/25	

14.03.02 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUIN)			
CT: 01/11/24	Laborables: 30 días	TT: 30/11/24	
CTA: mar 01/04/25	Holgura: 151 días	TTA: mié 30/04/25	

14.03.03 EQUIPO ANTIDERRAMES			
CT: 01/11/24	Laborables: 30 días	TT: 30/11/24	
CTA: mar 01/04/25	Holgura: 151 días	TTA: mié 30/04/25	

14.04 PLAN DE ABANDONO Y CIERRE DE OBRA			
CT: 26/04/25	Laborables: 5 días	TT: 30/04/25	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 0 días	TTA: mié 30/04/25	

15 EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO			
CT: 01/11/24	Laborables: 181 días	TT: 30/04/25	
CTA: vie 01/11/24	Holgura: 0 días	TTA: mié 30/04/25	

15.01 PLAN DE GESTION DEL SERVICIO			
CT: 01/11/24	Laborables: 181 días	TT: 30/04/25	
CTA: vie 01/11/24	Holgura: 0 días	TTA: mié 30/04/25	

15.02 PLAN DE EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL			
CT: 01/11/24	Laborables: 181 días	TT: 30/04/25	
CTA: vie 01/11/24	Holgura: 0 días	TTA: mié 30/04/25	


15.03 DESARROLLO DE CAPACITACIONES			
CT: 01/11/24	Laborables: 181 días	TT: 30/04/25	
CTA: vie 01/11/24	Holgura: 0 días	TTA: mié 30/04/25	


15.03.01 PERSONAL PARA DESARROLLO DE CAPACITACION			
CT: 01/11/24	Laborables: 181 días	TT: 30/04/25	
CTA: vie 01/11/24	Holgura: 0 días	TTA: mié 30/04/25	


15.04 SUPERVISION COMPONENTE SOCIAL			
CT: 01/11/24	Laborables: 181 días	TT: 30/04/25	
CTA: vie 01/11/24	Holgura: 0 días	TTA: mié 30/04/25	

15.04.01 SUPERVISION COMPONENTE SOCIAL			
CT: 01/11/24	Laborables: 181 días	TT: 30/04/25	
CTA: vie 01/11/24	Holgura: 0 días	TTA: mié 30/04/25	




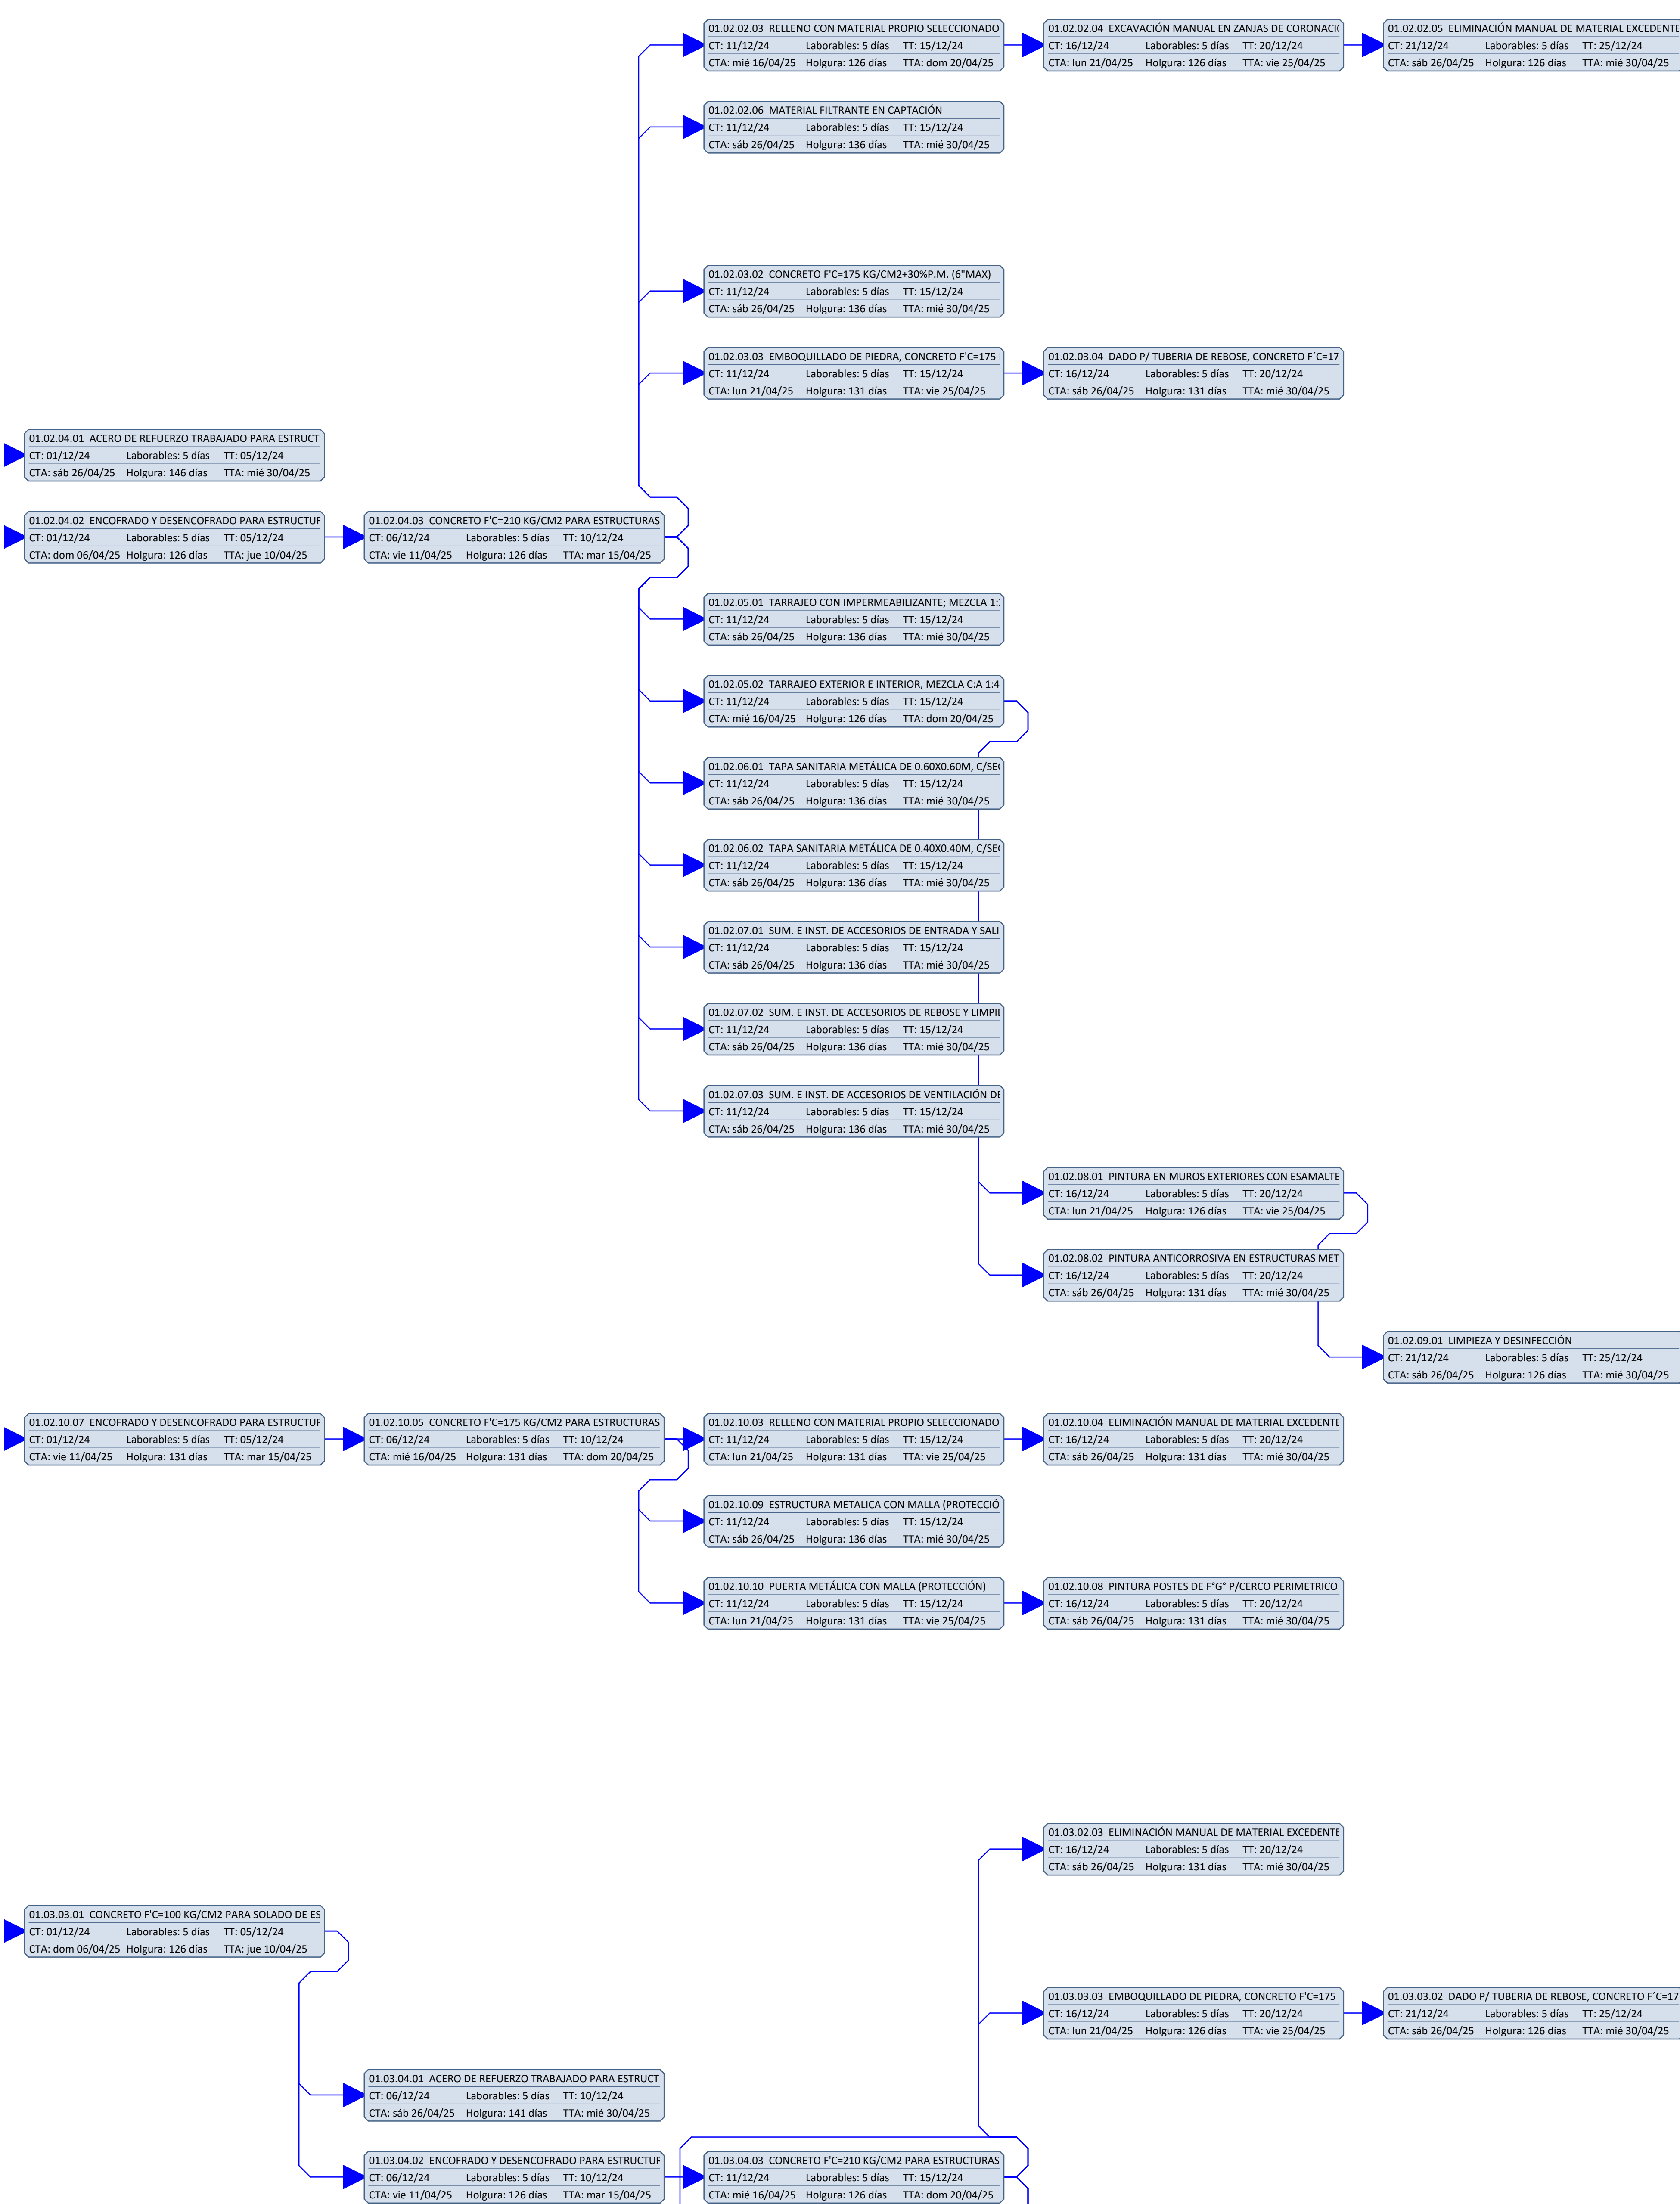


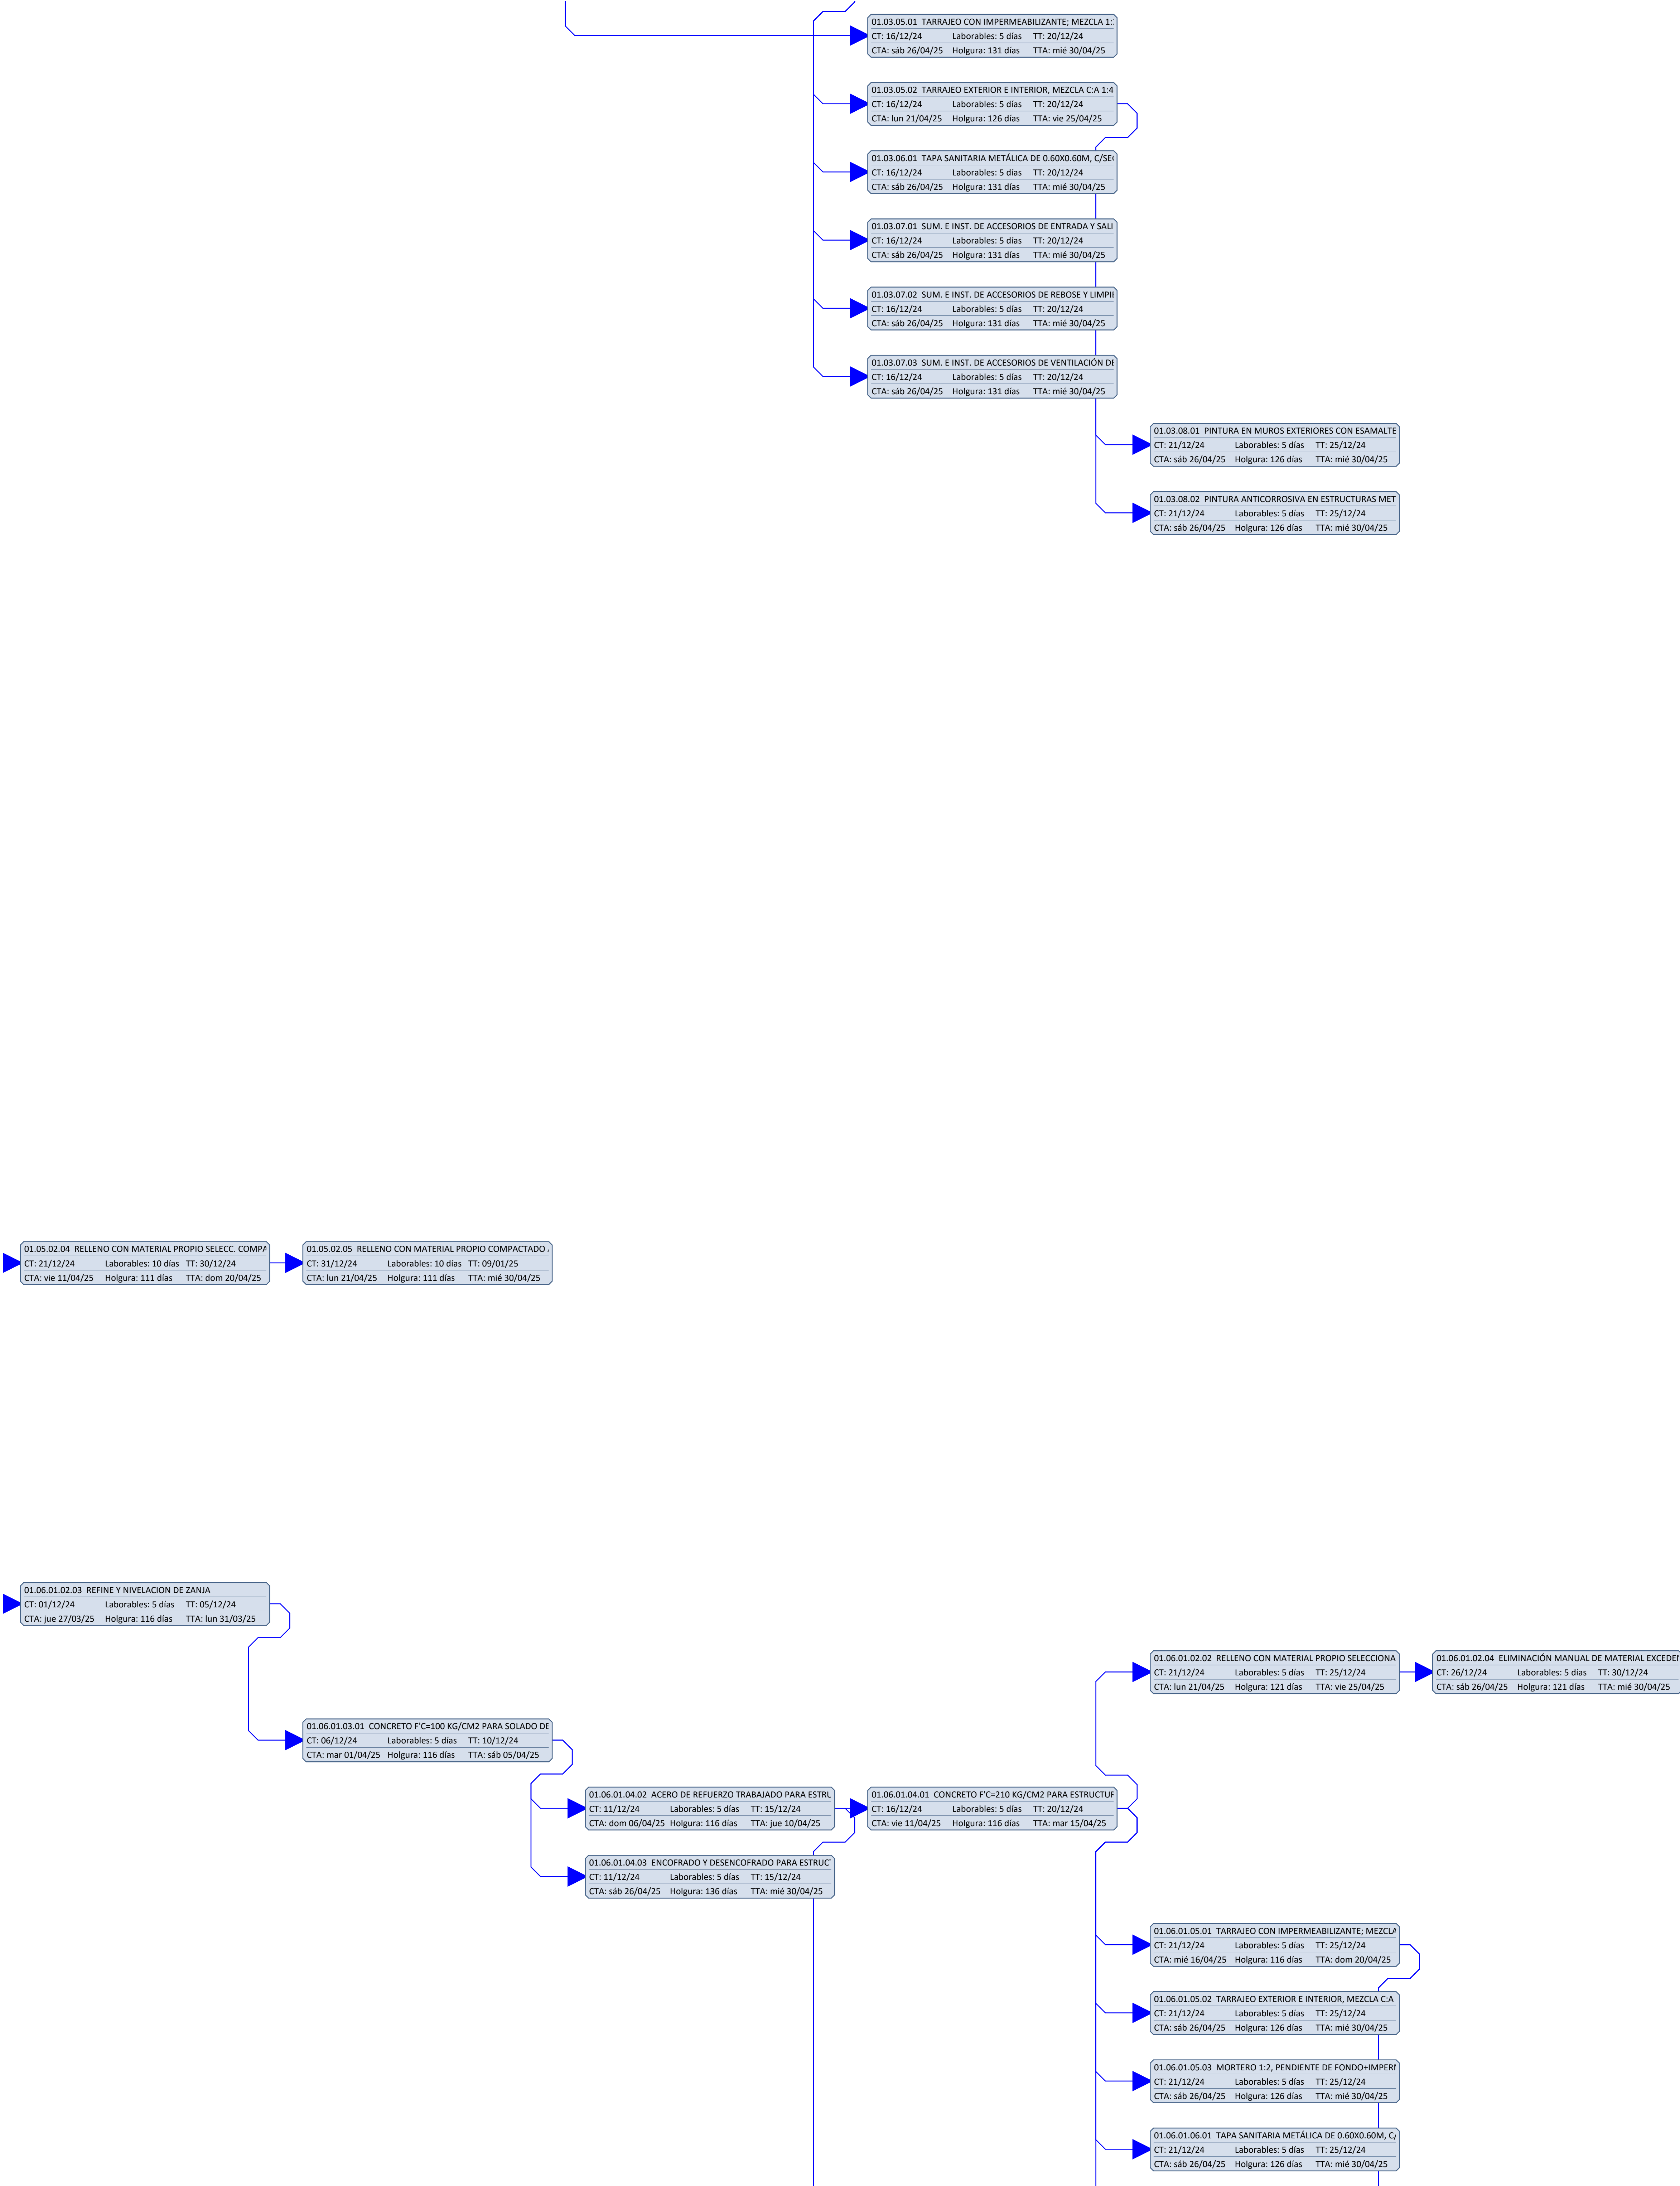


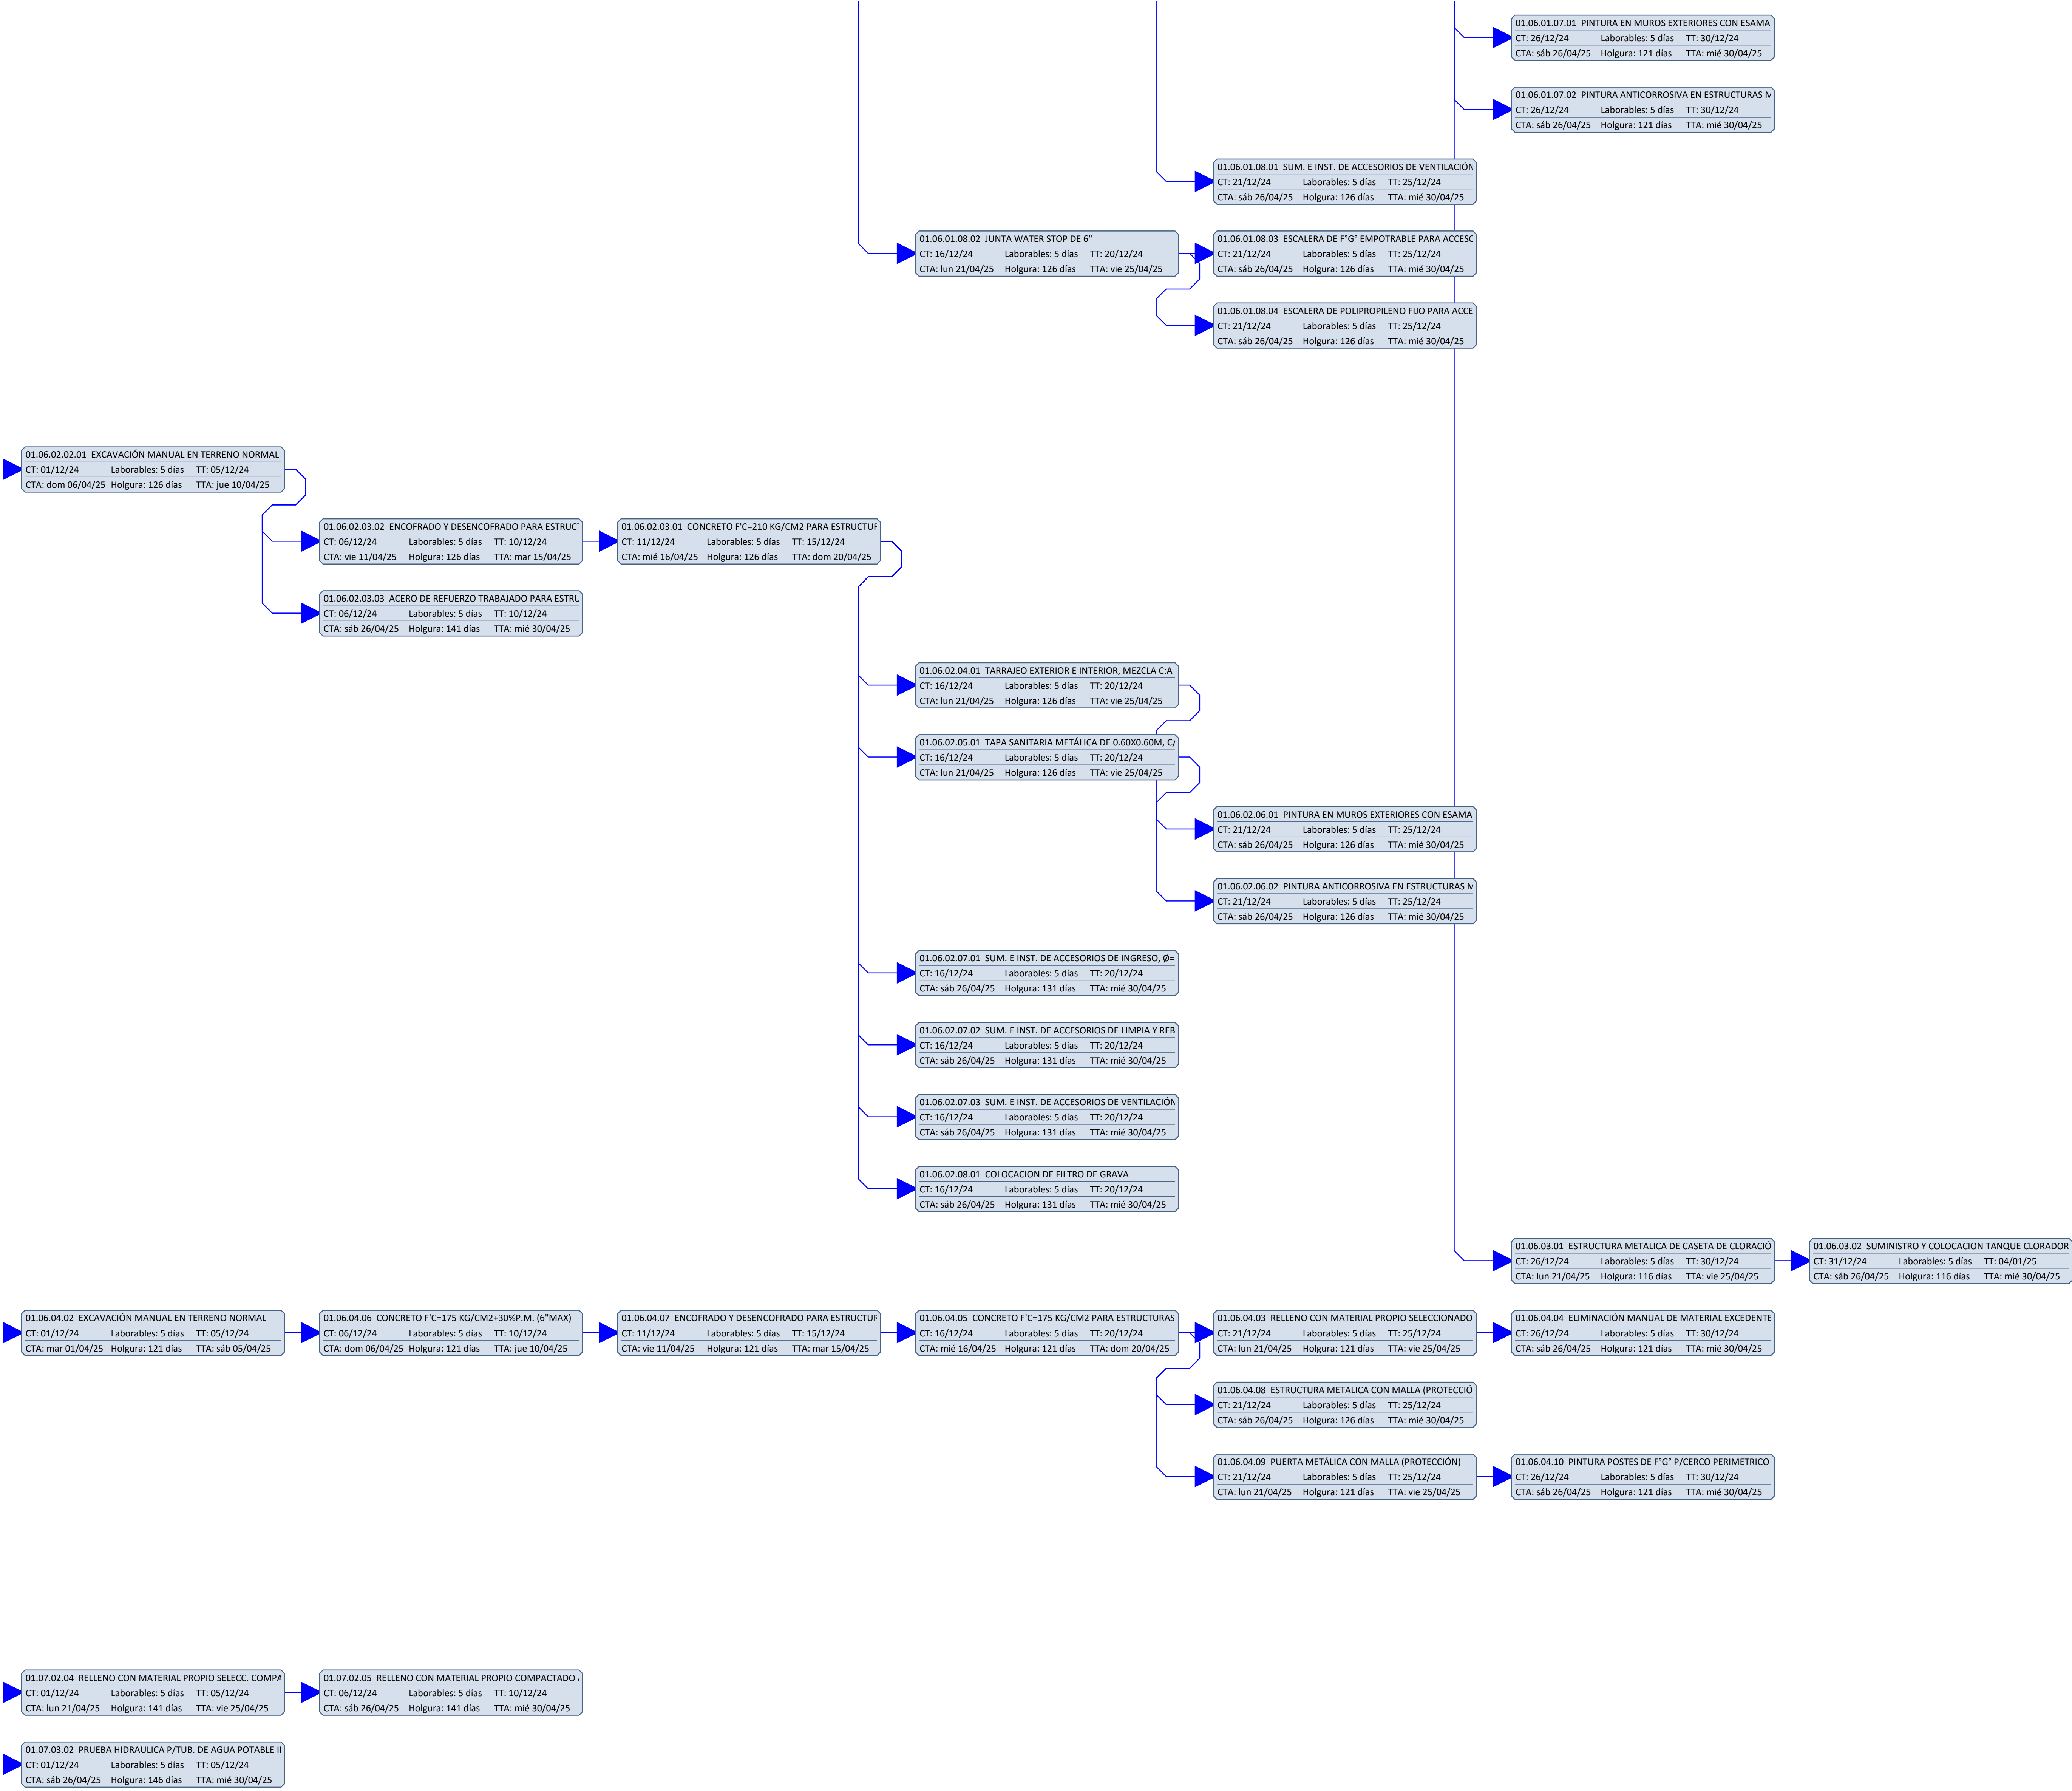






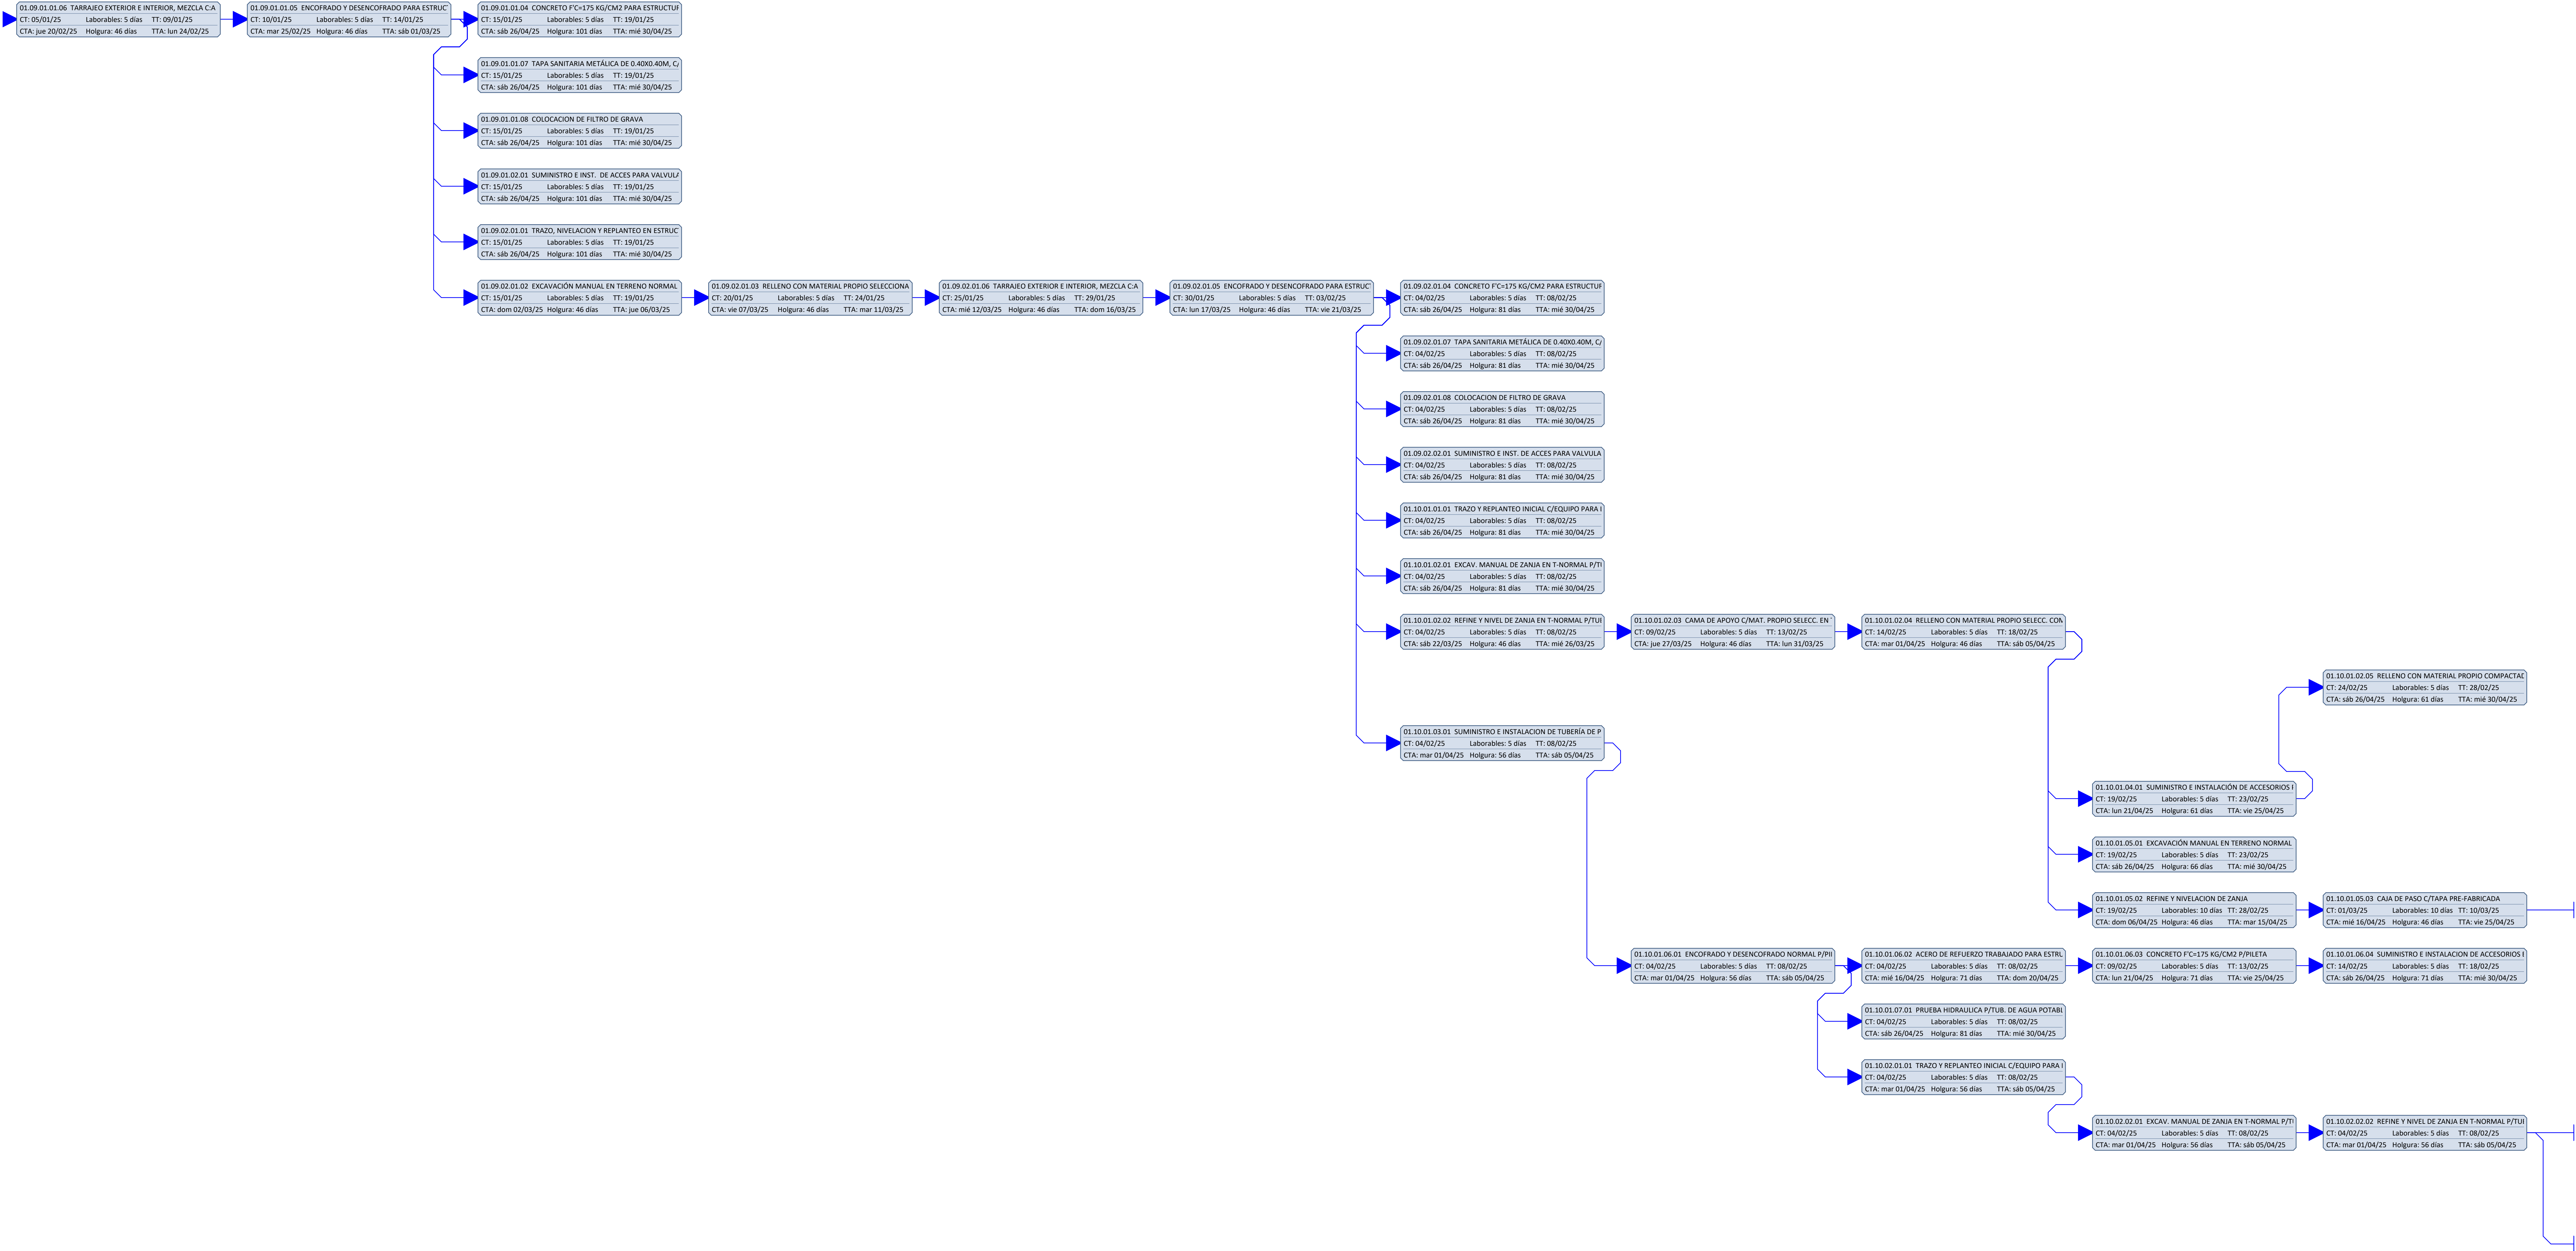


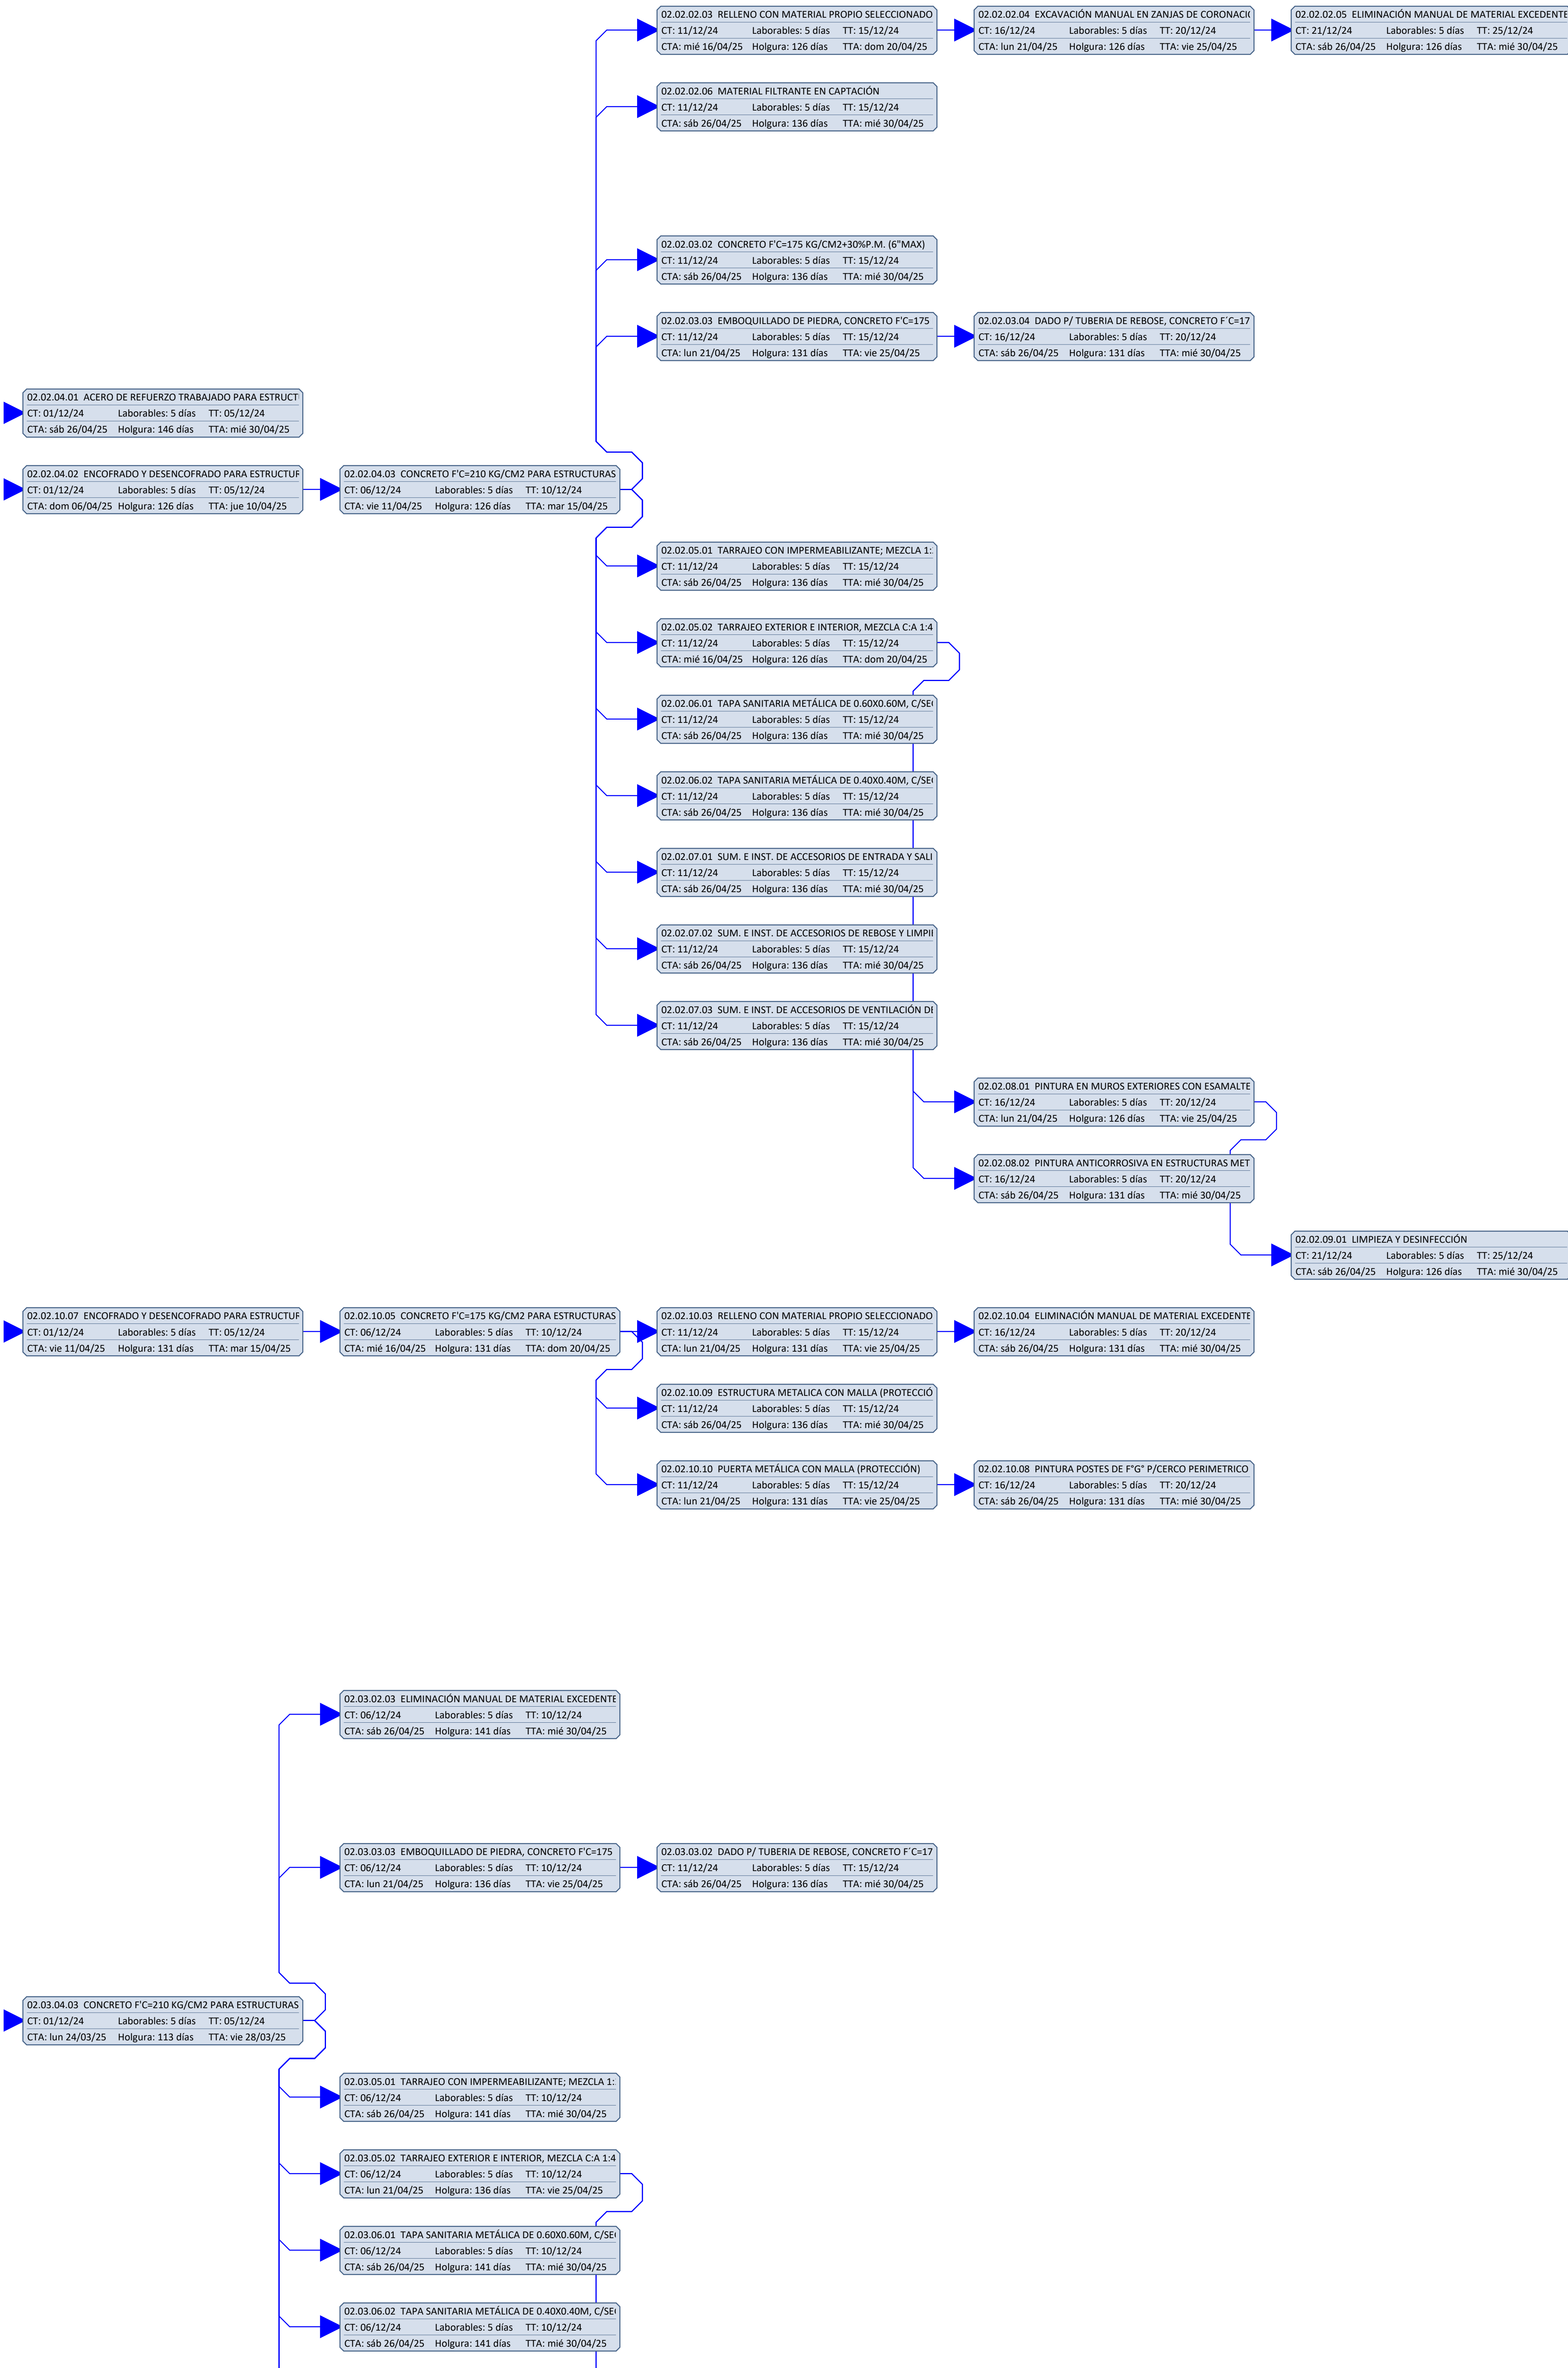


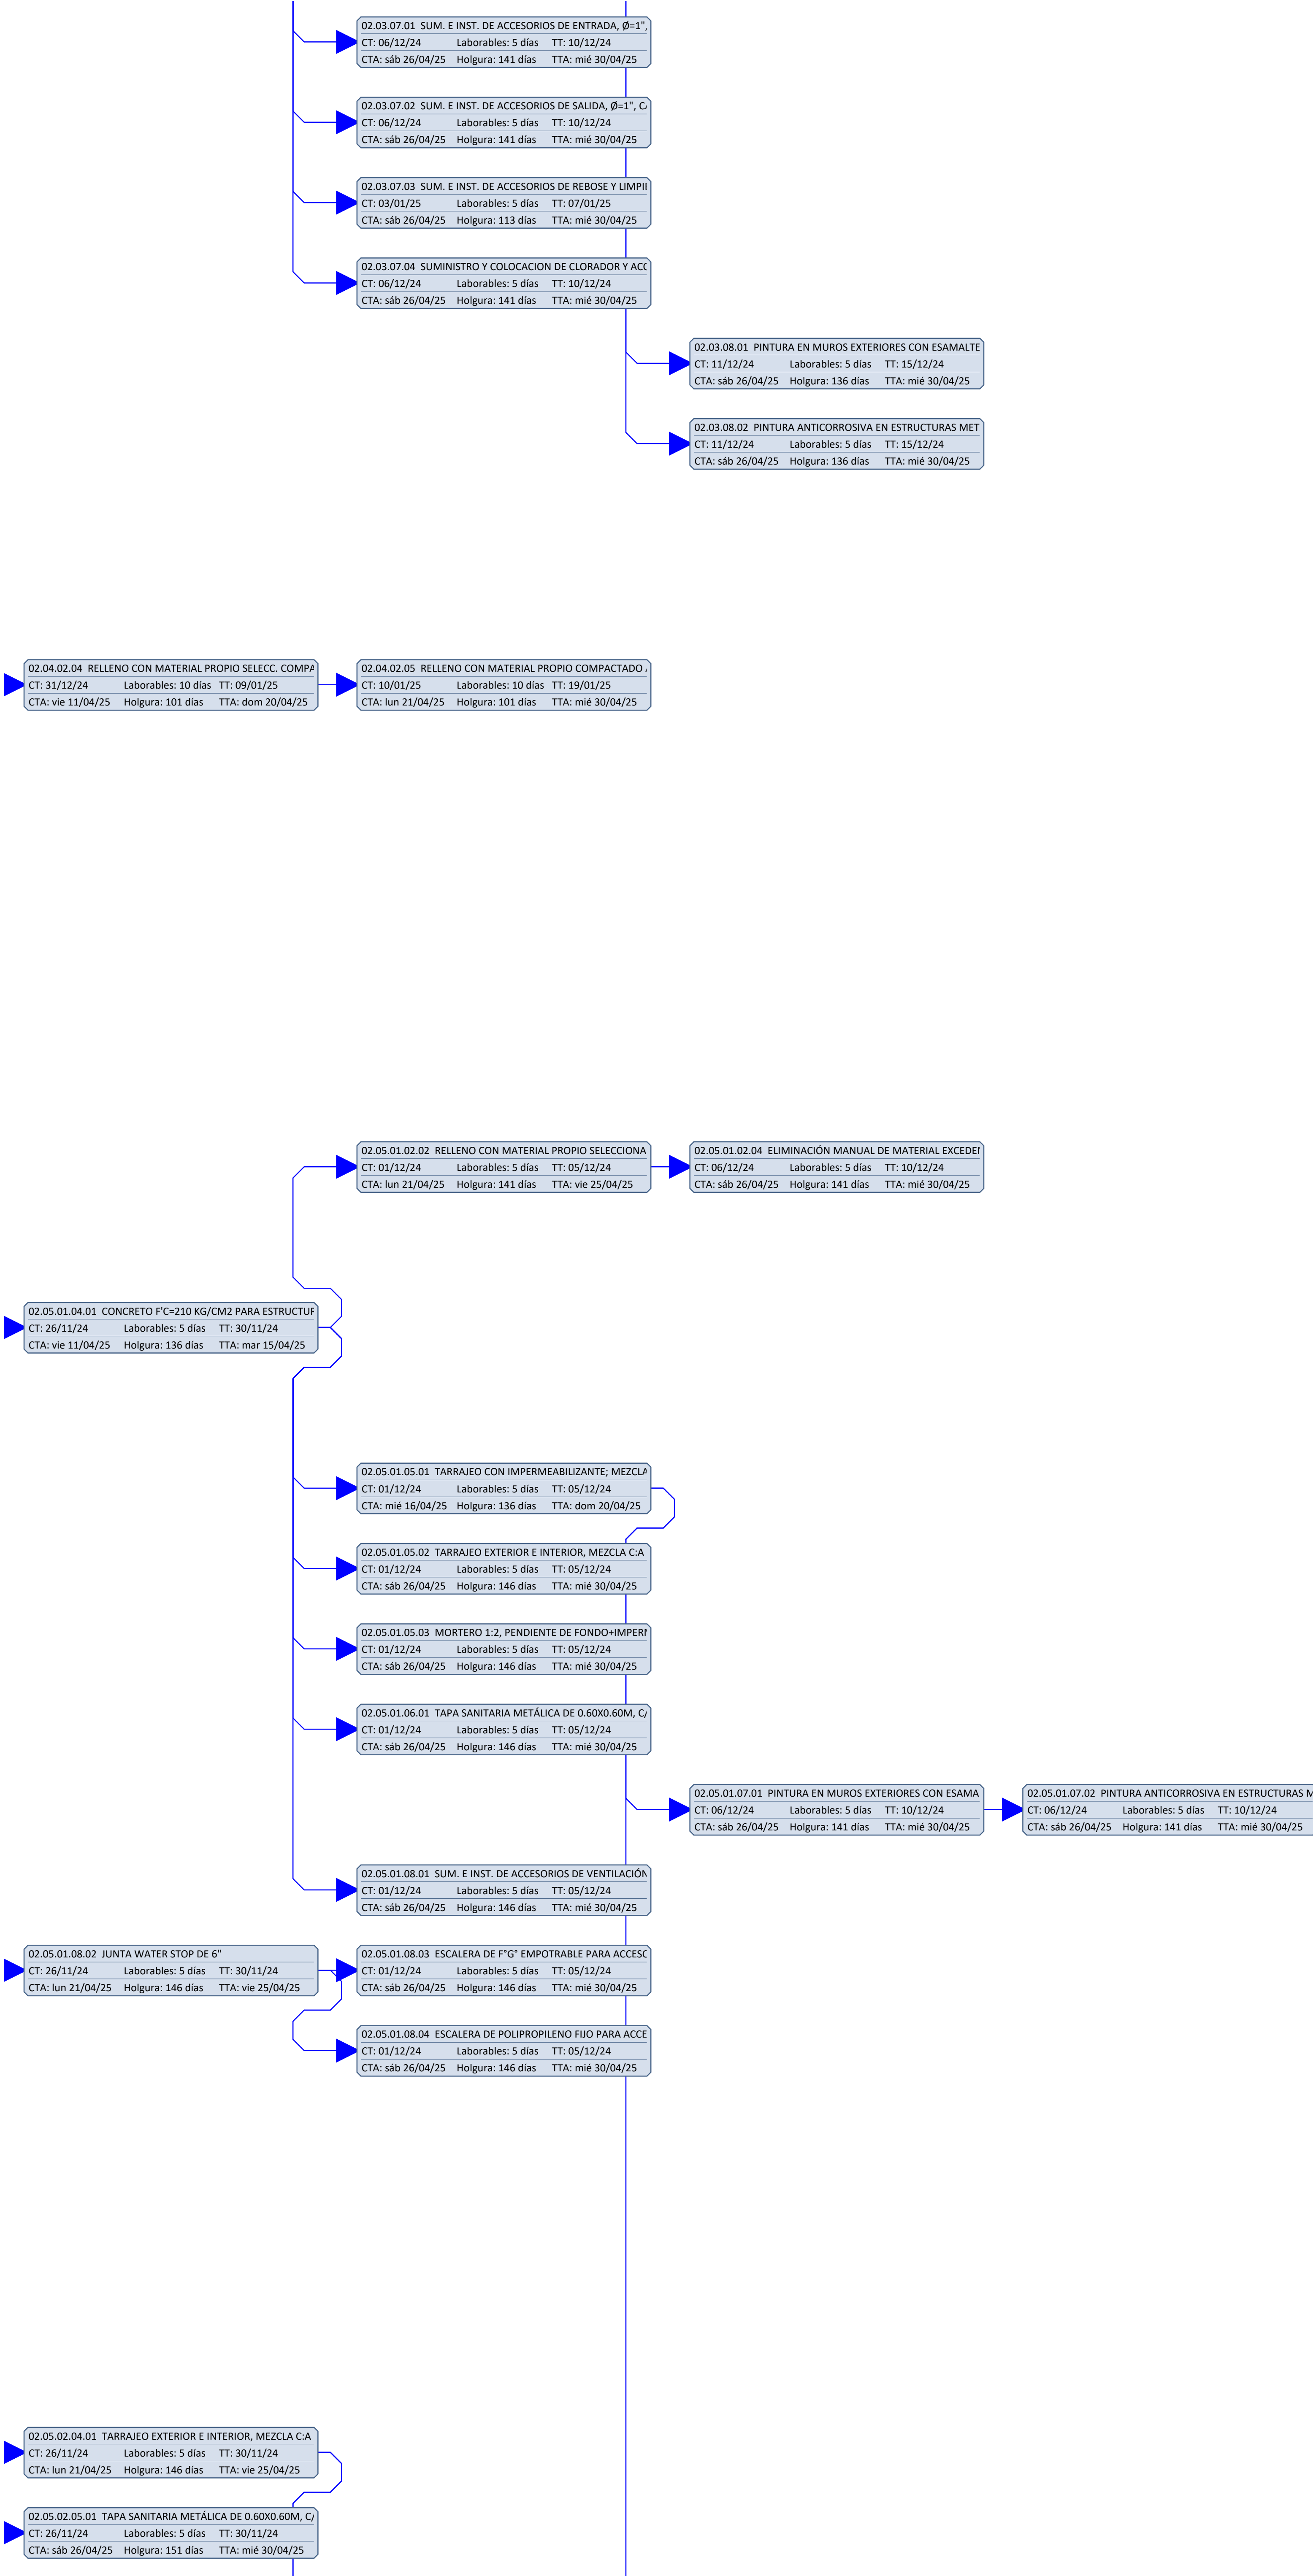




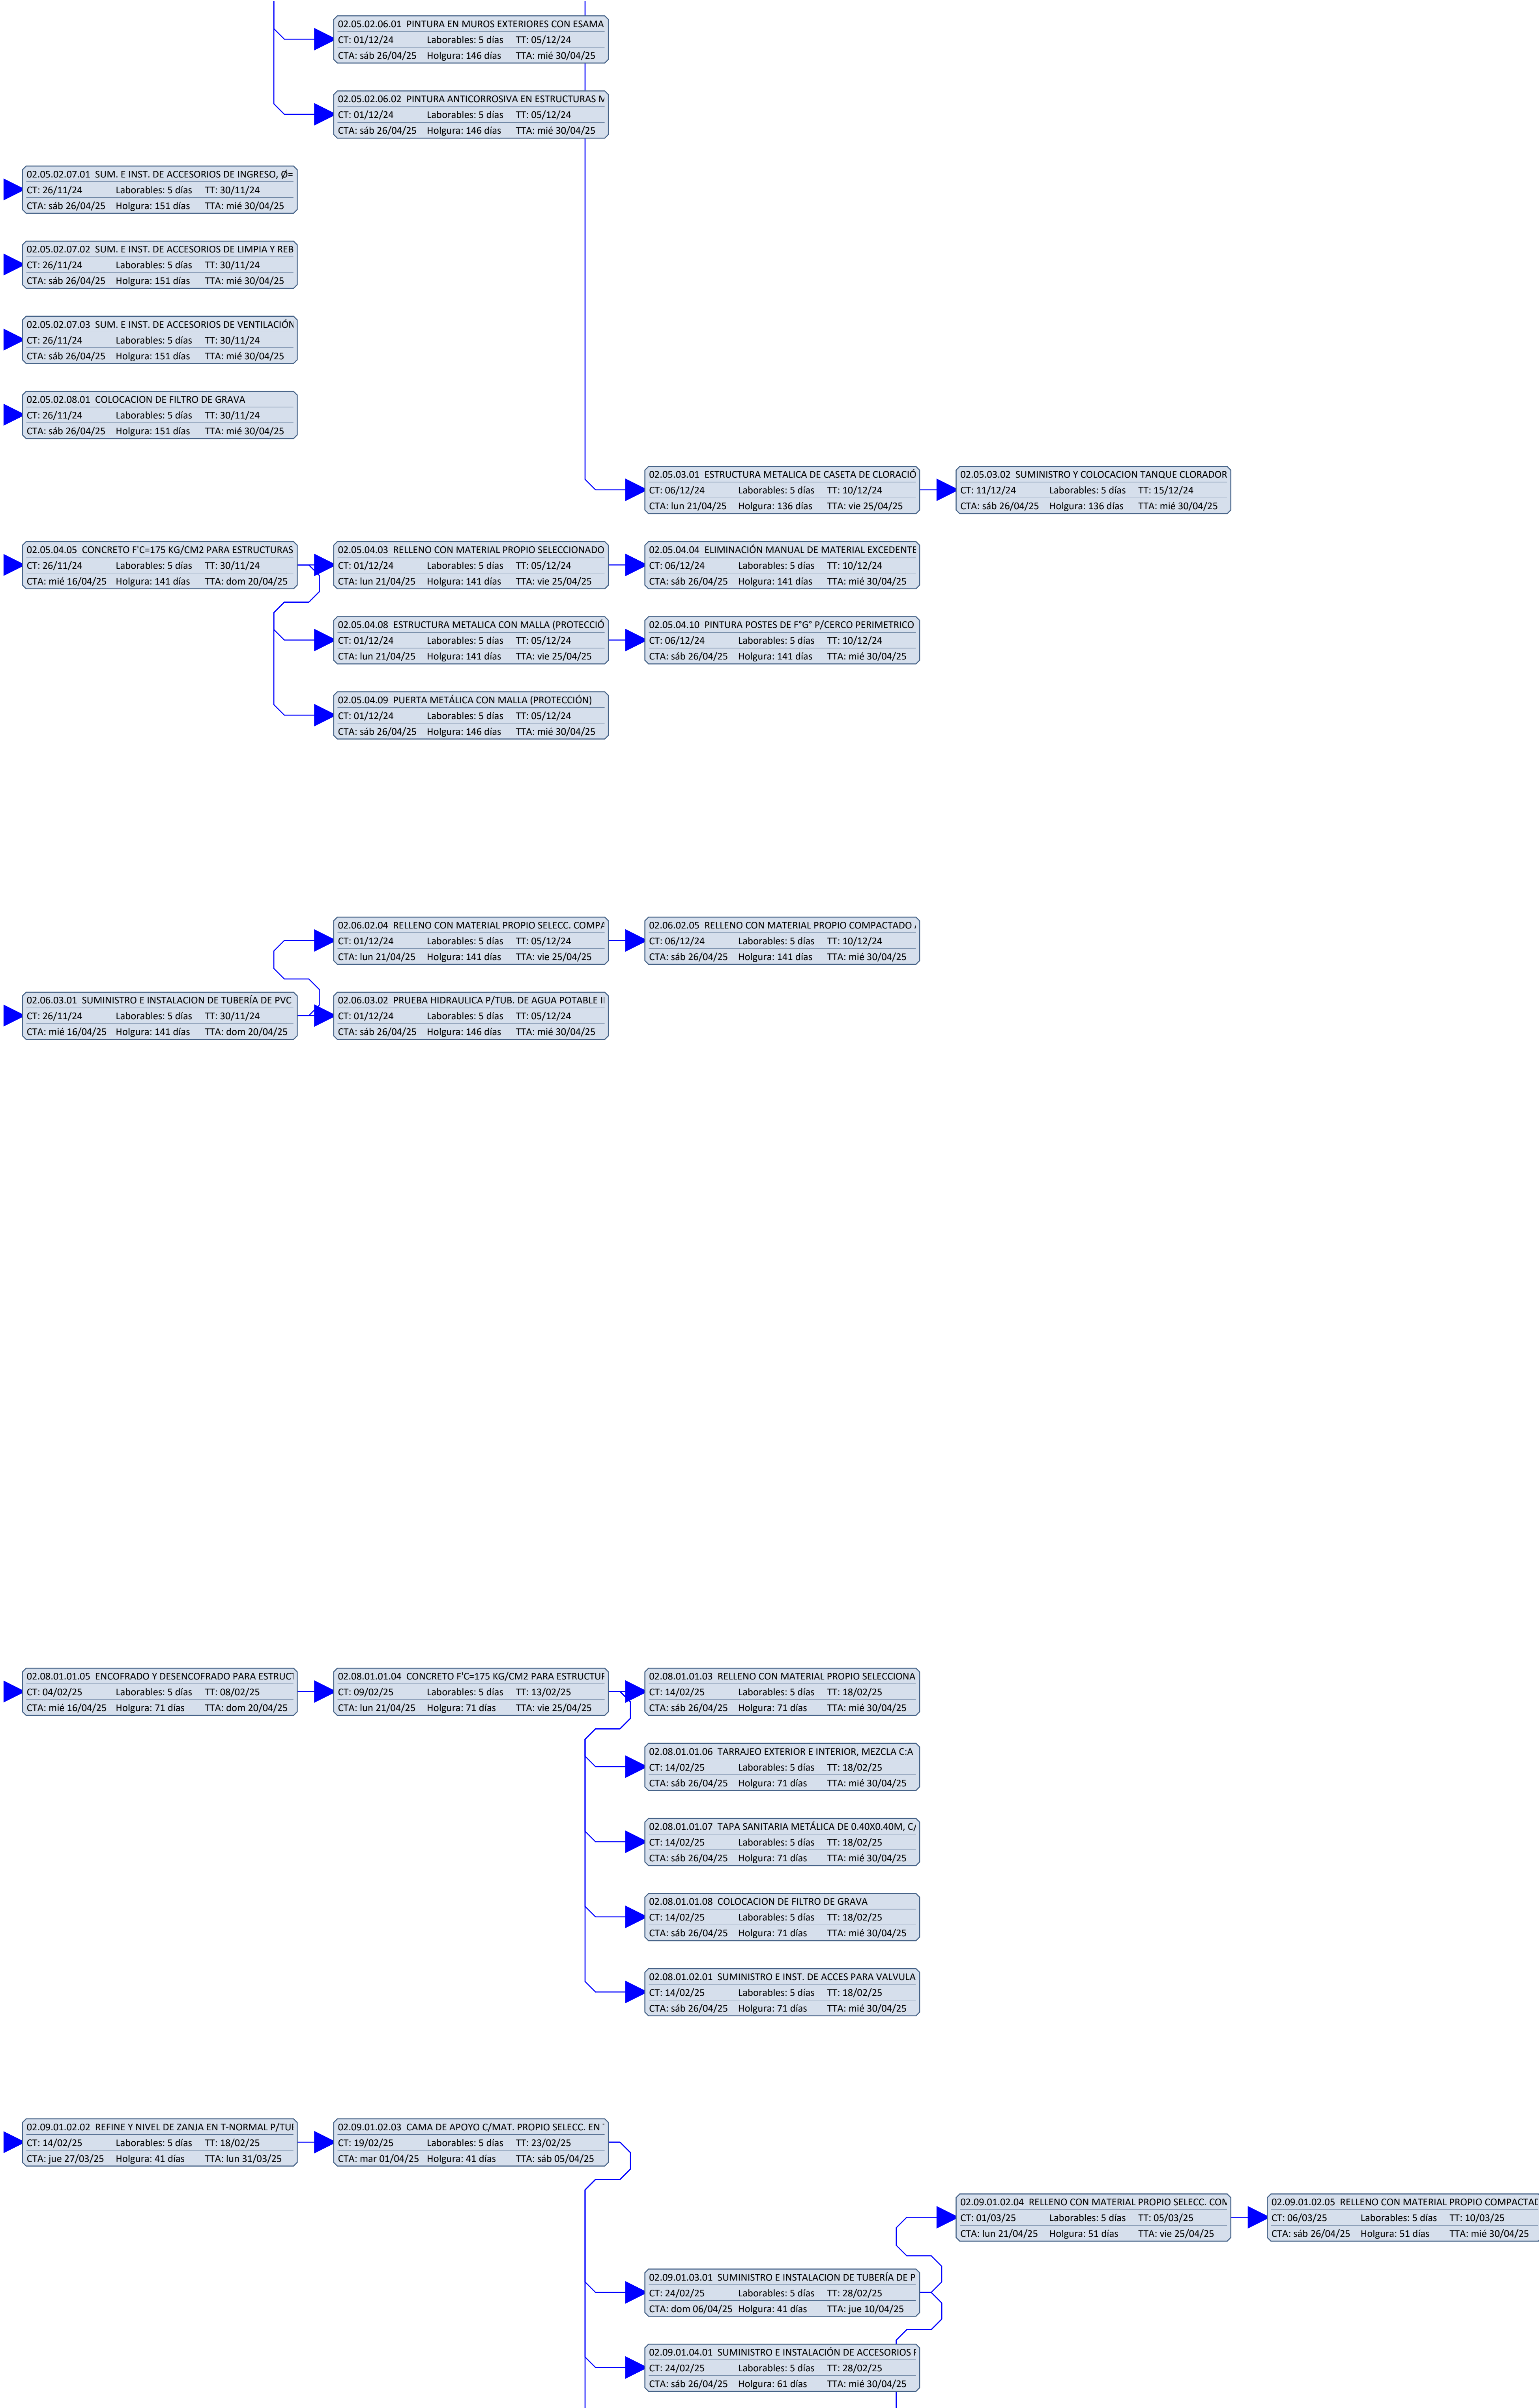


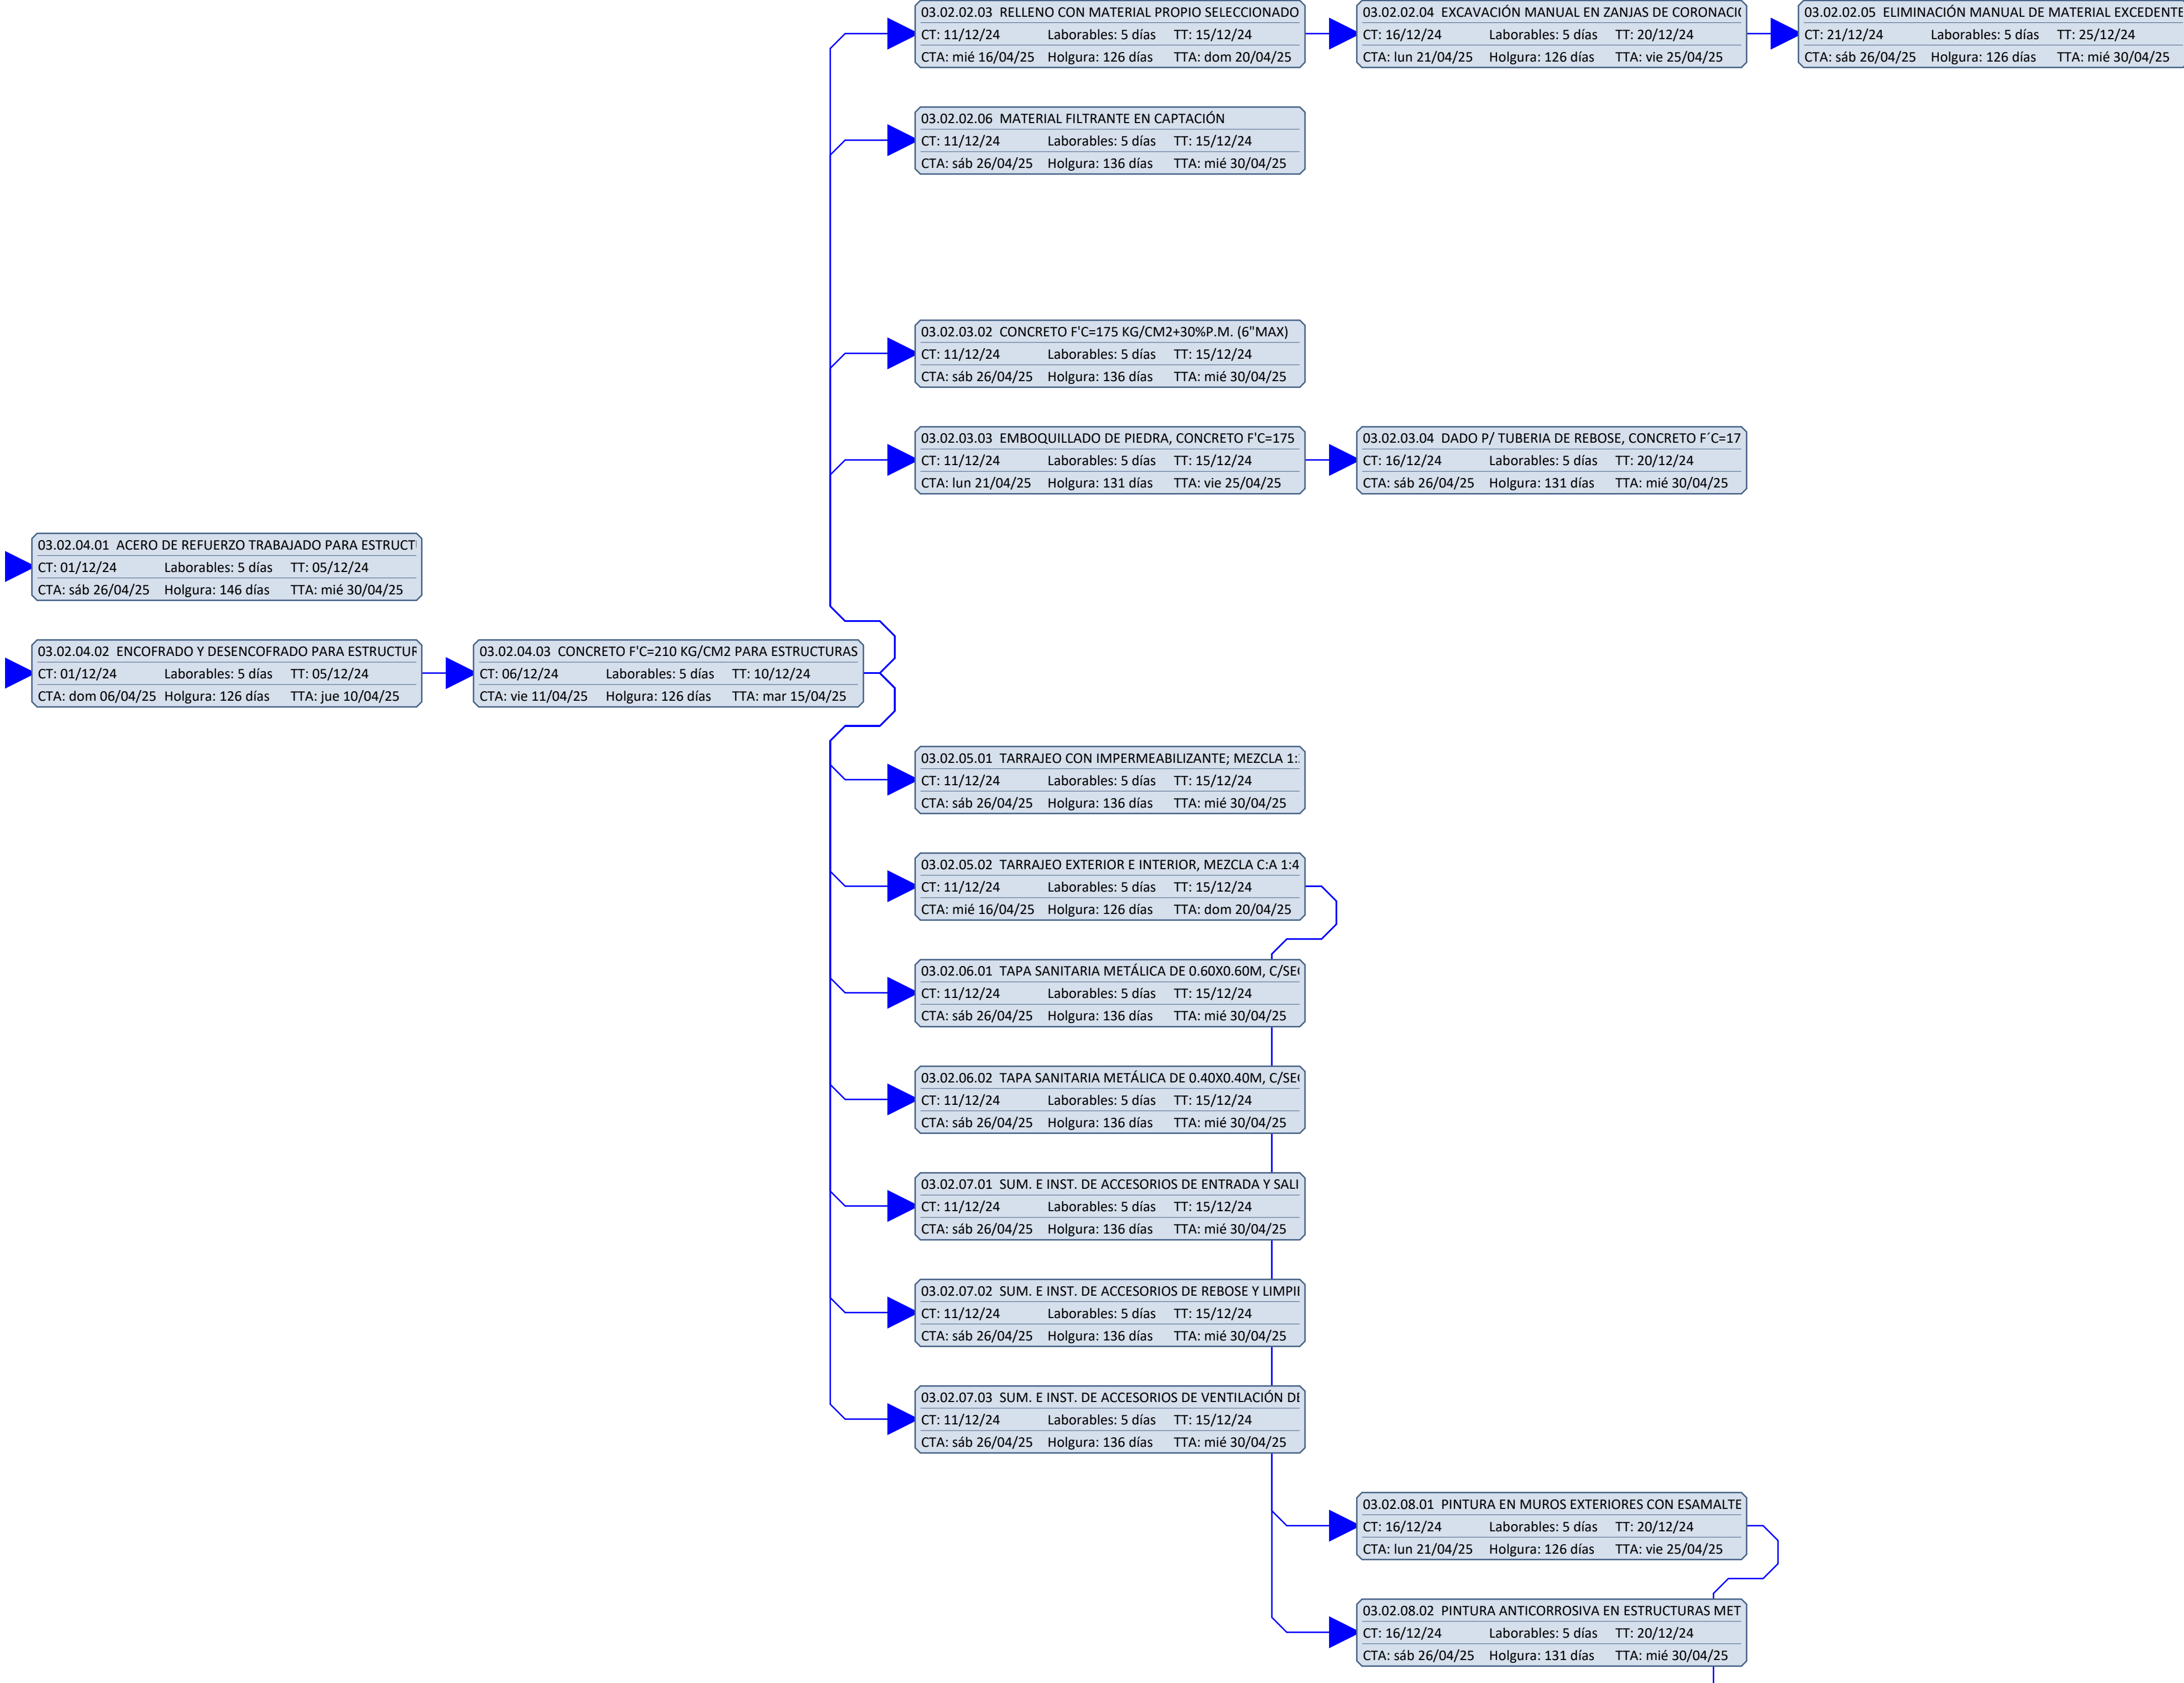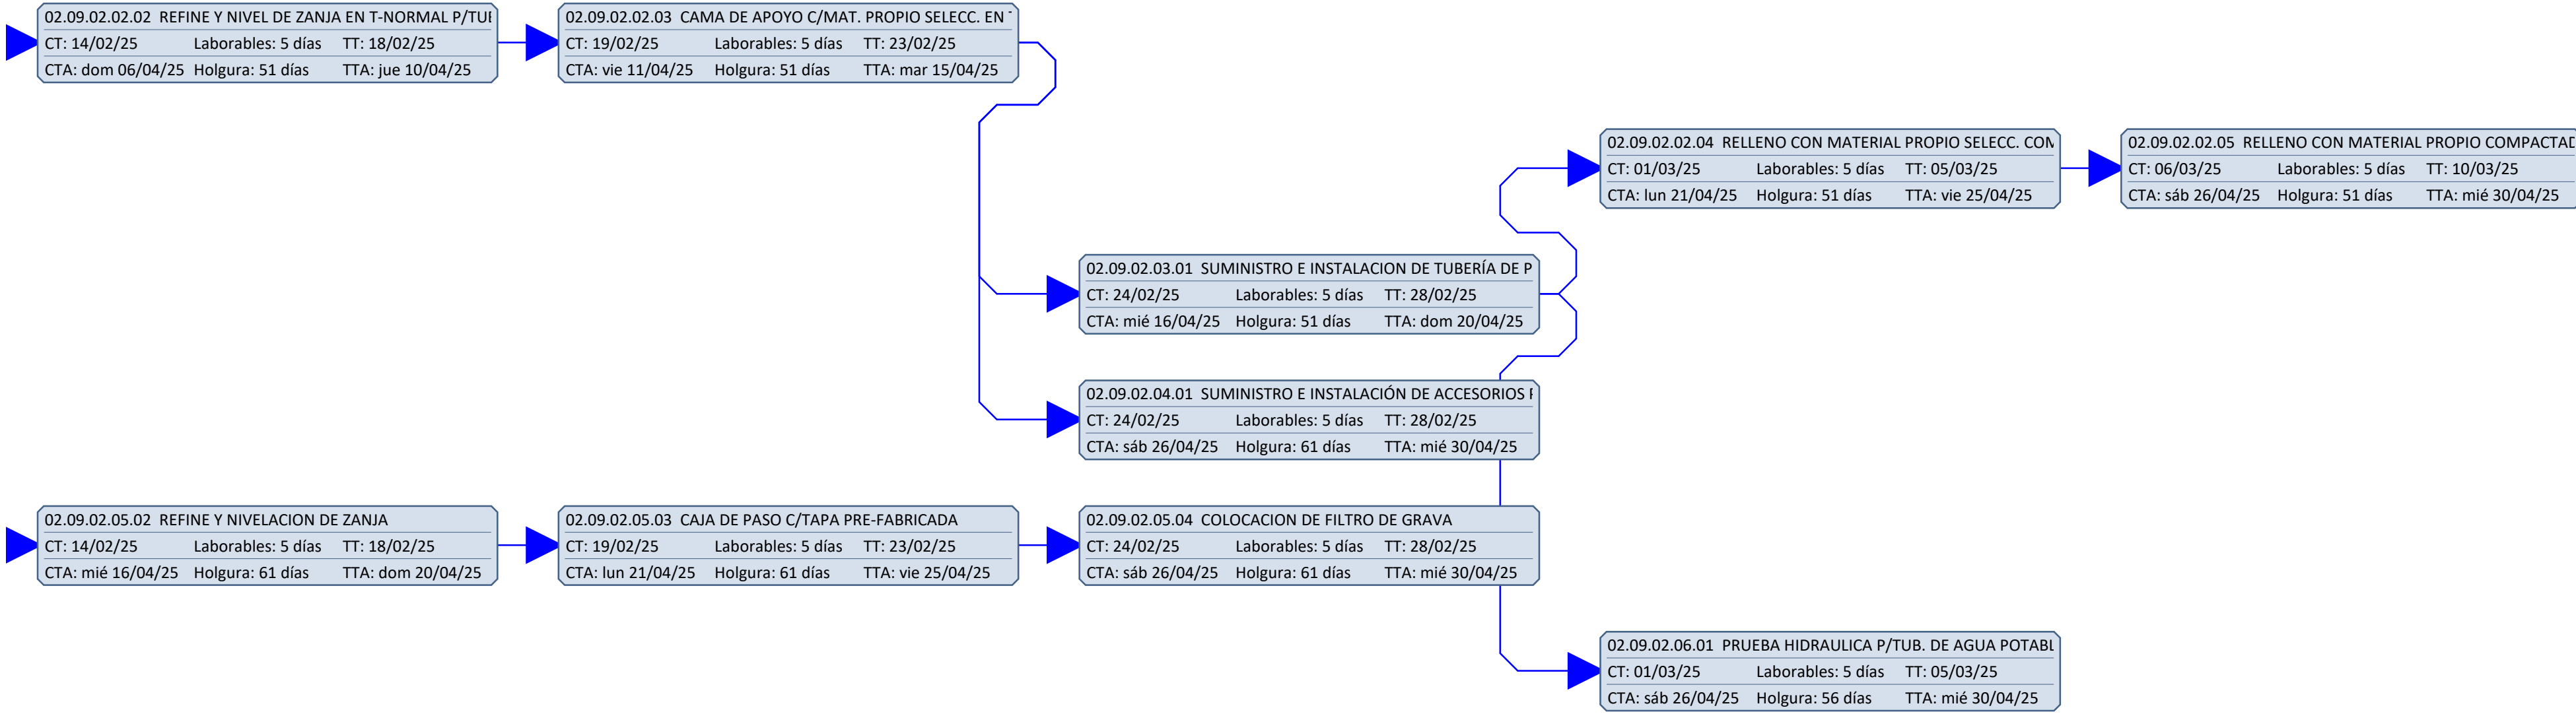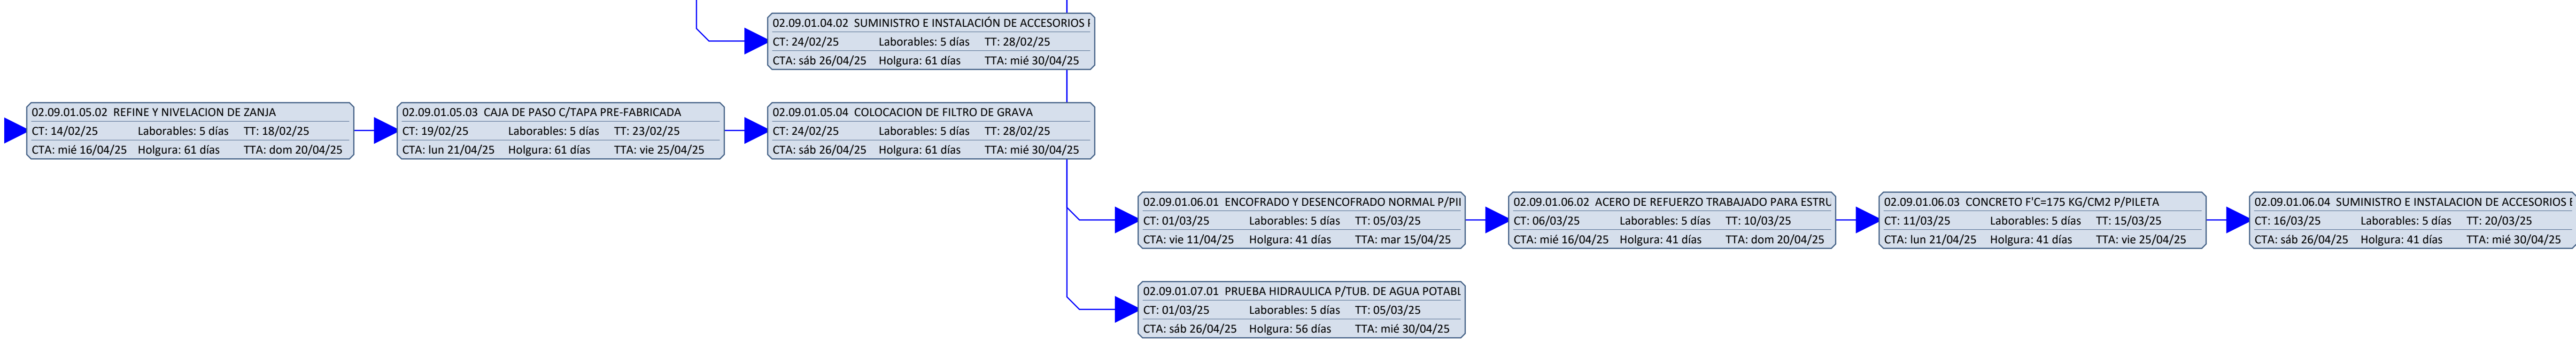


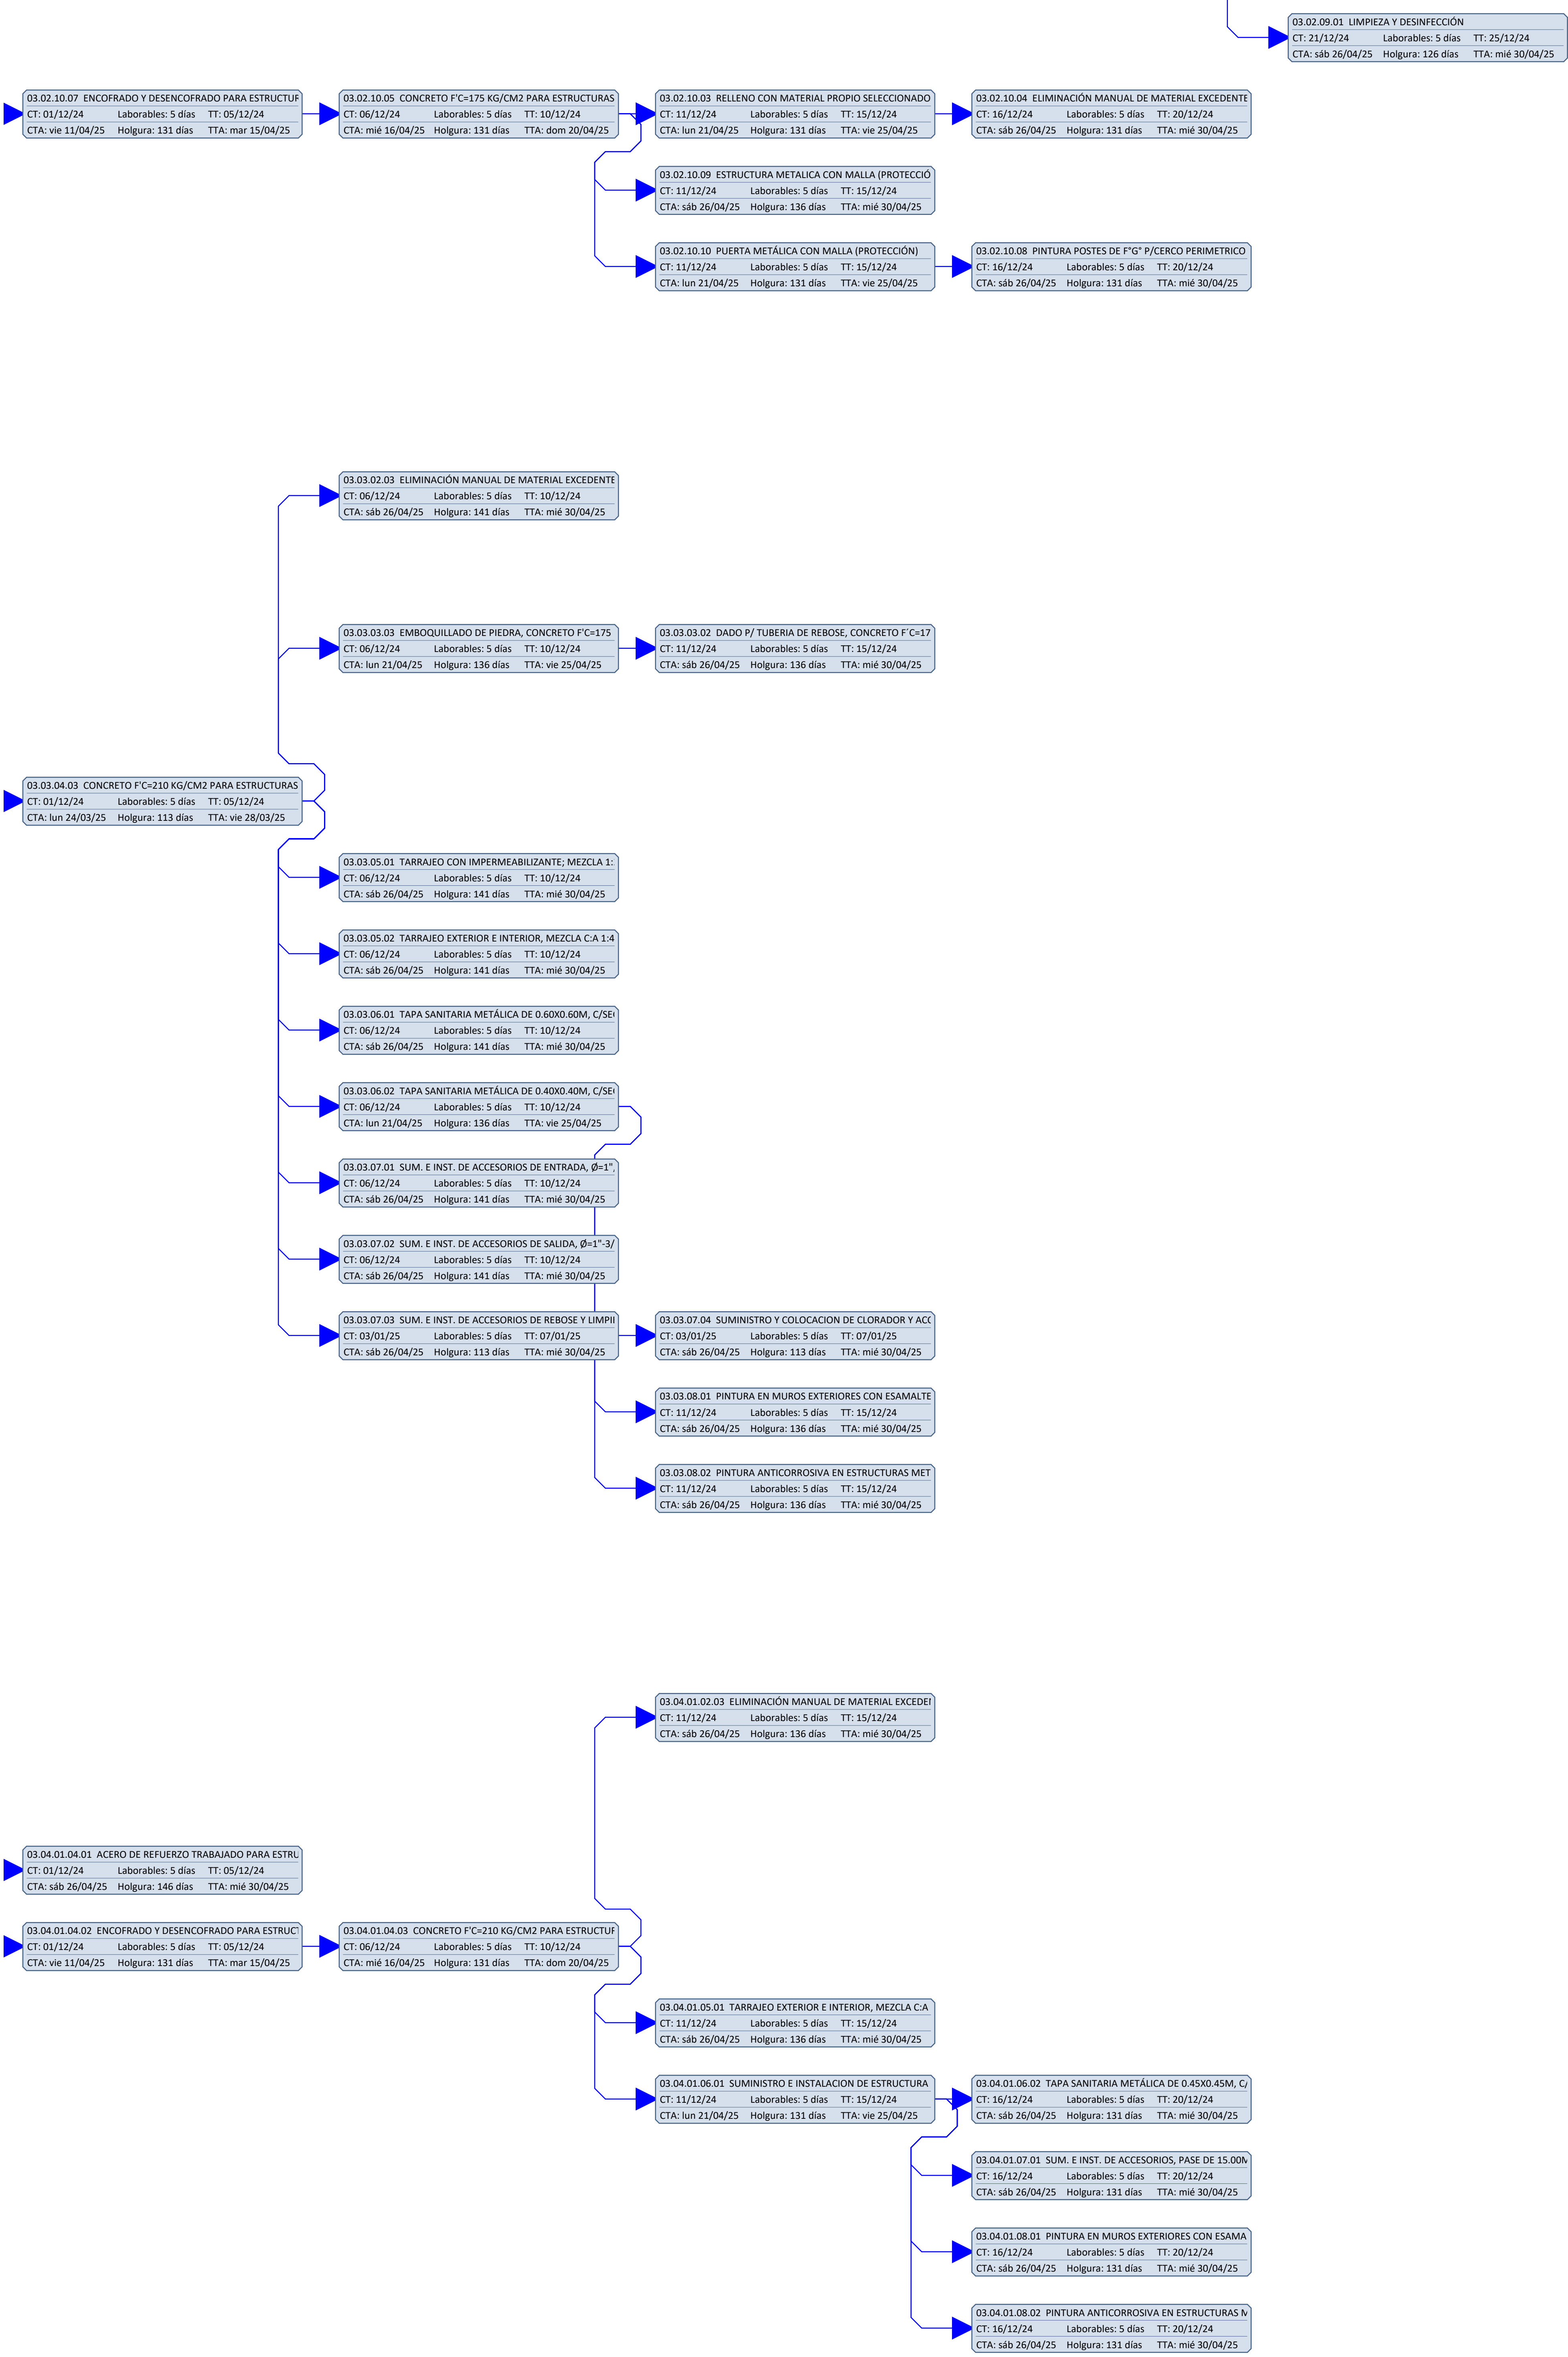



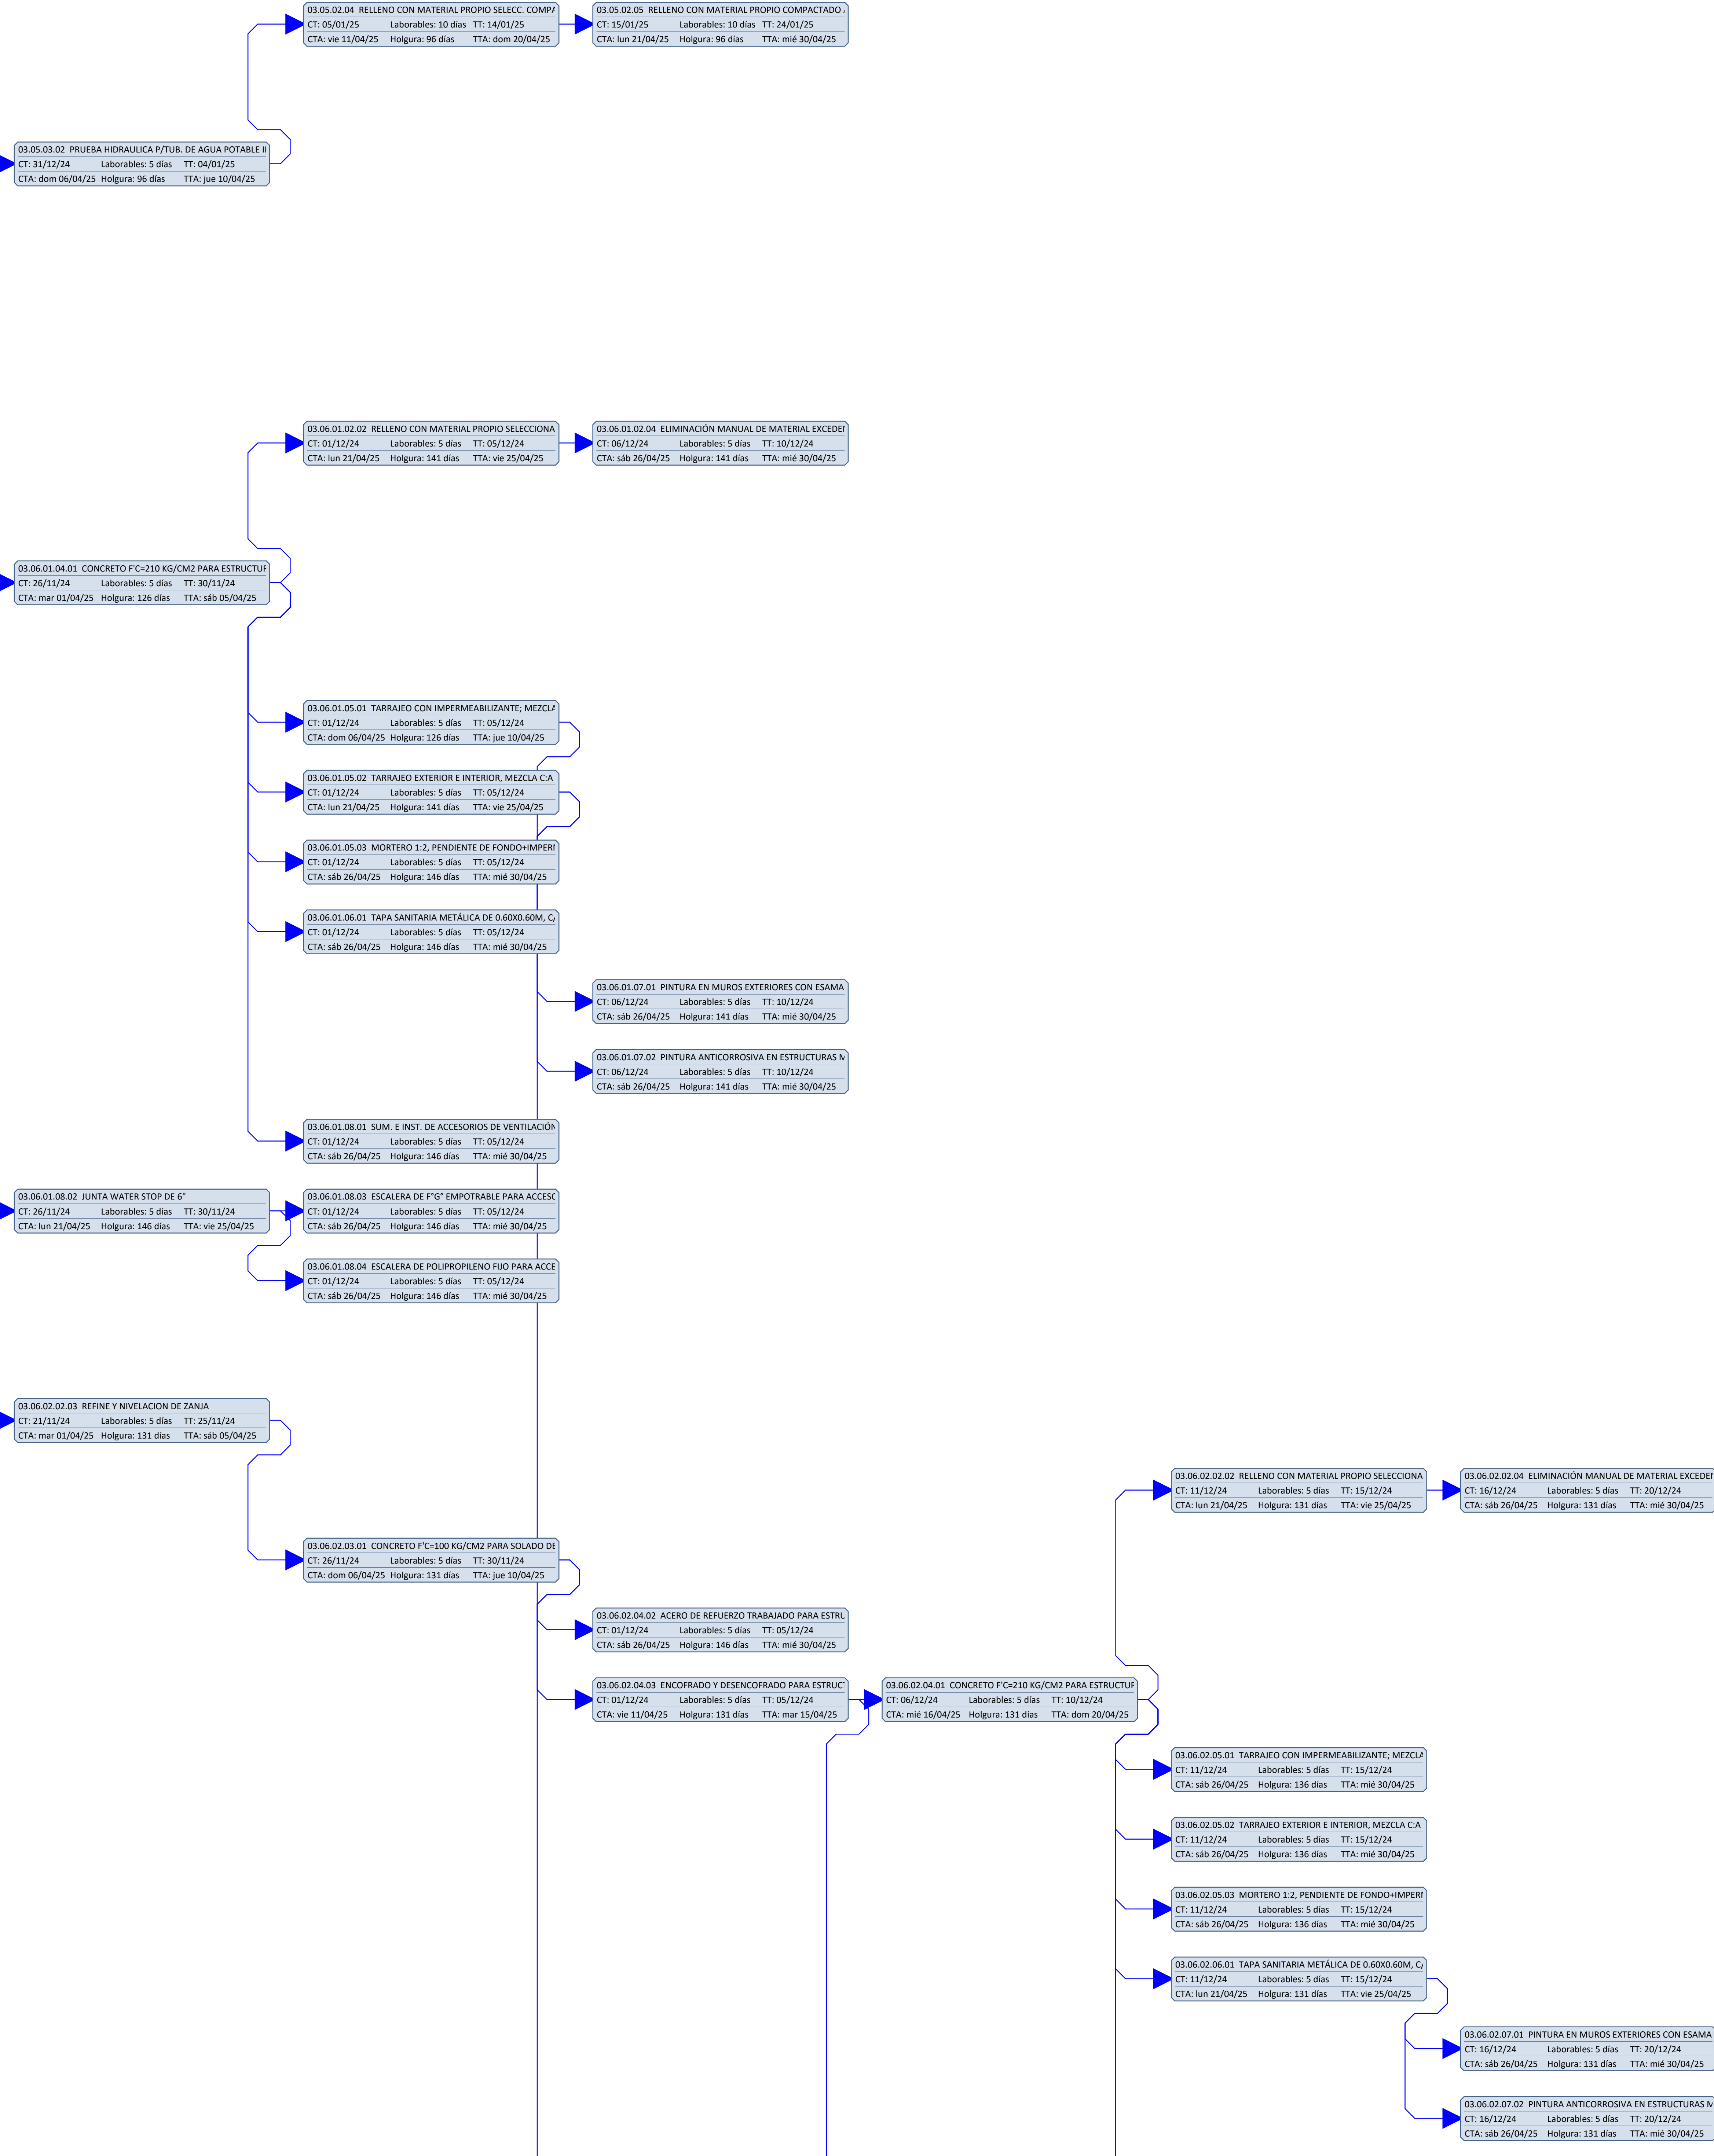


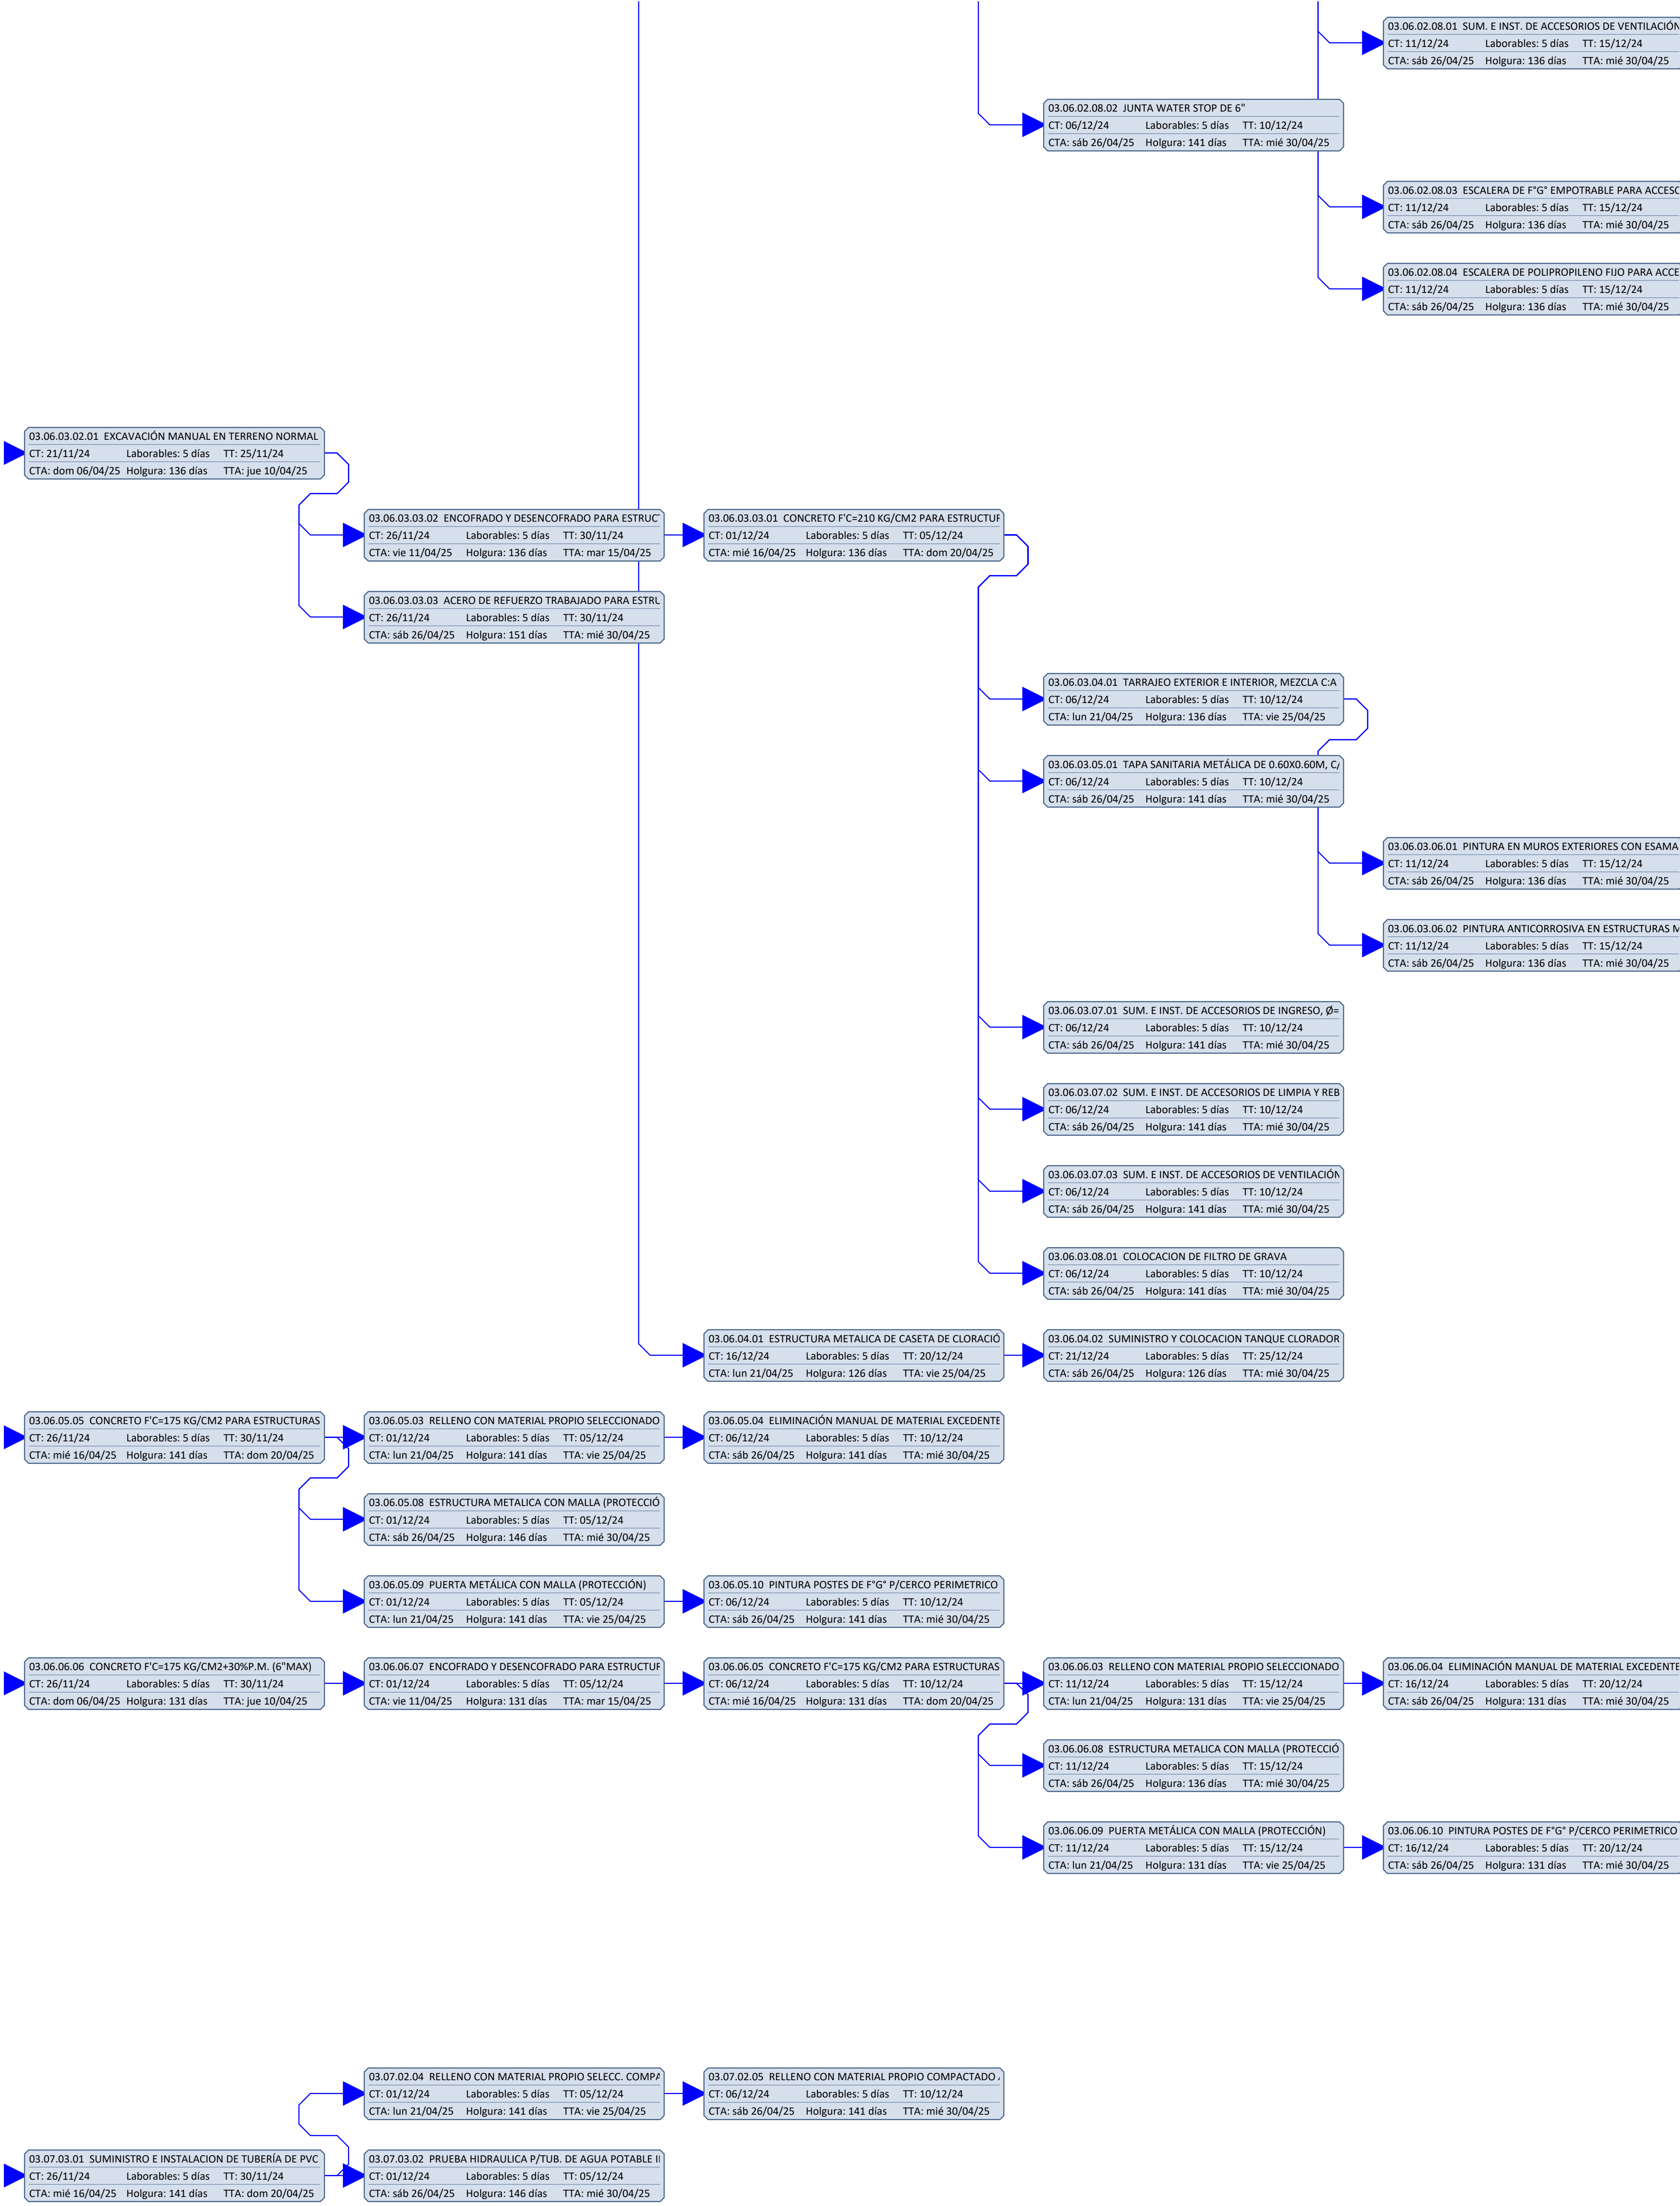


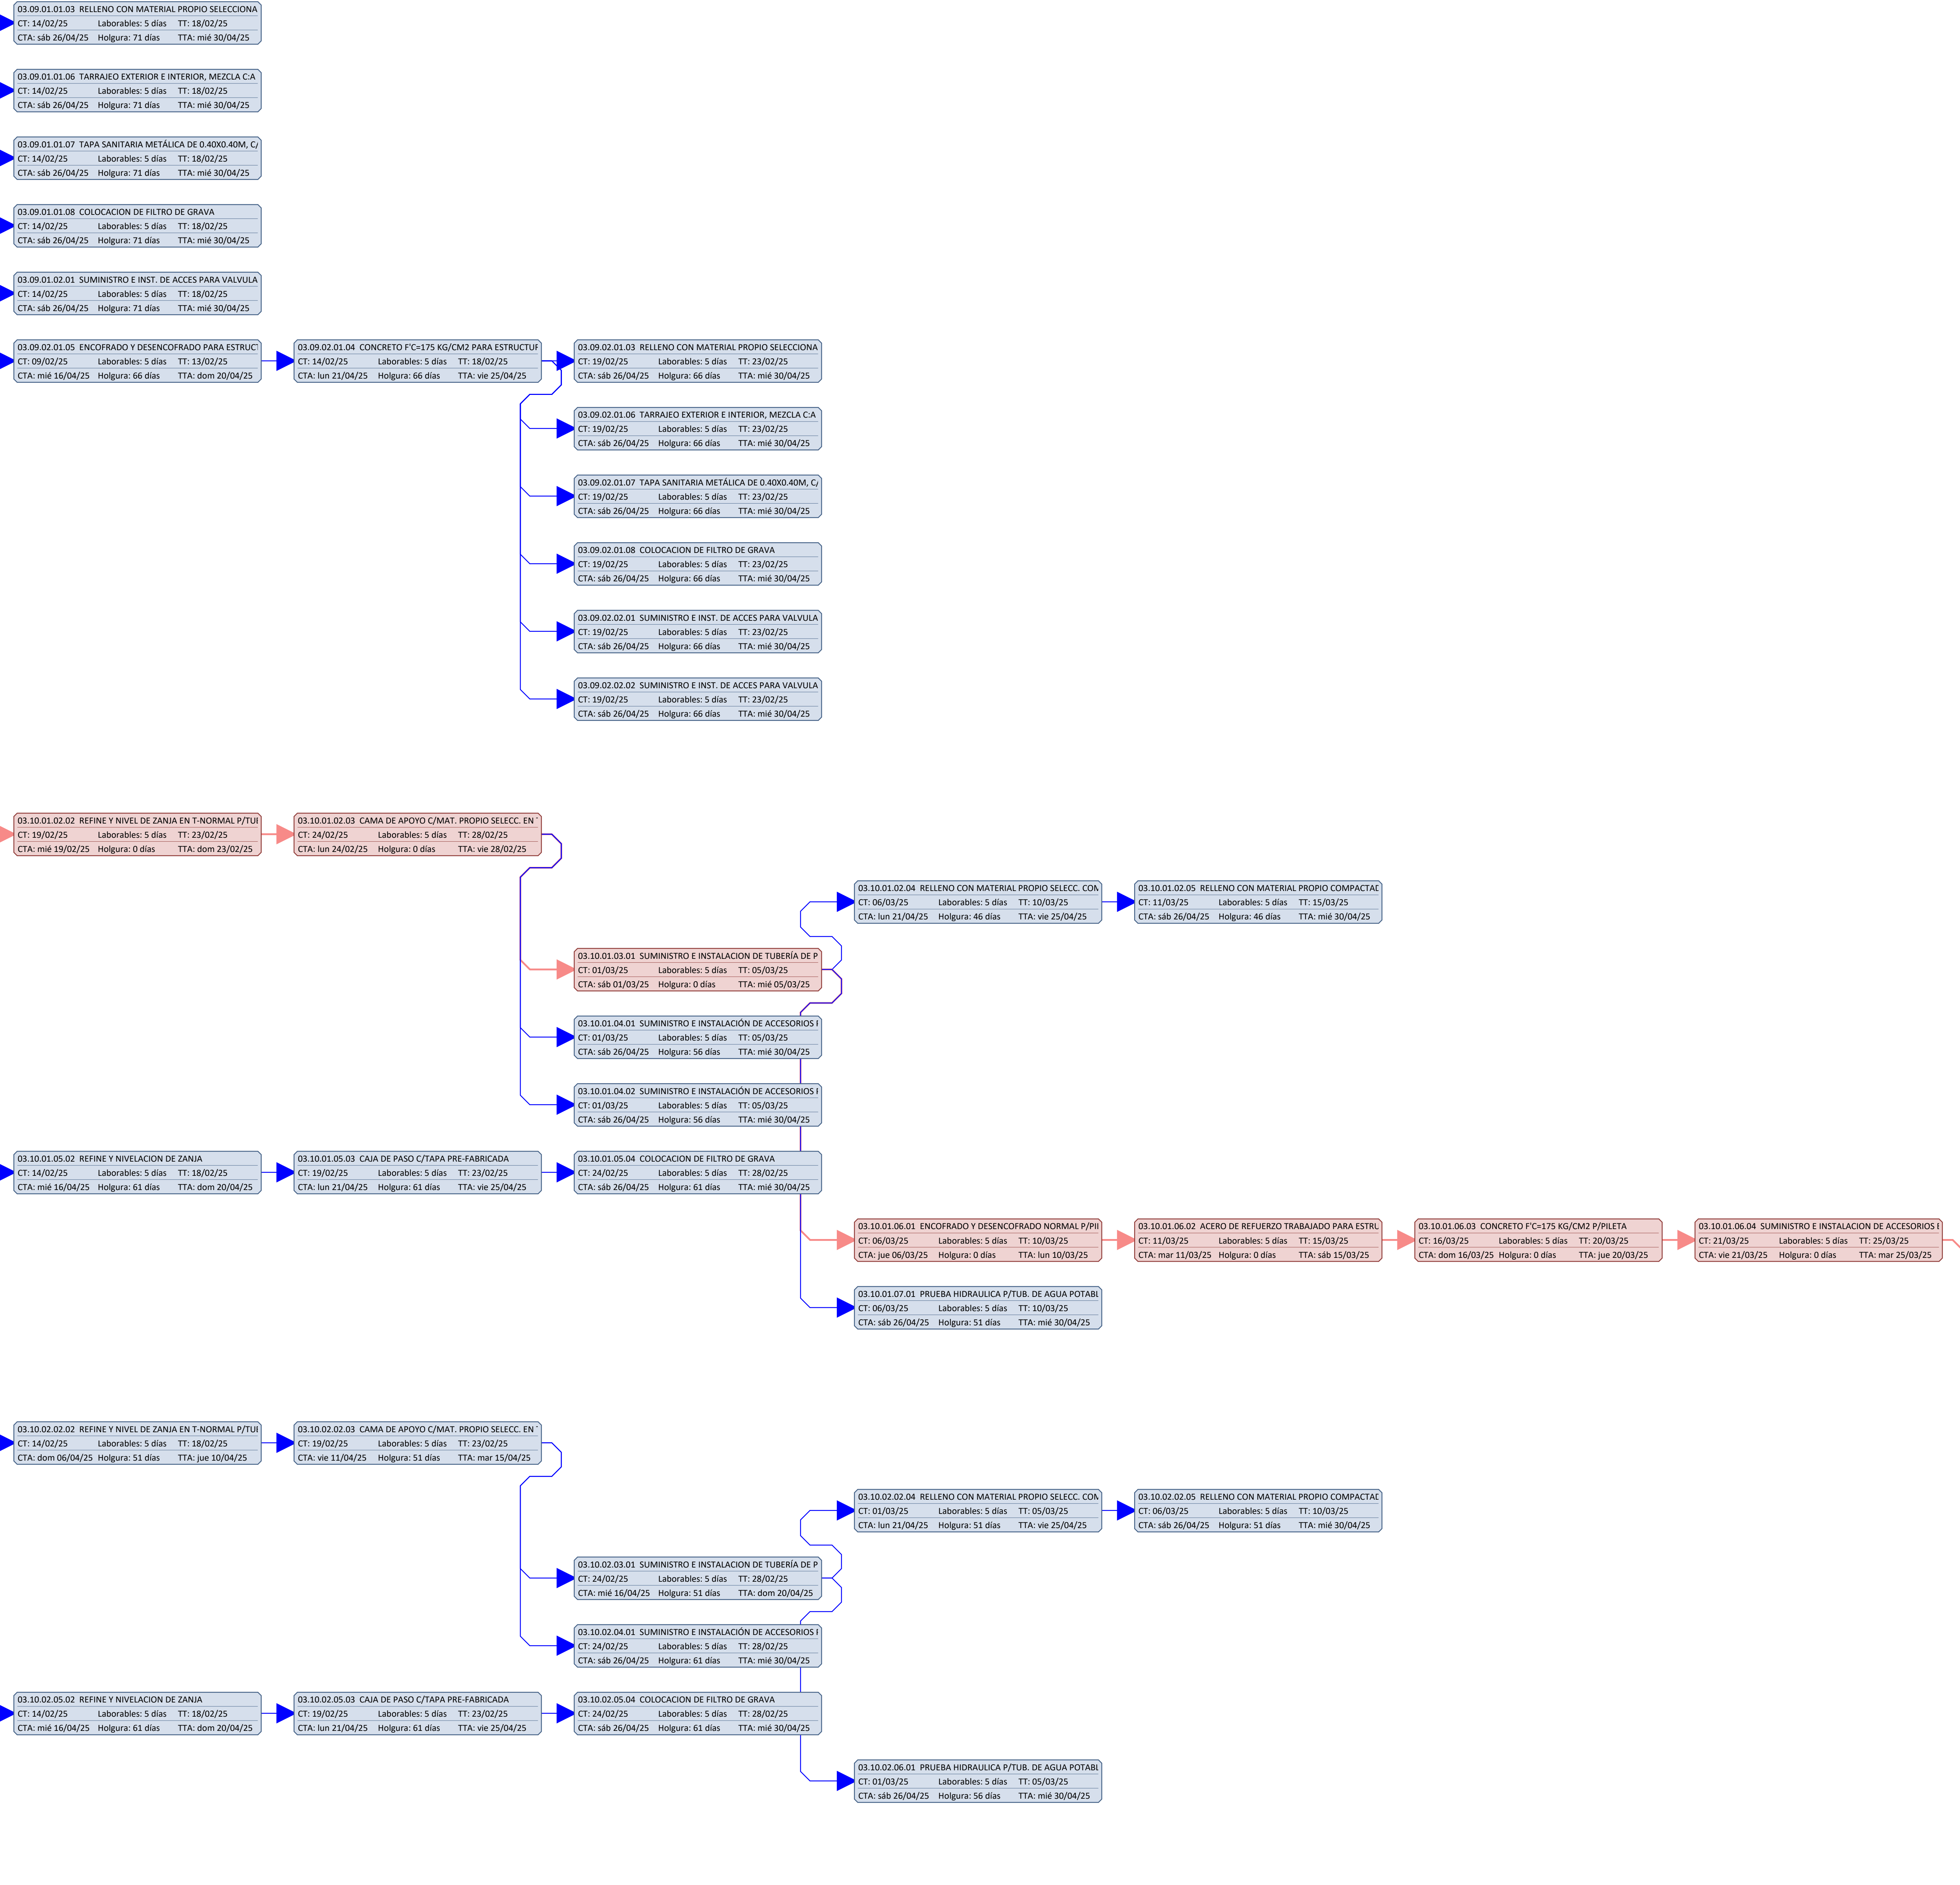






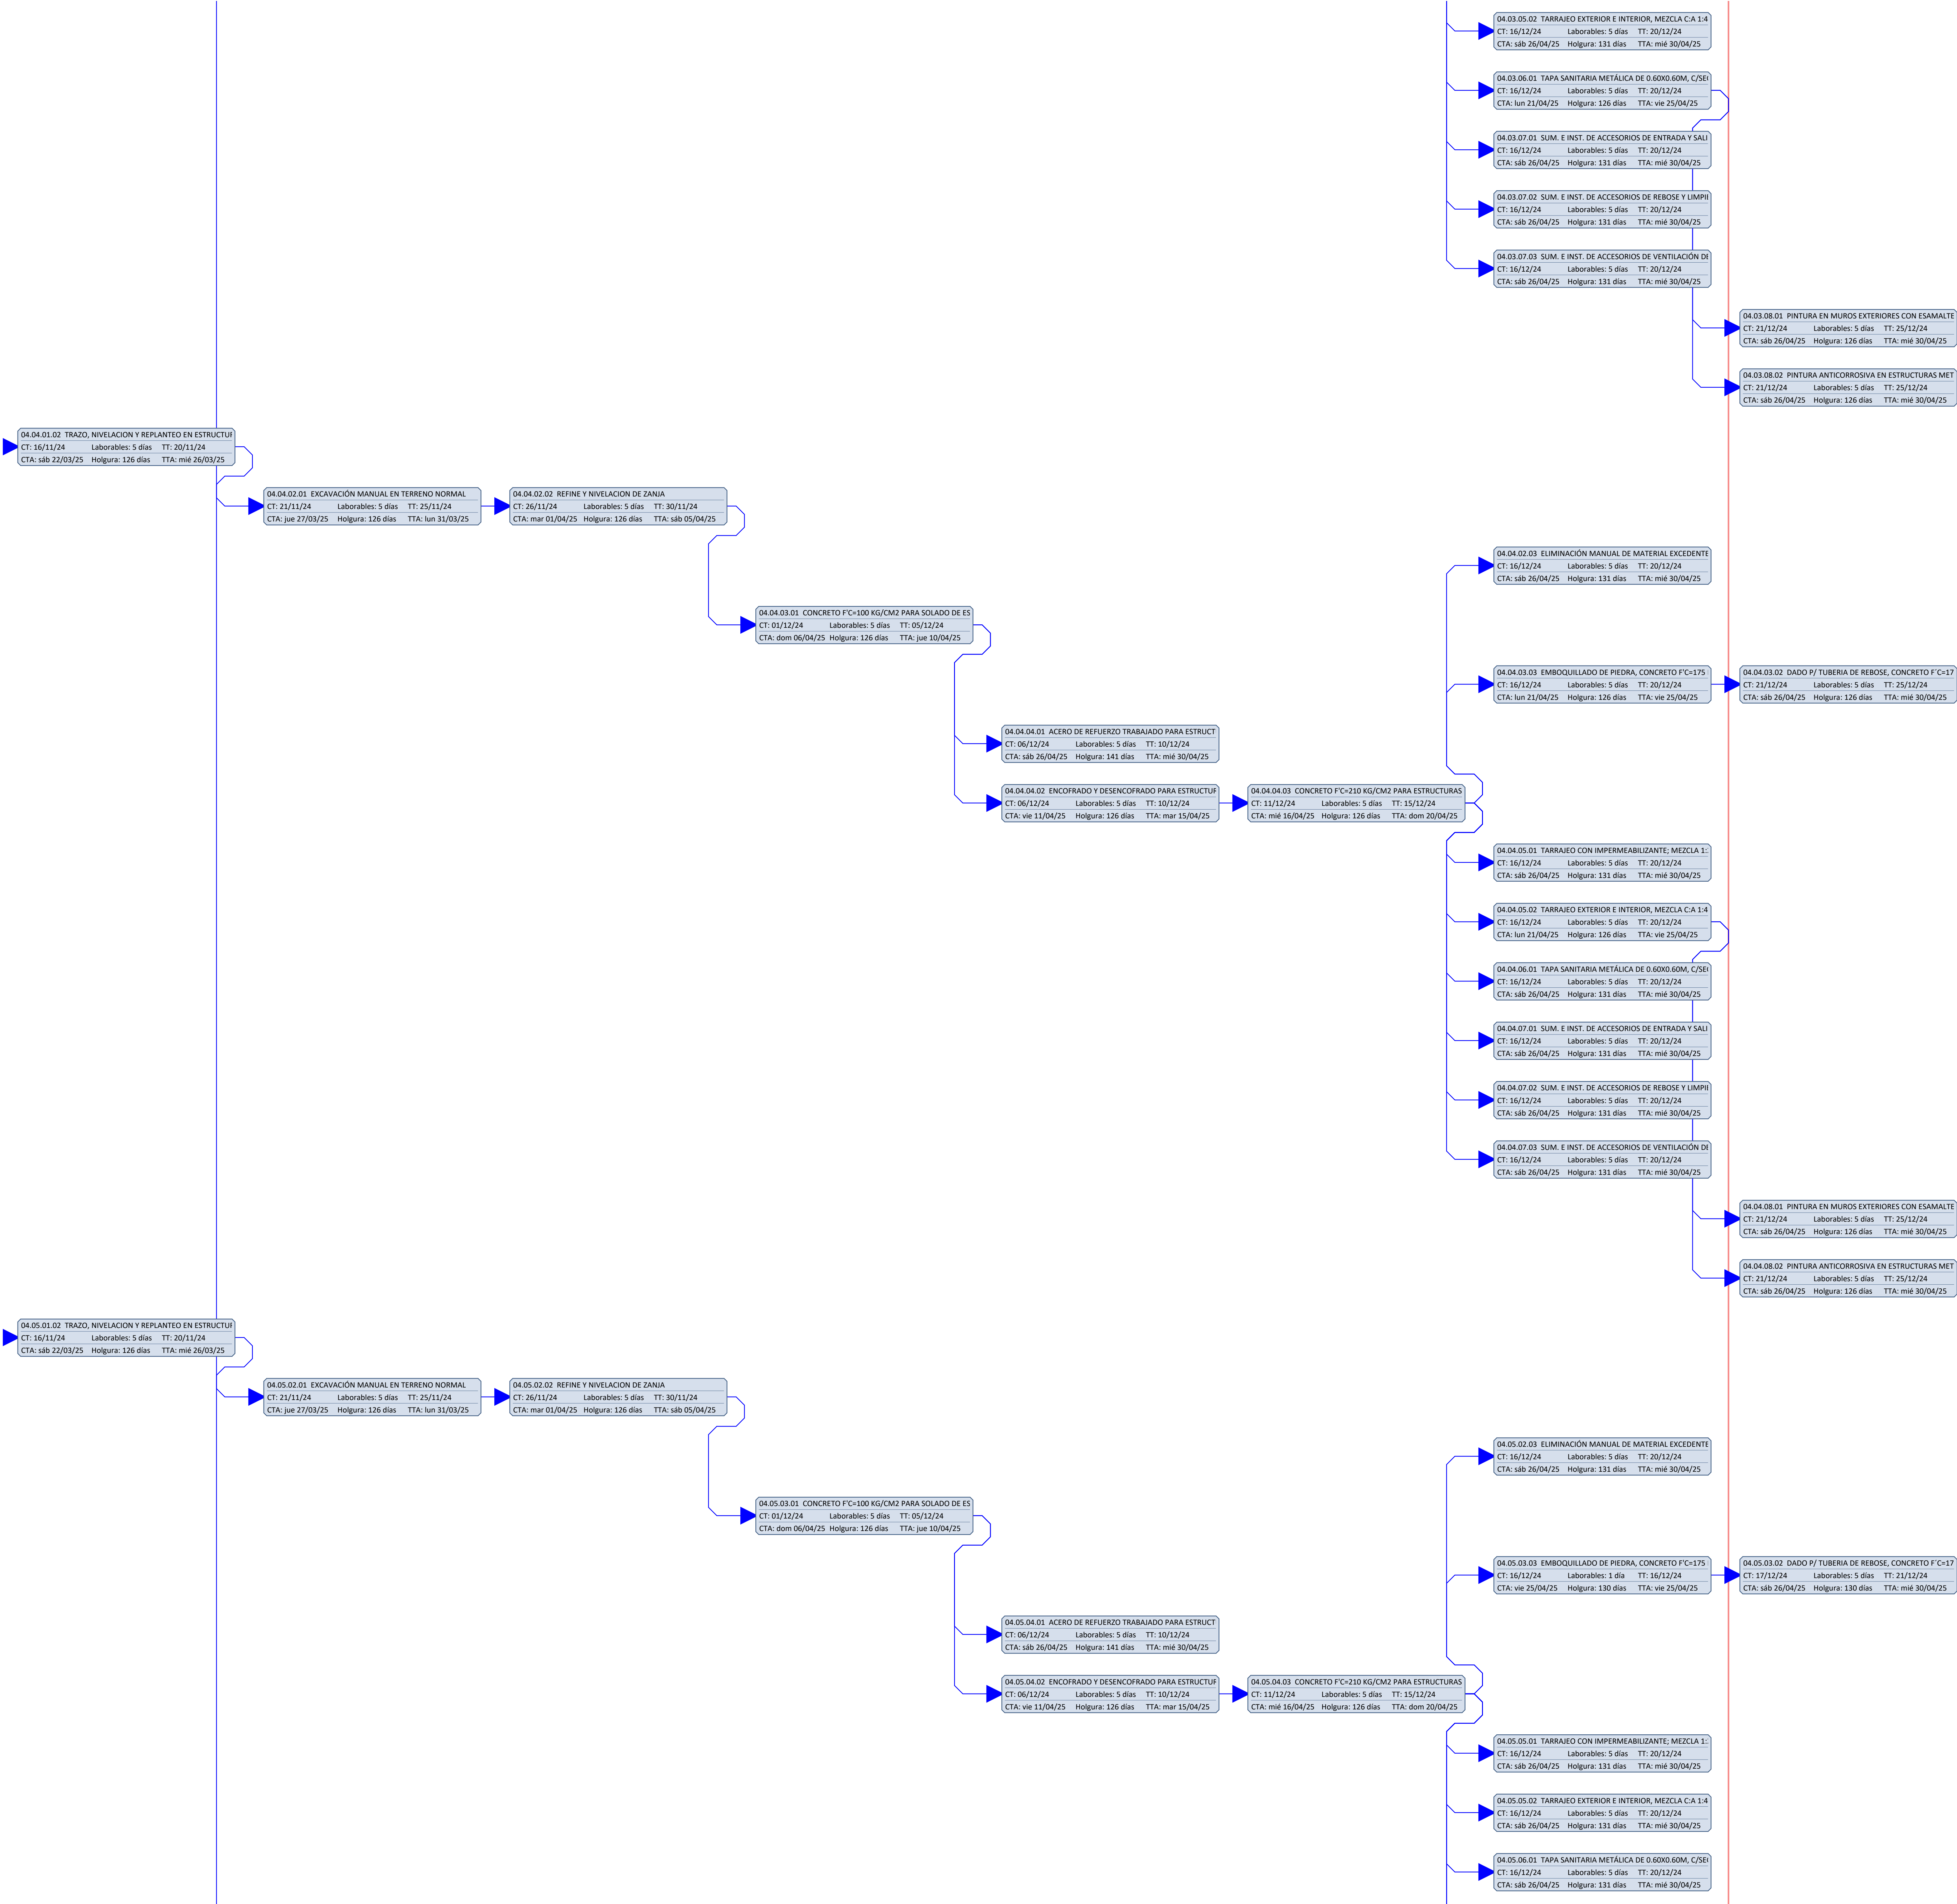

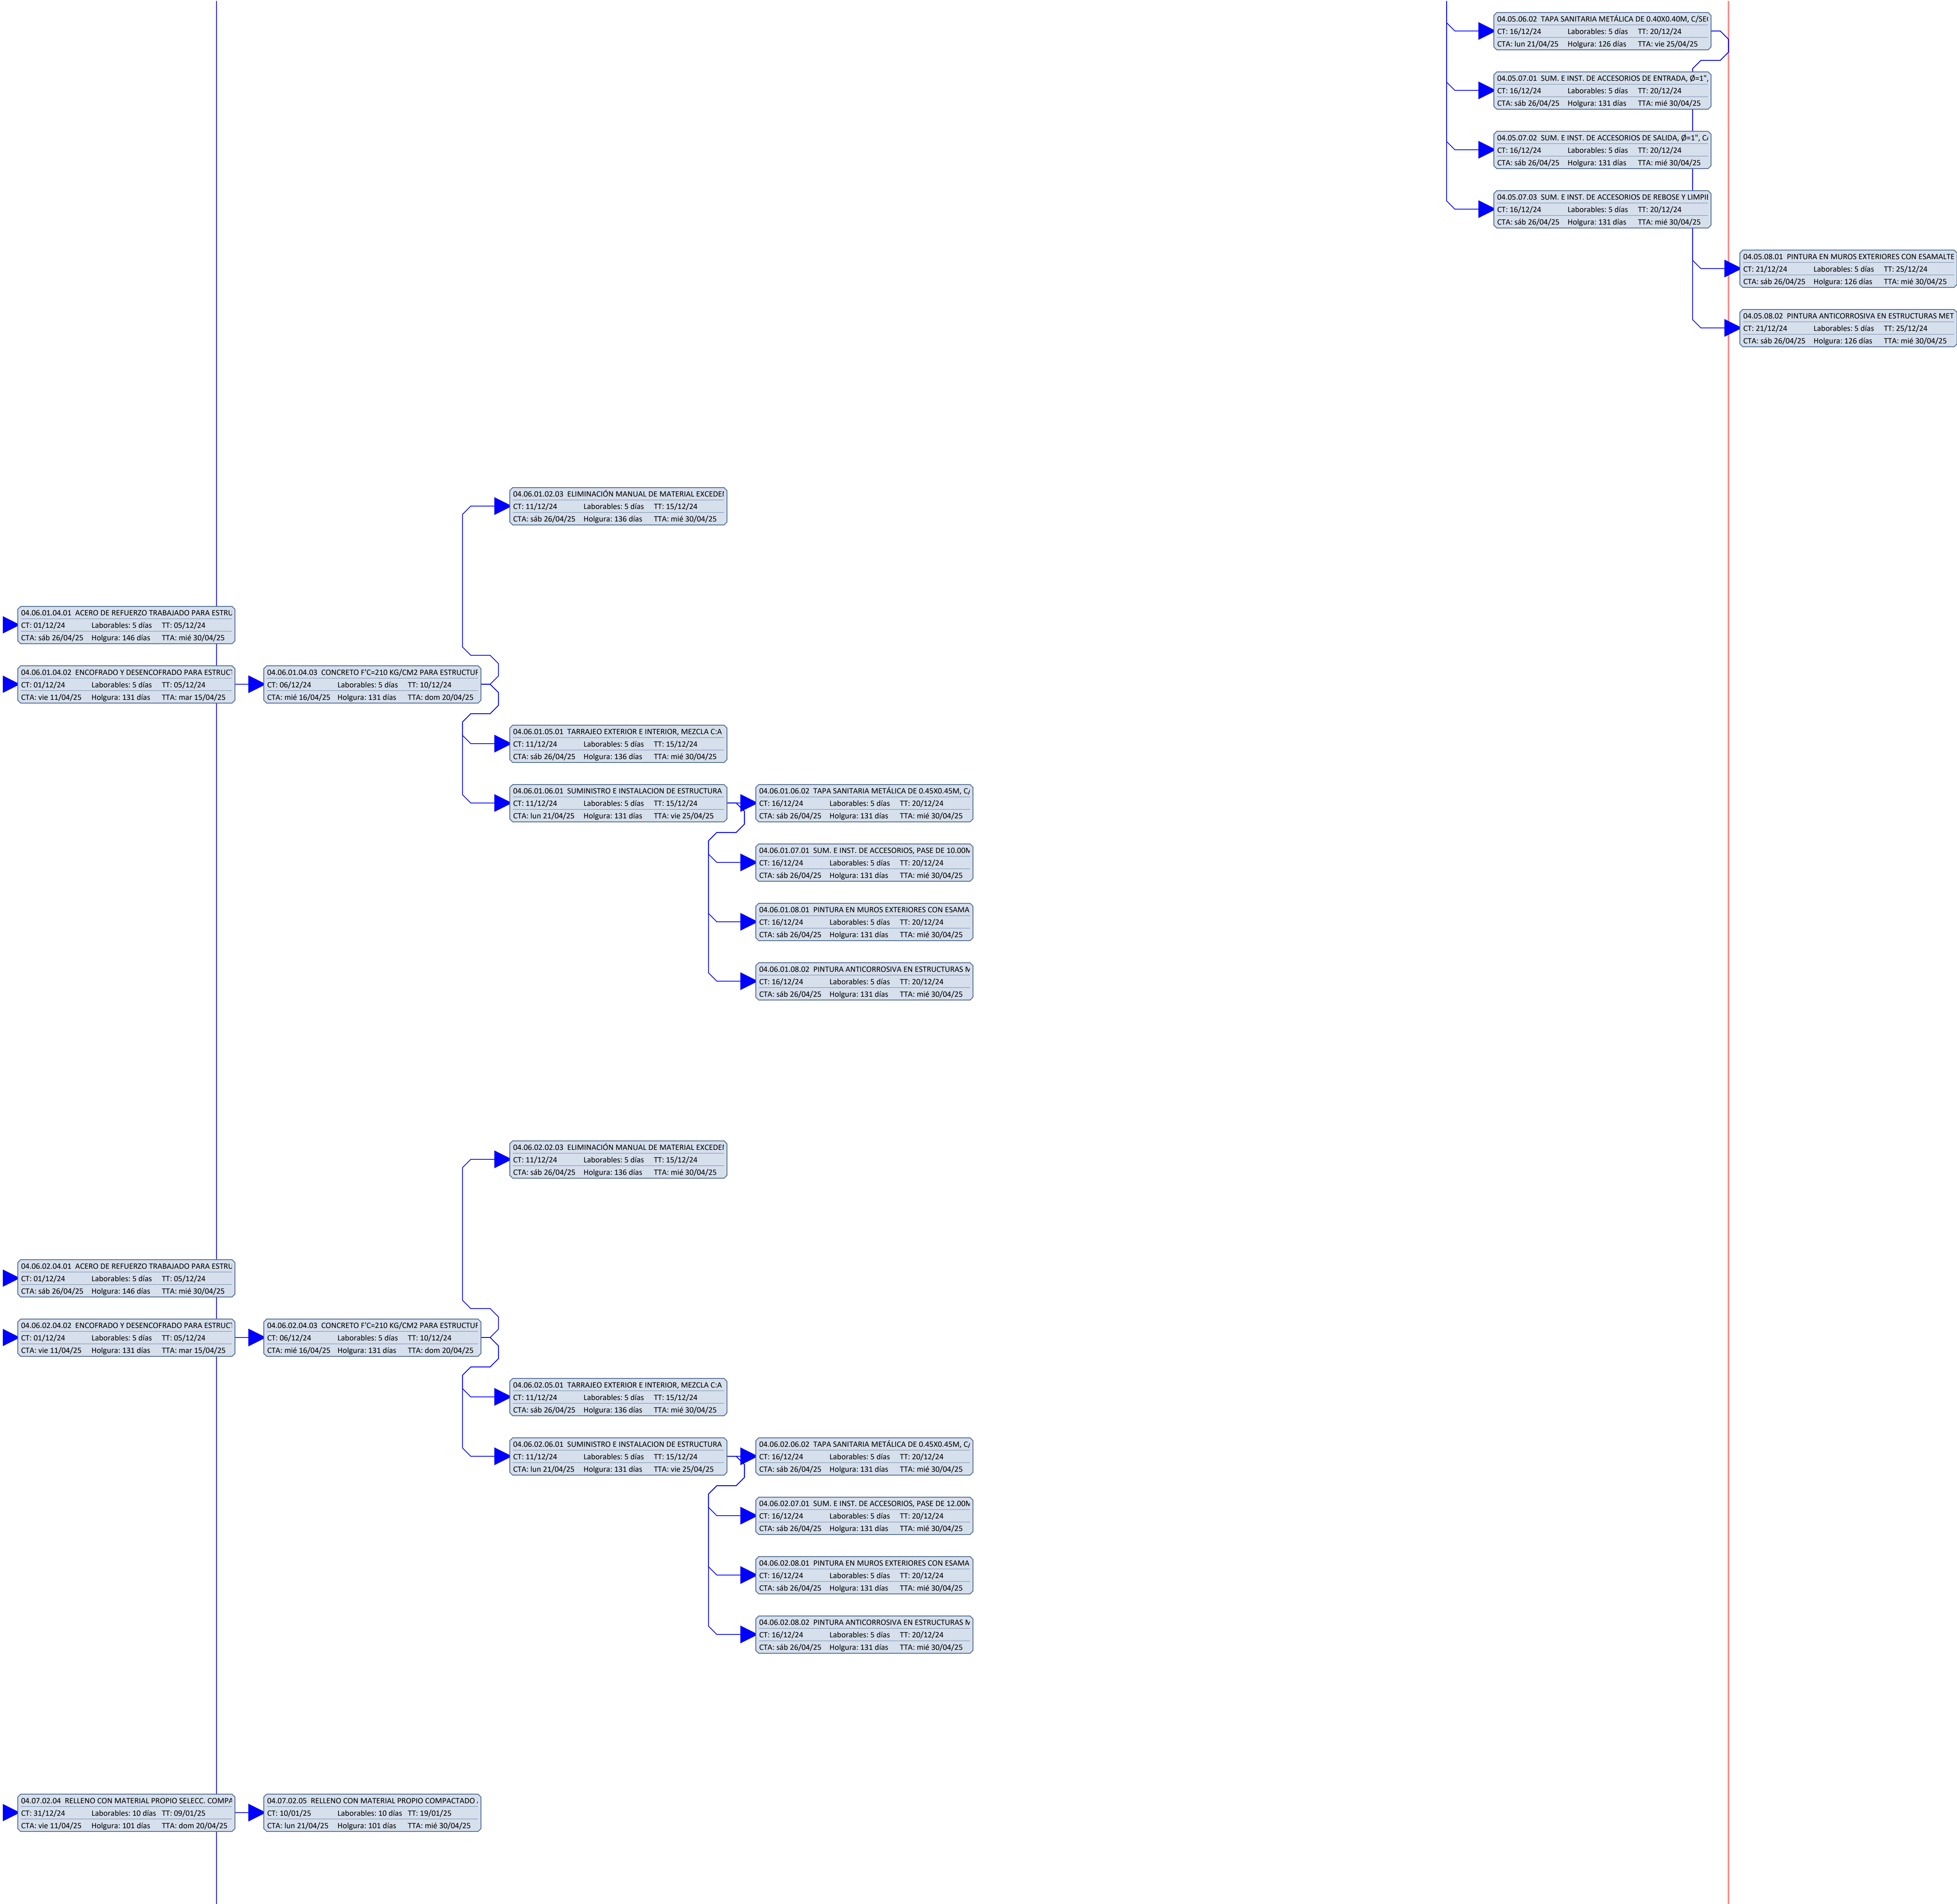



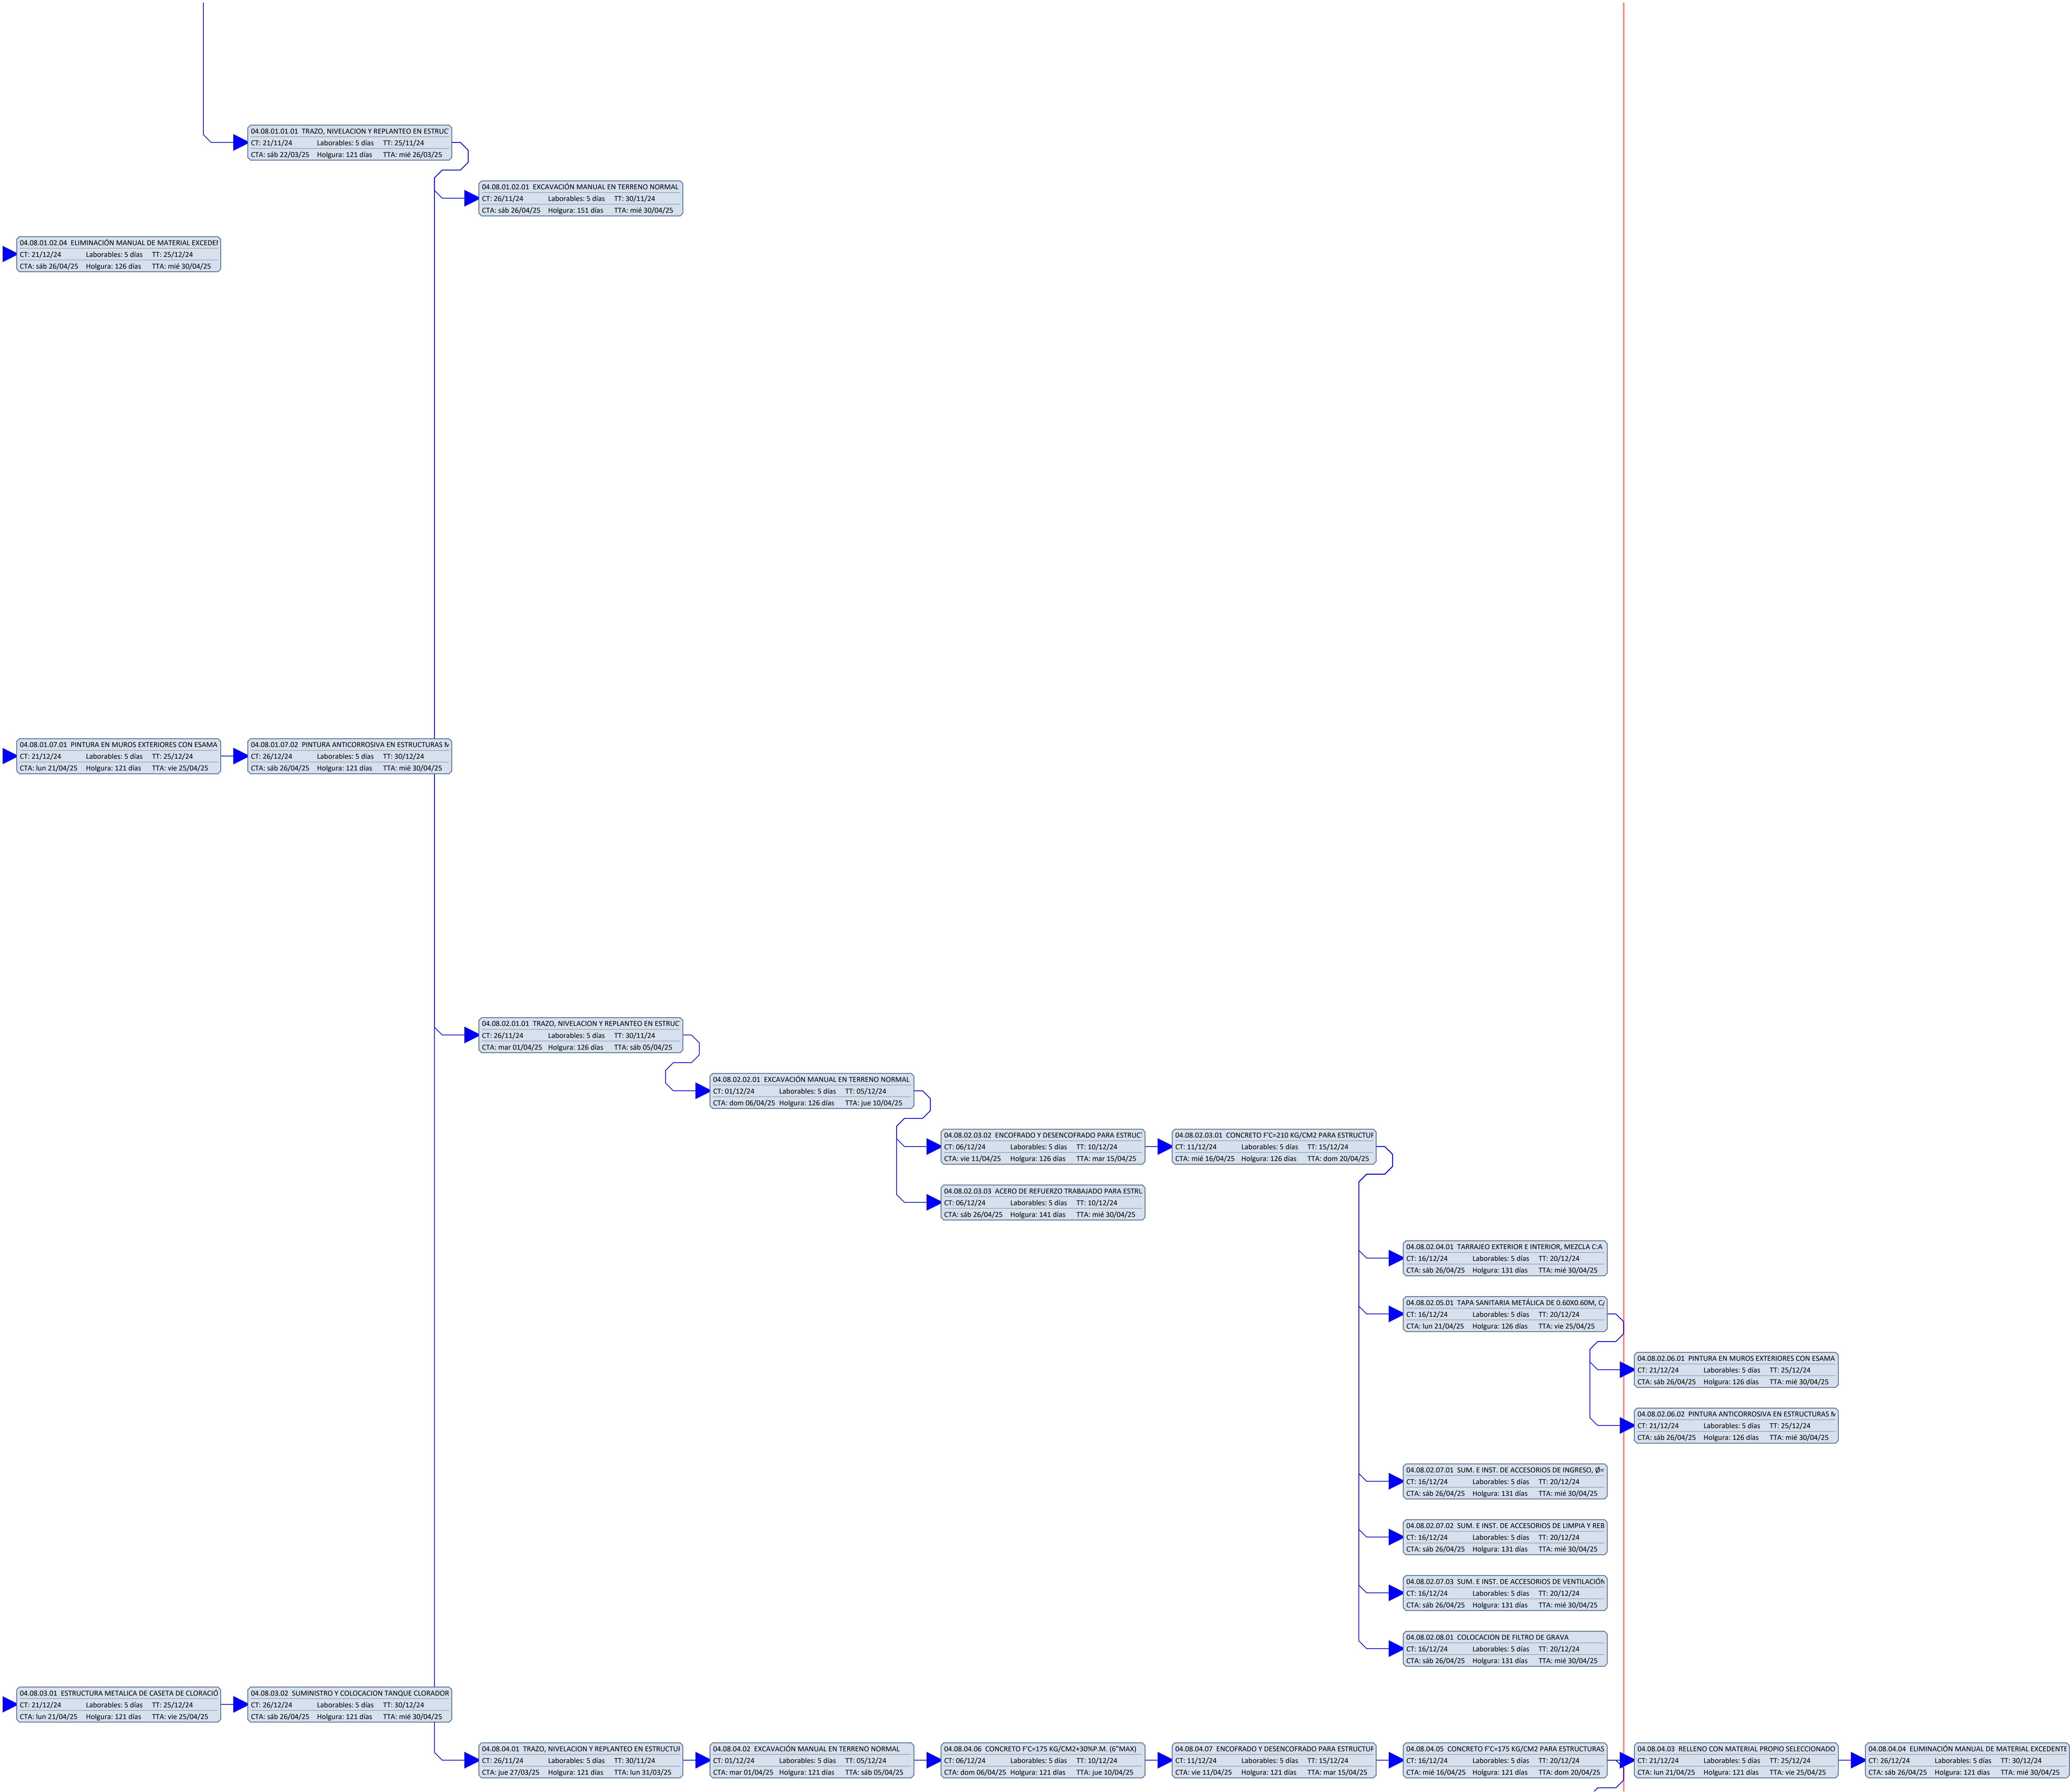

04.09.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECC. COMPACTADO	04.09.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO
CT: 01/12/24	CT: 06/12/24
Laborables: 5 días	Laborables: 5 días
TT: 05/12/24	TT: 10/12/24
CTA: lun 21/04/25	CTA: sáb 26/04/25
Holgura: 141 días	Holgura: 141 días
TTA: vie 25/04/25	TTA: mié 30/04/25

04.09.03.02 PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. DE AGUA POTABLE
CT: 01/12/24
Laborables: 5 días
TT: 05/12/24
CTA: sáb 26/04/25
Holgura: 146 días
TTA: mié 30/04/25


04.11.01.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
CT: 14/02/25
Laborables: 5 días
TT: 18/02/25
CTA: sáb 26/04/25
Holgura: 71 días
TTA: mié 30/04/25

04.11.01.01.06 TARRAJEO EXTERIOR E INTERIOR, MEZCLA C/A
CT: 14/02/25
Laborables: 5 días
TT: 18/02/25
CTA: sáb 26/04/25
Holgura: 71 días
TTA: mié 30/04/25

04.11.01.01.07 TAPA SANITARIA METÁLICA DE 0.40X0.40M, C
CT: 14/02/25
Laborables: 5 días
TT: 18/02/25
CTA: sáb 26/04/25
Holgura: 71 días
TTA: mié 30/04/25



04.11.01.01.08 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
CT: 14/02/25
Laborables: 5 días
TT: 18/02/25
CTA: sáb 26/04/25
Holgura: 71 días
TTA: mié 30/04/25



04.11.01.02.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCES PARA VALVULA
CT: 14/02/25
Laborables: 5 días
TT: 18/02/25
CTA: sáb 26/04/25
Holgura: 71 días
TTA: mié 30/04/25

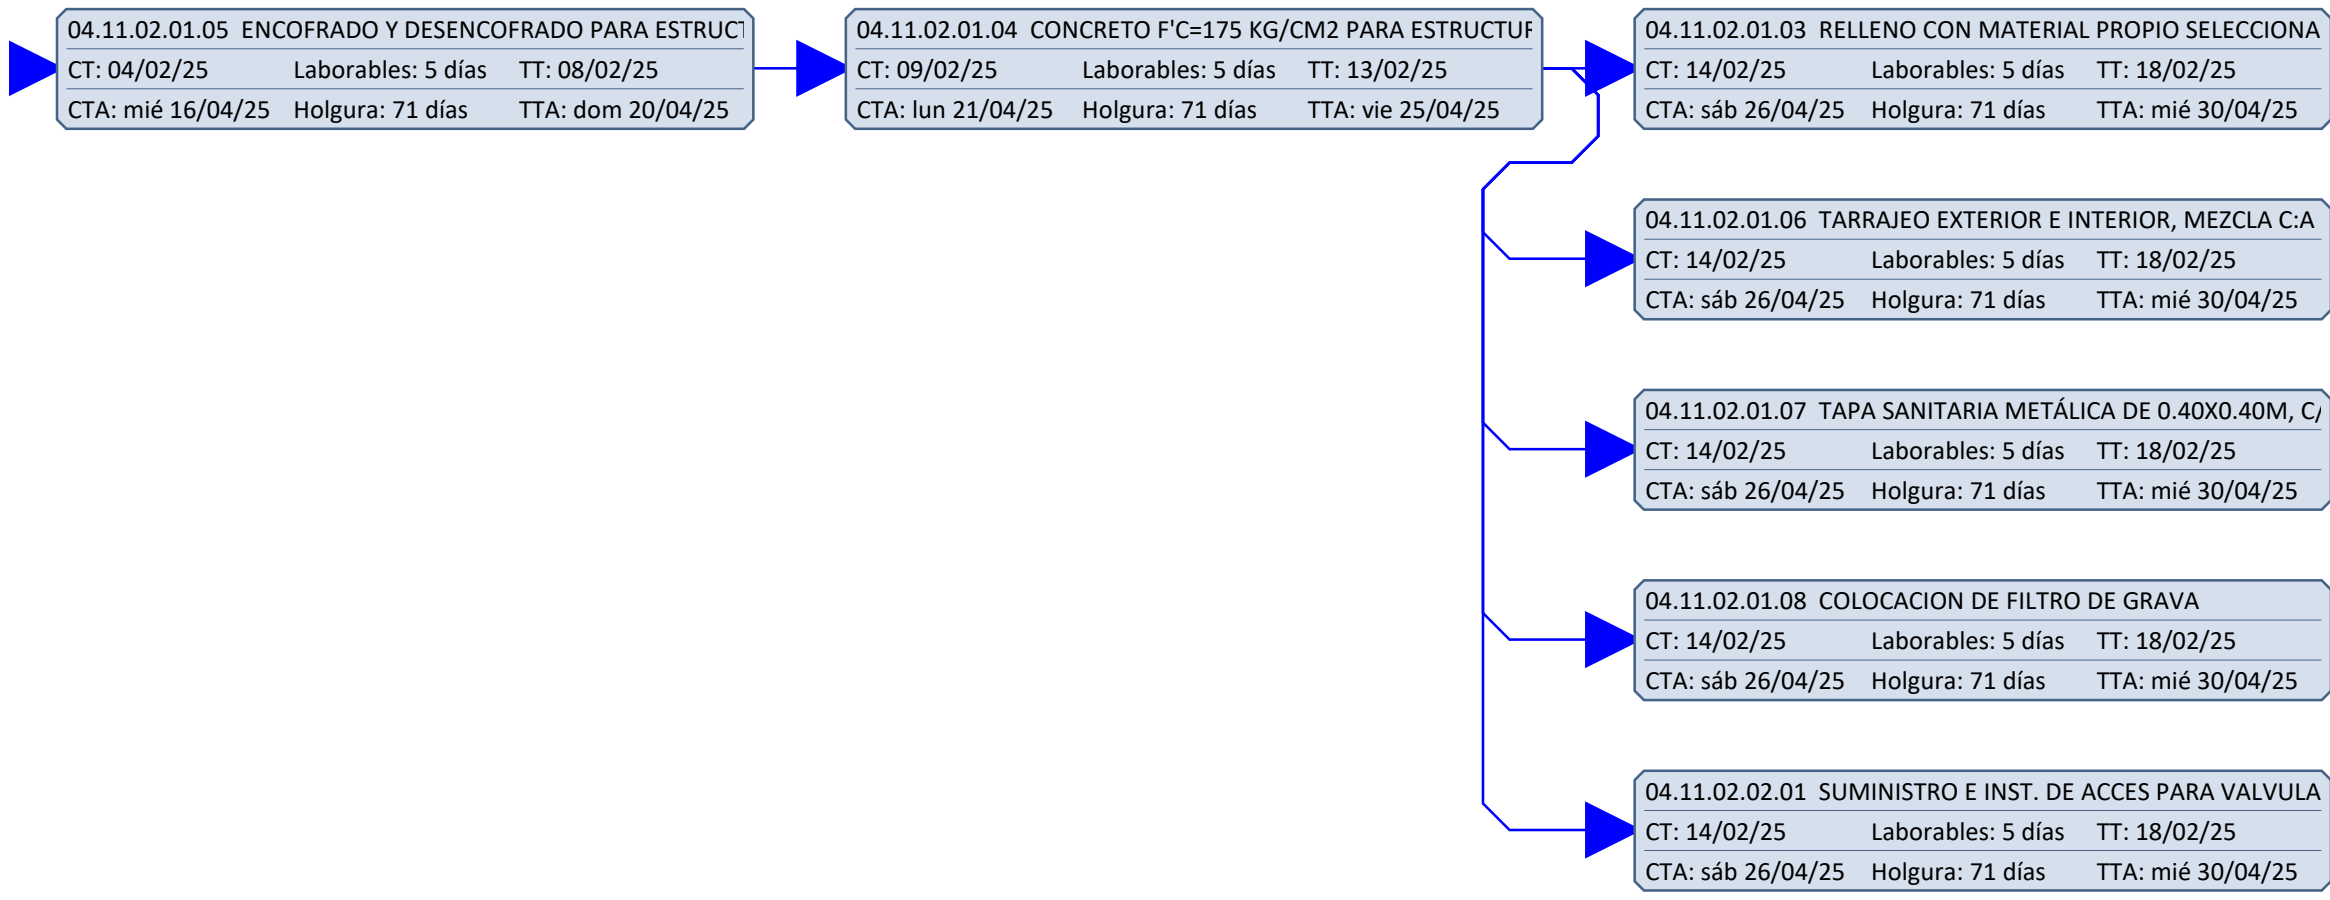

04.12.01.02.02 REFINE Y NIVEL DE ZANJA EN T-NORMAL P/TUB	04.12.01.02.03 CANA DE APOYO C/MAT. PROPIO SELECC. EN T
CT: 10/02/25	CT: 15/02/25
Laborables: 5 días	Laborables: 5 días
TT: 14/02/25	TT: 19/02/25
CTA: jue 27/03/25	CTA: mar 01/04/25
Holgura: 45 días	Holgura: 45 días
TTA: lun 31/03/25	TTA: sáb 05/04/25

04.12.01.05.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	04.12.01.05.03 CAJA DE PASO C/TAPA PRE-FABRICADA	04.12.01.05.04 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
CT: 14/02/25	CT: 19/02/25	CT: 24/02/25
Laborables: 5 días	Laborables: 5 días	Laborables: 5 días
TT: 18/02/25	TT: 23/02/25	TT: 28/02/25
CTA: mié 16/04/25	CTA: lun 21/04/25	CTA: sáb 26/04/25
Holgura: 61 días	Holgura: 61 días	Holgura: 61 días
TTA: dom 20/04/25	TTA: vie 25/04/25	TTA: mié 30/04/25

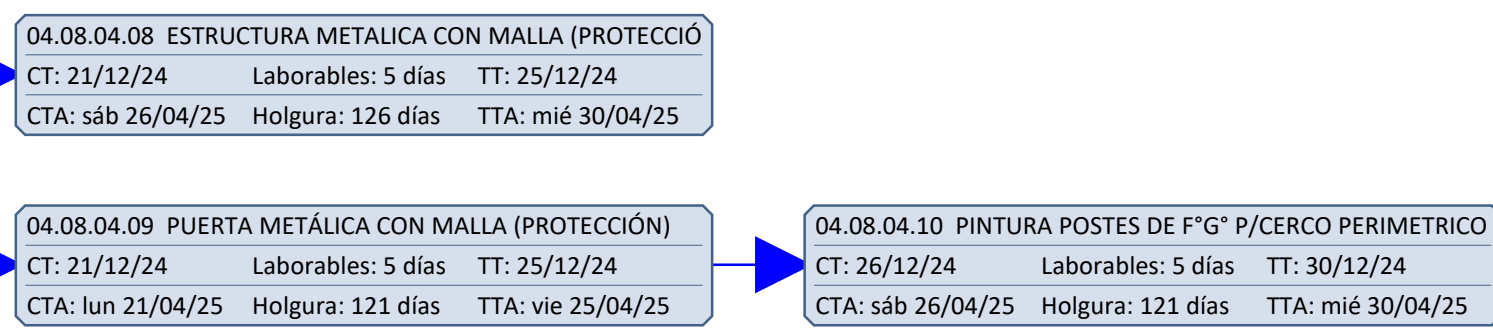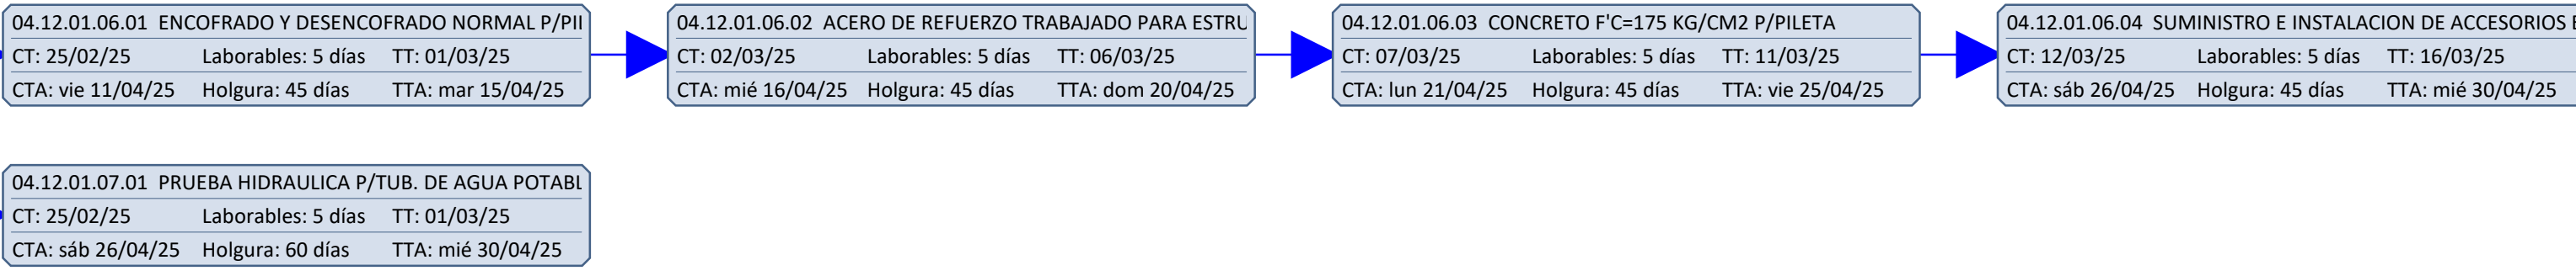

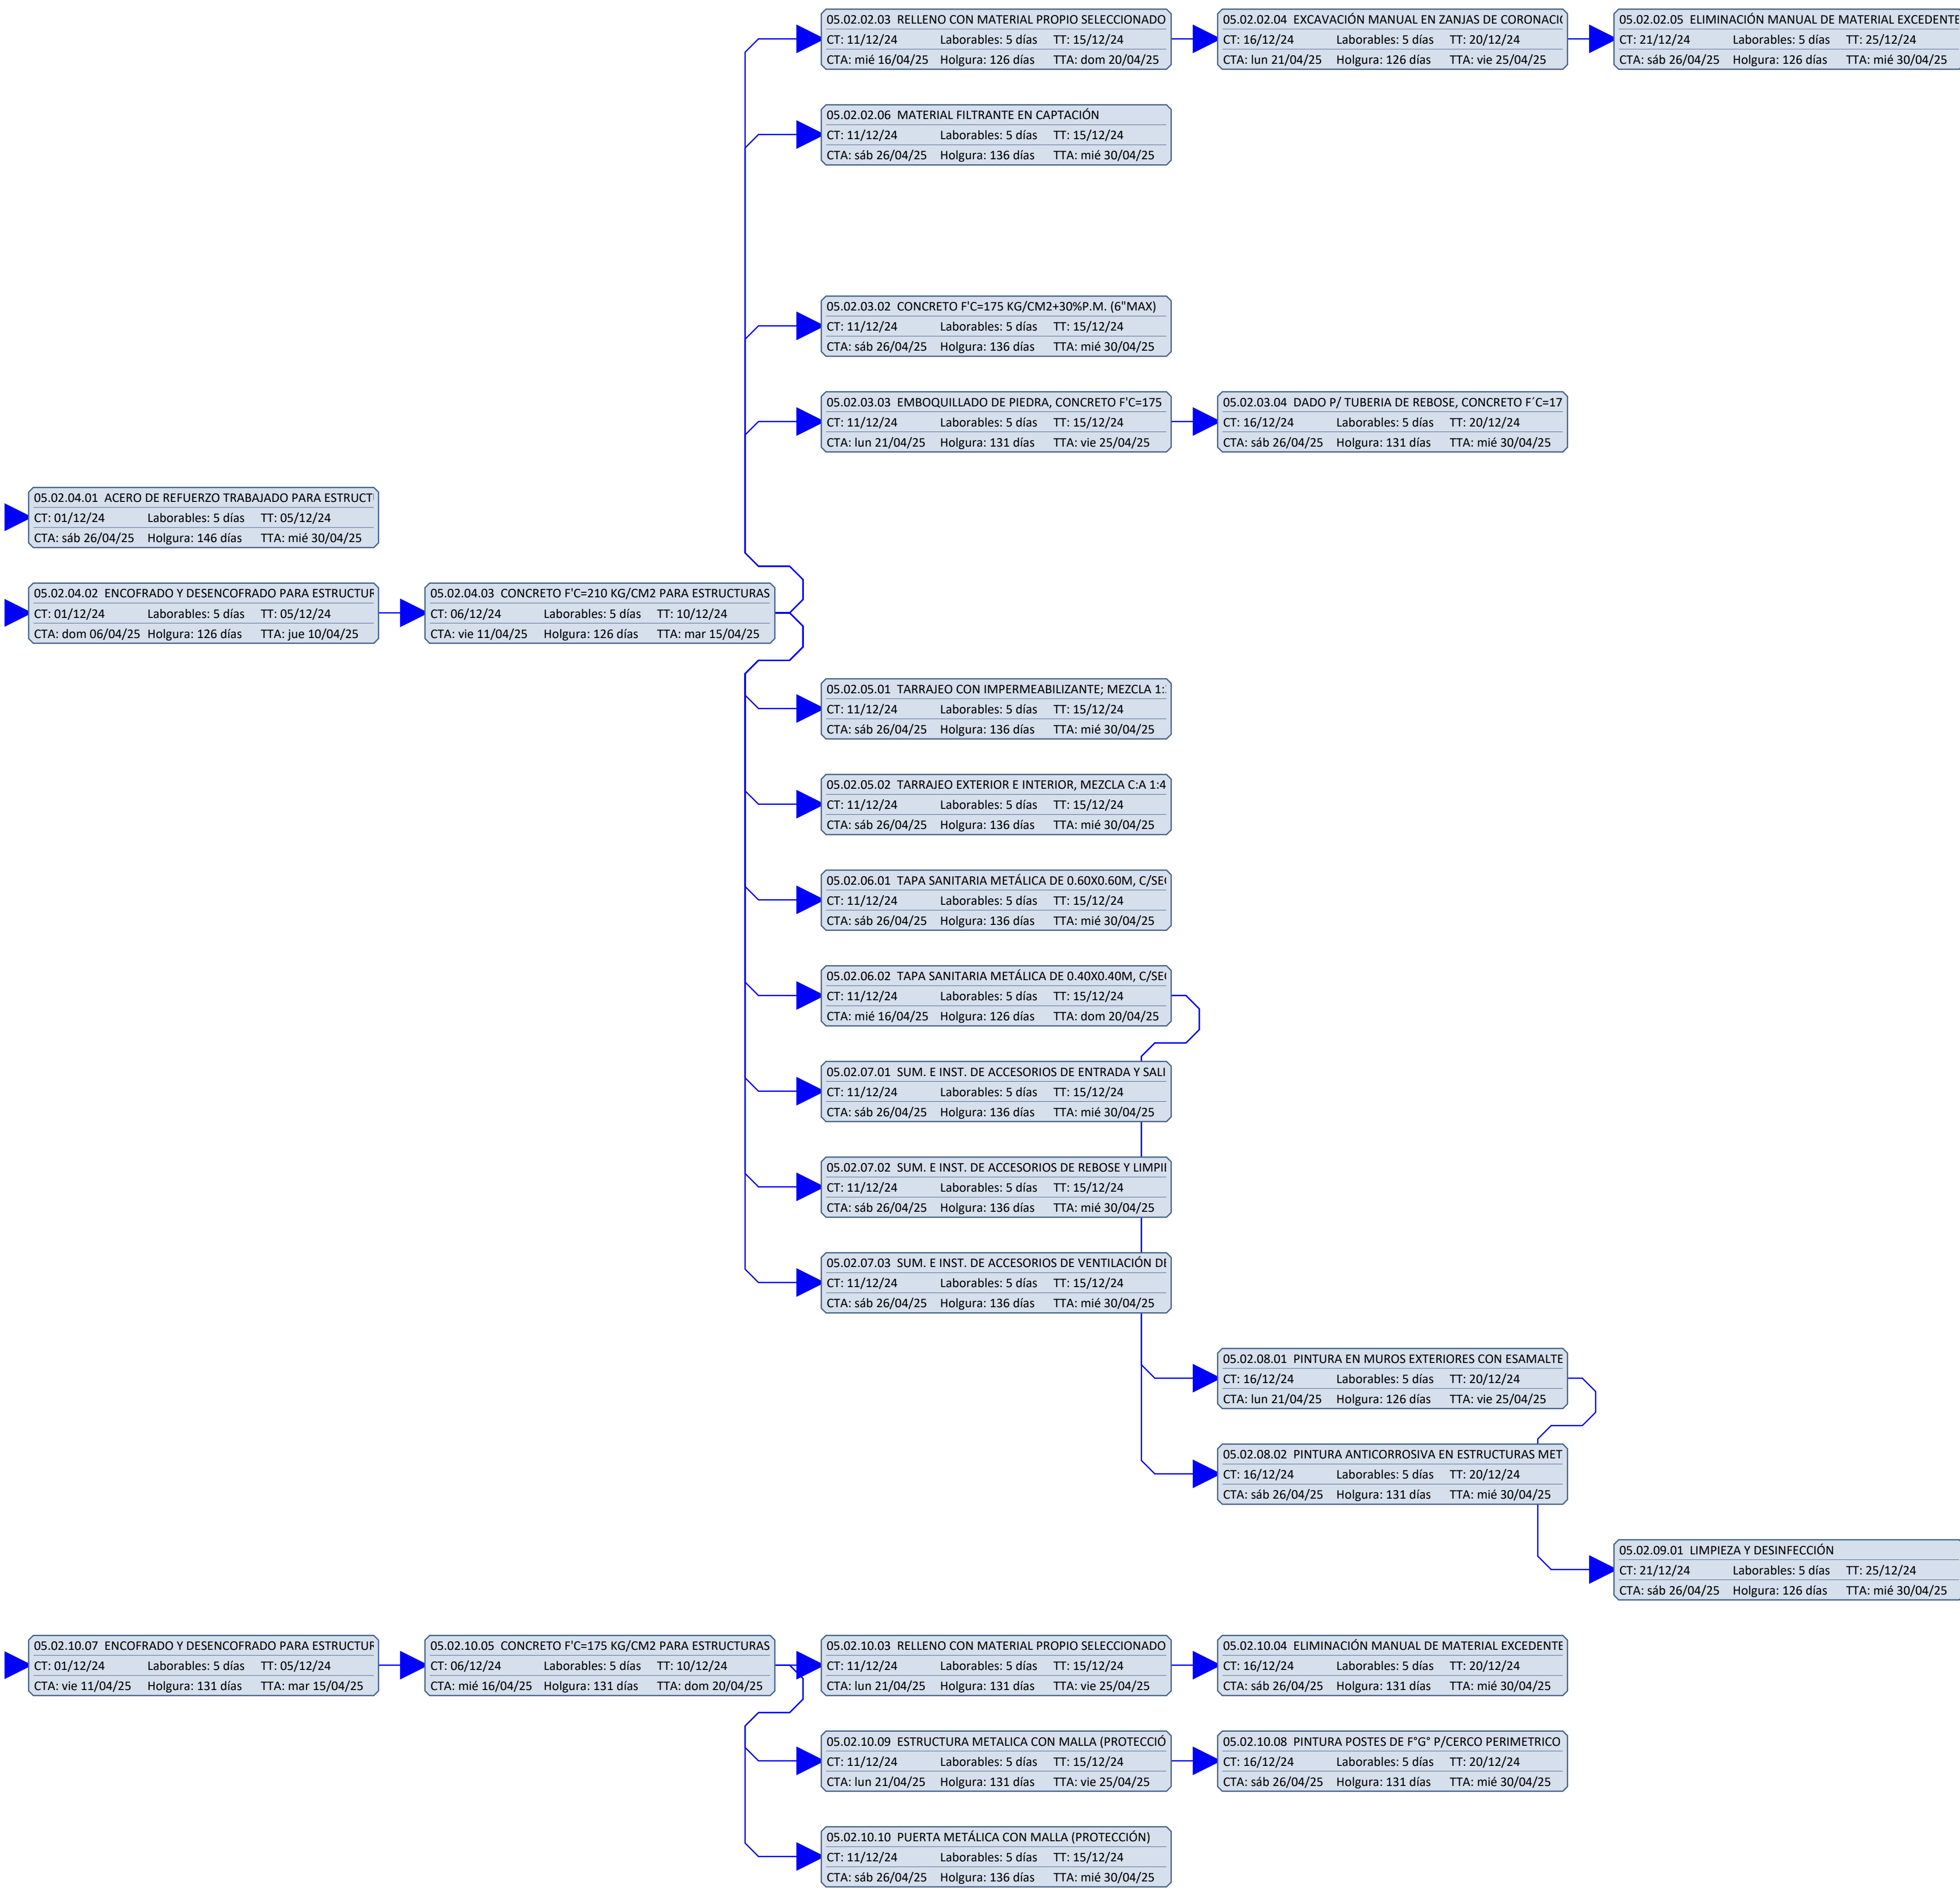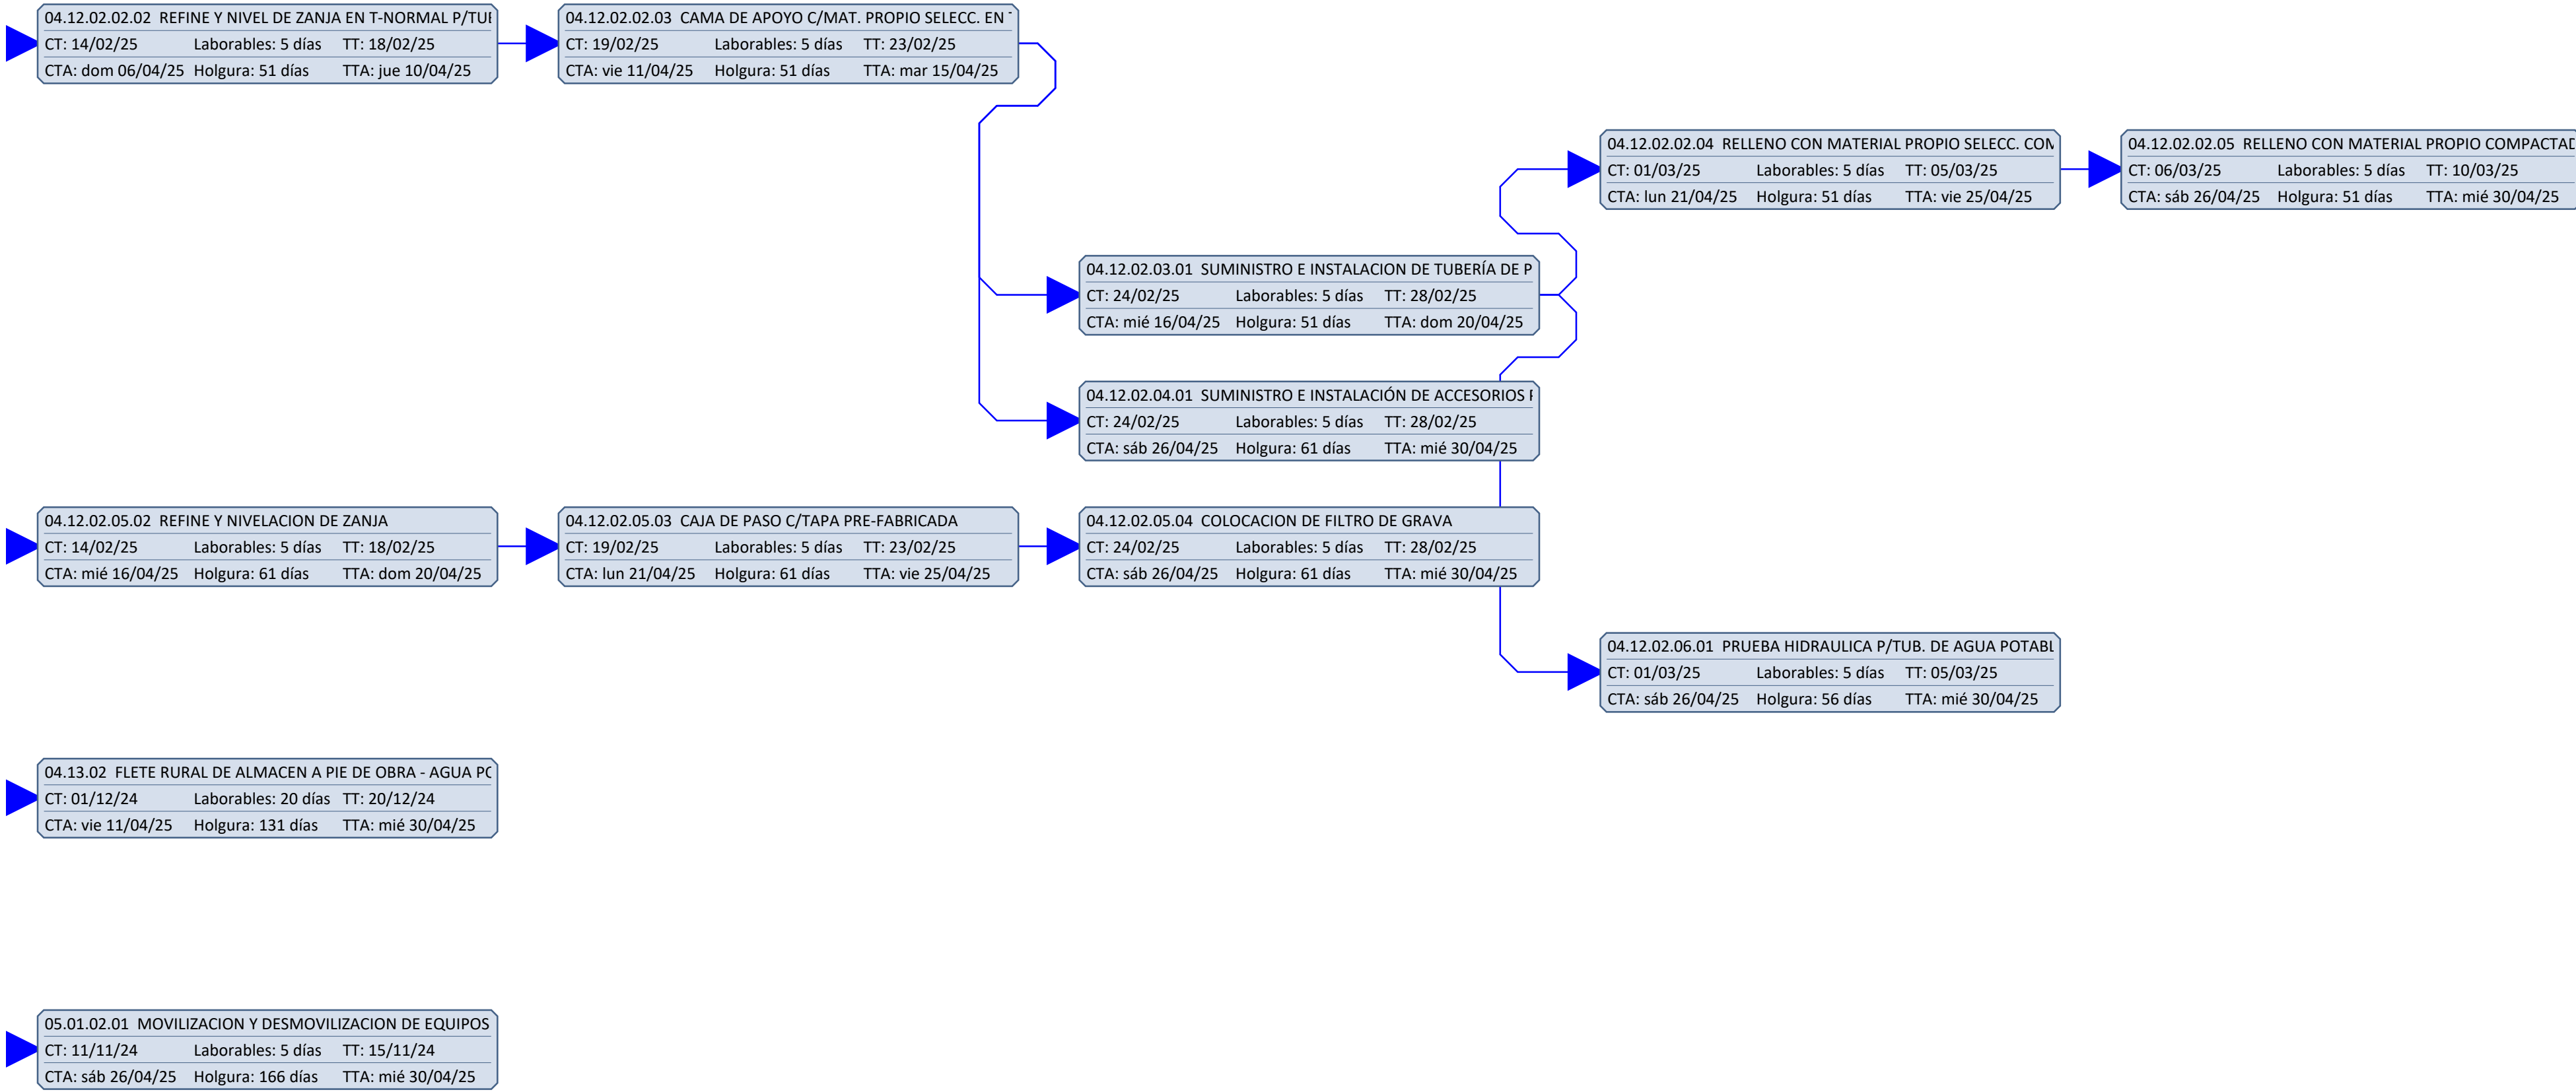



05.03.03.01. CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO DE ES  
CT: 01/12/24      Laborables: 5 días      TT: 05/12/24  
CTA: dom 06/04/25      Holgura: 126 días      TTA: jue 10/04/25

05.03.04.01. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCT  
CT: 06/12/24      Laborables: 5 días      TT: 10/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 141 días      TTA: mié 30/04/25

05.03.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTUR  
CT: 06/12/24      Laborables: 5 días      TT: 10/12/24  
CTA: vie 11/04/25      Holgura: 126 días      TTA: mar 15/04/25

05.03.04.03. CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS  
CT: 11/12/24      Laborables: 5 días      TT: 15/12/24  
CTA: mié 16/04/25      Holgura: 126 días      TTA: dom 20/04/25

05.03.02.03. ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE  
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días      TT: 20/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 131 días      TTA: mié 30/04/25

05.03.03.03. EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=175  
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días      TT: 20/12/24  
CTA: lun 21/04/25      Holgura: 126 días      TTA: vie 25/04/25

05.03.03.02. DADO P/ TUBERIA DE REBOSE, CONCRETO F'C=17  
CT: 21/12/24      Laborables: 5 días      TT: 25/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 126 días      TTA: mié 30/04/25

05.03.05.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:  
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días      TT: 20/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 131 días      TTA: mié 30/04/25

05.03.05.02. TARRAJEO EXTERIOR E INTERIOR, MEZCLA C/A 1:4  
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días      TT: 20/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 131 días      TTA: mié 30/04/25

05.03.06.01. TAPA SANITARIA METÁLICA DE Ø 60XØ 60M, C/SEI  
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días      TT: 20/12/24  
CTA: lun 21/04/25      Holgura: 126 días      TTA: vie 25/04/25

05.03.07.01. SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALI  
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días      TT: 20/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 131 días      TTA: mié 30/04/25

05.03.07.02. SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPI  
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días      TT: 20/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 131 días      TTA: mié 30/04/25

05.03.07.03. SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN DI  
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días      TT: 20/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 131 días      TTA: mié 30/04/25

05.03.08.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESAMALTE  
CT: 21/12/24      Laborables: 5 días      TT: 25/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 126 días      TTA: mié 30/04/25

05.03.08.02. PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS MET  
CT: 21/12/24      Laborables: 5 días      TT: 25/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 126 días      TTA: mié 30/04/25

05.04.01.01. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO  
CT: 11/11/24      Laborables: 5 días      TT: 15/11/24  
CTA: lun 17/03/25      Holgura: 126 días      TTA: vie 21/03/25

05.04.01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTUR  
CT: 16/11/24      Laborables: 5 días      TT: 20/11/24  
CTA: sáb 22/03/25      Holgura: 126 días      TTA: mié 26/03/25

05.04.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL  
CT: 21/11/24      Laborables: 5 días      TT: 26/11/24  
CTA: jue 27/03/25      Holgura: 126 días      TTA: lun 31/03/25

05.04.02.02. REFINE Y NIVELACION DE ZANIA  
CT: 26/11/24      Laborables: 5 días      TT: 30/11/24  
CTA: mar 01/04/25      Holgura: 126 días      TTA: sáb 05/04/25

05.04.03.01. CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO DE ES  
CT: 01/12/24      Laborables: 5 días      TT: 05/12/24  
CTA: dom 06/04/25      Holgura: 126 días      TTA: jue 10/04/25

05.04.04.01. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCT  
CT: 06/12/24      Laborables: 5 días      TT: 10/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 141 días      TTA: mié 30/04/25

05.04.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTUR  
CT: 06/12/24      Laborables: 5 días      TT: 10/12/24  
CTA: vie 11/04/25      Holgura: 126 días      TTA: mar 15/04/25

05.04.04.03. CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS  
CT: 11/12/24      Laborables: 5 días      TT: 15/12/24  
CTA: mié 16/04/25      Holgura: 126 días      TTA: dom 20/04/25

05.04.02.03. ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE  
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días      TT: 20/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 131 días      TTA: mié 30/04/25

05.04.03.03. EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=175  
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días      TT: 20/12/24  
CTA: lun 21/04/25      Holgura: 126 días      TTA: vie 25/04/25

05.04.03.02. DADO P/ TUBERIA DE REBOSE, CONCRETO F'C=17  
CT: 21/12/24      Laborables: 5 días      TT: 25/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 126 días      TTA: mié 30/04/25

05.04.05.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:  
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días      TT: 20/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 131 días      TTA: mié 30/04/25

05.04.05.02. TARRAJEO EXTERIOR E INTERIOR, MEZCLA C/A 1:4  
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días      TT: 20/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 131 días      TTA: mié 30/04/25

05.04.06.01. TAPA SANITARIA METÁLICA DE Ø 60XØ 60M, C/SEI  
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días      TT: 20/12/24  
CTA: lun 21/04/25      Holgura: 126 días      TTA: vie 25/04/25


05.04.07.01. SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALI  
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días      TT: 20/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 131 días      TTA: mié 30/04/25


05.04.07.02. SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPI  
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días      TT: 20/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 131 días      TTA: mié 30/04/25

05.04.07.03. SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN DI  
CT: 16/12/24      Laborables: 5 días      TT: 20/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 131 días      TTA: mié 30/04/25

05.04.08.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESAMALTE  
CT: 21/12/24      Laborables: 5 días      TT: 25/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 126 días      TTA: mié 30/04/25


05.04.08.02. PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS MET  
CT: 21/12/24      Laborables: 5 días      TT: 25/12/24  
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 126 días      TTA: mié 30/04/25

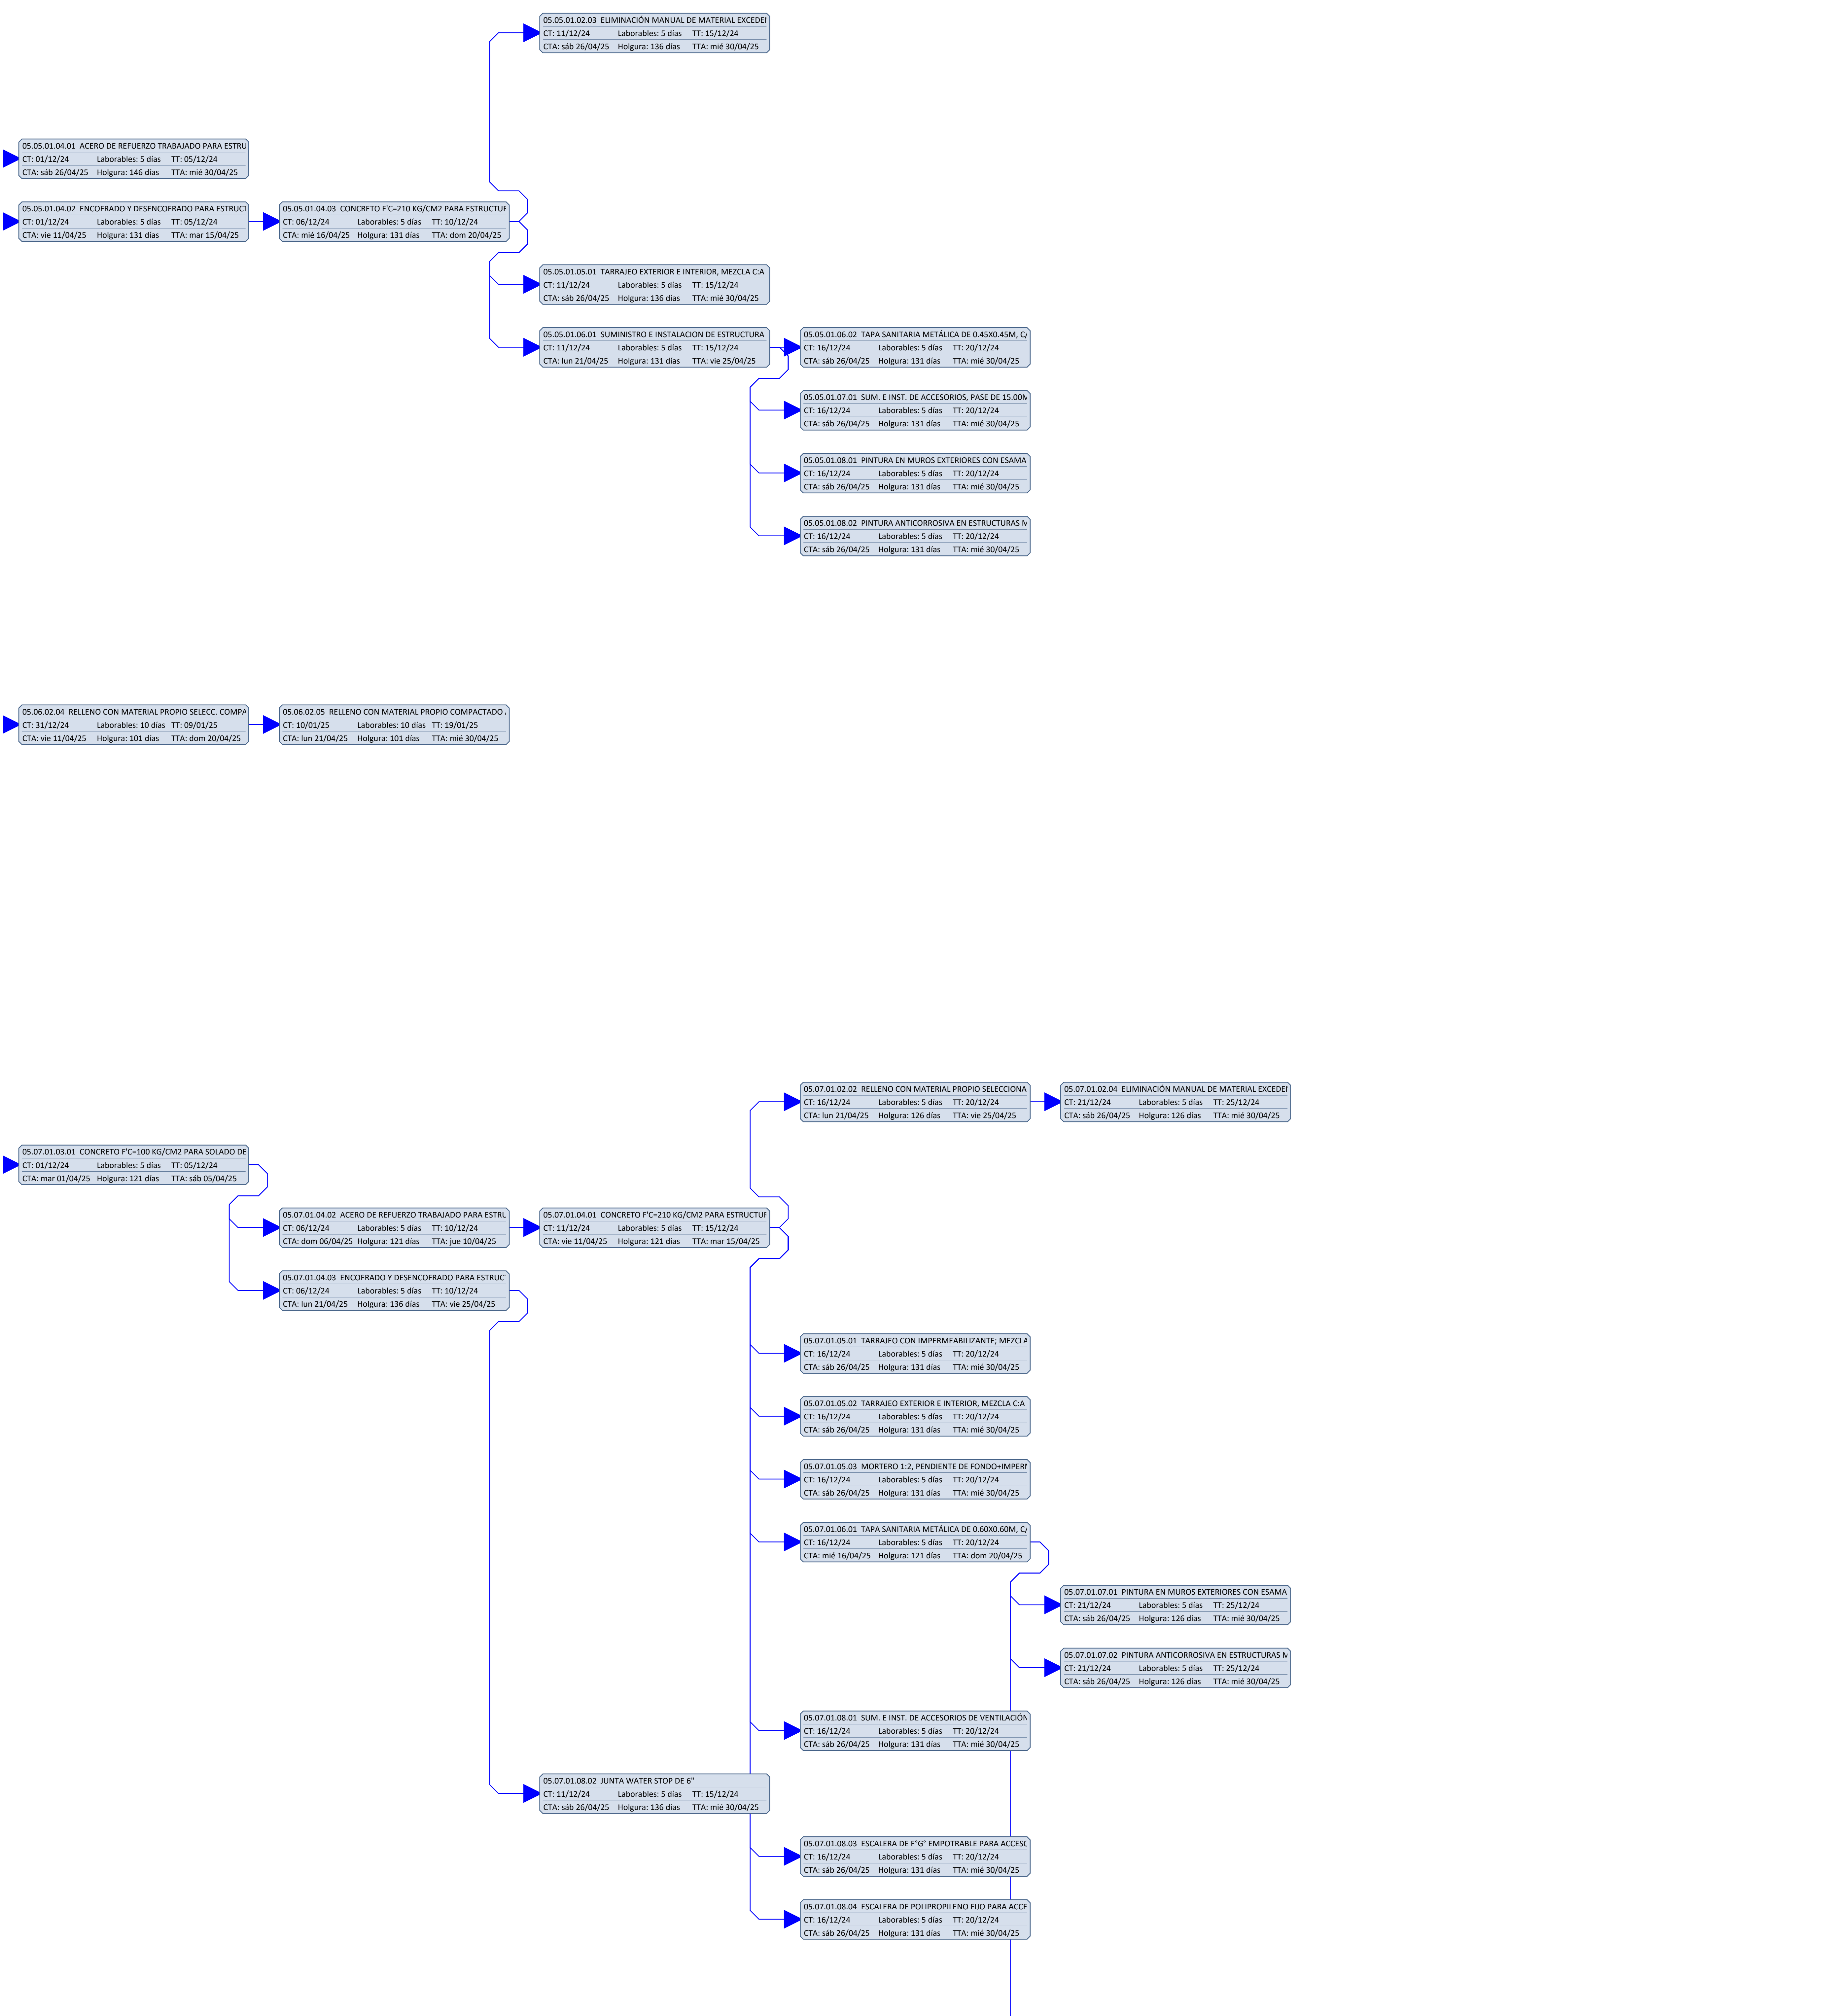


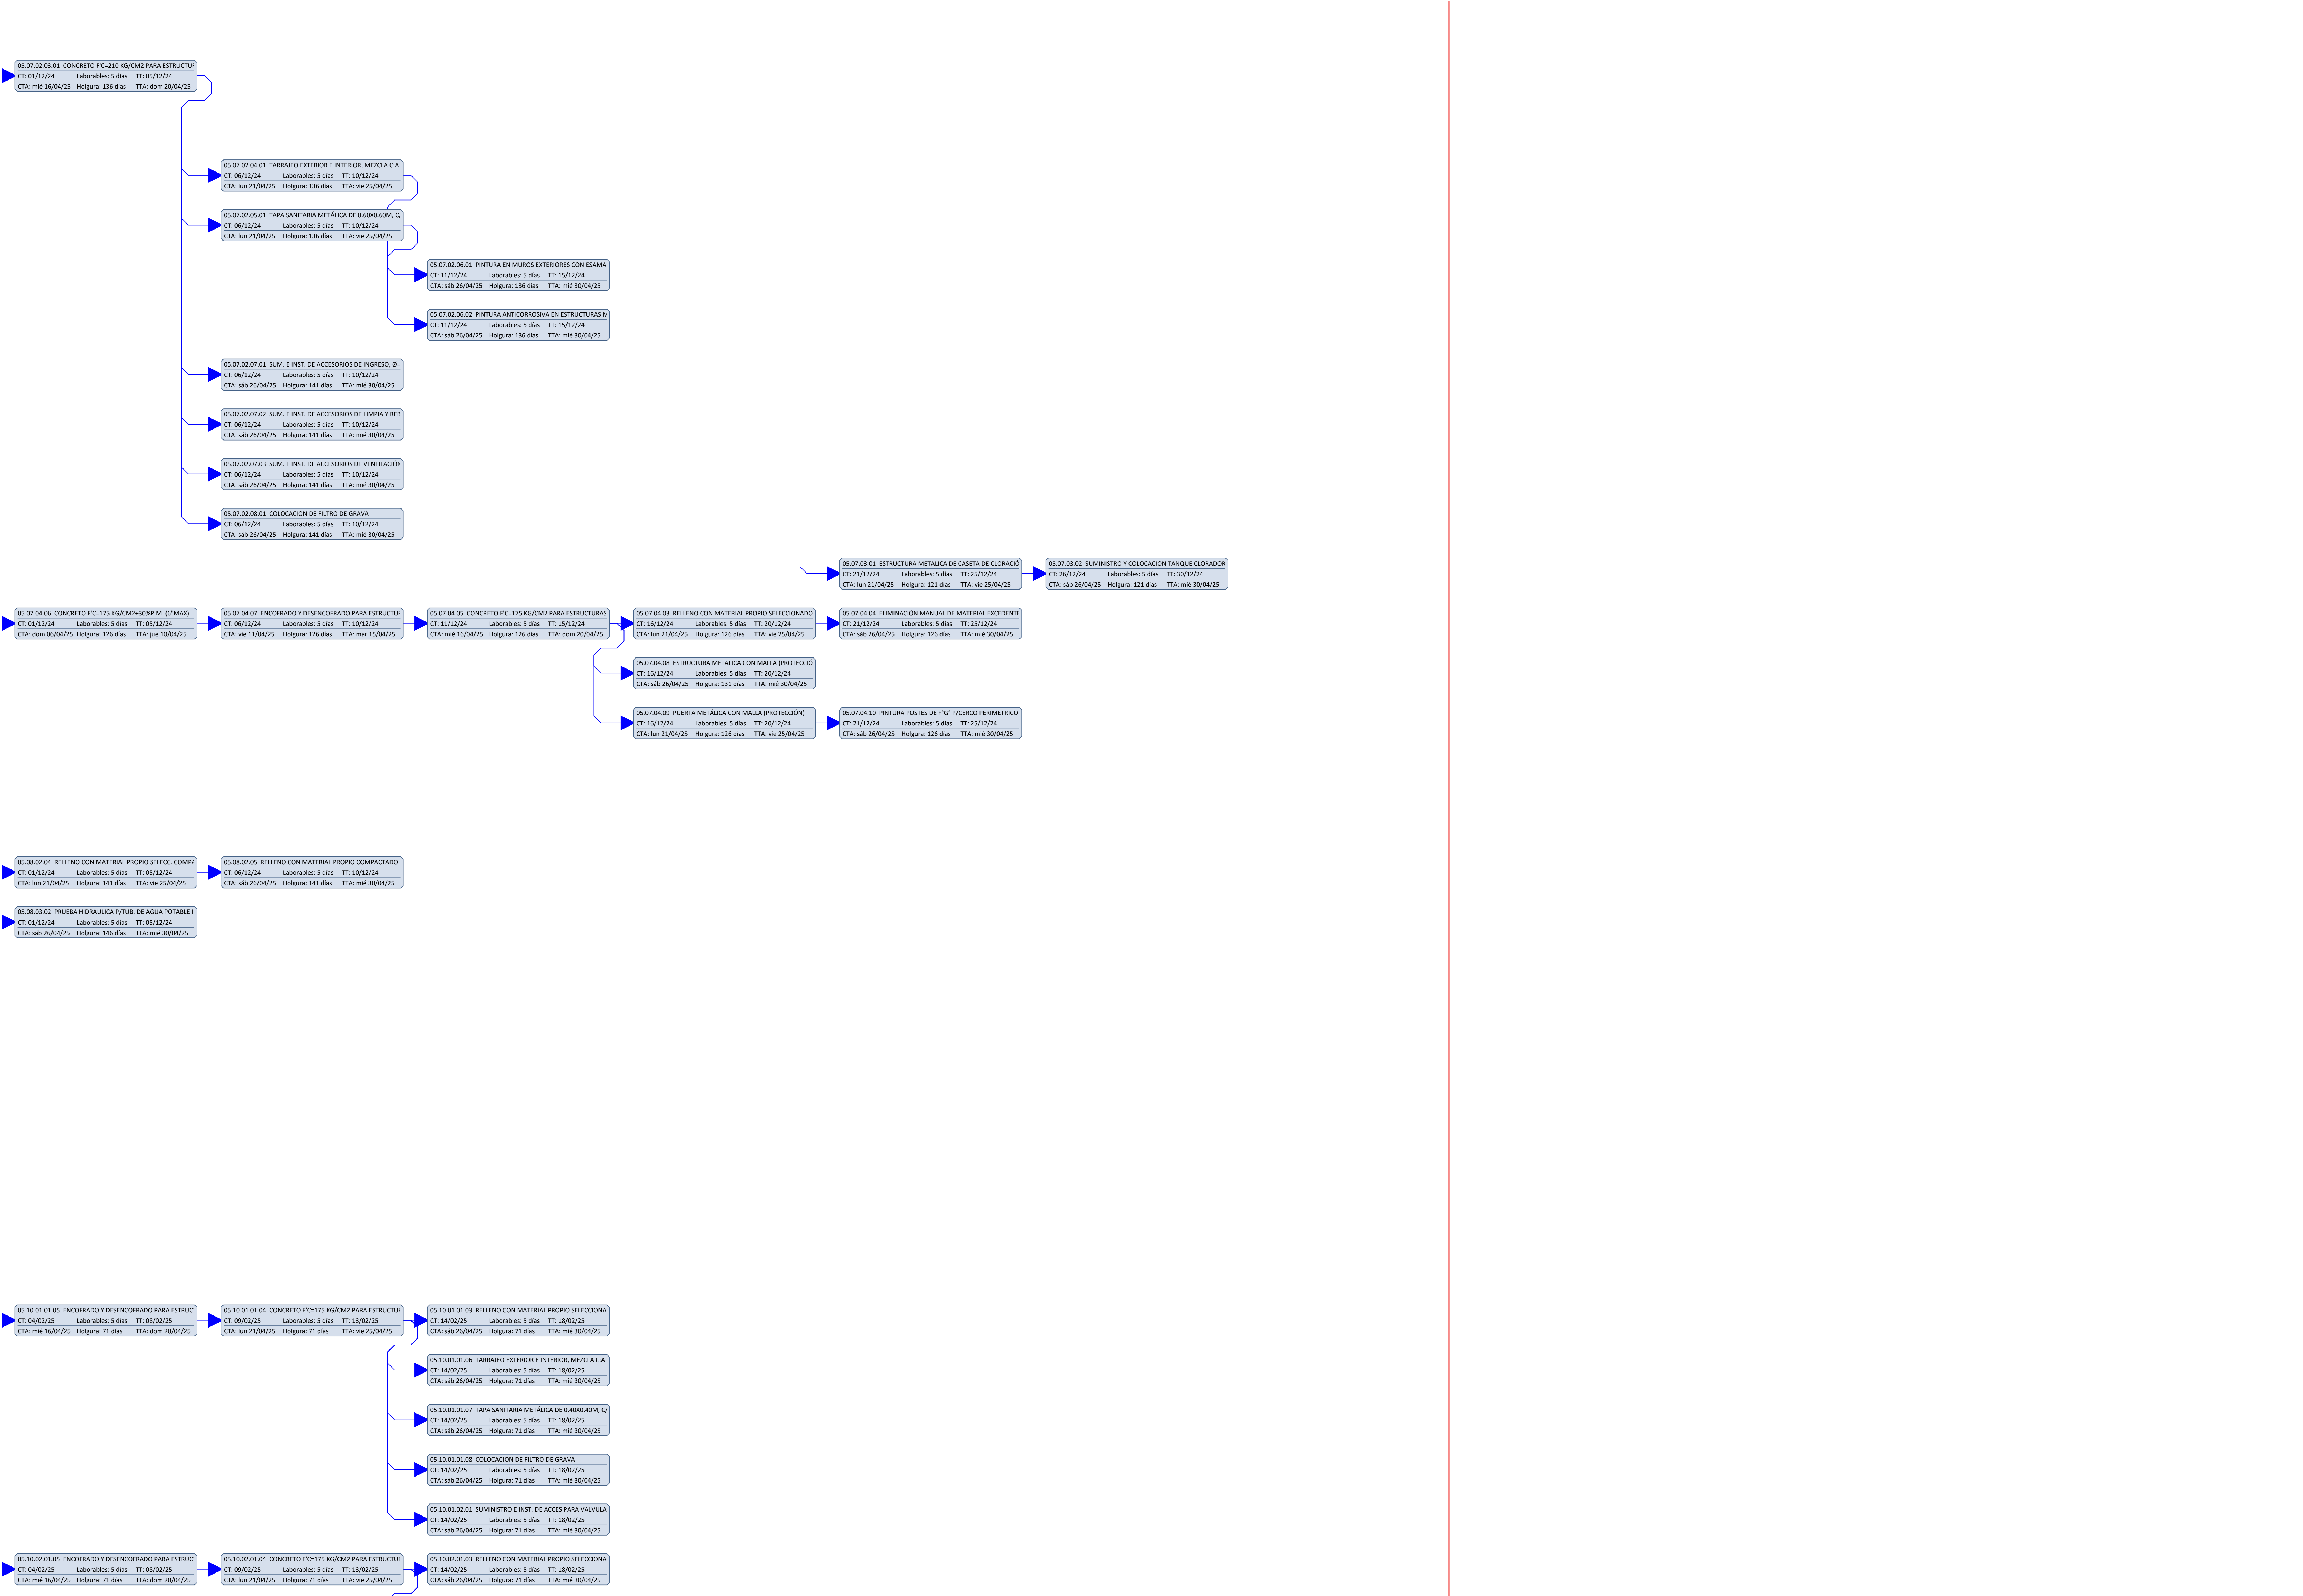







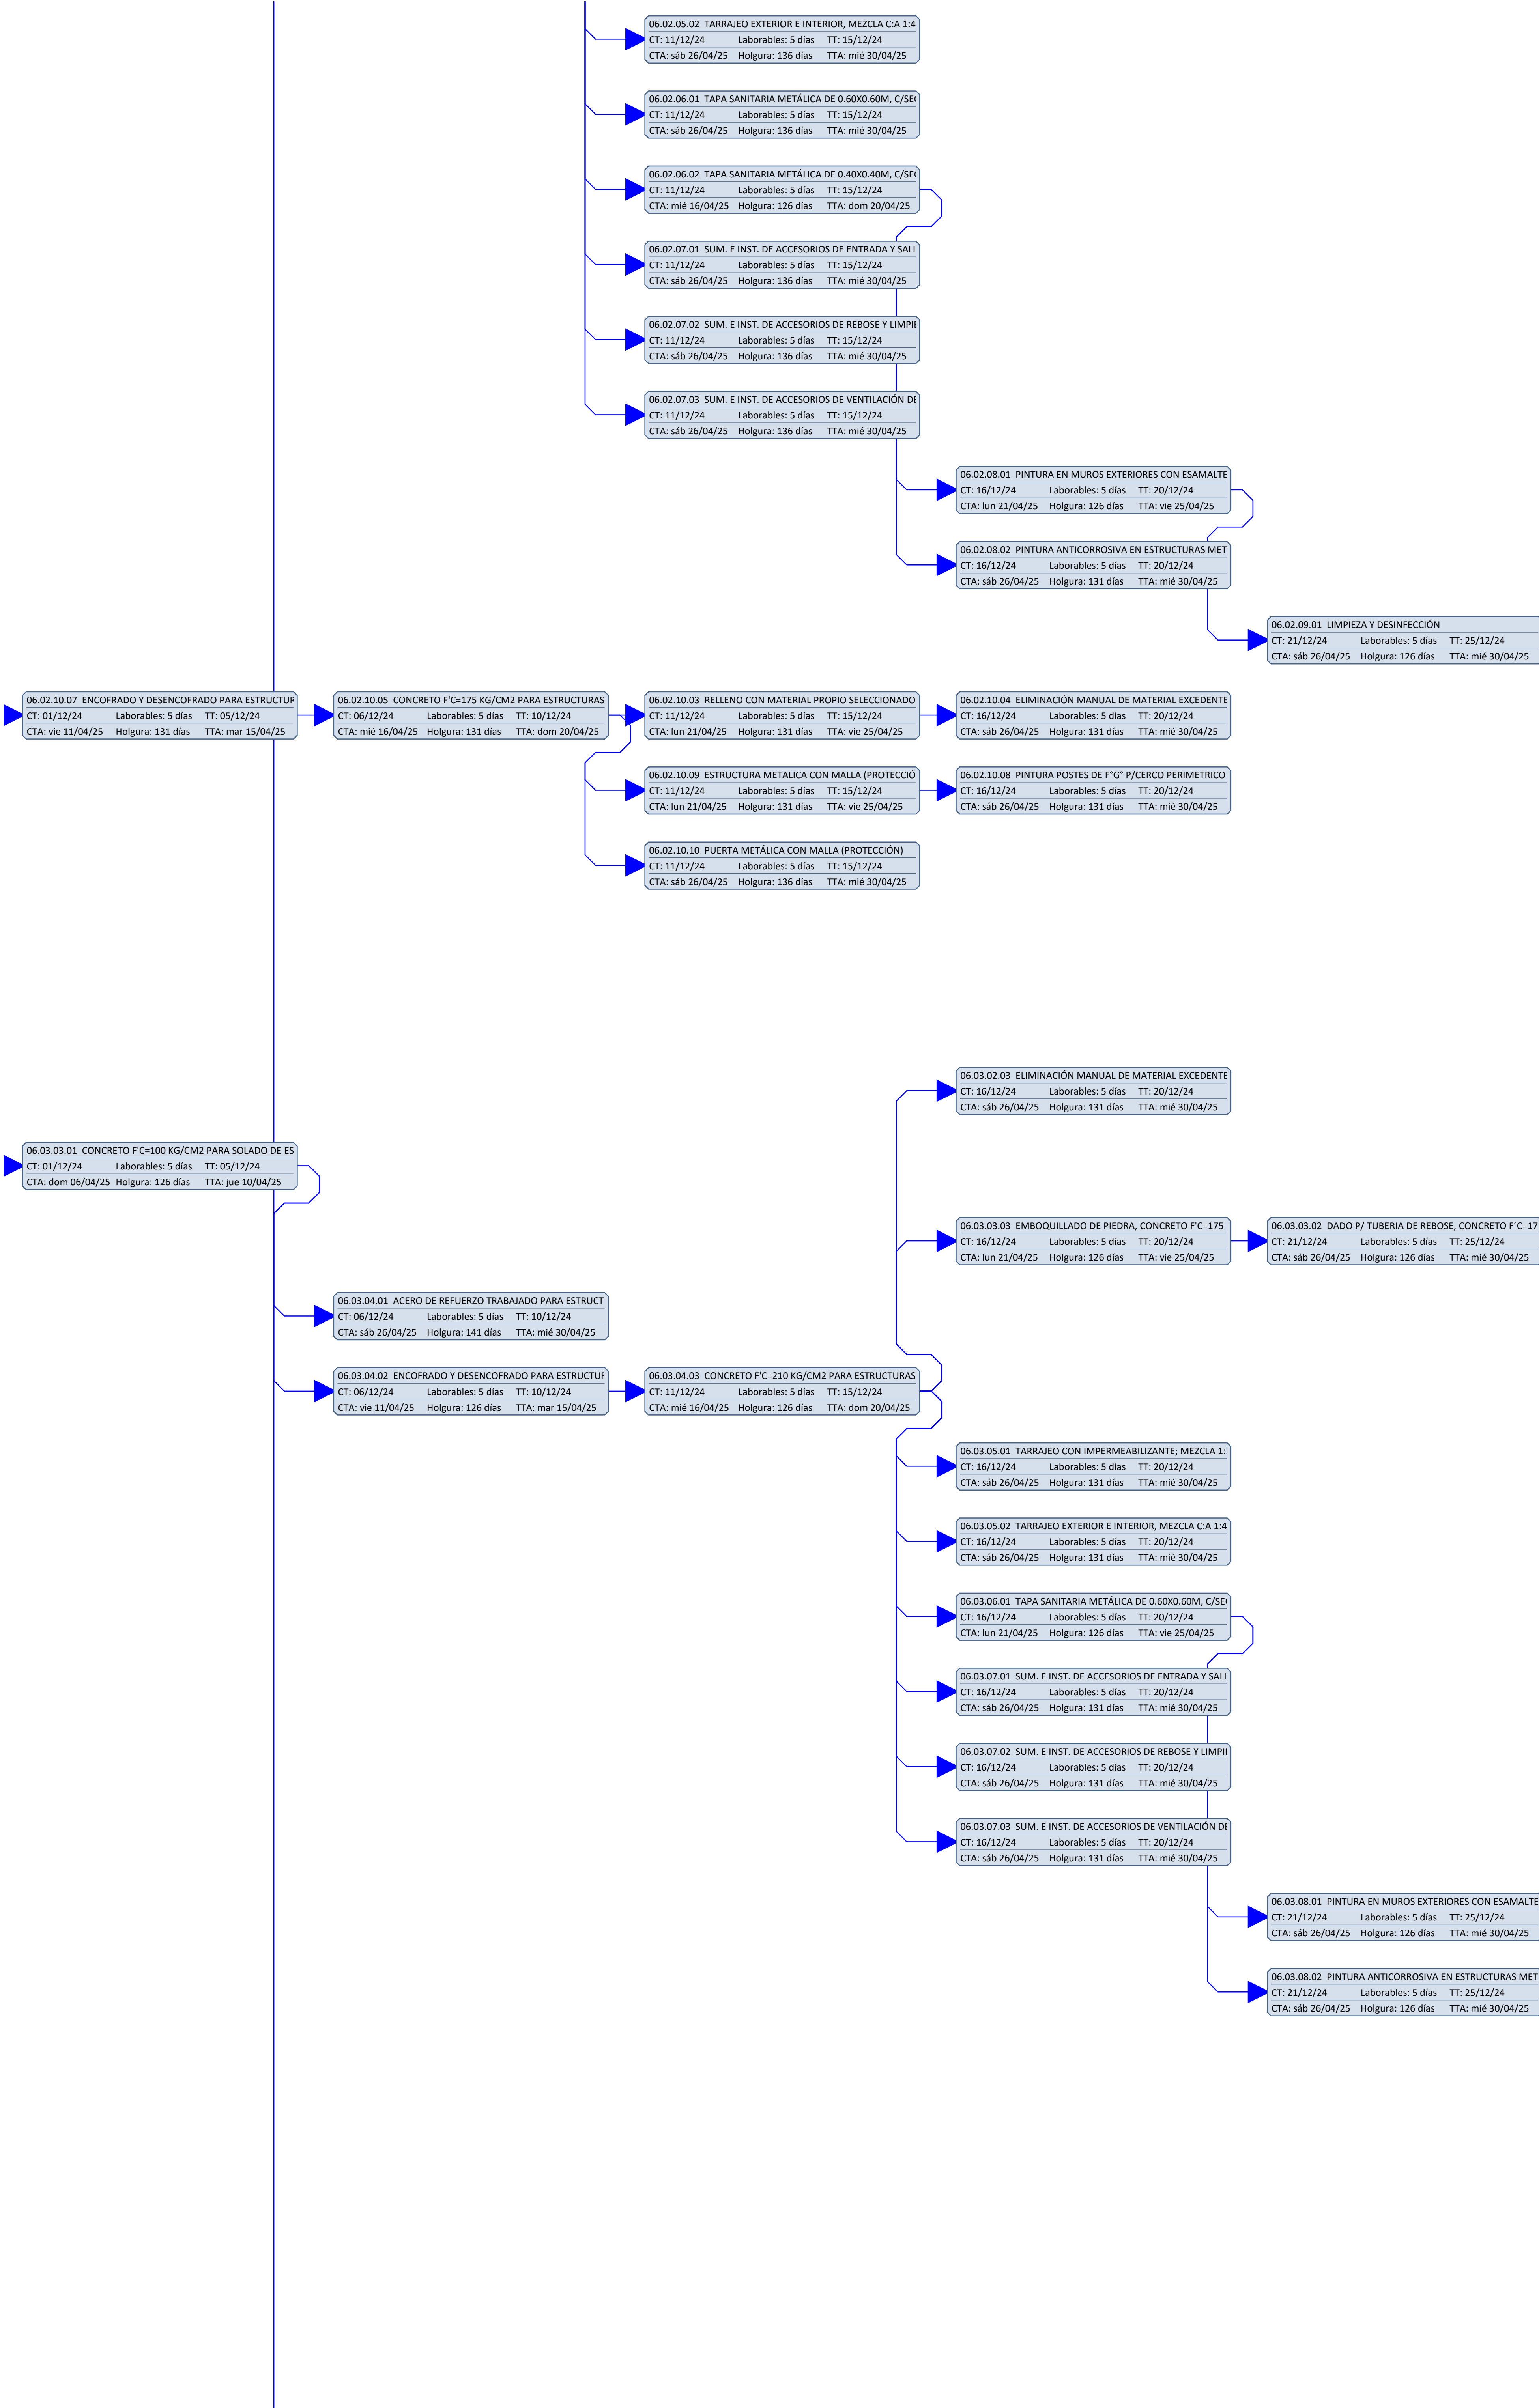


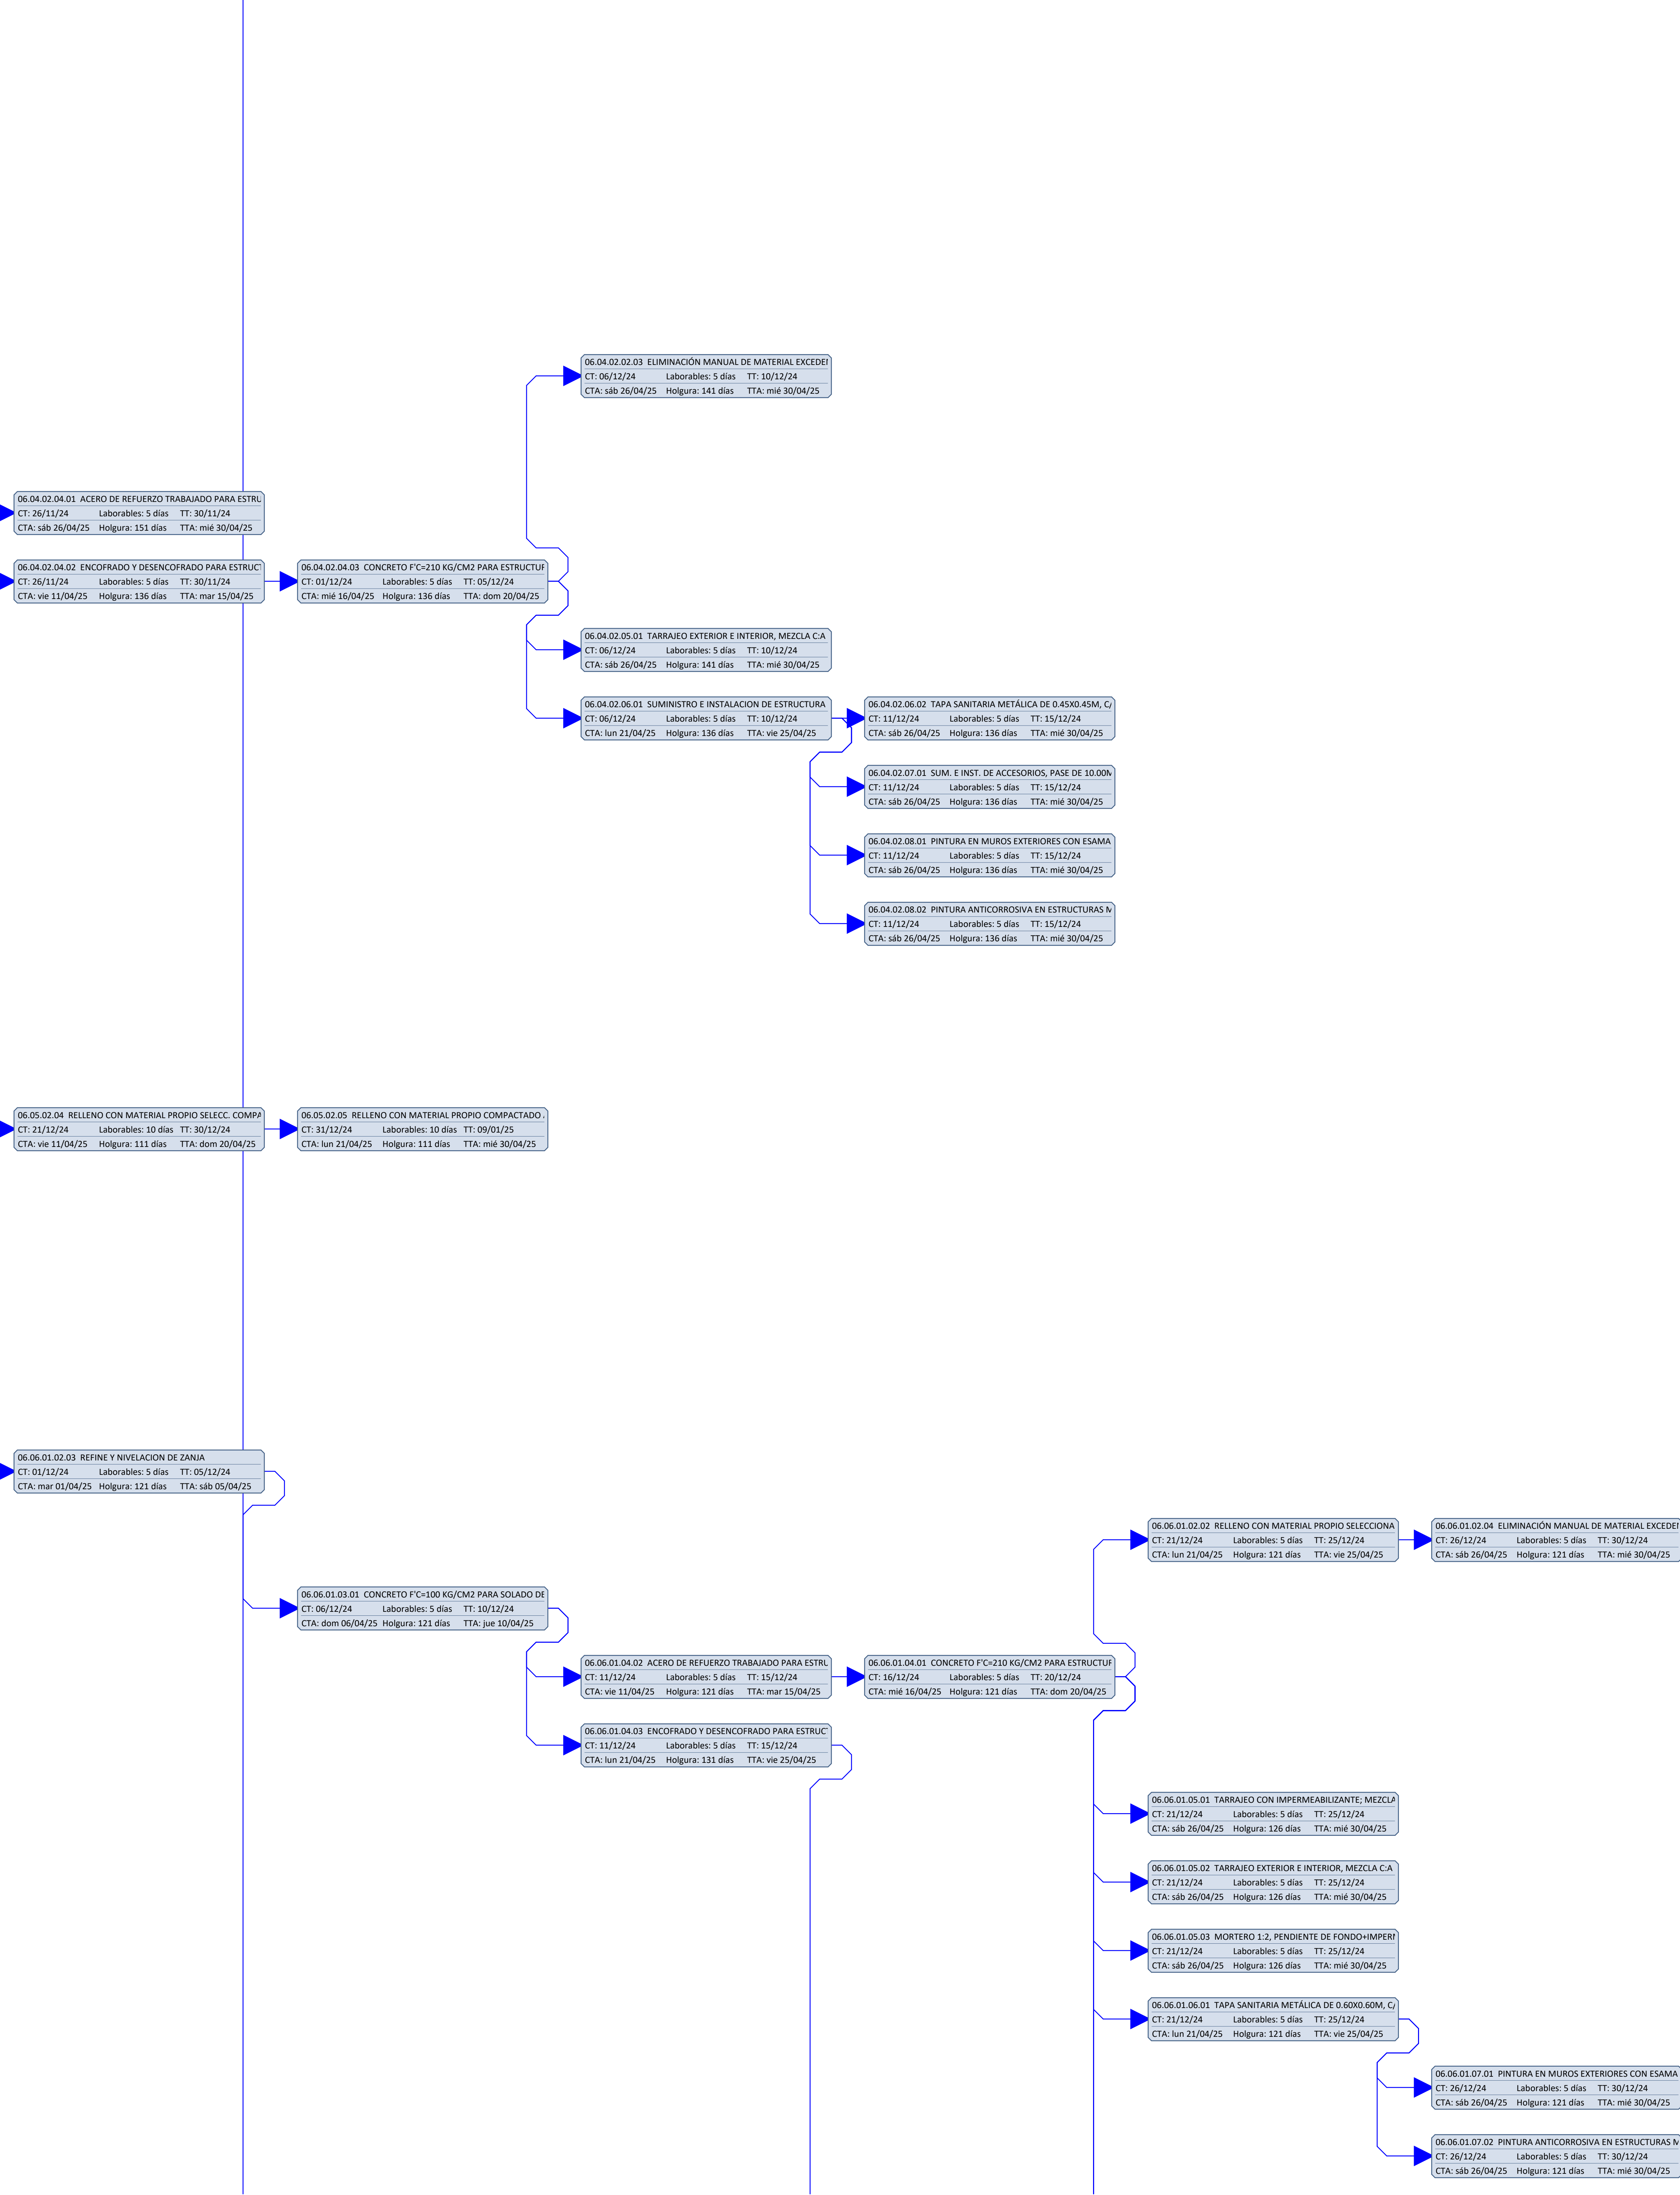




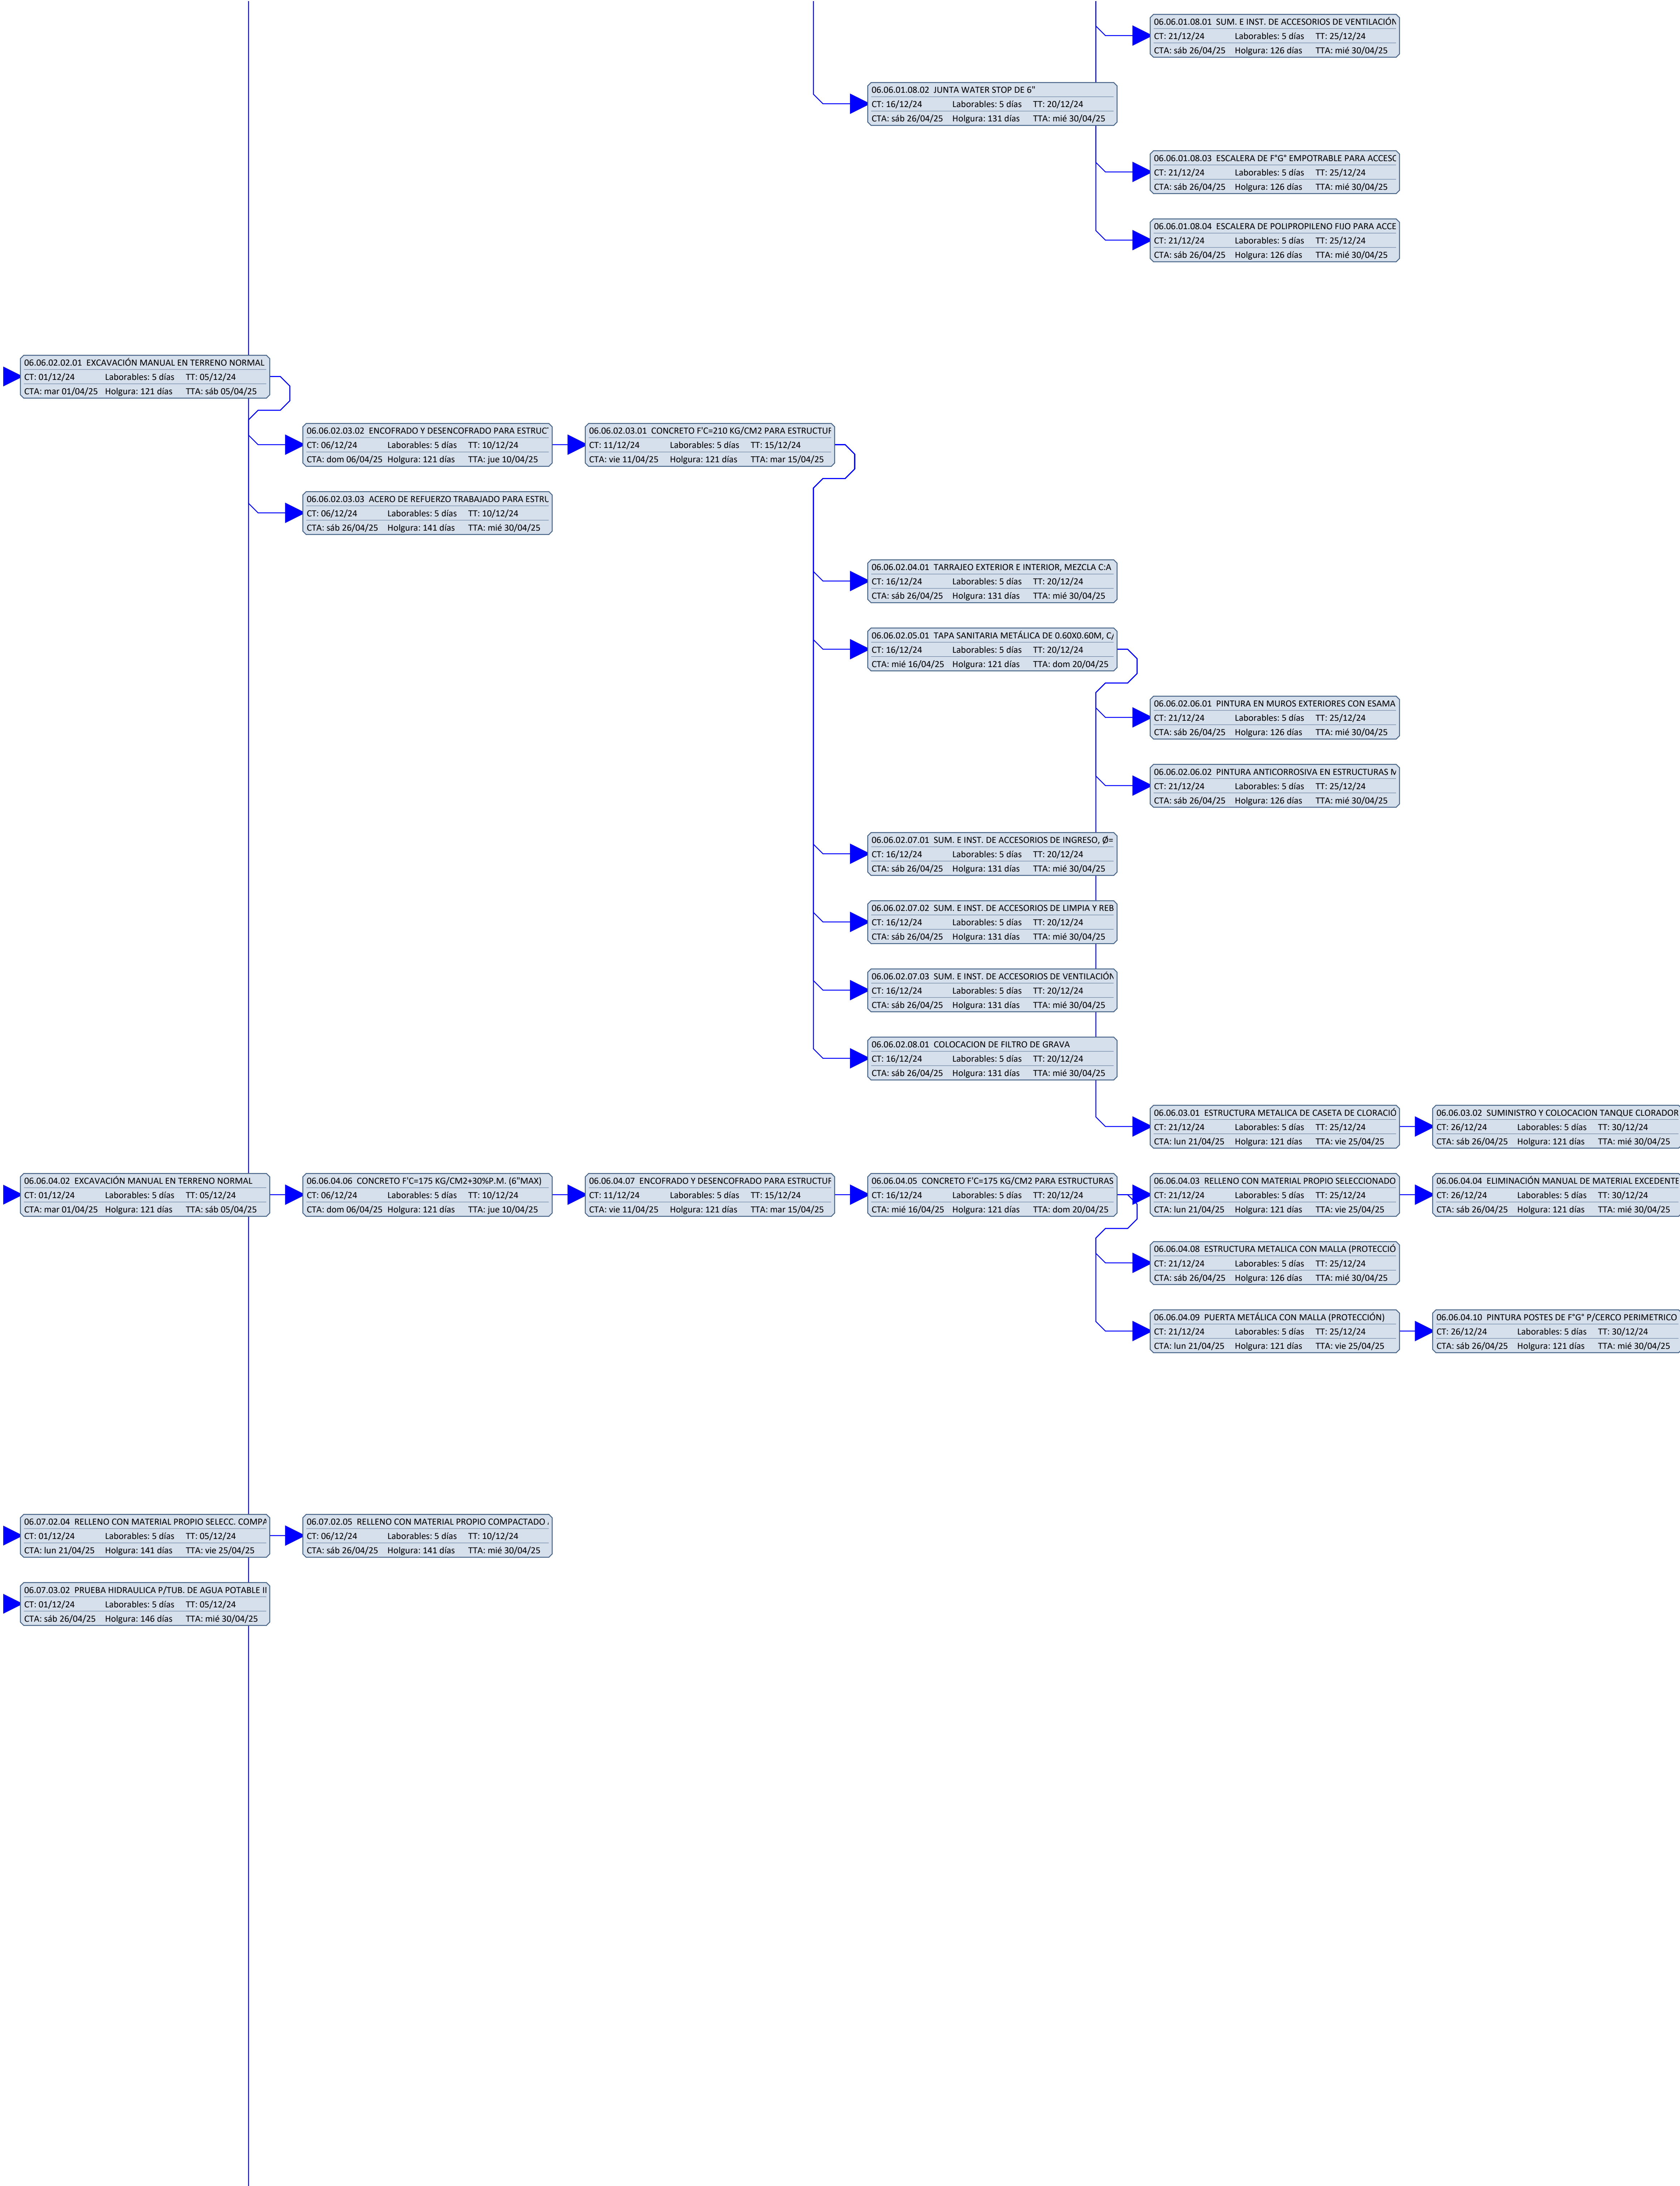


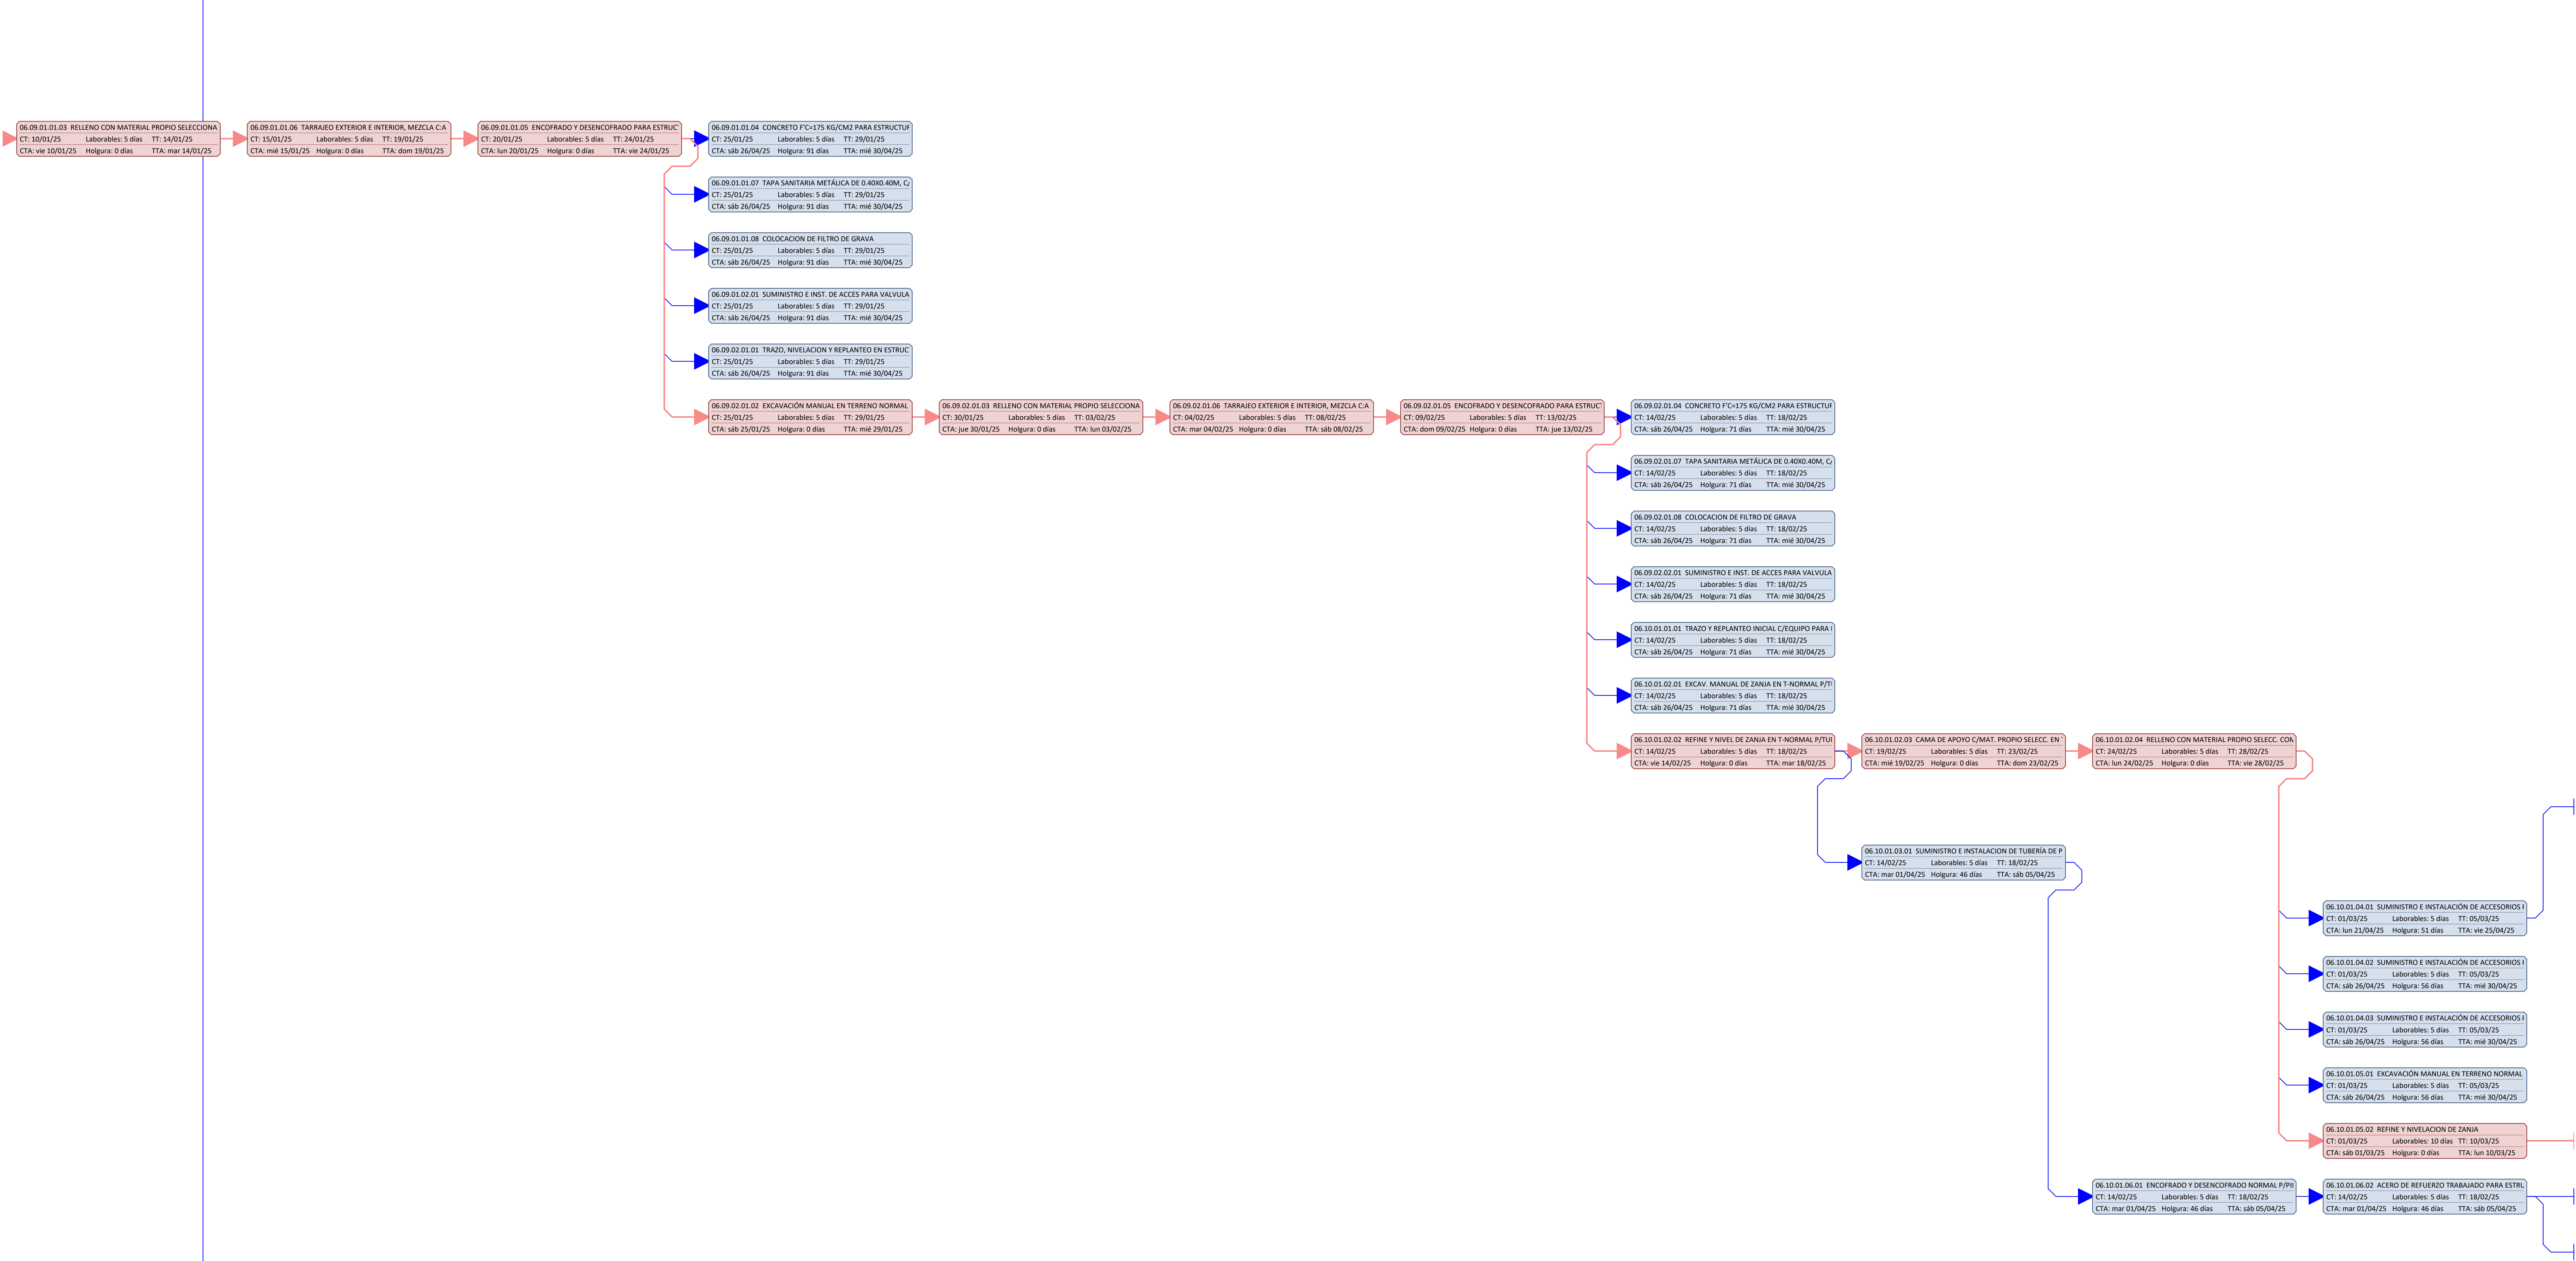

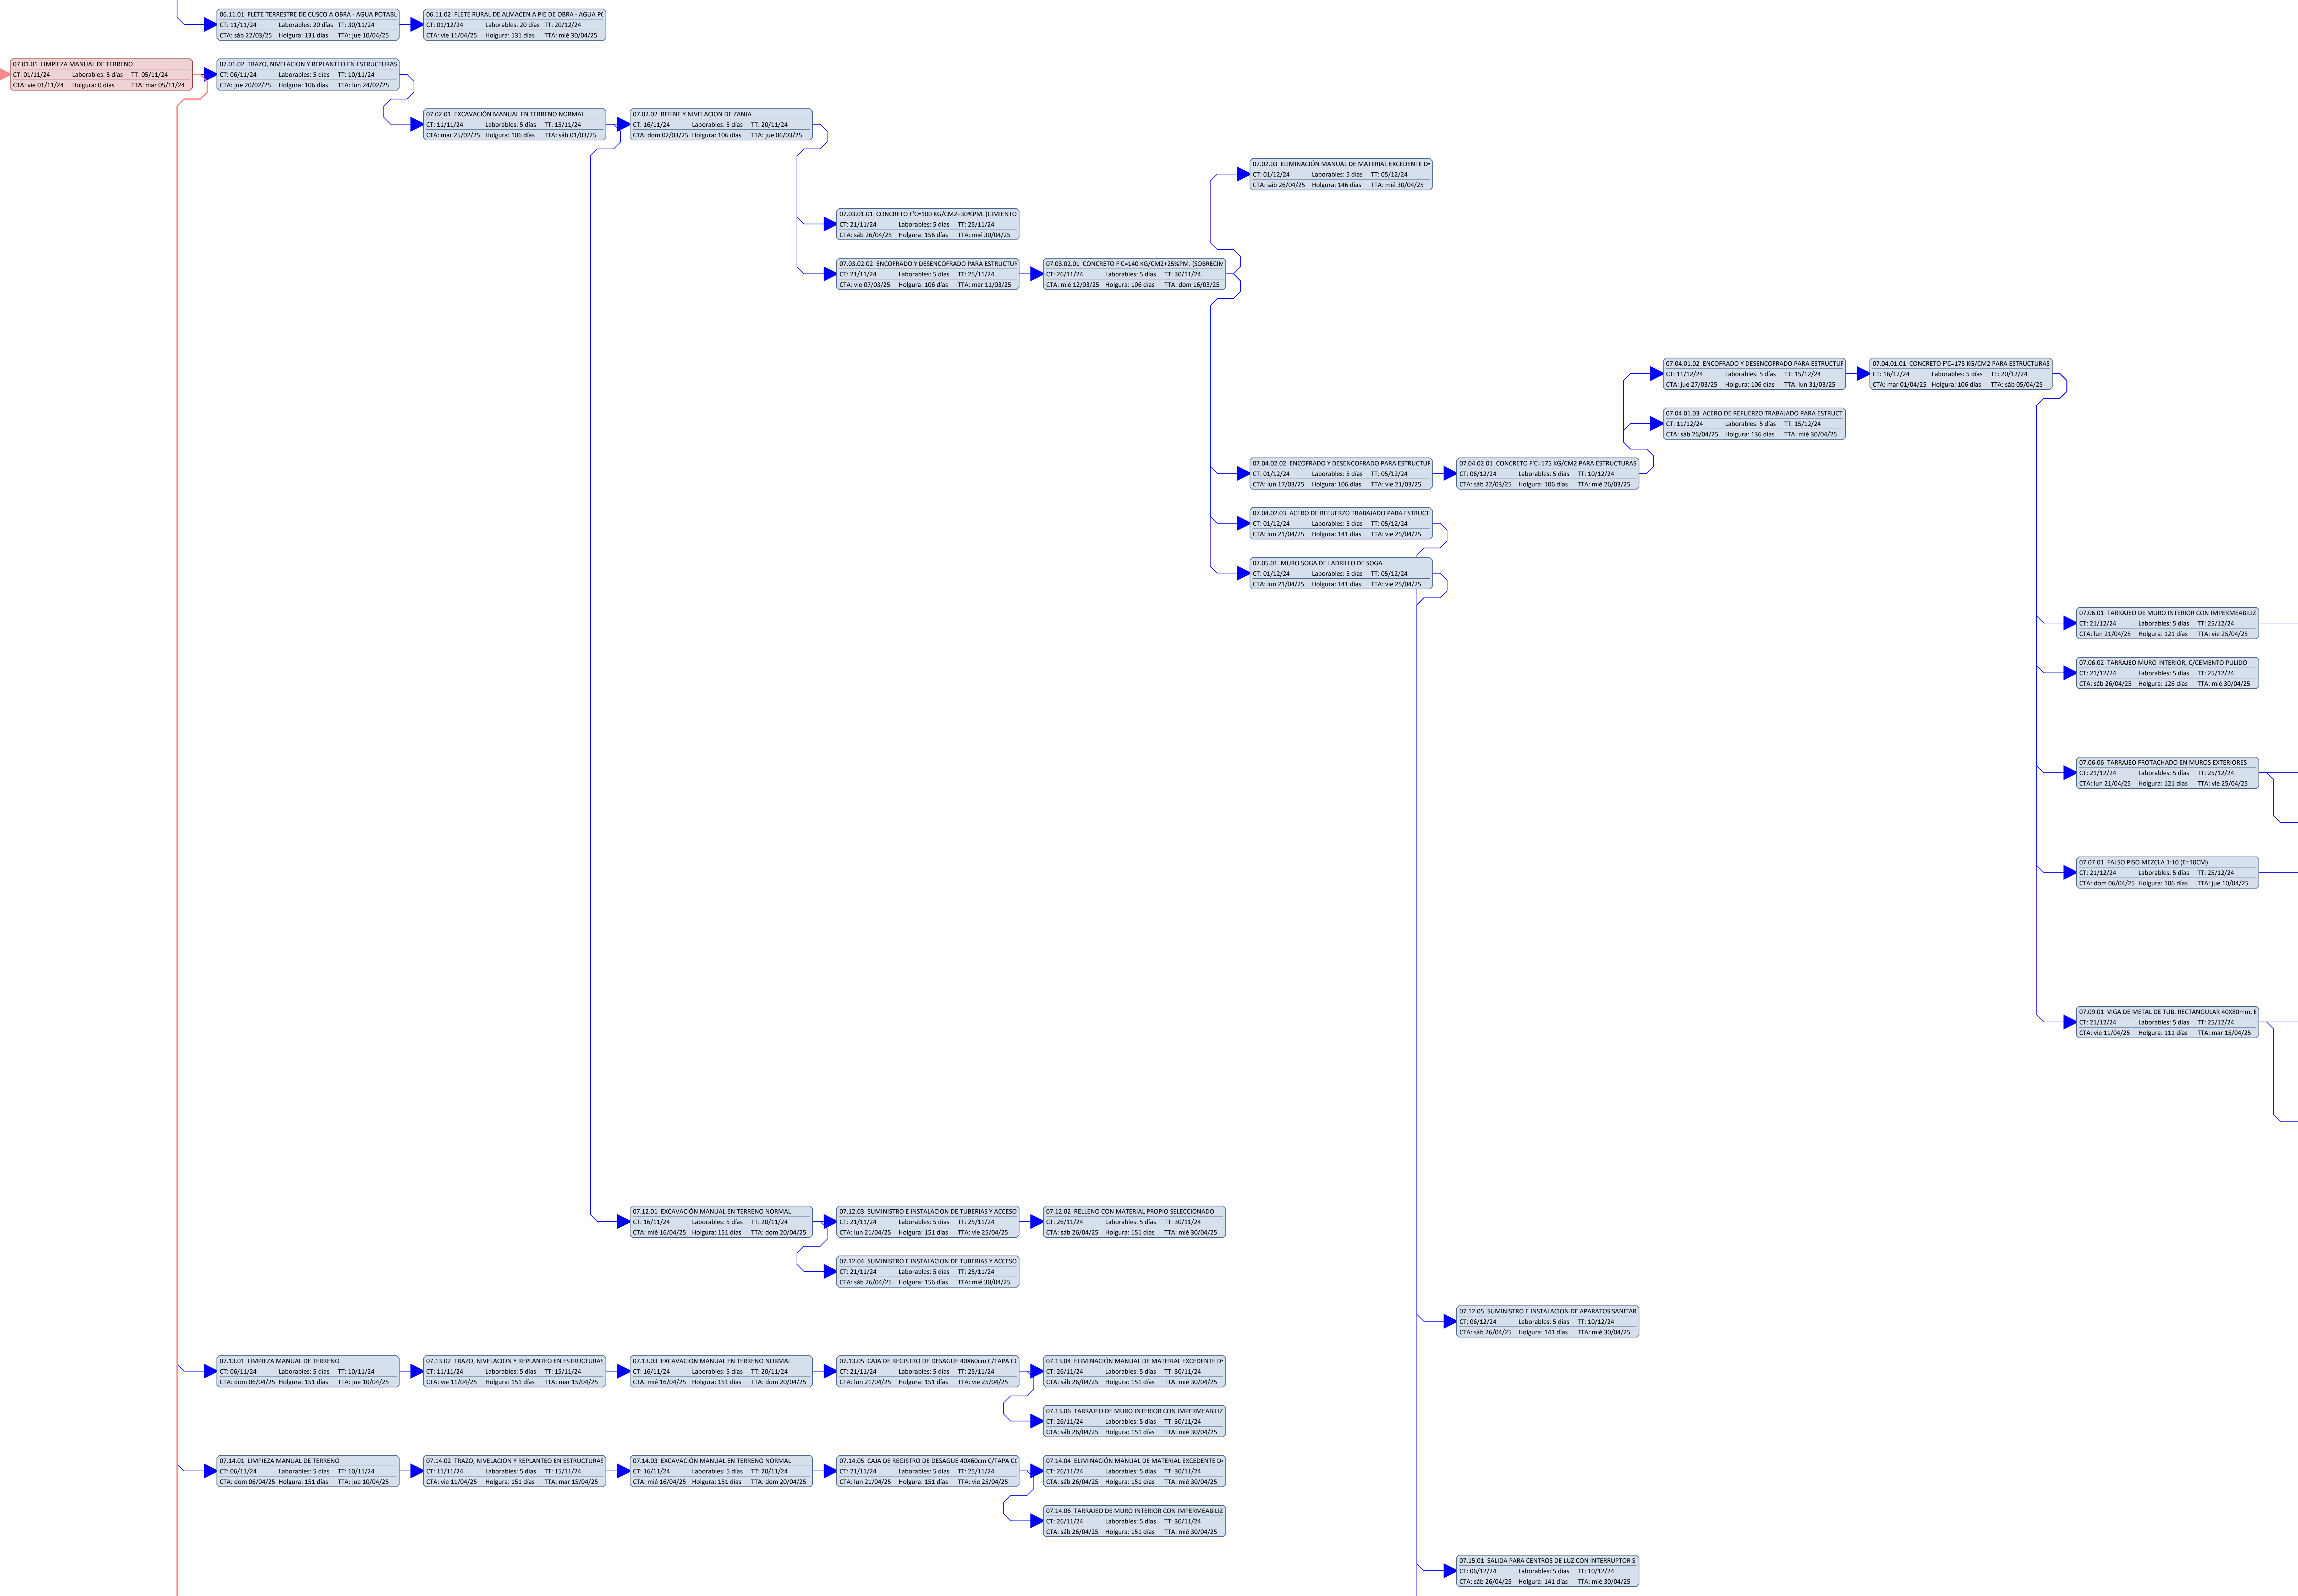




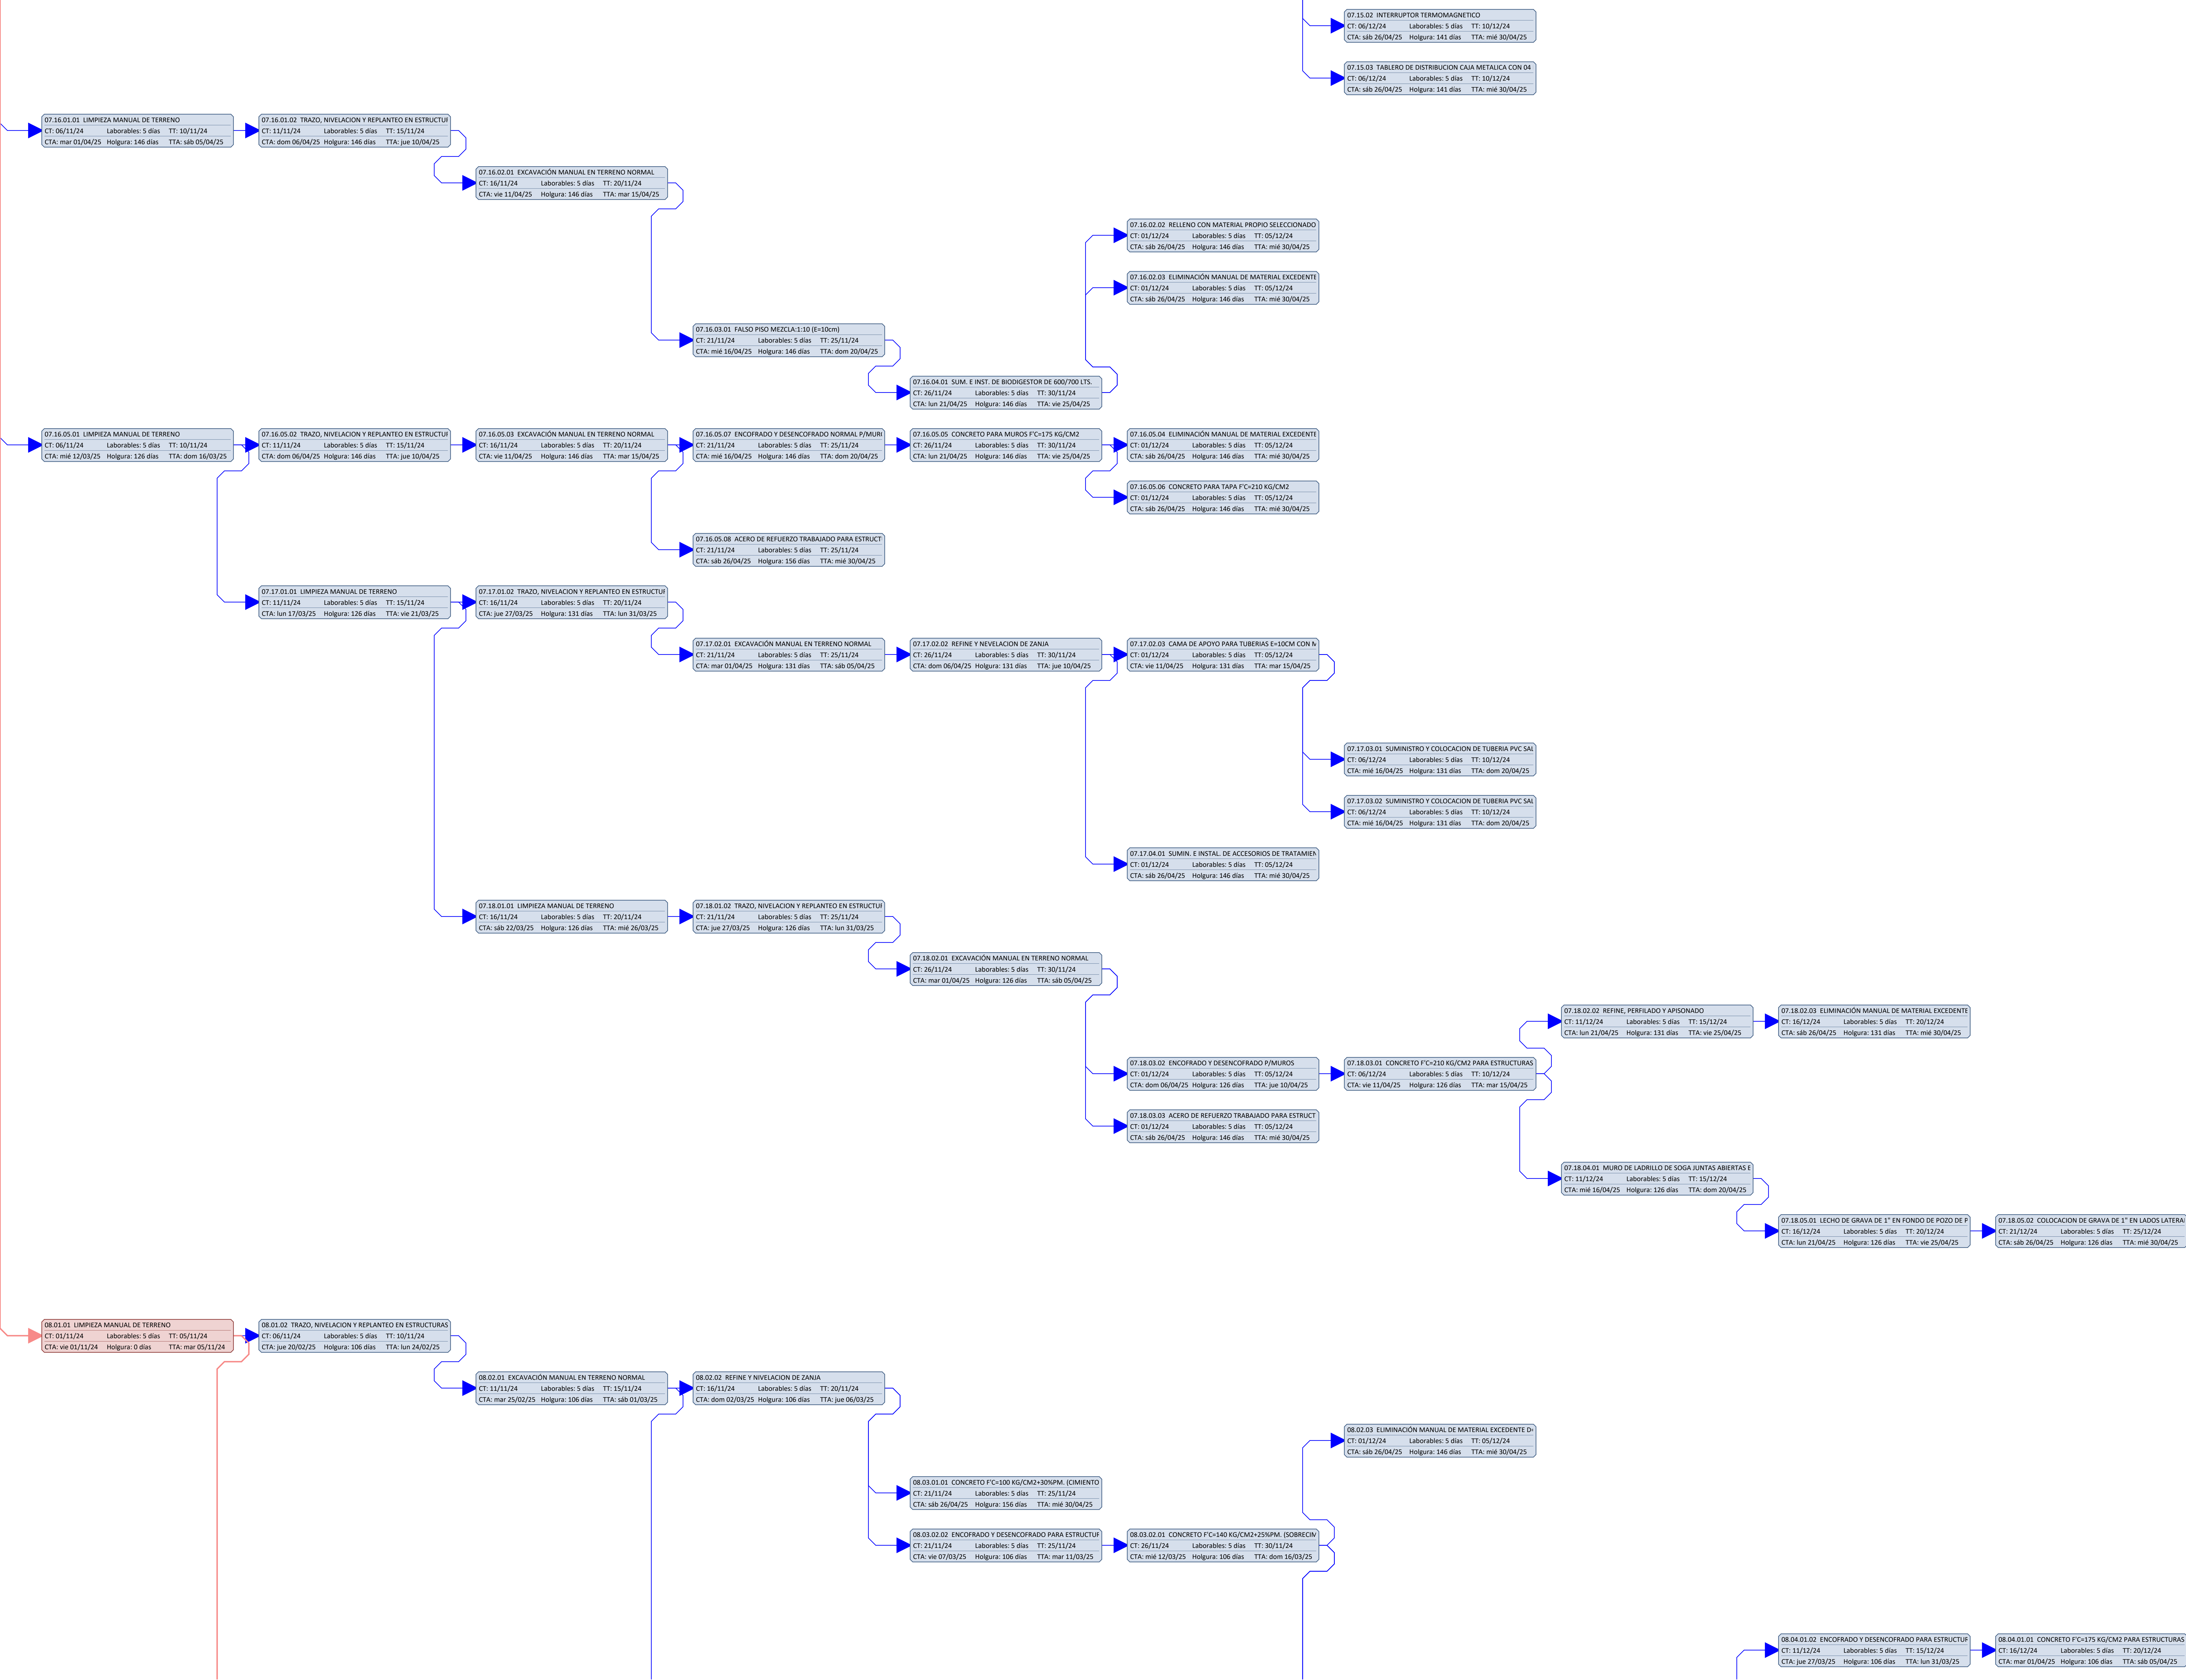


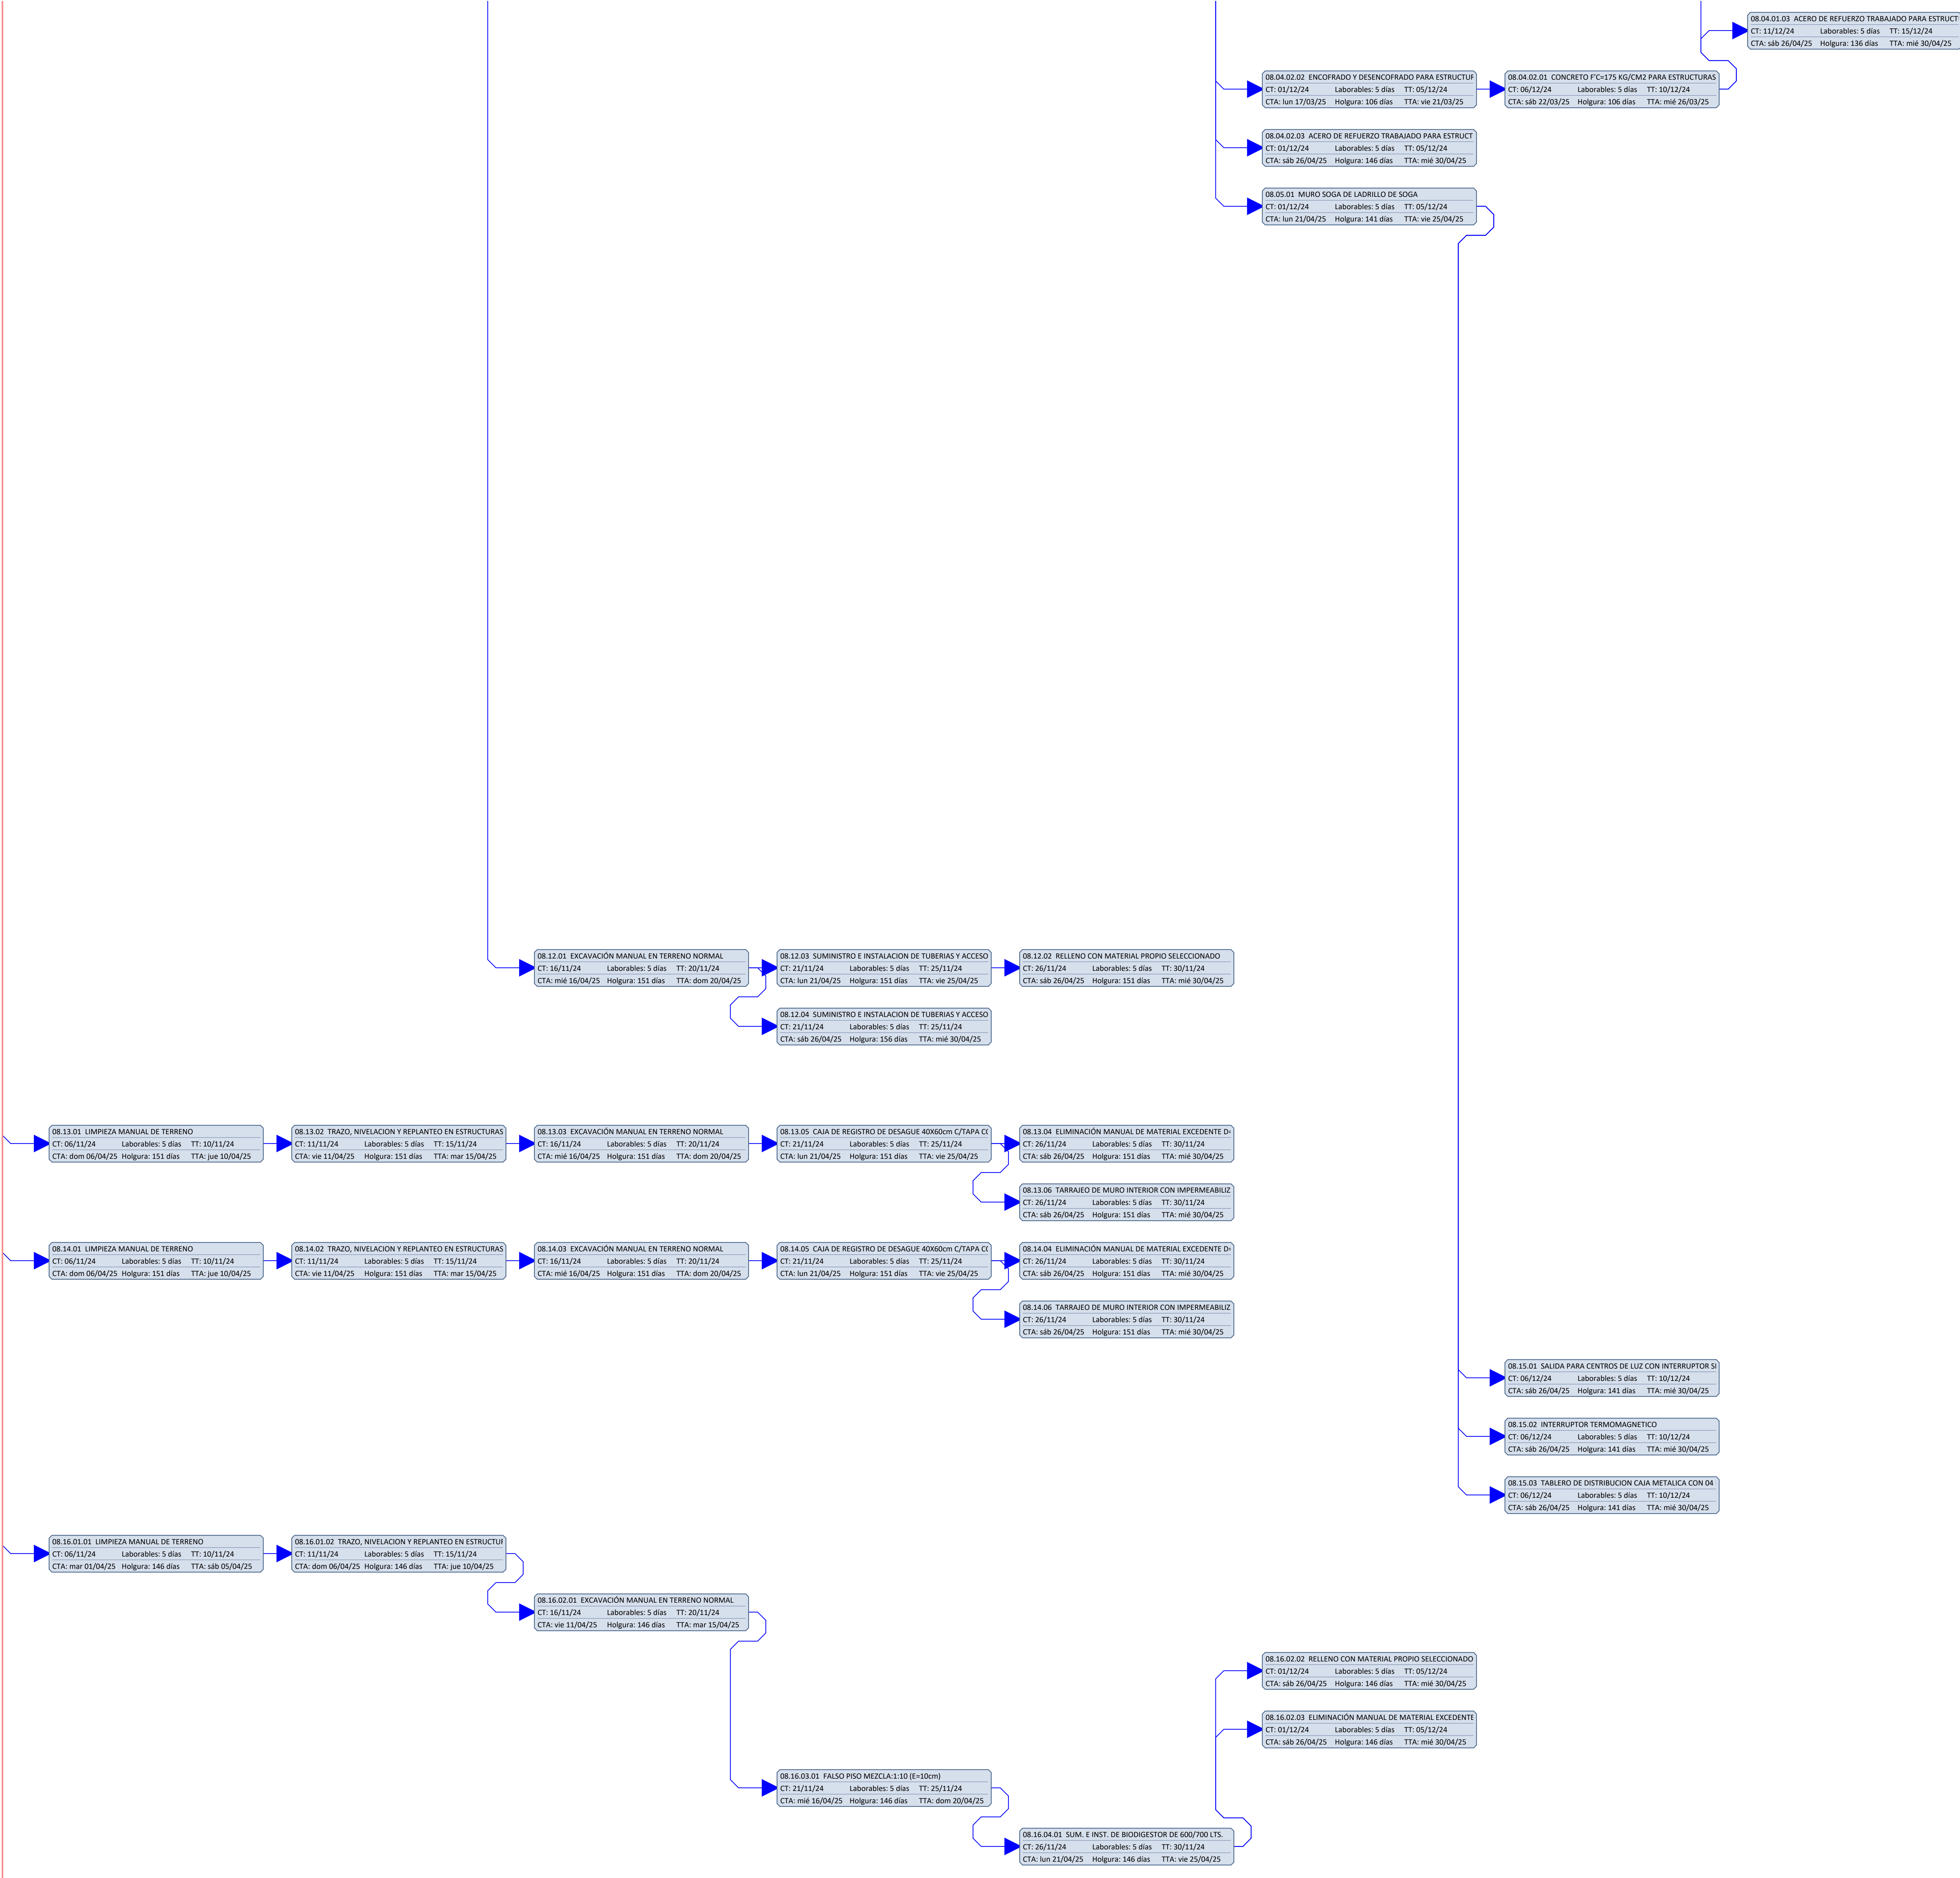





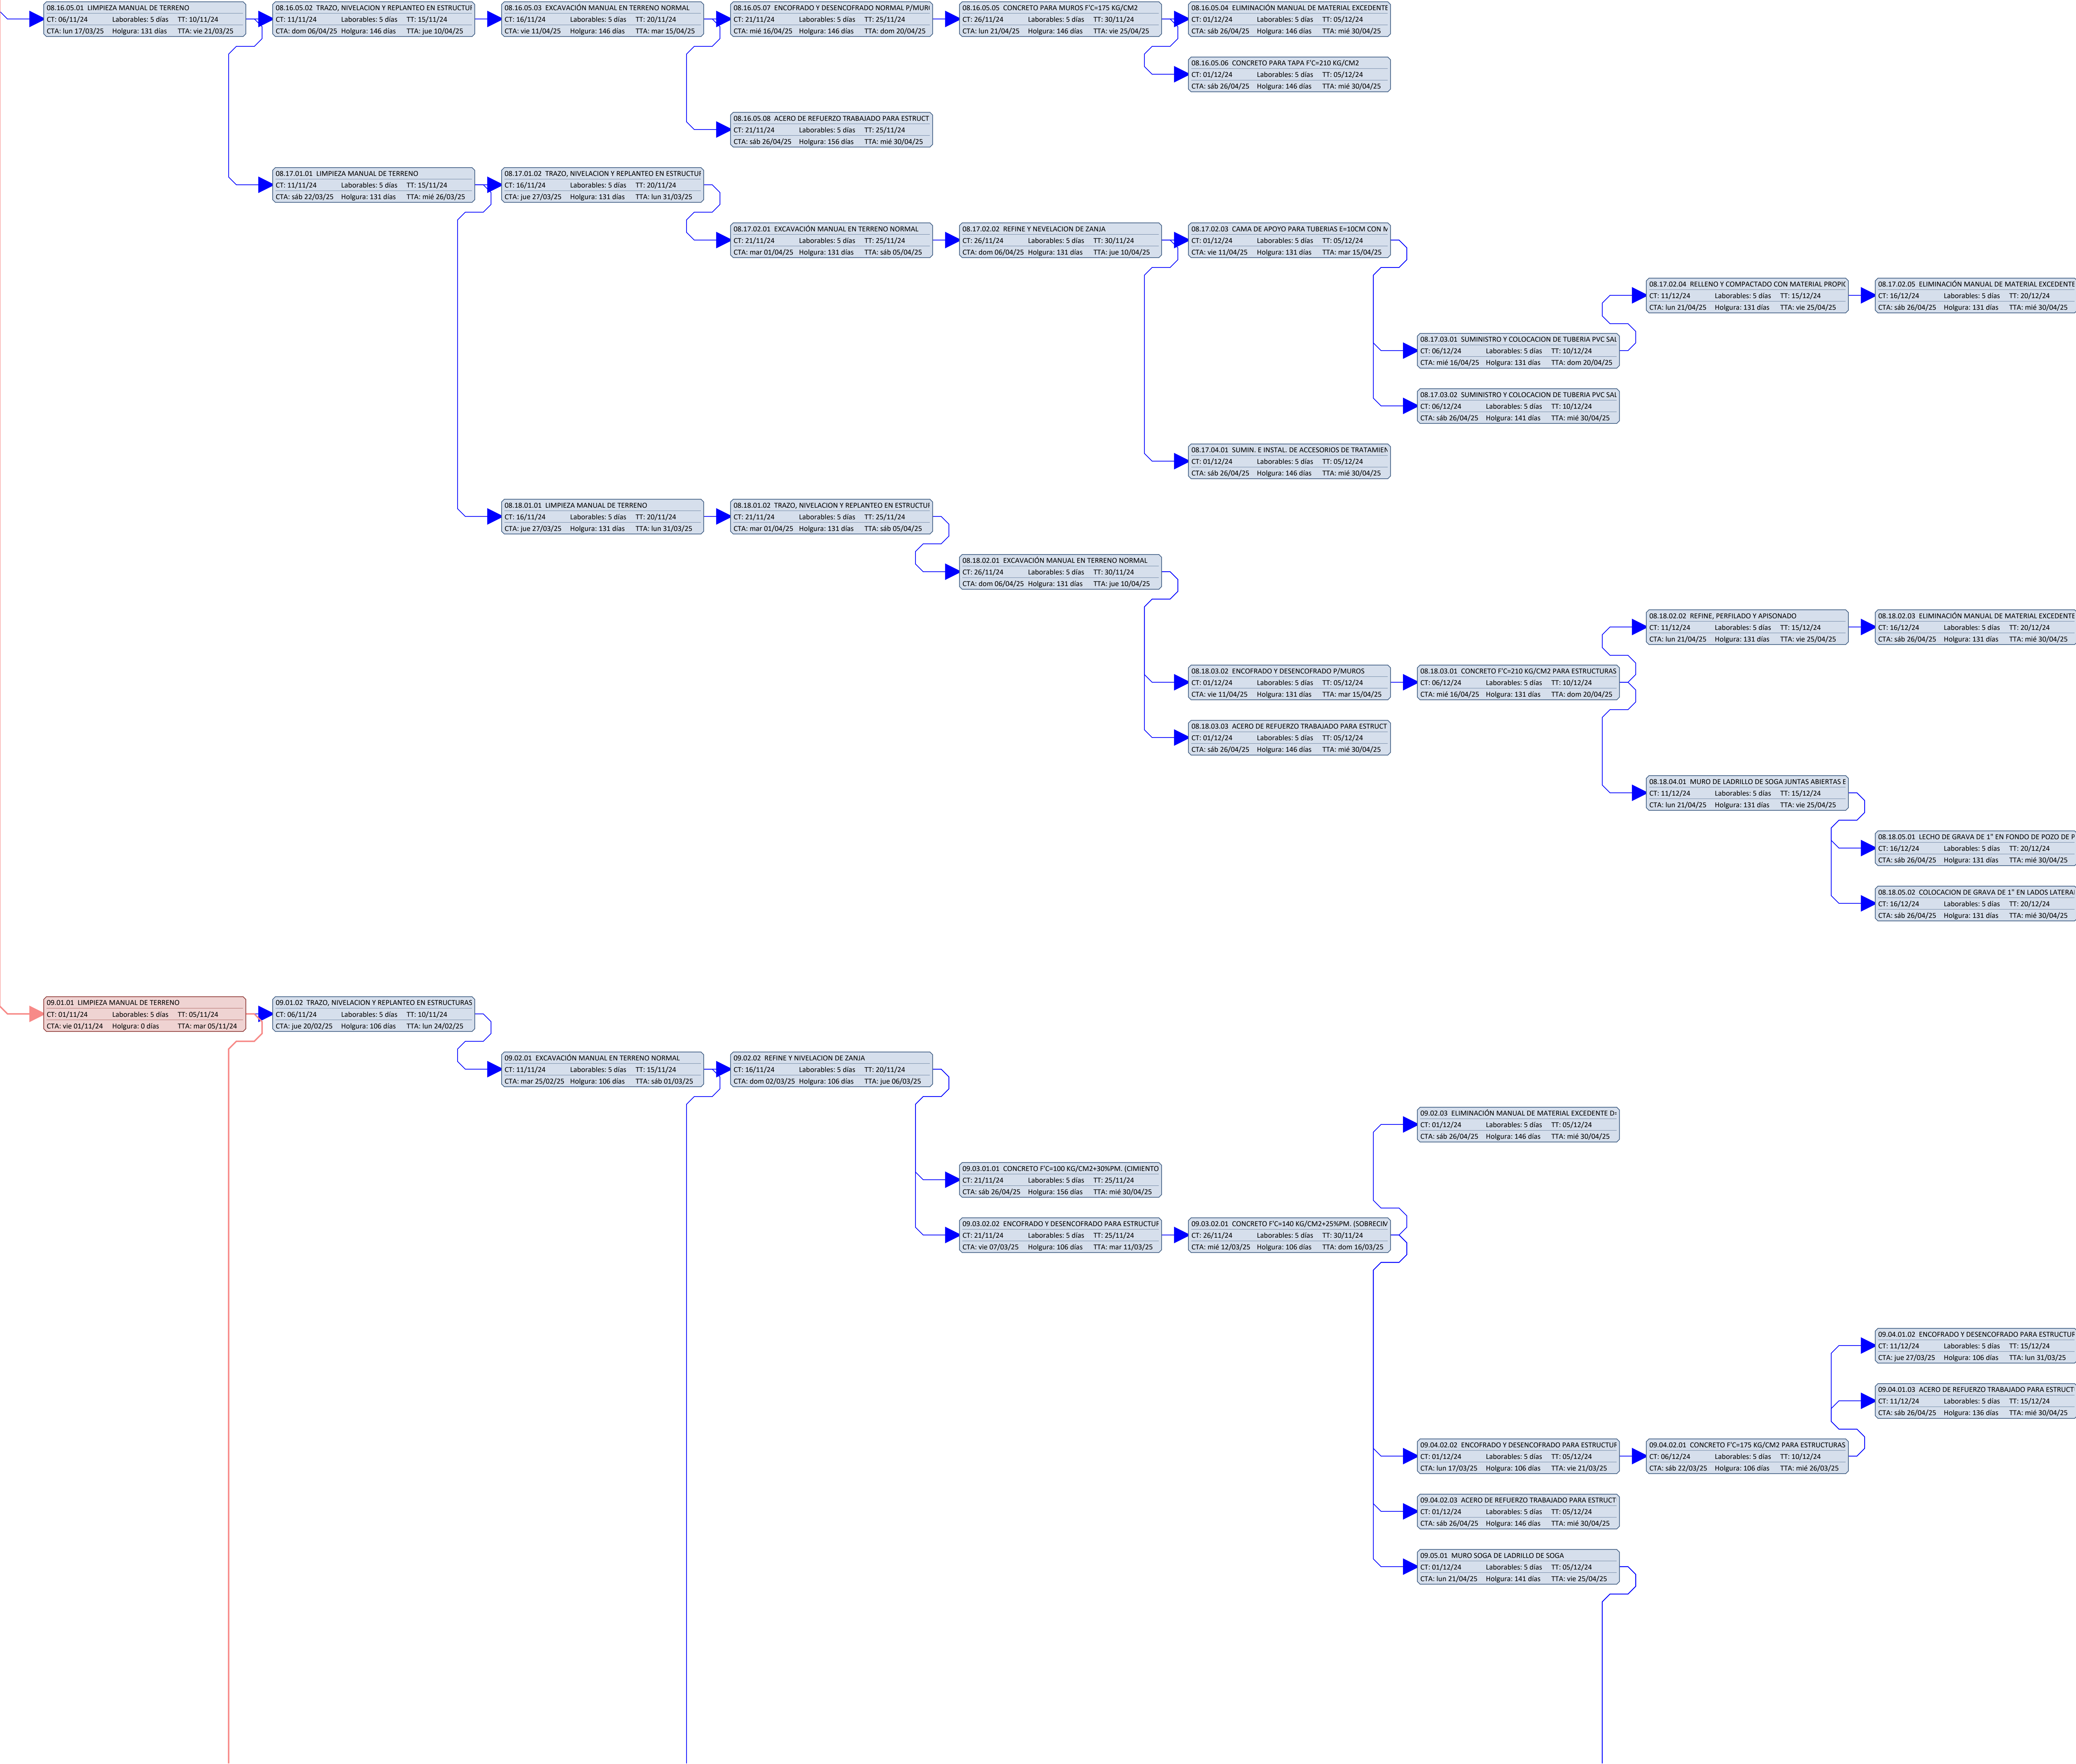




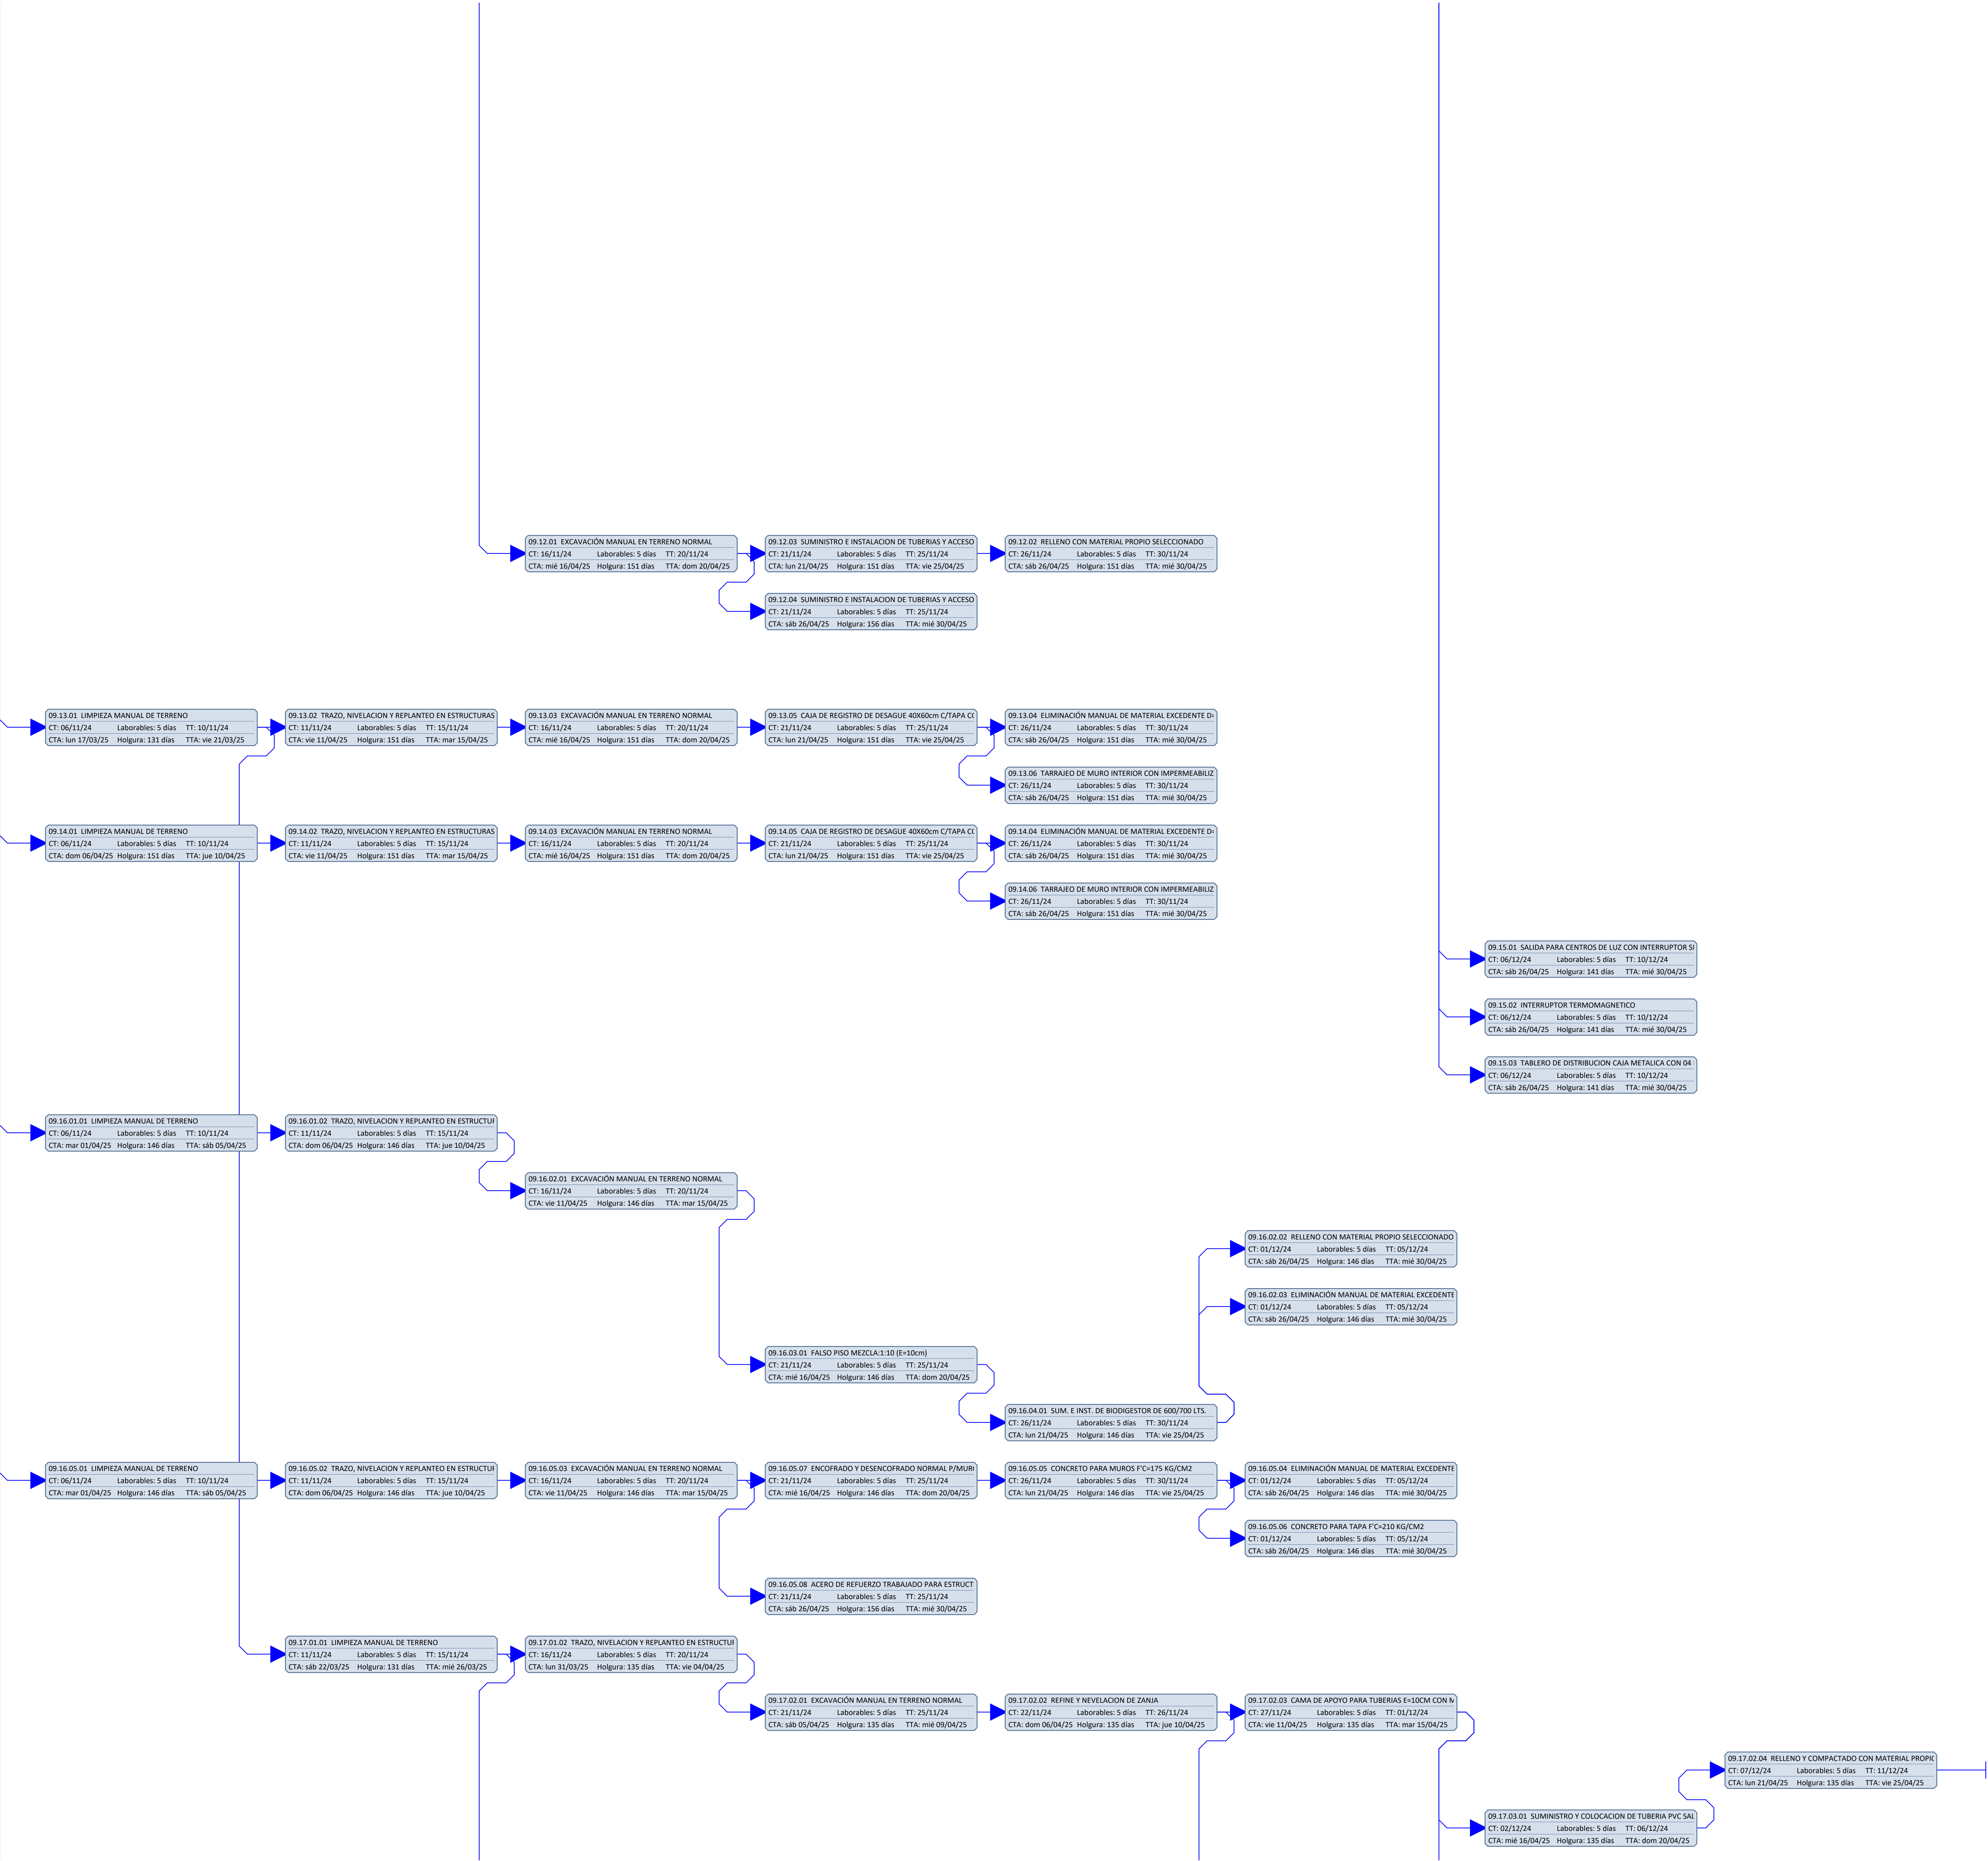


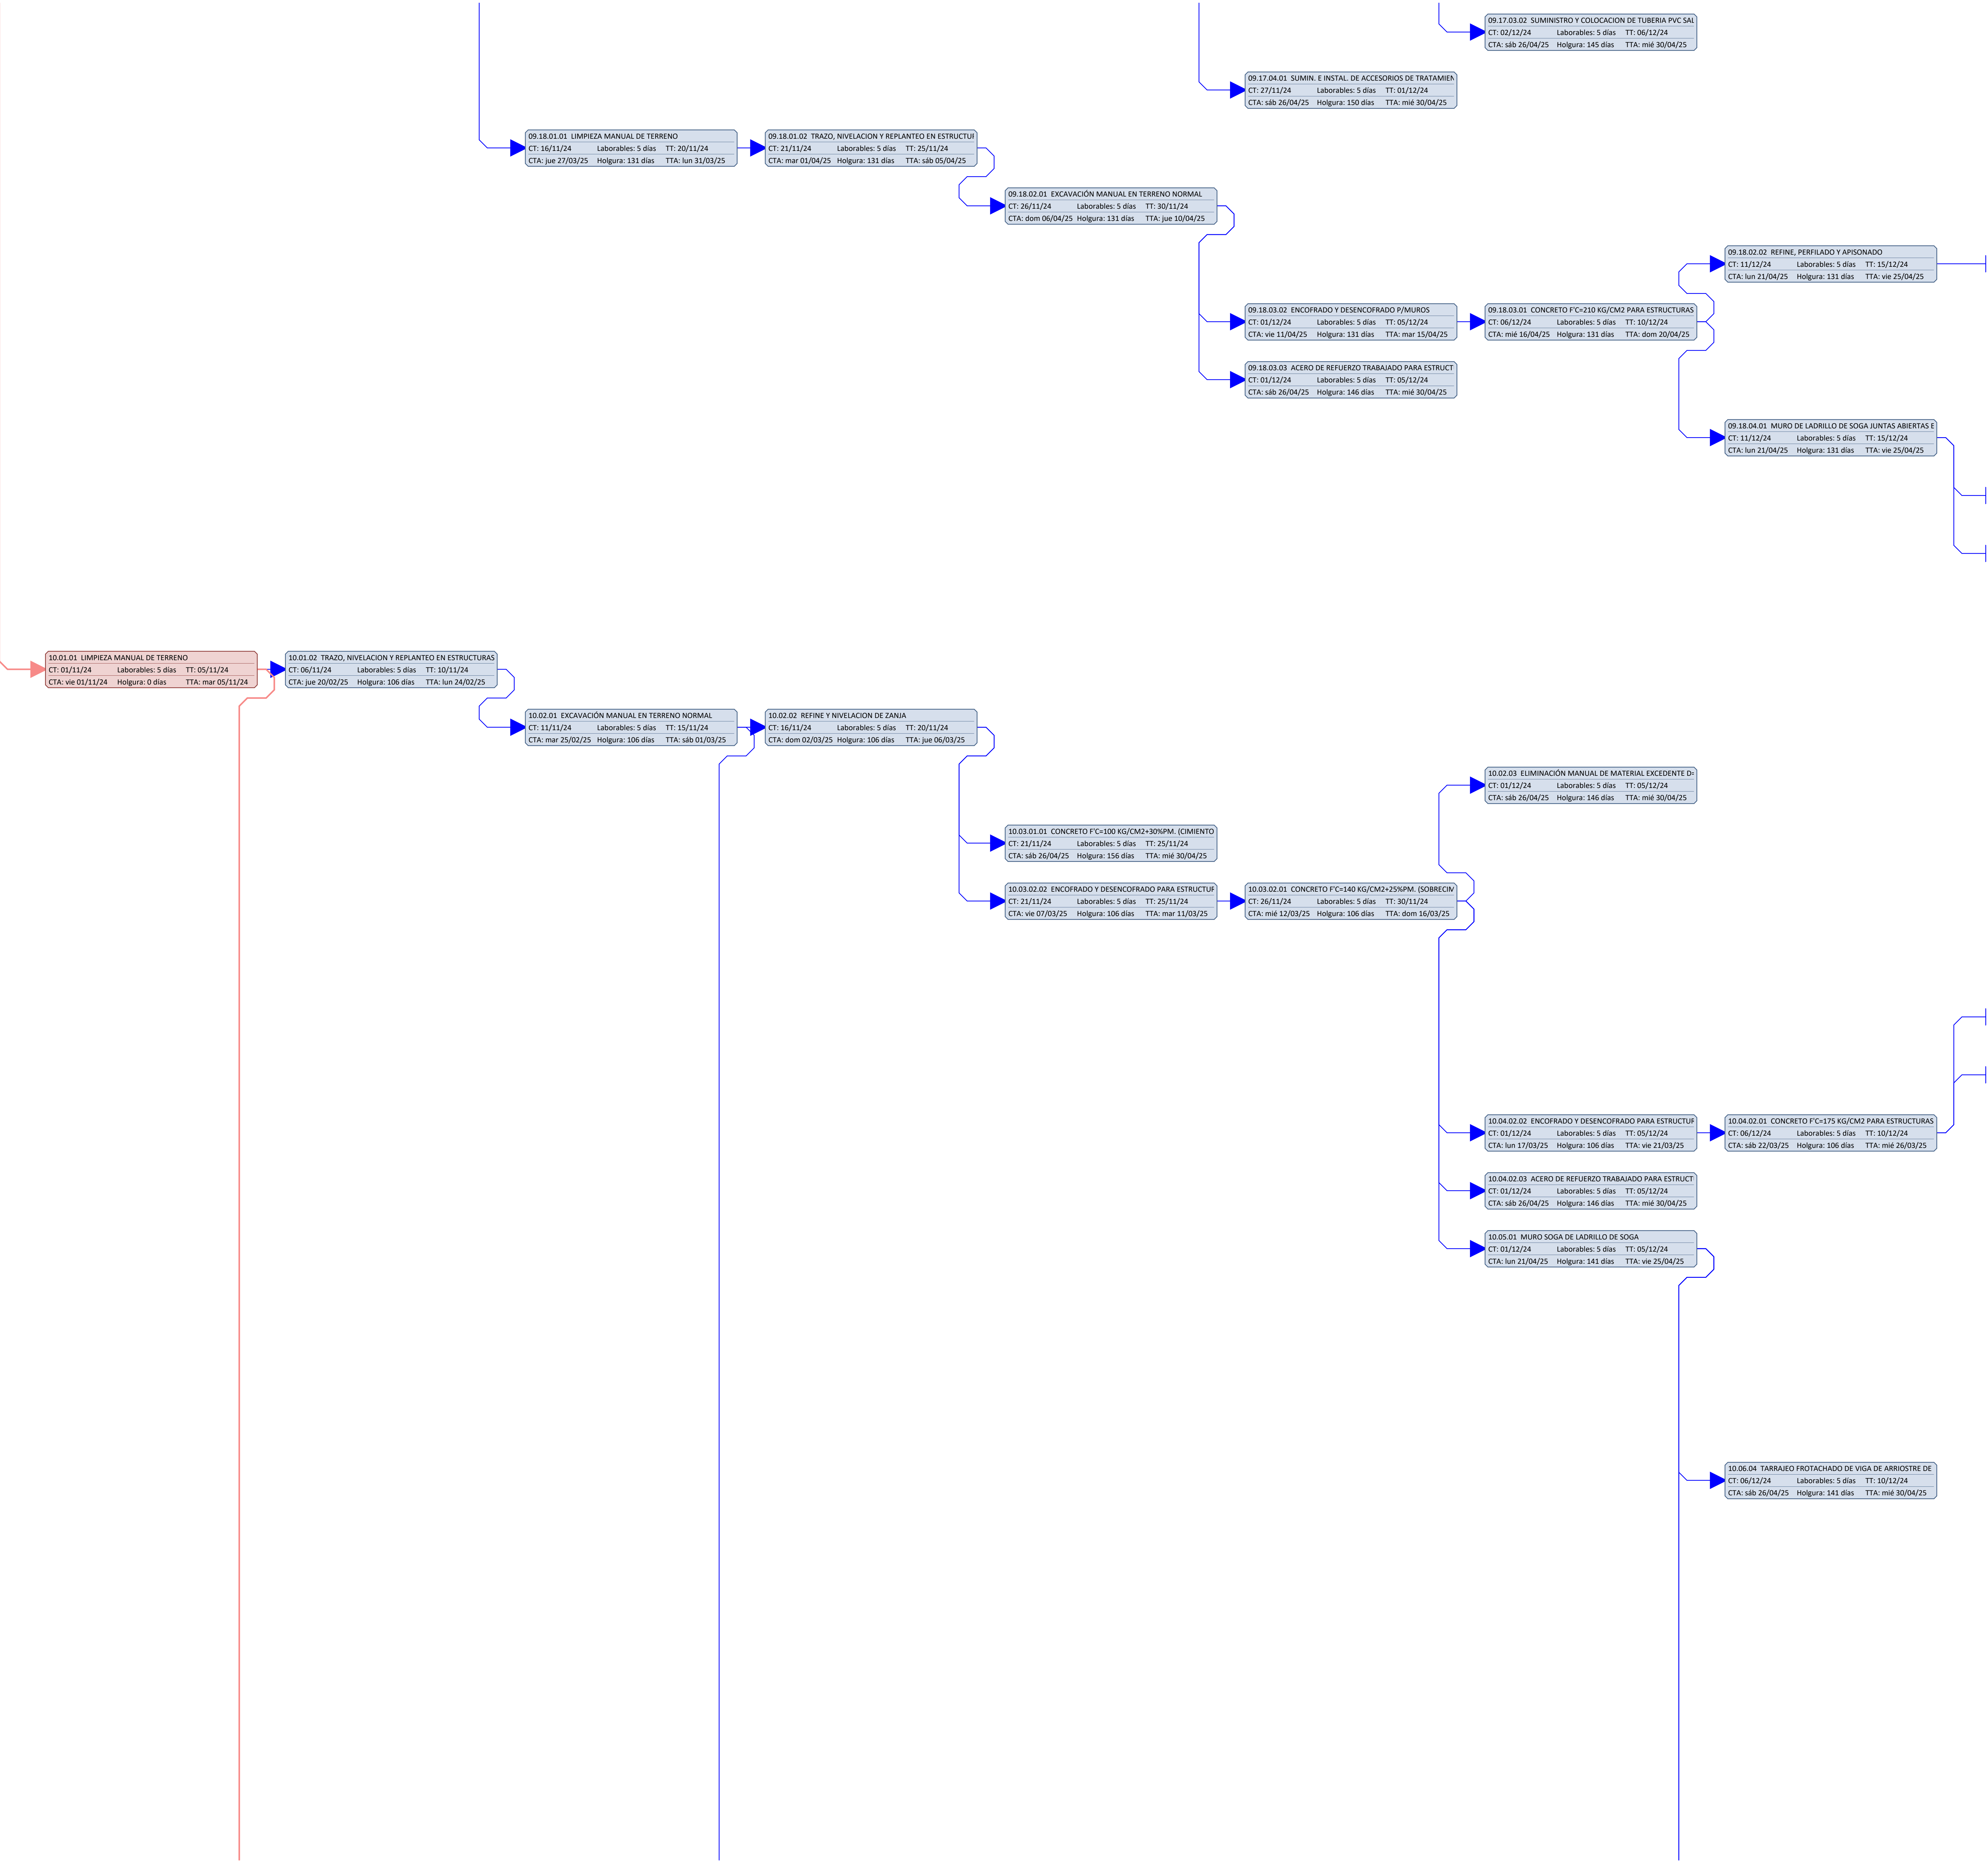


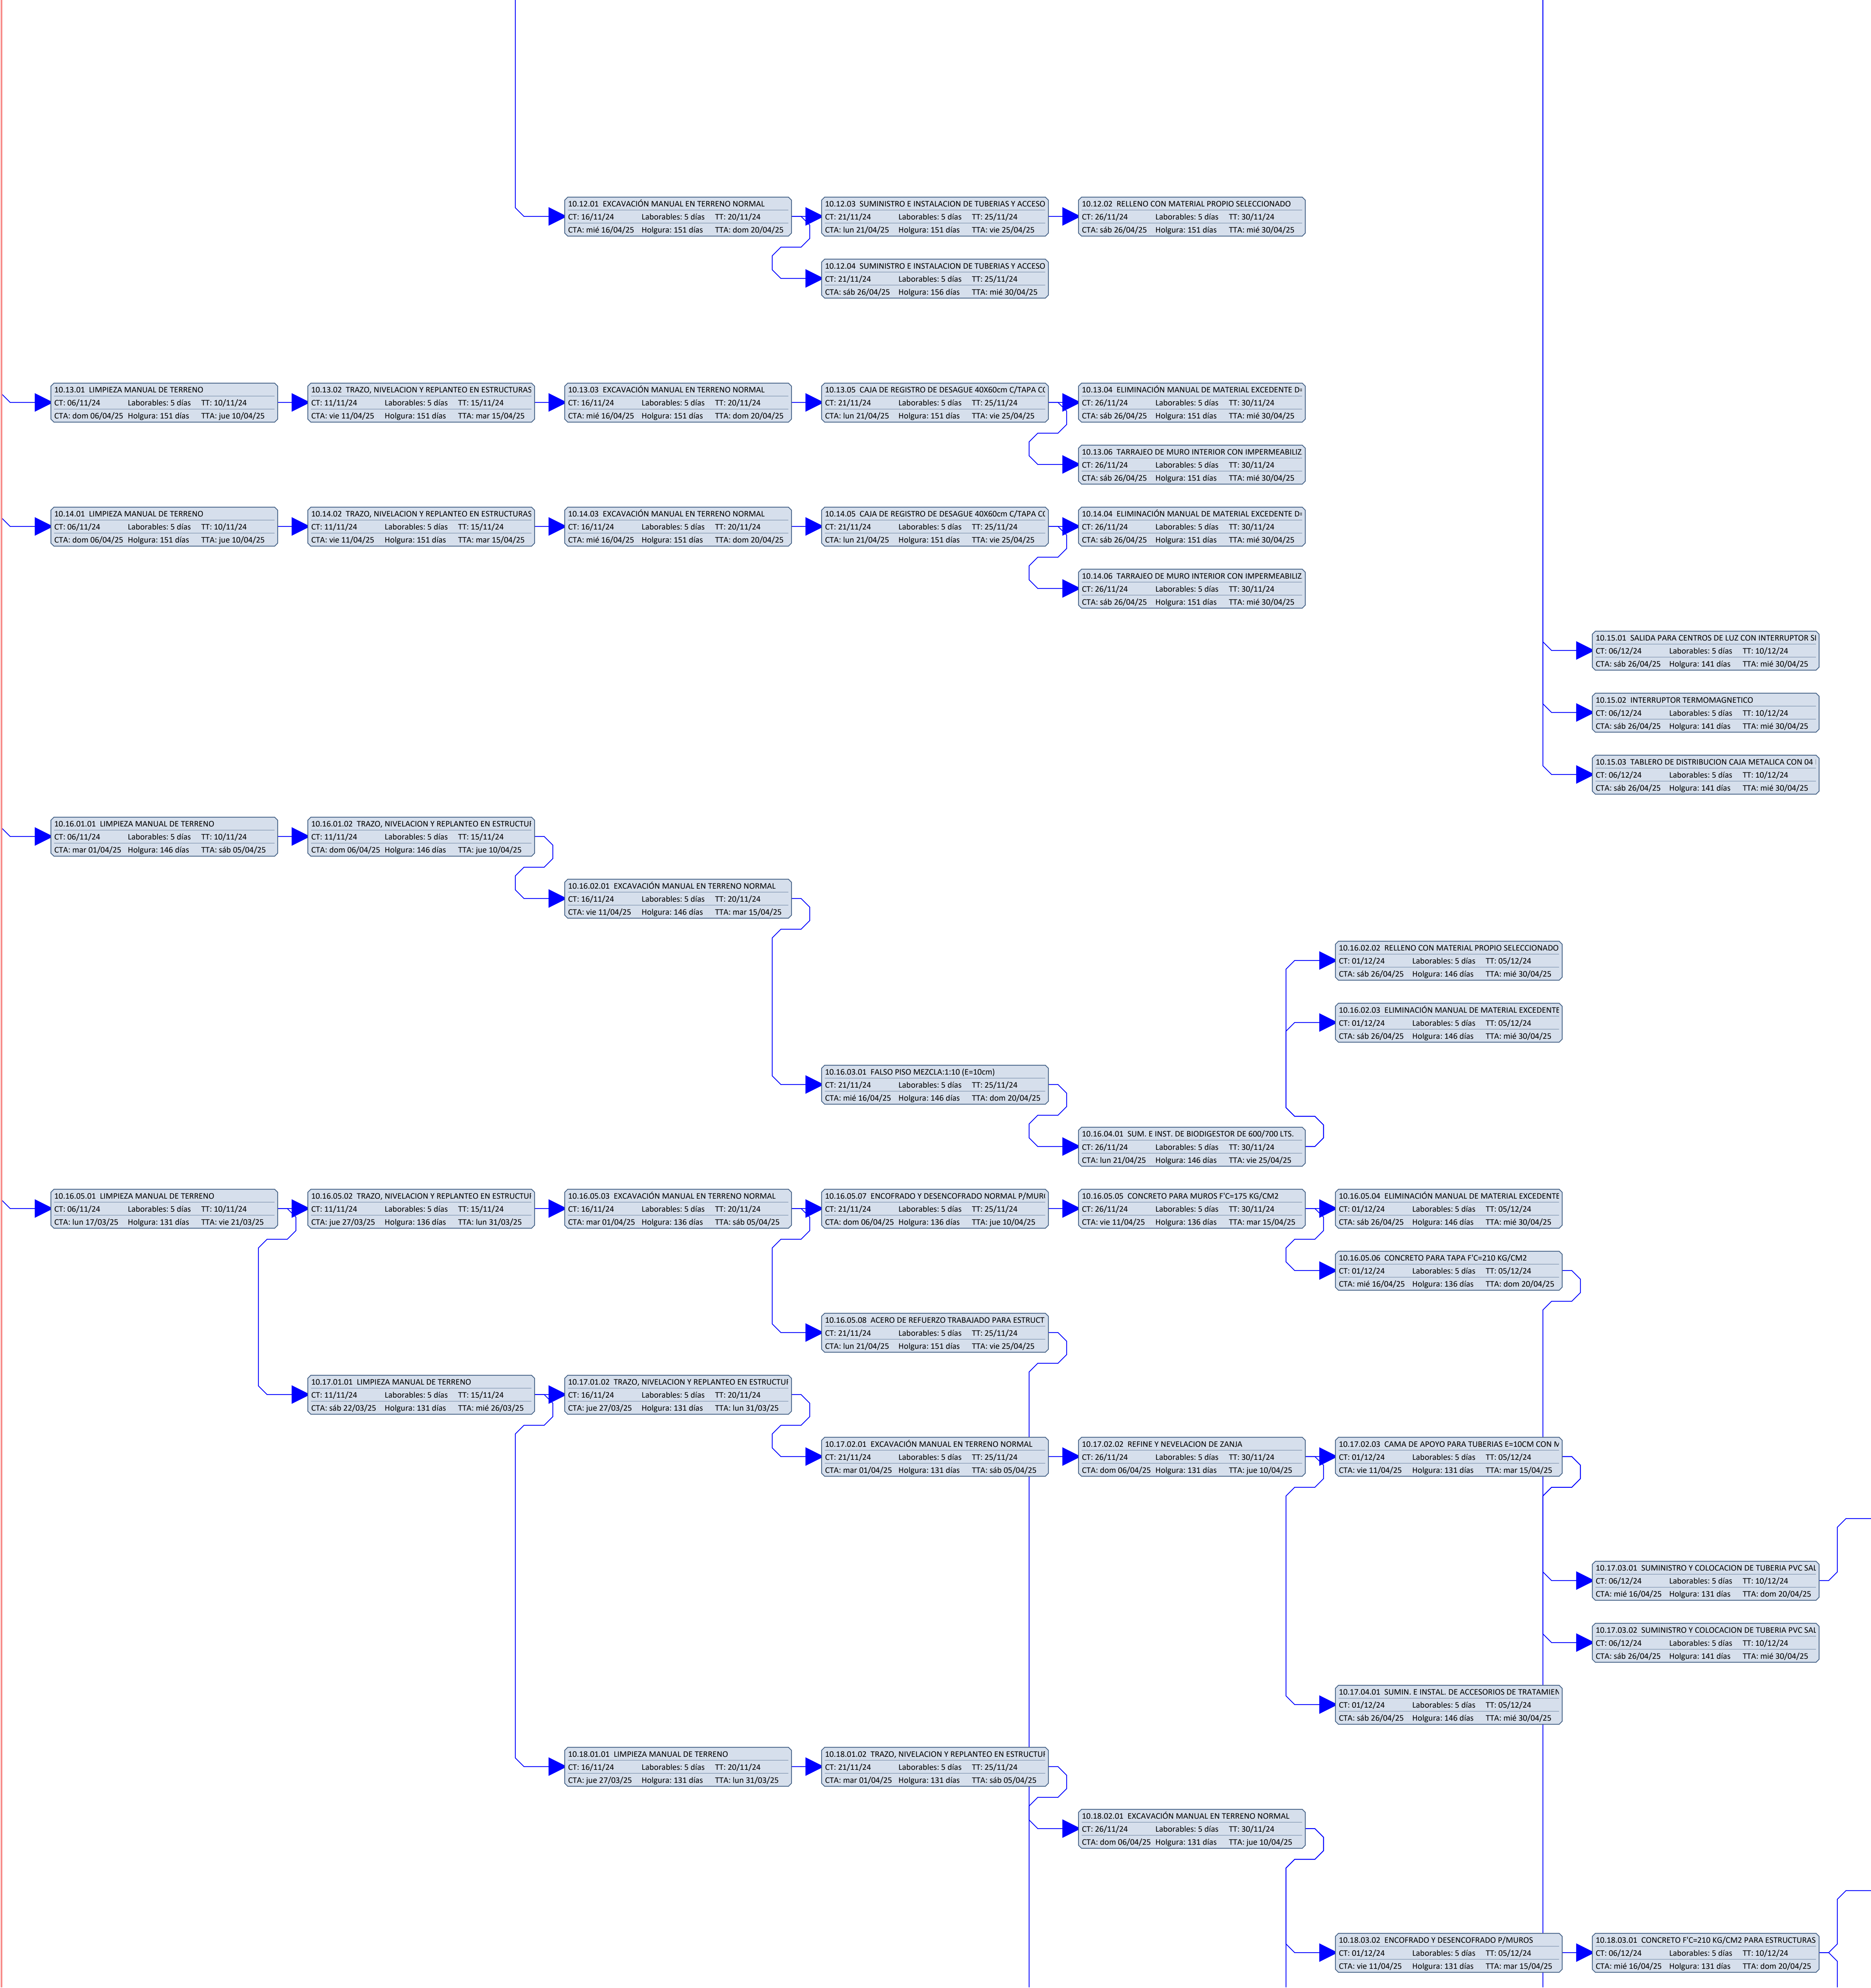




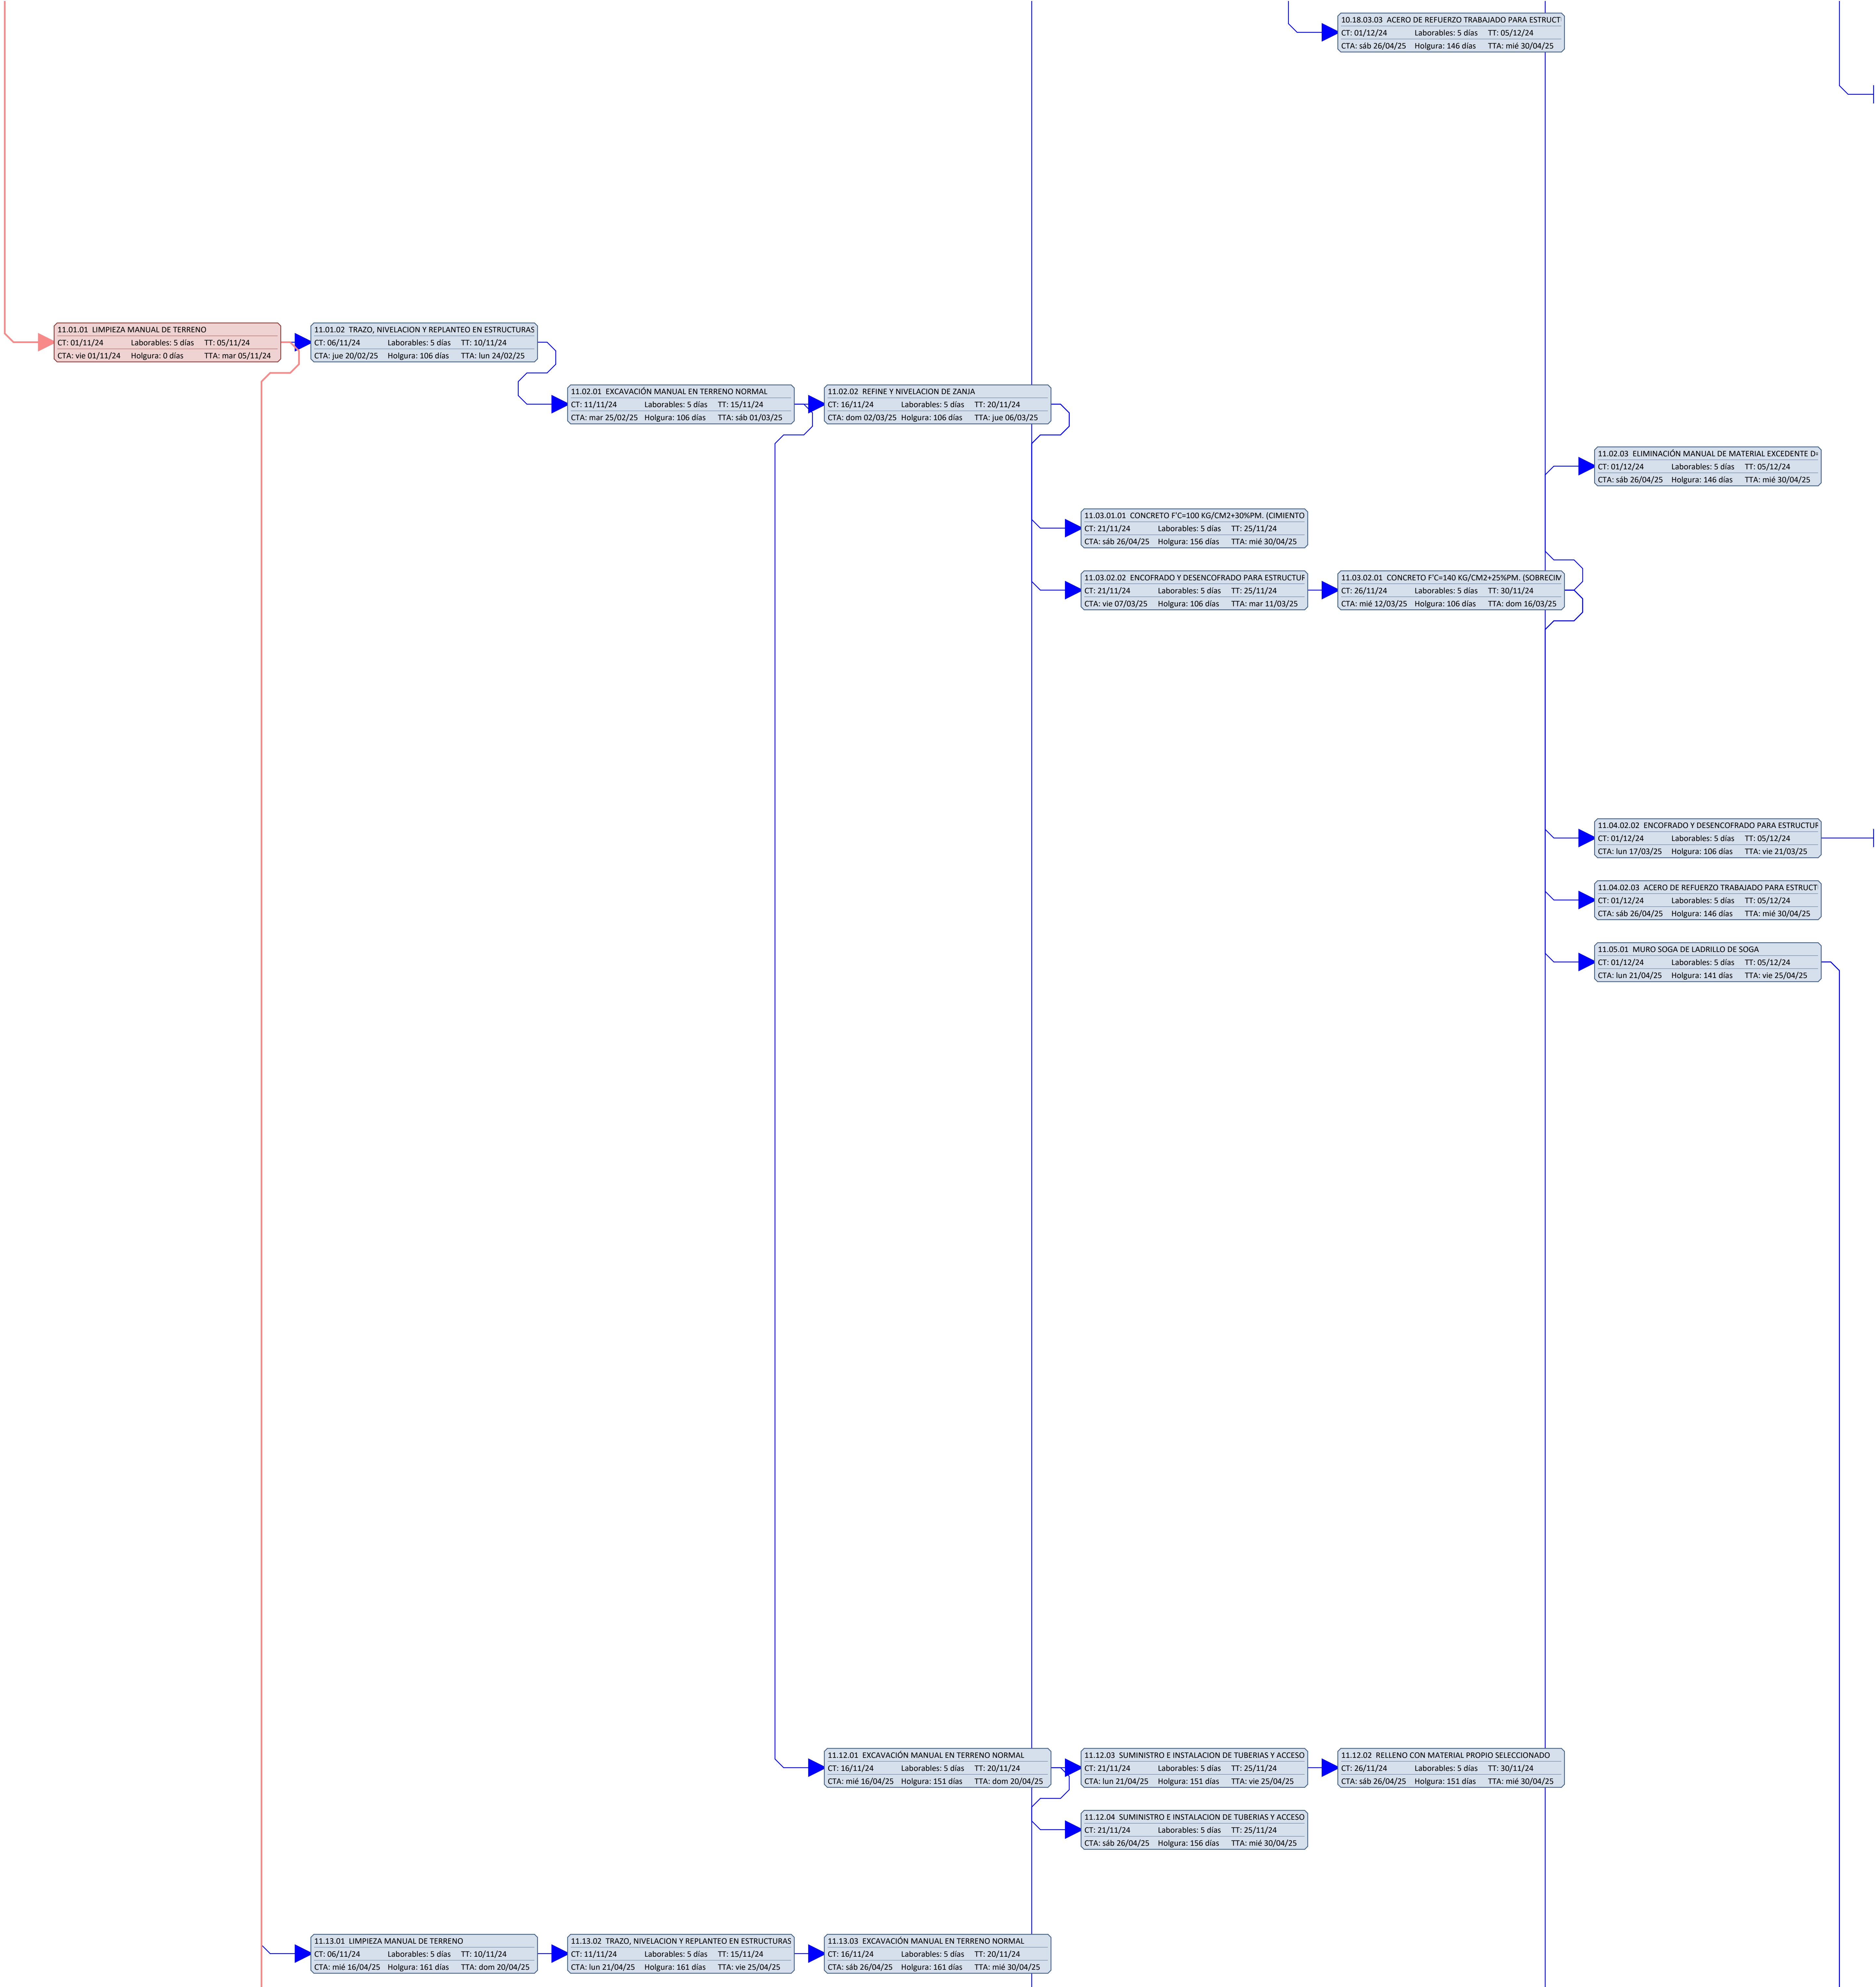

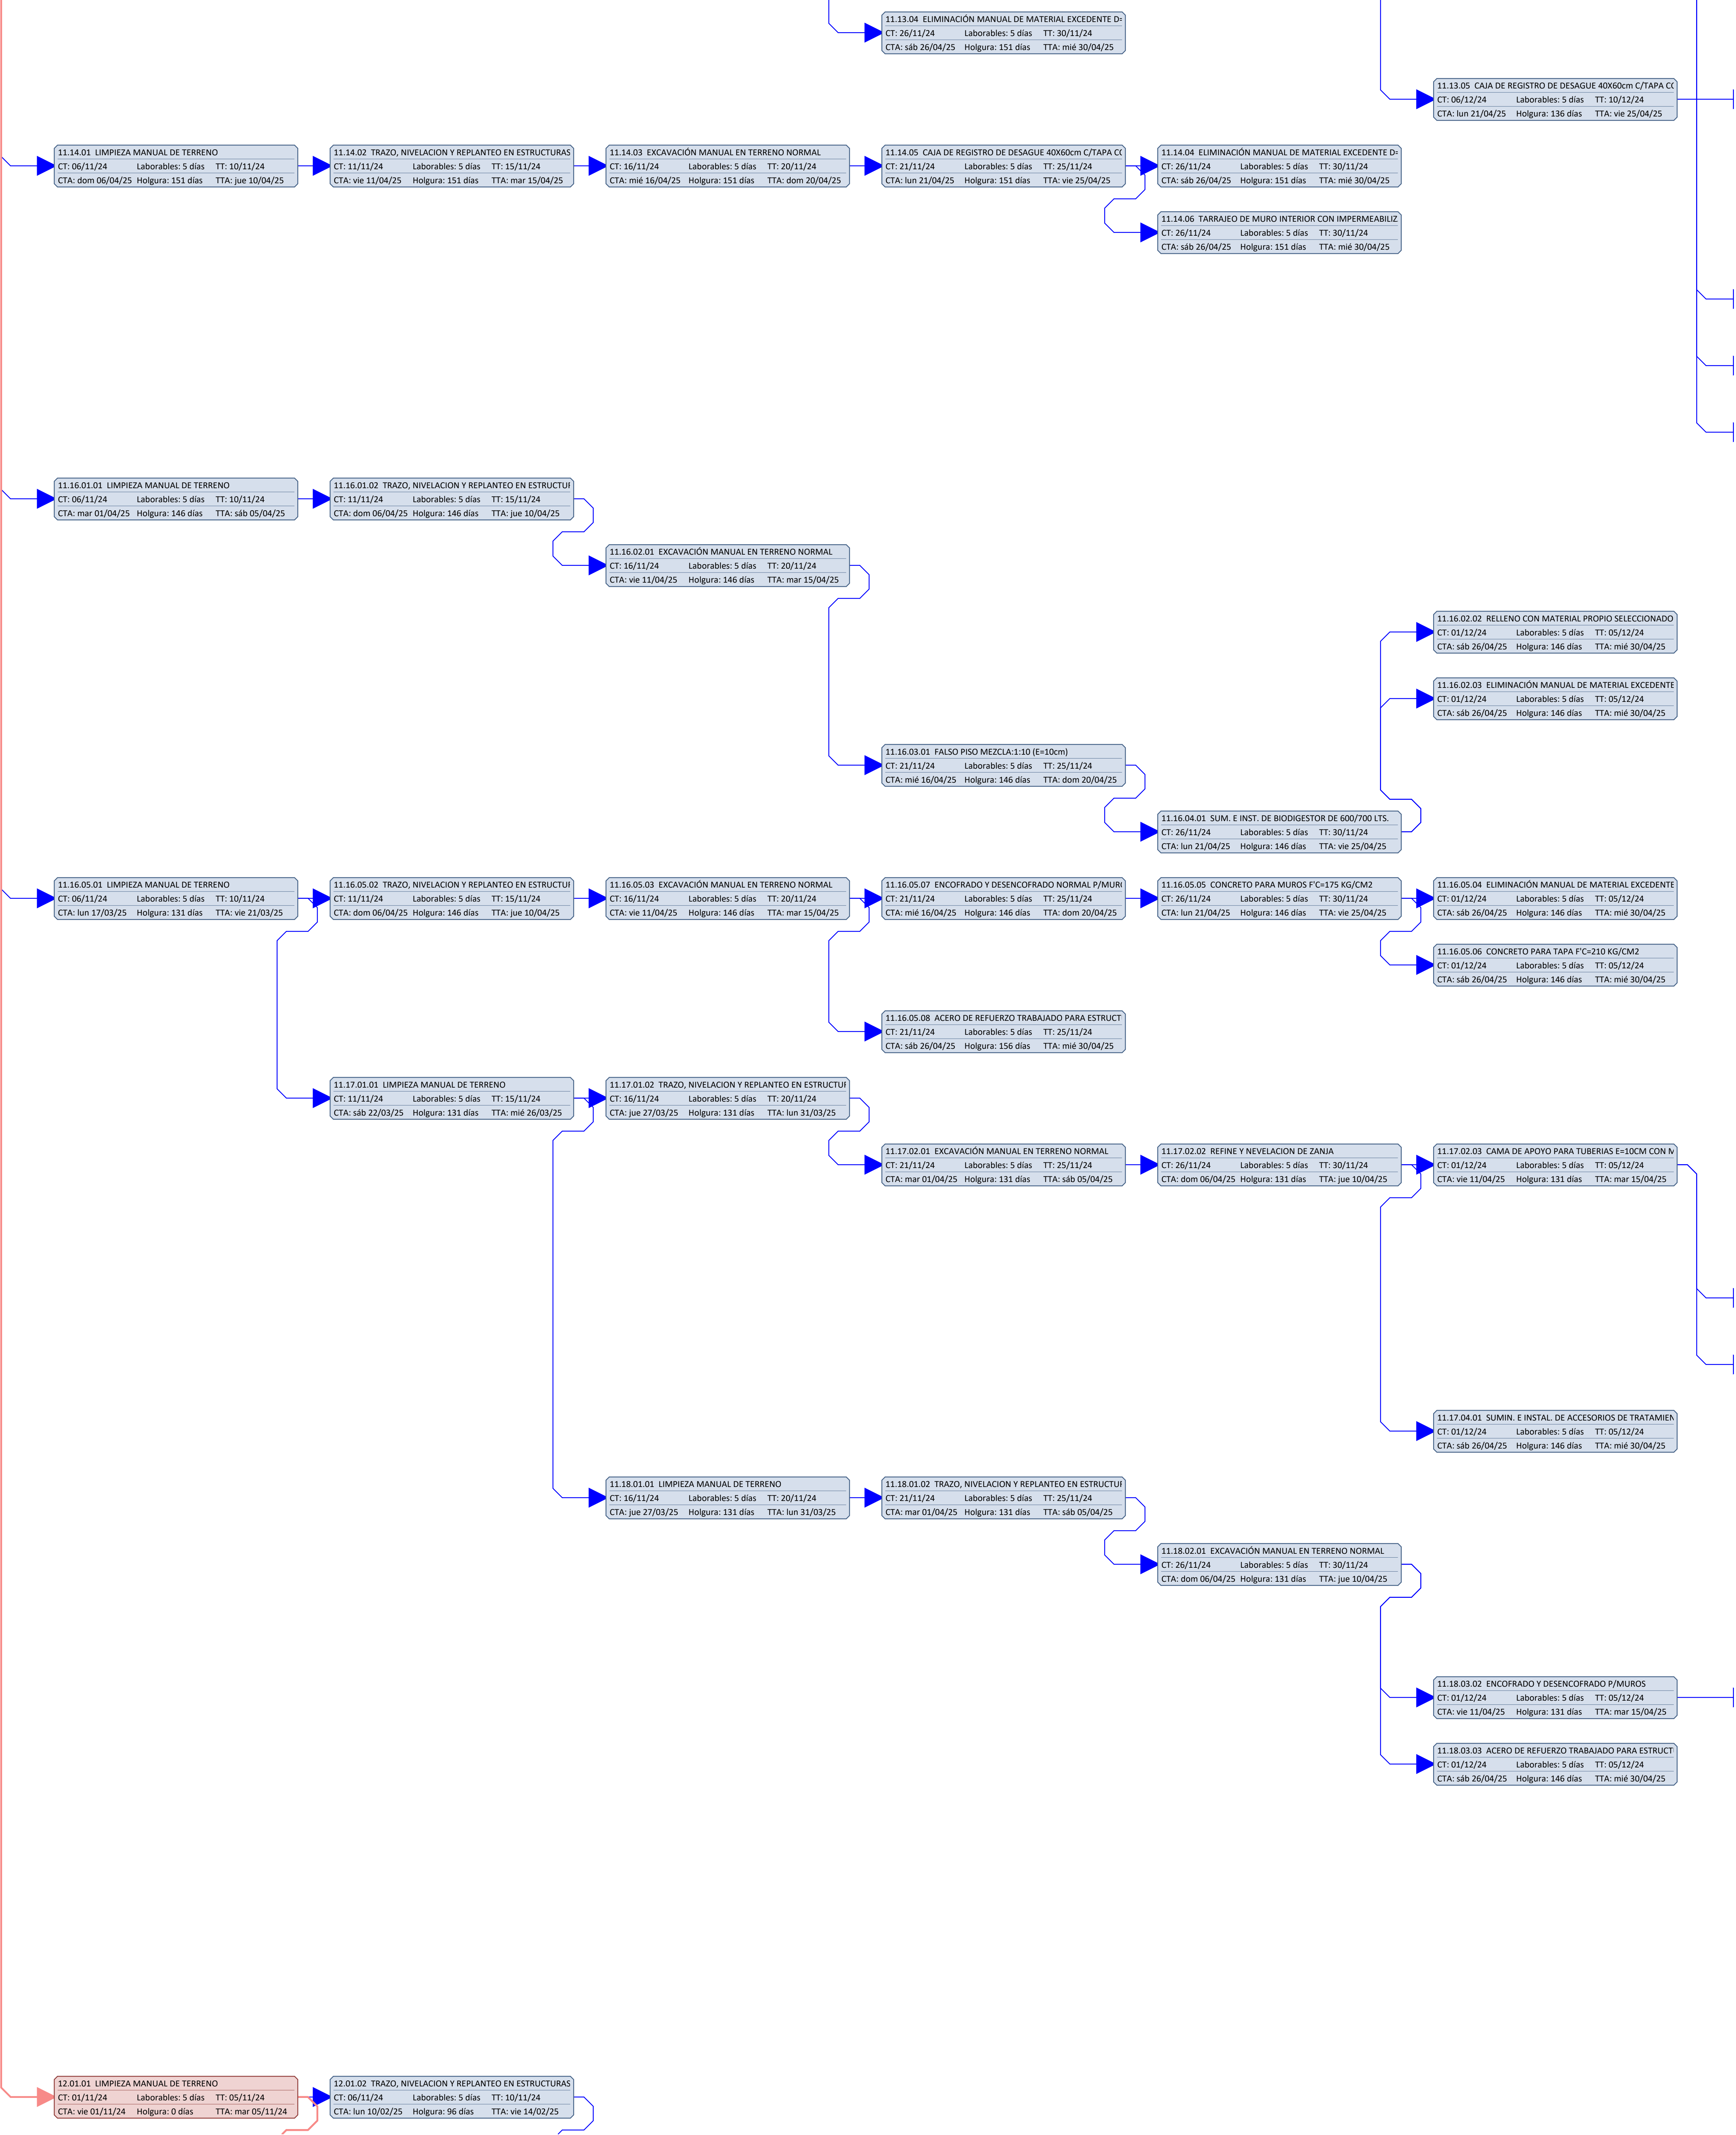

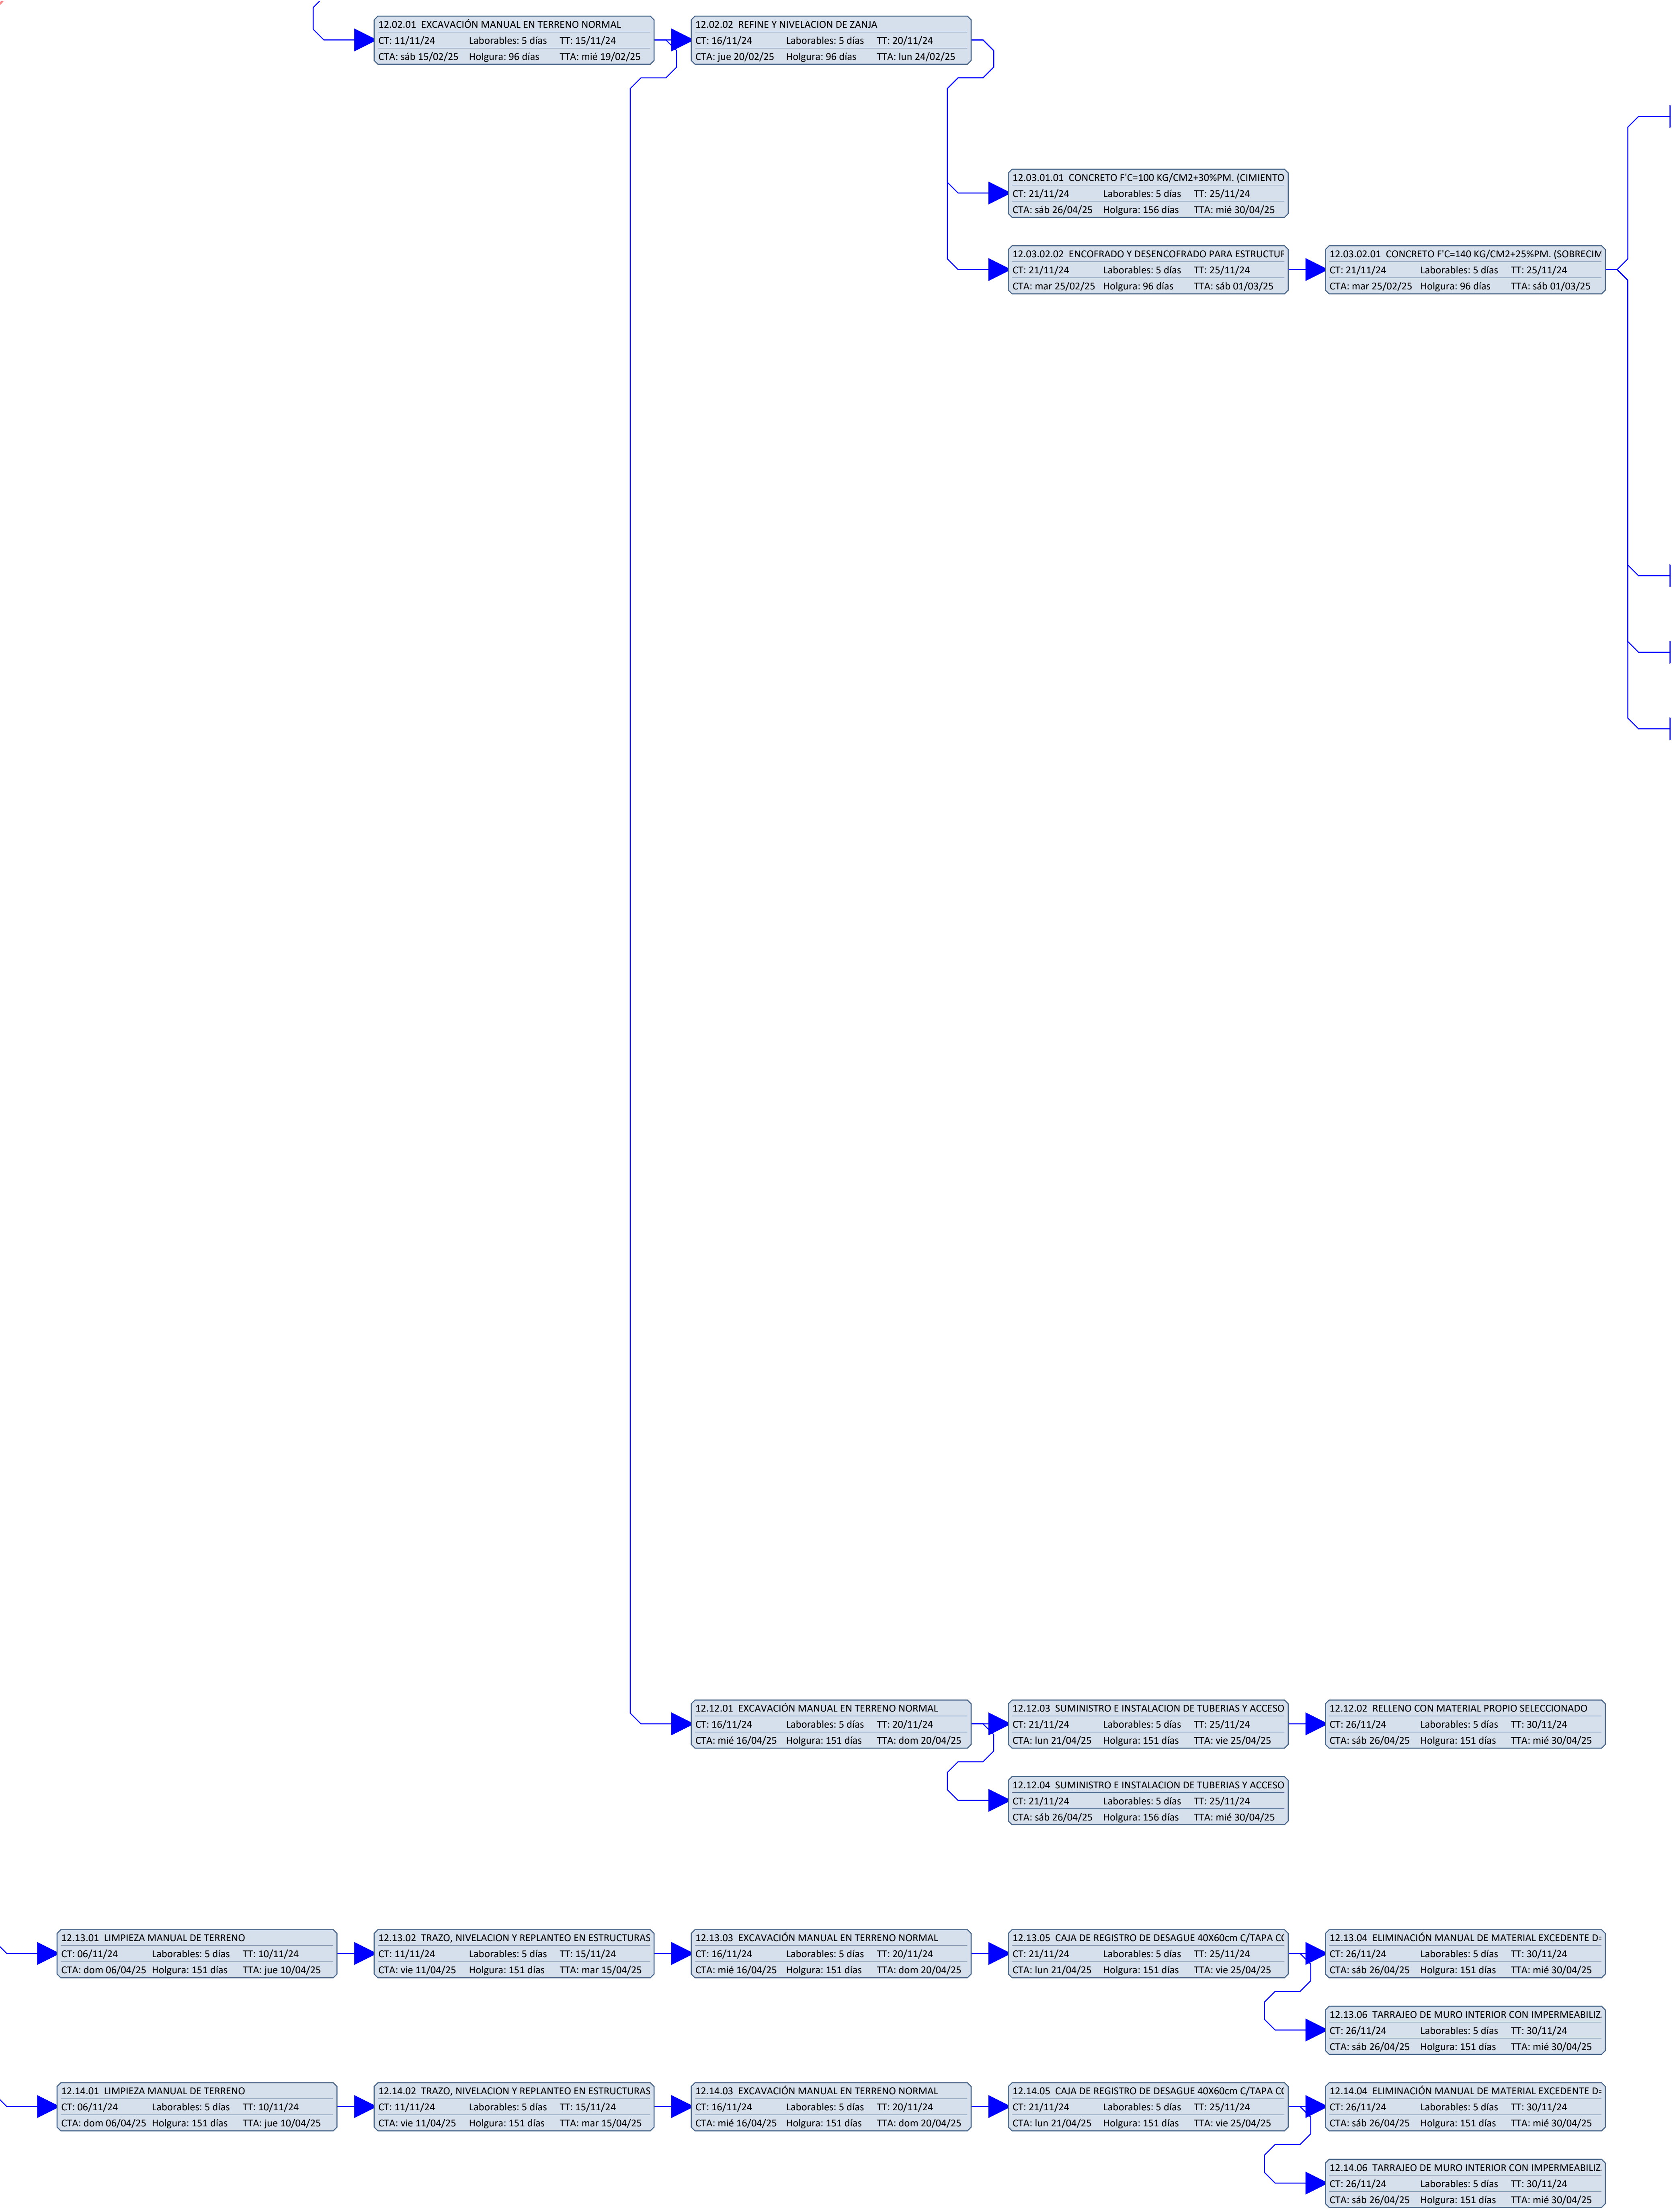



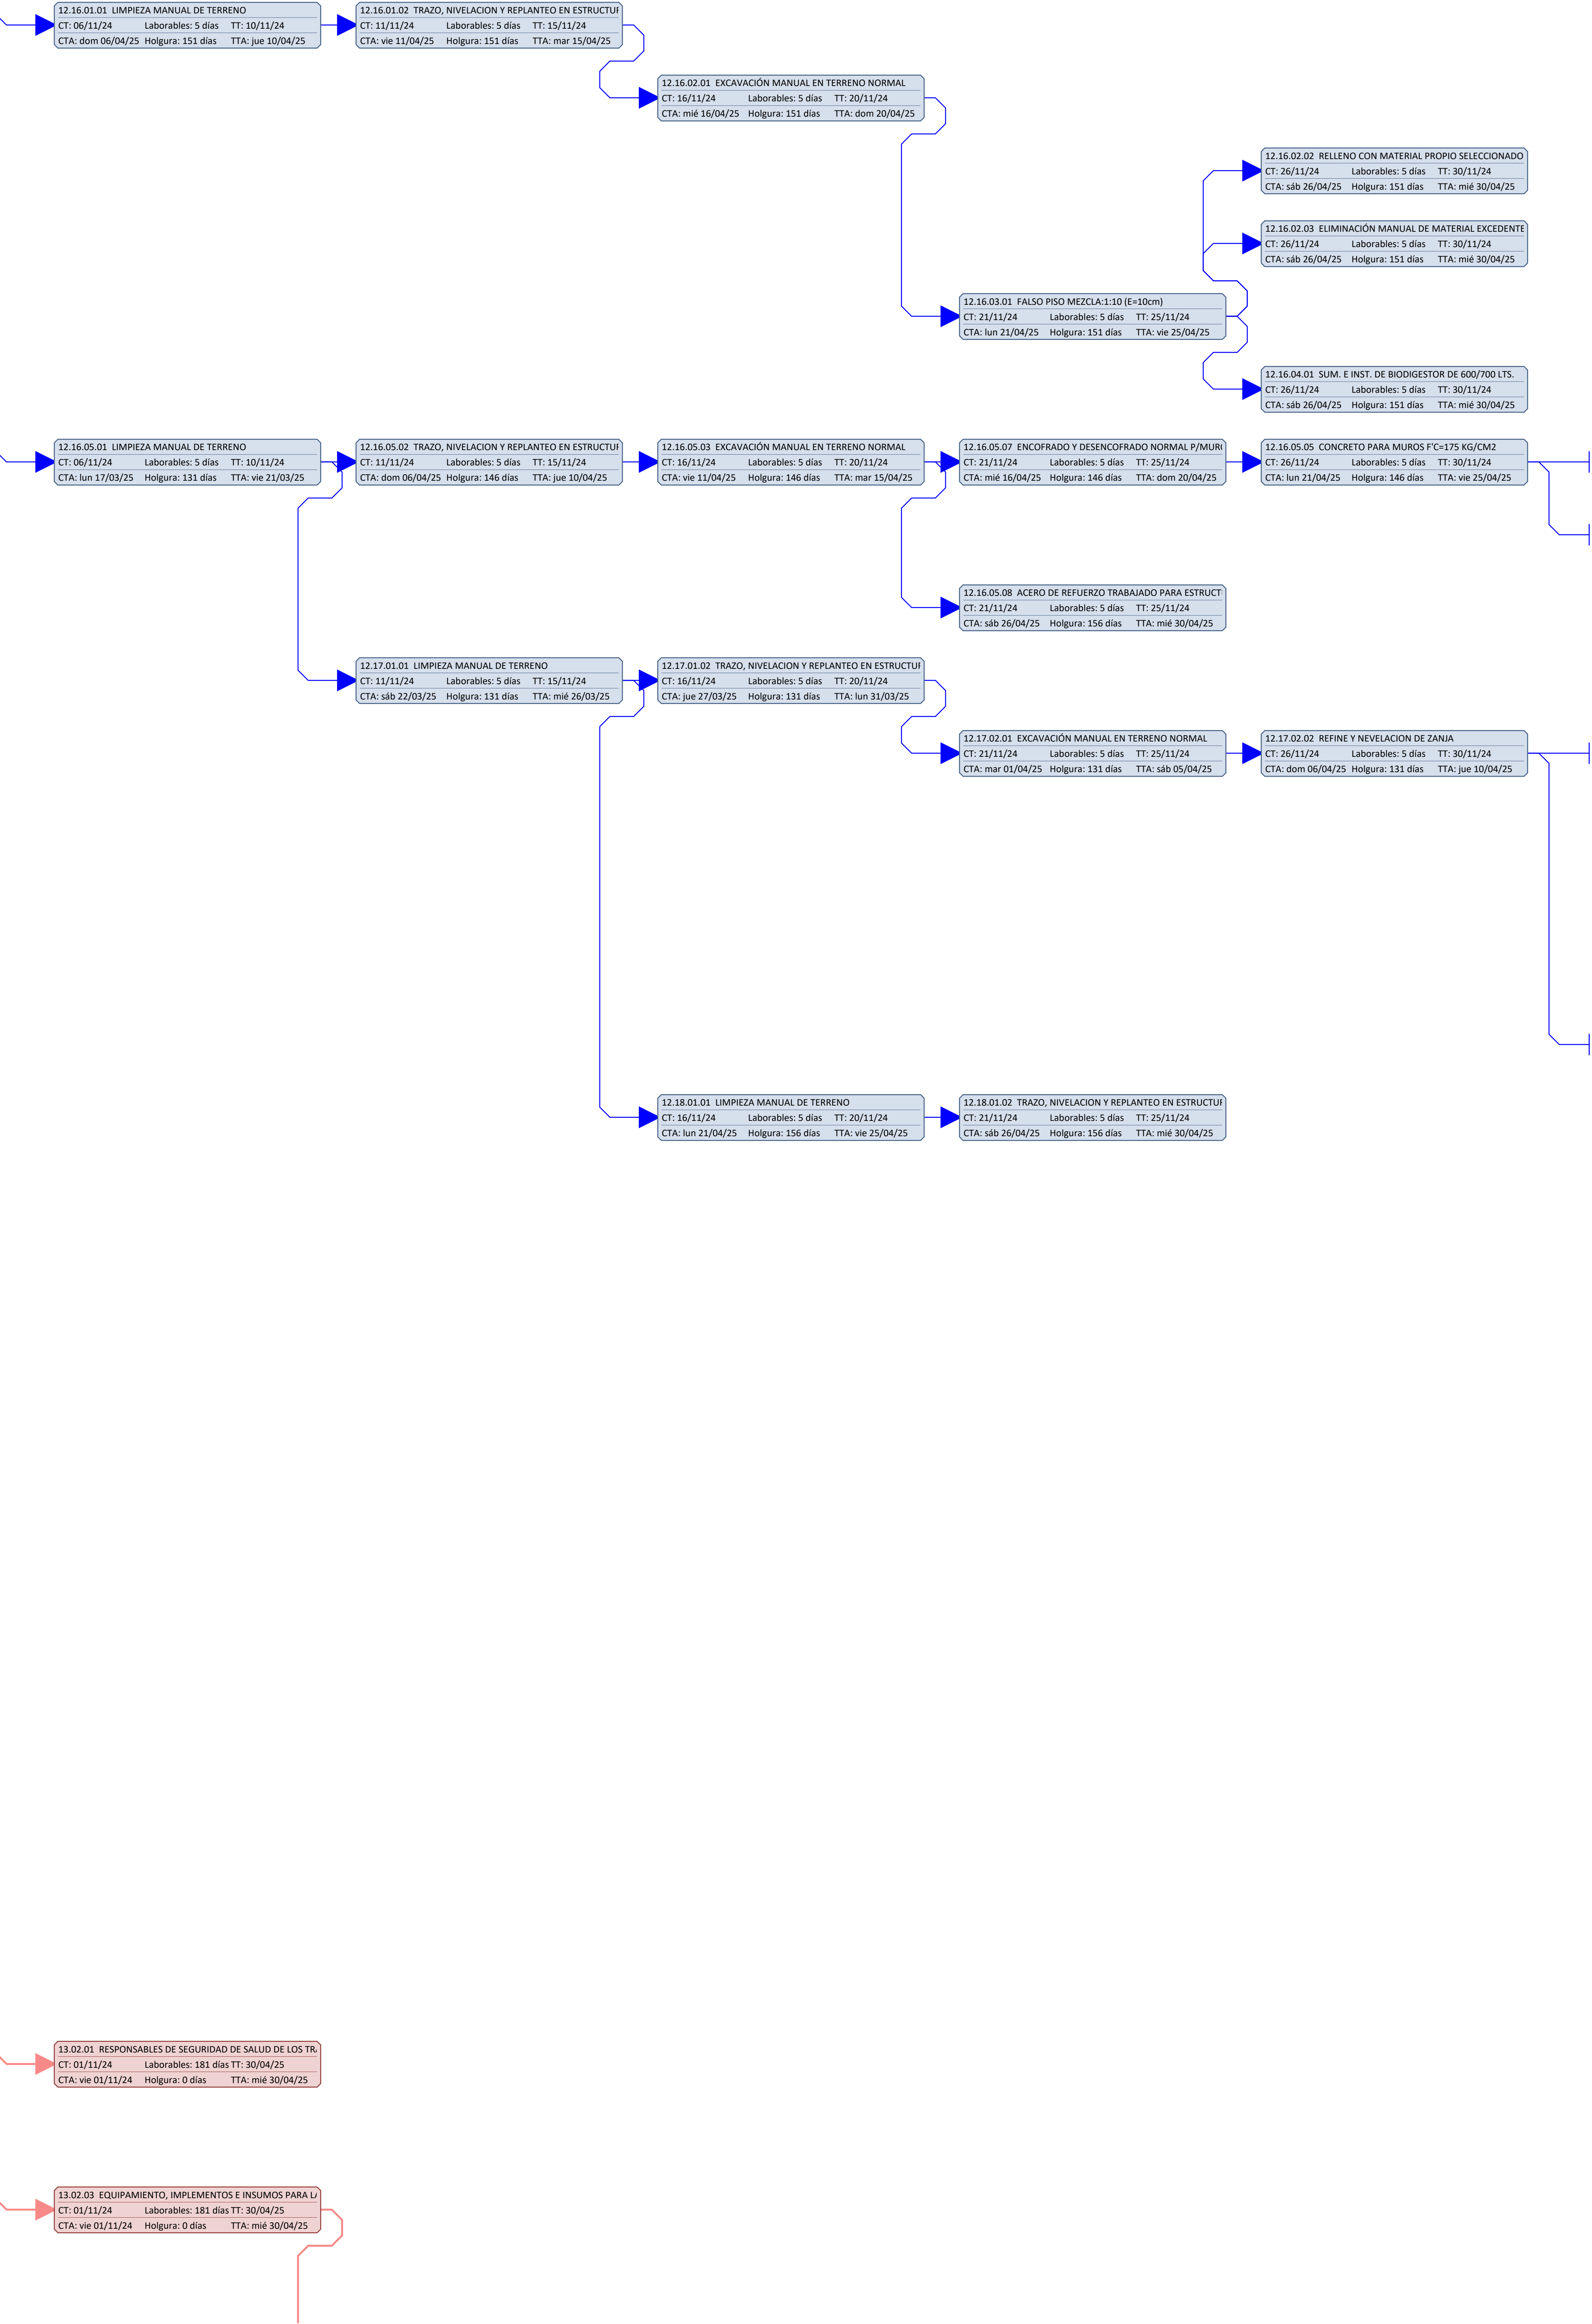


























































05.11.01.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1  
CT: 21/03/25    Laborables: 5 días    TT: 25/03/25  
CTA: vie 21/03/25    Holgura: 0 días    TTA: mar 25/03/25









06.10.01.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTA
CT: 06/03/25      Laborables: 5 días      TT: 10/03/25
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 51 días      TTA: mié 30/04/25

06.10.01.05.03 CAJA DE PASO C/TAPA PRE-FABRICADA
CT: 11/03/25      Laborables: 10 días      TT: 20/03/25
CTA: mar 11/03/25      Holgura: 0 días      TTA: jue 20/03/25

06.10.01.06.03 CONCRETO F'c=175 KG/CM2 P/PILETA
CT: 19/02/25      Laborables: 5 días      TT: 23/02/25
CTA: lun 21/04/25      Holgura: 61 días      TTA: vie 25/04/25

06.10.01.07.01 PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. DE AGUA POTAB
CT: 14/02/25      Laborables: 5 días      TT: 18/02/25
CTA: mar 01/04/25      Holgura: 46 días      TTA: sáb 05/04/25

06.10.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO PARA
CT: 14/02/25      Laborables: 5 días      TT: 18/02/25
CTA: mar 01/04/25      Holgura: 46 días      TTA: sáb 05/04/25

06.10.02.02.01 EXCAV. MANUAL DE ZANJA EN T-NORMAL P/TU
CT: 14/02/25      Laborables: 5 días      TT: 18/02/25
CTA: mar 01/04/25      Holgura: 46 días      TTA: sáb 05/04/25

06.10.02.02.02 REFINE Y NIVEL DE ZANJA EN T-NORMAL P/TU
CT: 14/02/25      Laborables: 5 días      TT: 18/02/25
CTA: mar 01/04/25      Holgura: 46 días      TTA: sáb 05/04/25

06.10.02.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO SELECC. EN
CT: 19/02/25      Laborables: 5 días      TT: 23/02/25
CTA: dom 06/04/25      Holgura: 46 días      TTA: jue 10/04/25

06.10.02.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECC. CON
CT: 24/02/25      Laborables: 5 días      TT: 28/02/25
CTA: vie 11/04/25      Holgura: 46 días      TTA: mar 15/04/25

06.10.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P
CT: 14/02/25      Laborables: 5 días      TT: 18/02/25
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 71 días      TTA: mié 30/04/25

06.10.02.06.01 PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. DE AGUA POTAB
CT: 14/02/25      Laborables: 5 días      TT: 18/02/25
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 71 días      TTA: mié 30/04/25

06.10.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS I
CT: 01/03/25      Laborables: 5 días      TT: 05/03/25
CTA: lun 21/04/25      Holgura: 51 días      TTA: vie 25/04/25

06.10.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS I
CT: 01/03/25      Laborables: 5 días      TT: 05/03/25
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 56 días      TTA: mié 30/04/25

06.10.02.05.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL
CT: 01/03/25      Laborables: 5 días      TT: 05/03/25
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 56 días      TTA: mié 30/04/25


06.10.02.05.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA
CT: 01/03/25      Laborables: 5 días      TT: 05/03/25
CTA: mié 16/04/25      Holgura: 46 días      TTA: dom 20/04/25


06.10.02.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTA
CT: 06/03/25      Laborables: 5 días      TT: 10/03/25
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 51 días      TTA: mié 30/04/25


06.10.02.05.03 CAJA DE PASO C/TAPA PRE-FABRICADA
CT: 06/03/25      Laborables: 5 días      TT: 10/03/25
CTA: lun 21/04/25      Holgura: 46 días      TTA: vie 25/04/25


06.10.02.05.04 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
CT: 11/03/25      Laborables: 5 días      TT: 15/03/25
CTA: sáb 26/04/25      Holgura: 46 días      TTA: mié 30/04/25



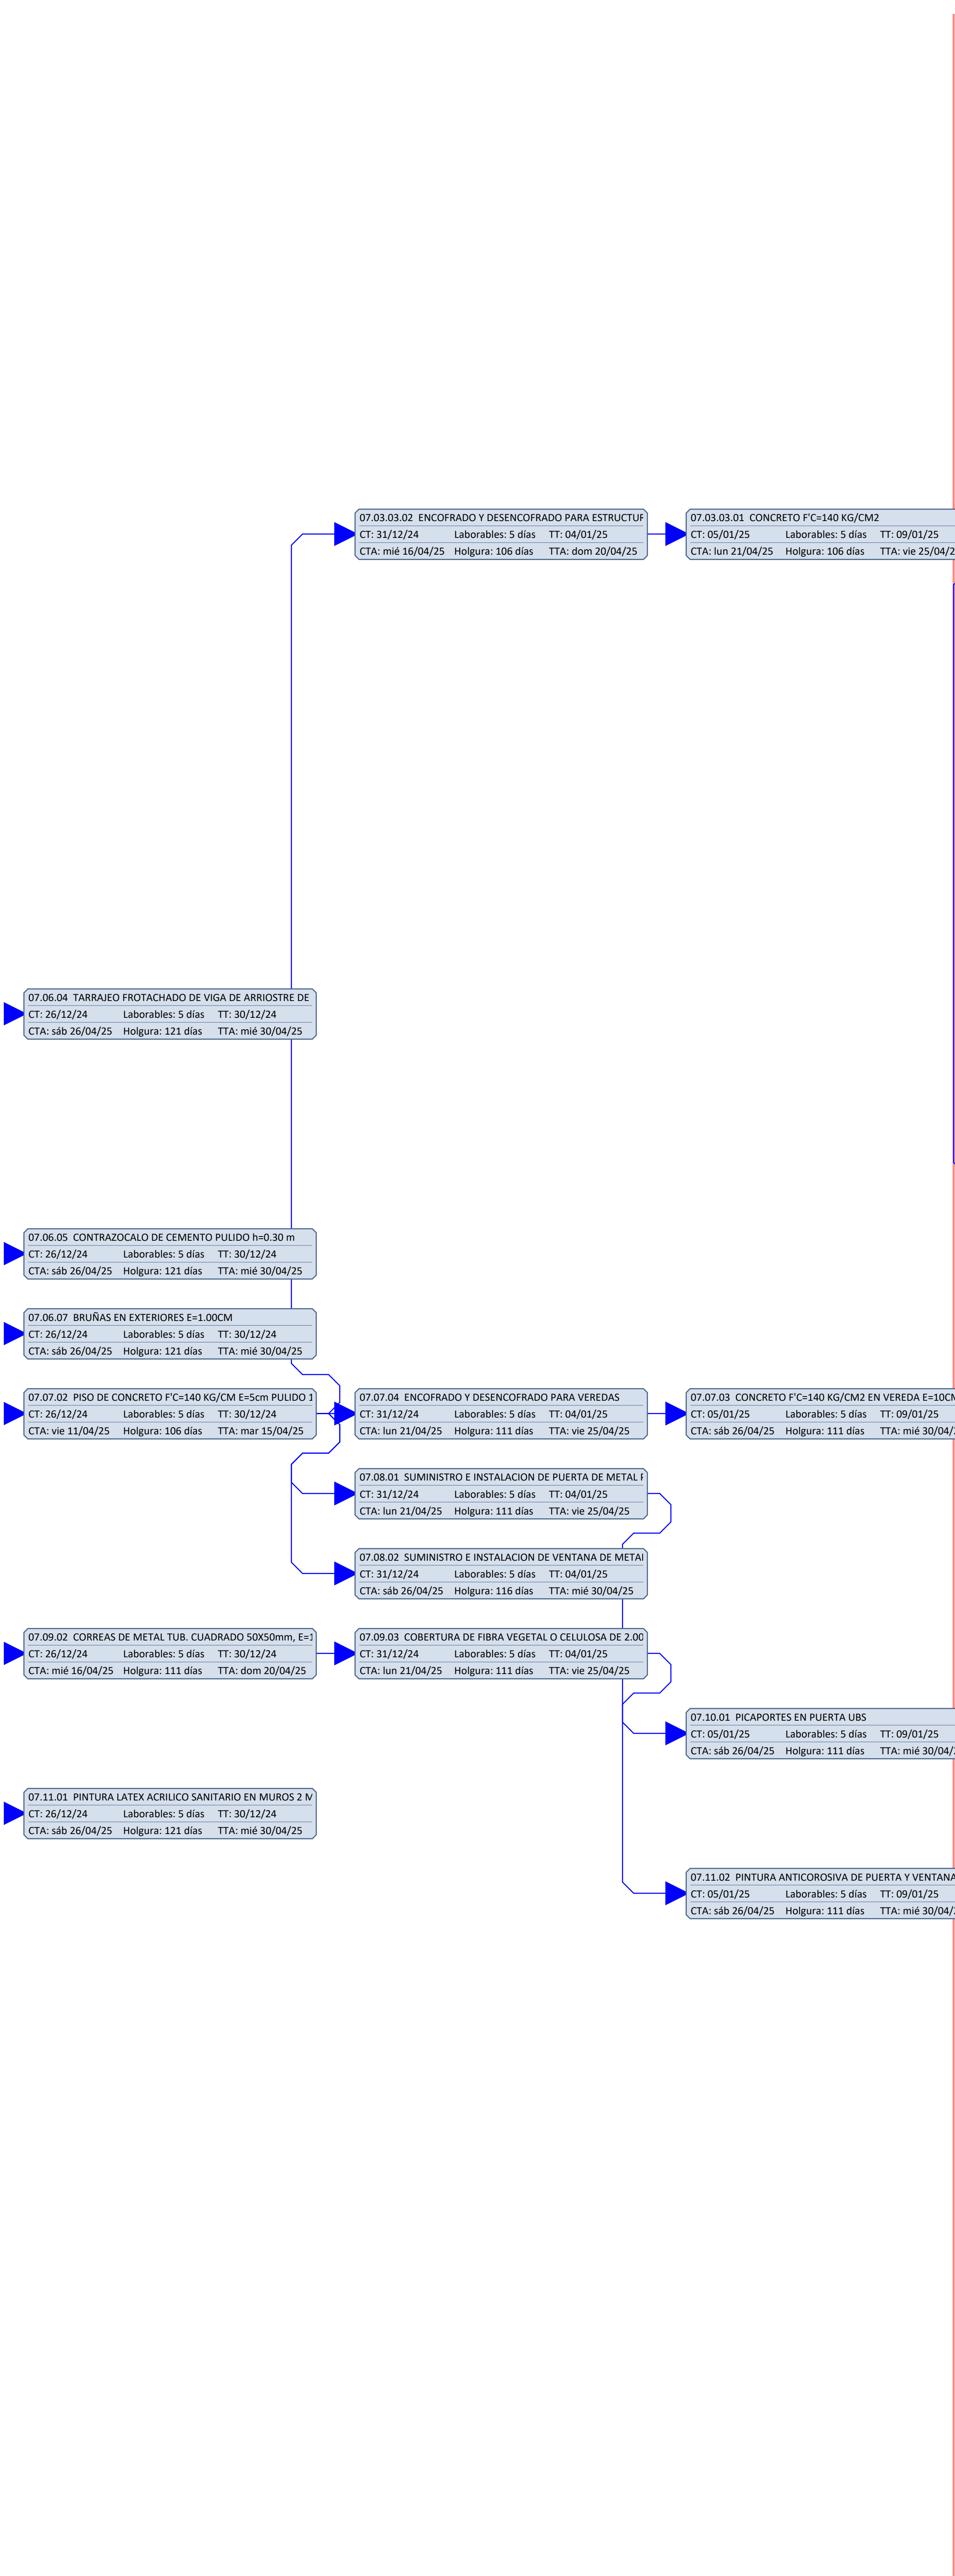


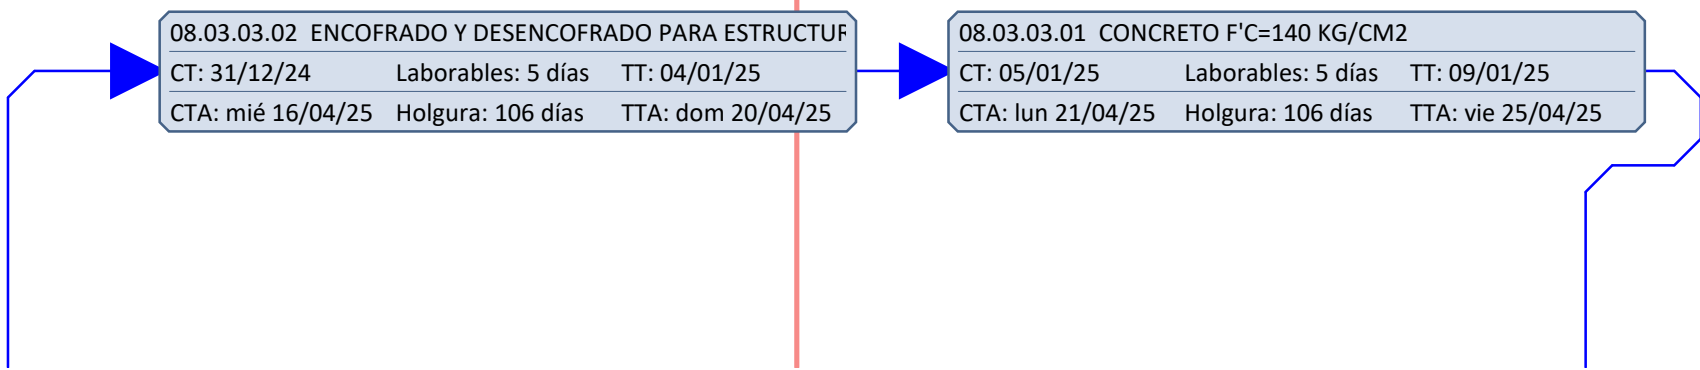

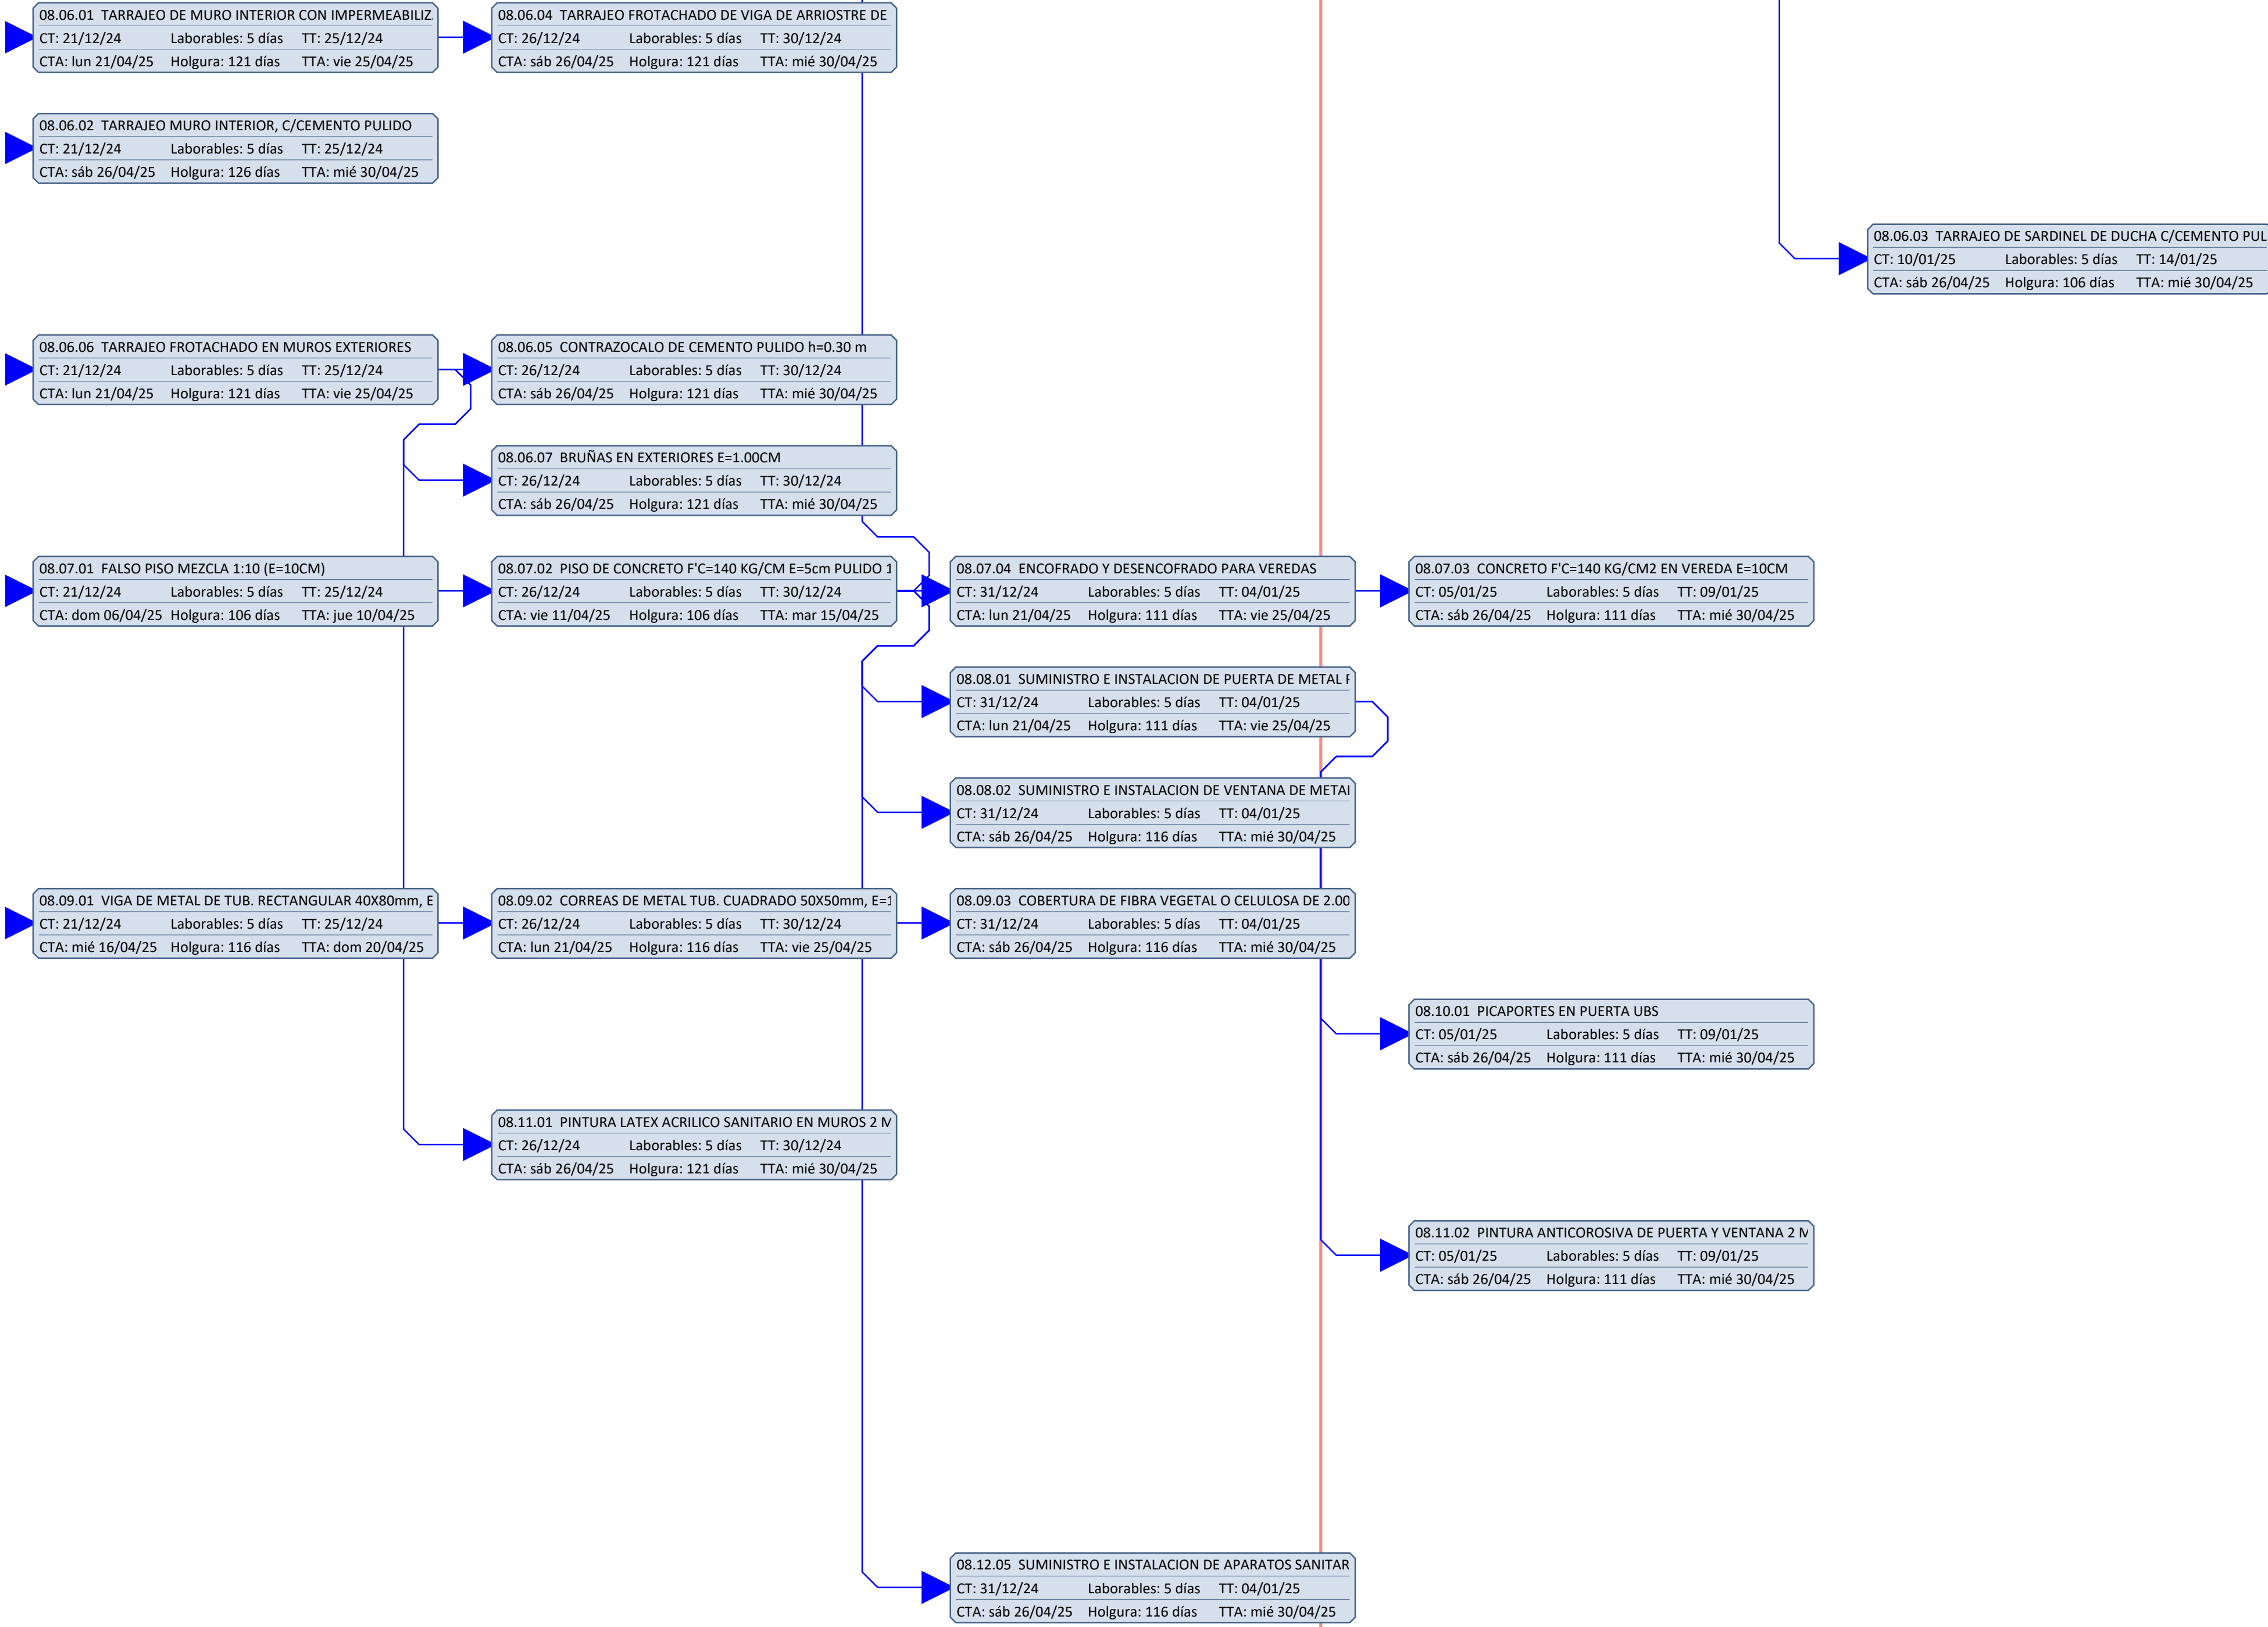

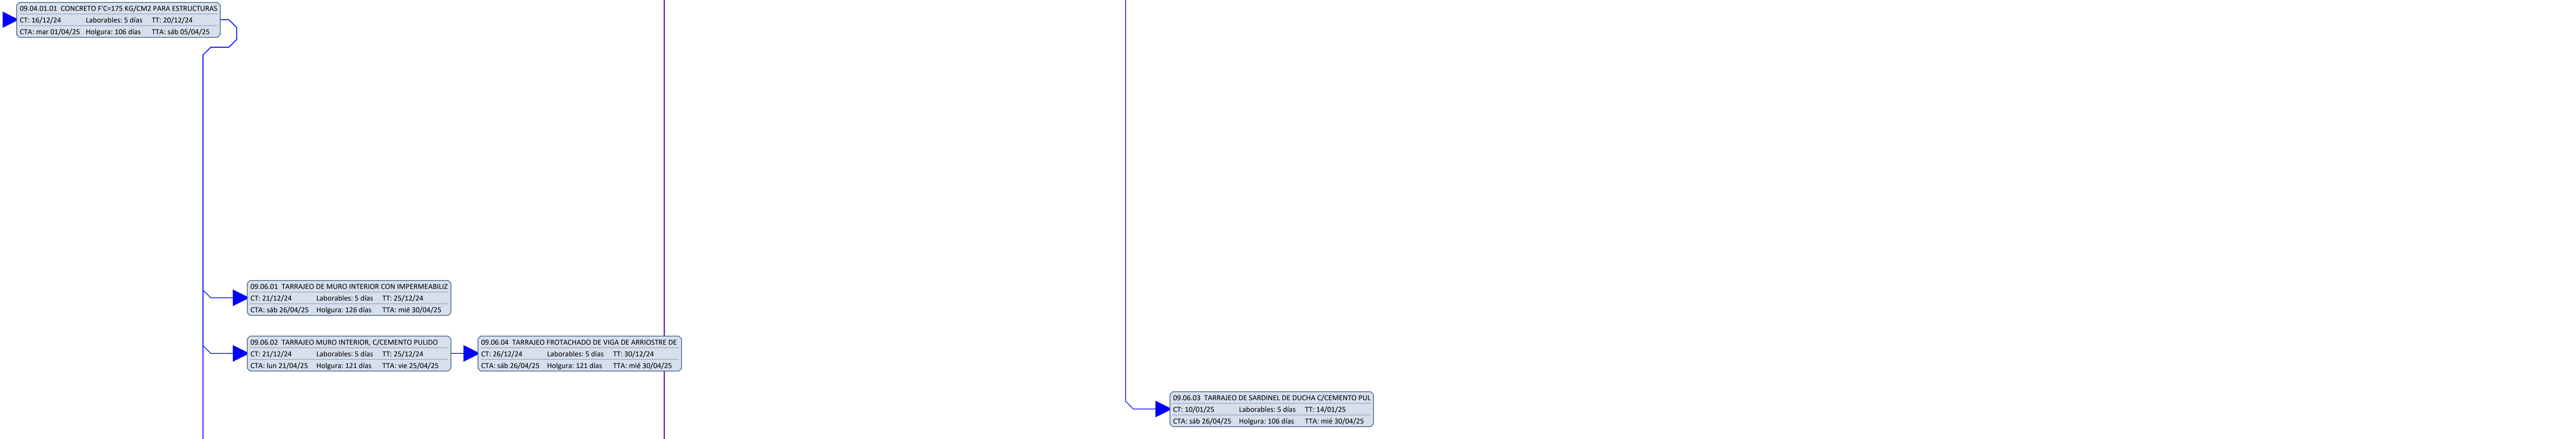



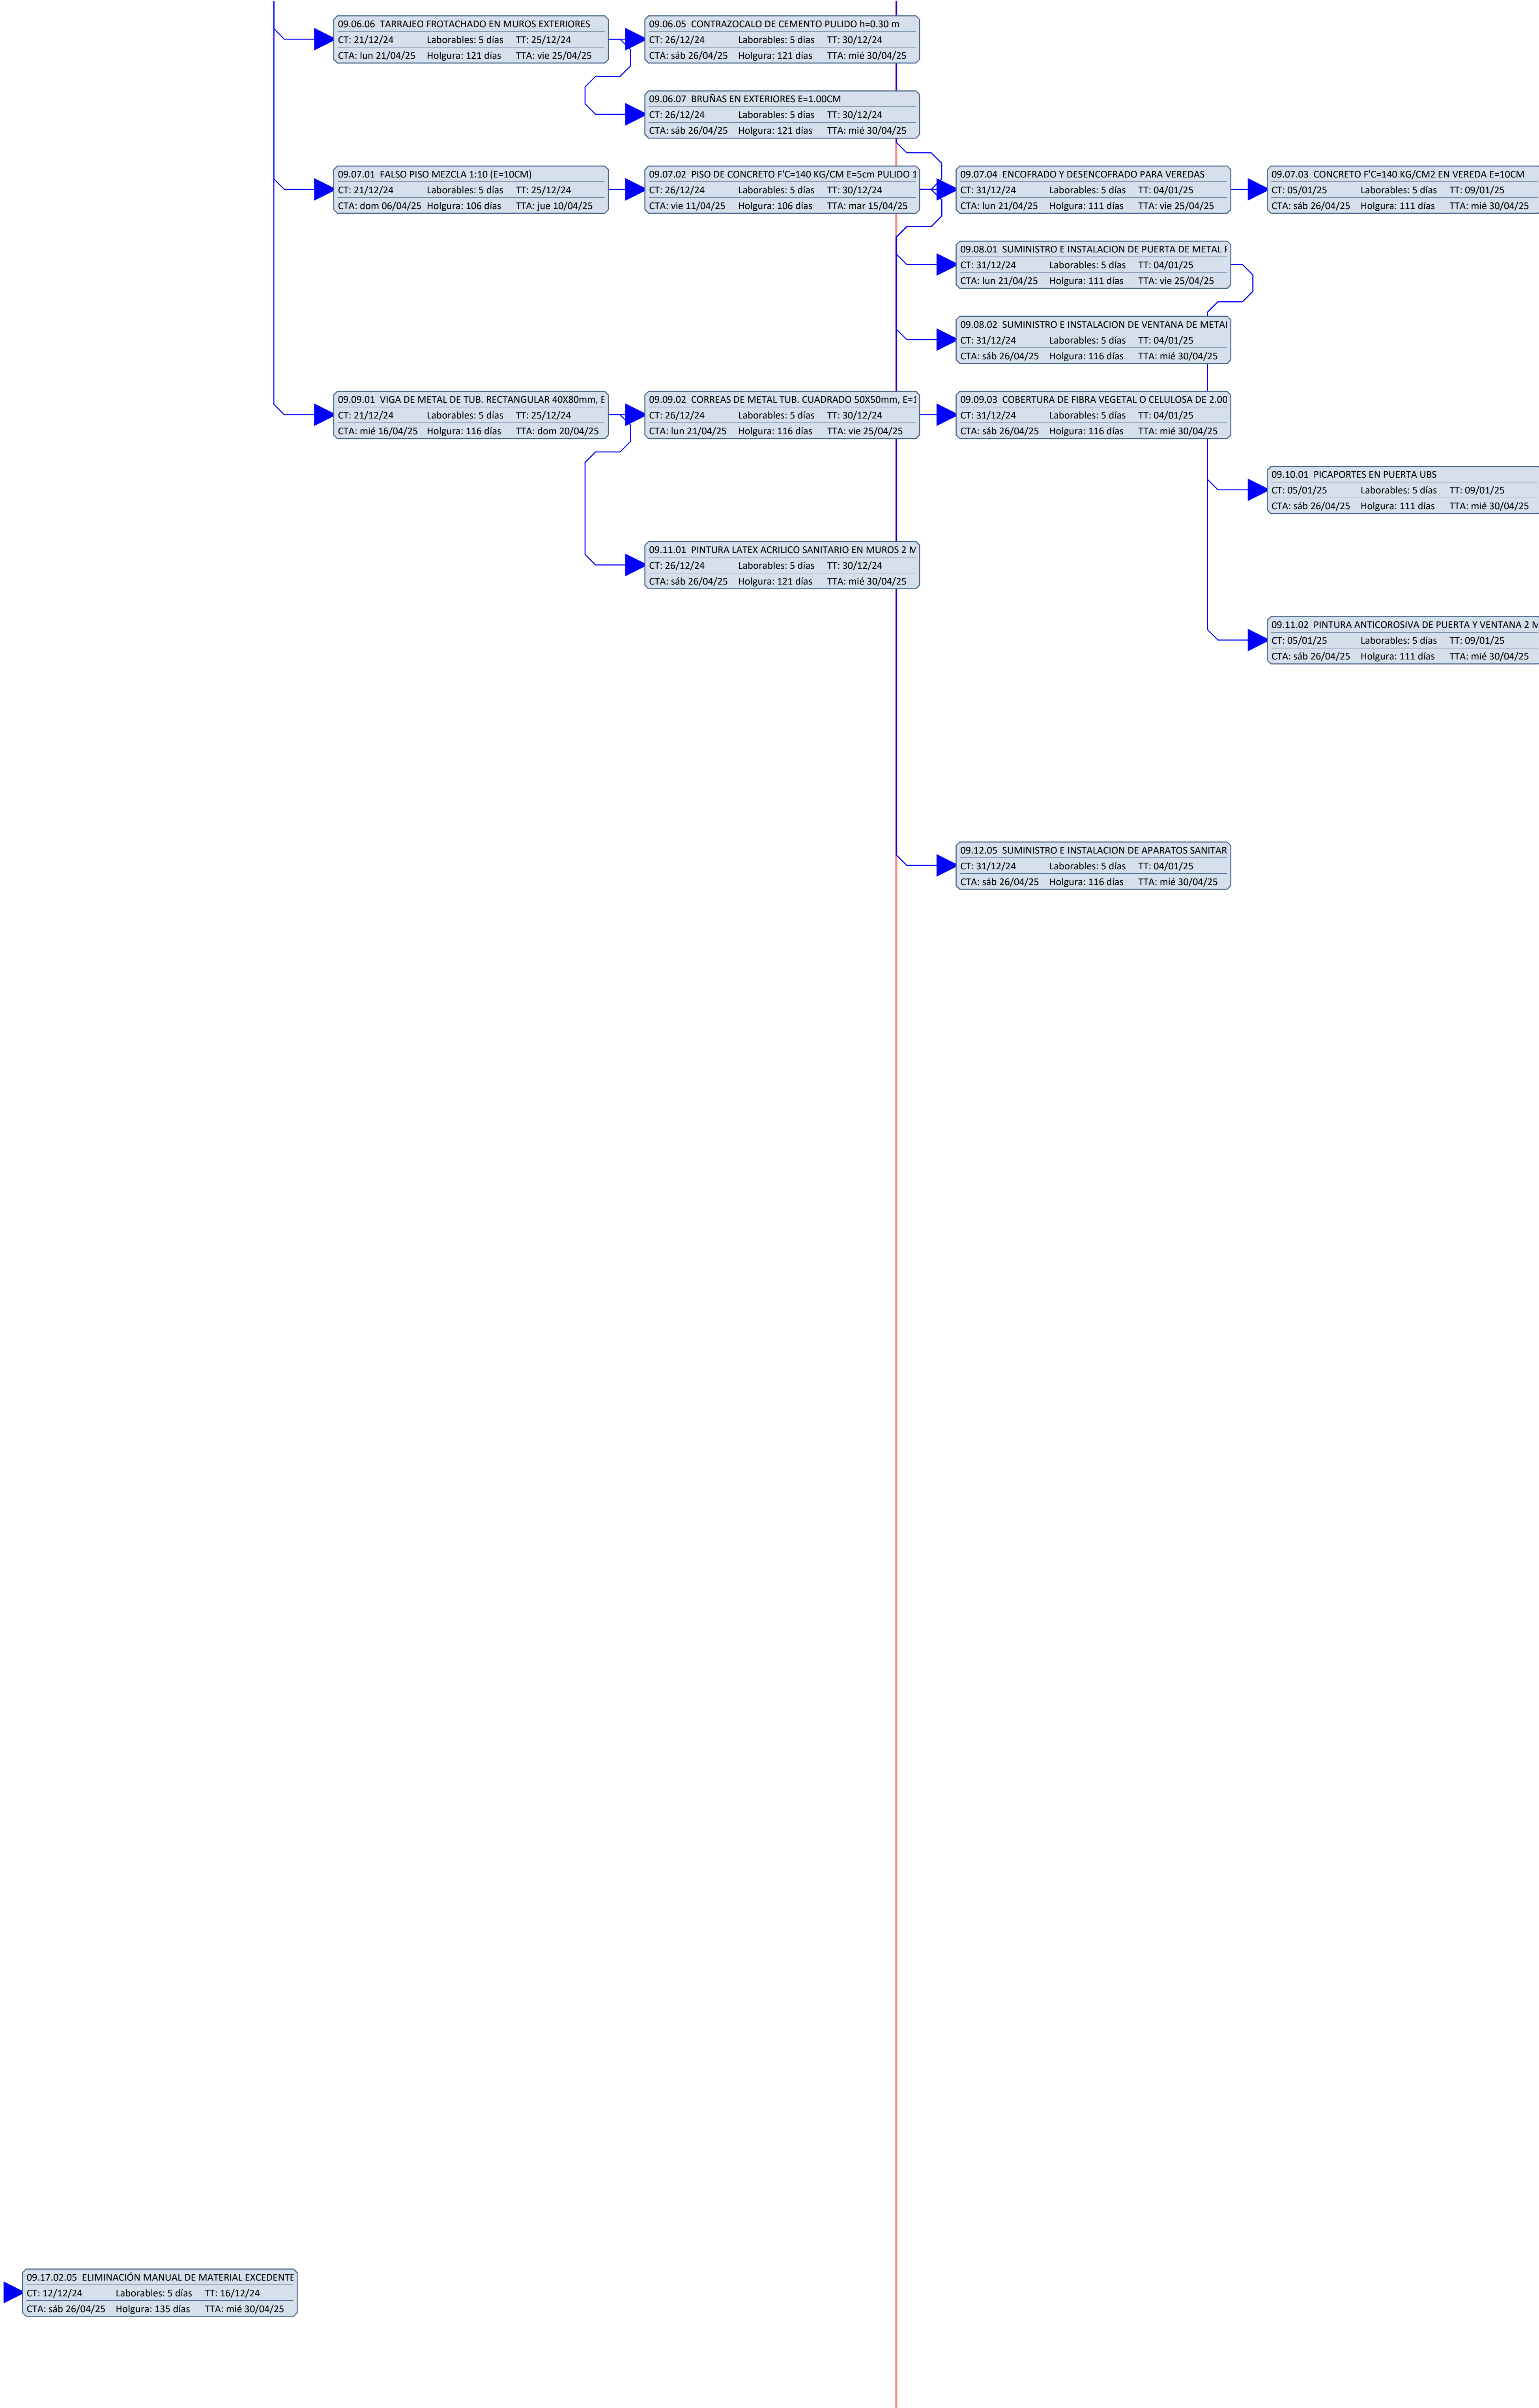

▶

09.18.02.03 ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE		
CT: 16/12/24	Laborables: 5 días	TT: 20/12/24
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25

▶

09.18.05.01	LECHO DE GRAVA DE 1" EN FONDO DE POZO DE P	
CT: 16/12/24	Laborables: 5 días	TT: 20/12/24
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25

▶

09.18.05.02	COLOCACION DE GRAVA DE 1" EN LADOS LATERA		
CT: 16/12/24	Laborables: 5 días	TT: 20/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 131 días	TTA: mié 30/04/25	

▶

10.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTUR	
CT: 11/12/24	Laborables: 5 días	TT: 15/12/24
CTA: jue 27/03/25	Holgura: 106 días	TTA: lun 31/03/25

▶

10.04.01.01	CONCRETO F'C=175 KG/M2 PARA ESTRUCTURAS	
CT: 16/12/24	Laborables: 5 días	TT: 20/12/24
CTA: mar 01/04/25	Holgura: 106 días	TTA: sáb 05/04/25

▶

10.04.01.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS		
CT: 16/12/24	Laborables: 5 días	TT: 20/12/24
CTA: mar 01/04/25	Holgura: 106 días	TTA: sáb 05/04/25

▶

10.04.01.03	ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCT	
CT: 11/12/24	Laborables: 5 días	TT: 15/12/24
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 136 días	TTA: mié 30/04/25

▶

10.06.01	TARRAJEO DE MURO INTERIOR CON IMPERMEABILIZ	
CT: 21/12/24	Laborables: 5 días	TT: 25/12/24
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 126 días	TTA: mié 30/04/25

▶

10.06.02	TARRAJEO MURO INTERIOR, C/CEMENTO PULIDO	
CT: 21/12/24	Laborables: 5 días	TT: 25/12/24
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 126 días	TTA: mié 30/04/25

▶

10.06.06	TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS EXTERIORES	
CT: 21/12/24	Laborables: 5 días	TT: 25/12/24
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 121 días	TTA: vie 25/04/25

▶

10.06.05	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m		
CT: 26/12/24	Laborables: 5 días	TT: 30/12/24	
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 121 días	TTA: mié 30/04/25	

▶

10.06.07 BRUÑAS EN EXTERIORES E=1.00CM		
CT: 26/12/24	Laborables: 5 días	TT: 30/12/24
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 121 días	TTA: mié 30/04/25

▶

10.07.01 FALSO PISO MEZCLA 1:10 (E=10CM)		
CT: 21/12/24	Laborables: 5 días	TT: 25/12/24
CTA: dom 06/04/25	Holgura: 106 días	TTA: jue 10/04/25

▶

10.07.02	PISO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM E=5cm PULIDO 1		
CT: 26/12/24	Laborables: 5 días	TT: 30/12/24	
CTA: vie 11/04/25	Holgura: 106 días	TTA: mar 15/04/25	

▶

10.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE METAL 1	
CT: 31/12/24	Laborables: 5 días	TT: 04/01/25
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 111 días	TTA: vie 25/04/25

▶

10.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE METAL	
CT: 31/12/24	Laborables: 5 días	TT: 04/01/25
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 116 días	TTA: mié 30/04/25

▶

10.09.01	VIGA DE METAL DE TUB. RECTANGULAR 40X80mm, E	
CT: 21/12/24	Laborables: 5 días	TT: 25/12/24
CTA: mié 16/04/25	Holgura: 116 días	TTA: dom 20/04/25

▶

10.09.02	CORREAS DE METAL TUB. CUADRADO 50X50mm, E=1	
CT: 26/12/24	Laborables: 5 días	TT: 30/12/24
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 116 días	TTA: vie 25/04/25

▶

10.09.03	COBERTURA DE FIBRA VEGETAL O CELULOSA DE 2.00	
CT: 31/12/24	Laborables: 5 días	TT: 04/01/25
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 116 días	TTA: mié 30/04/25

▶


10.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTUR	
CT: 31/12/24	Laborables: 5 días	TT: 04/01/25
CTA: mié 16/04/25	Holgura: 106 días	TTA: dom 20/04/25

▶

10.03.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2		
CT: 05/01/25	Laborables: 5 días	TT: 09/01/25
CTA: lun 21/04/25	Holgura: 106 días	TTA: vie 25/04/25


▶


10.06.03	TARRAJEO DE SARDINEL DE DUCHA C/CEMENTO PUL	
CT: 10/01/25	Laborables: 5 días	TT: 14/01/25
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 106 días	TTA: mié 30/04/25

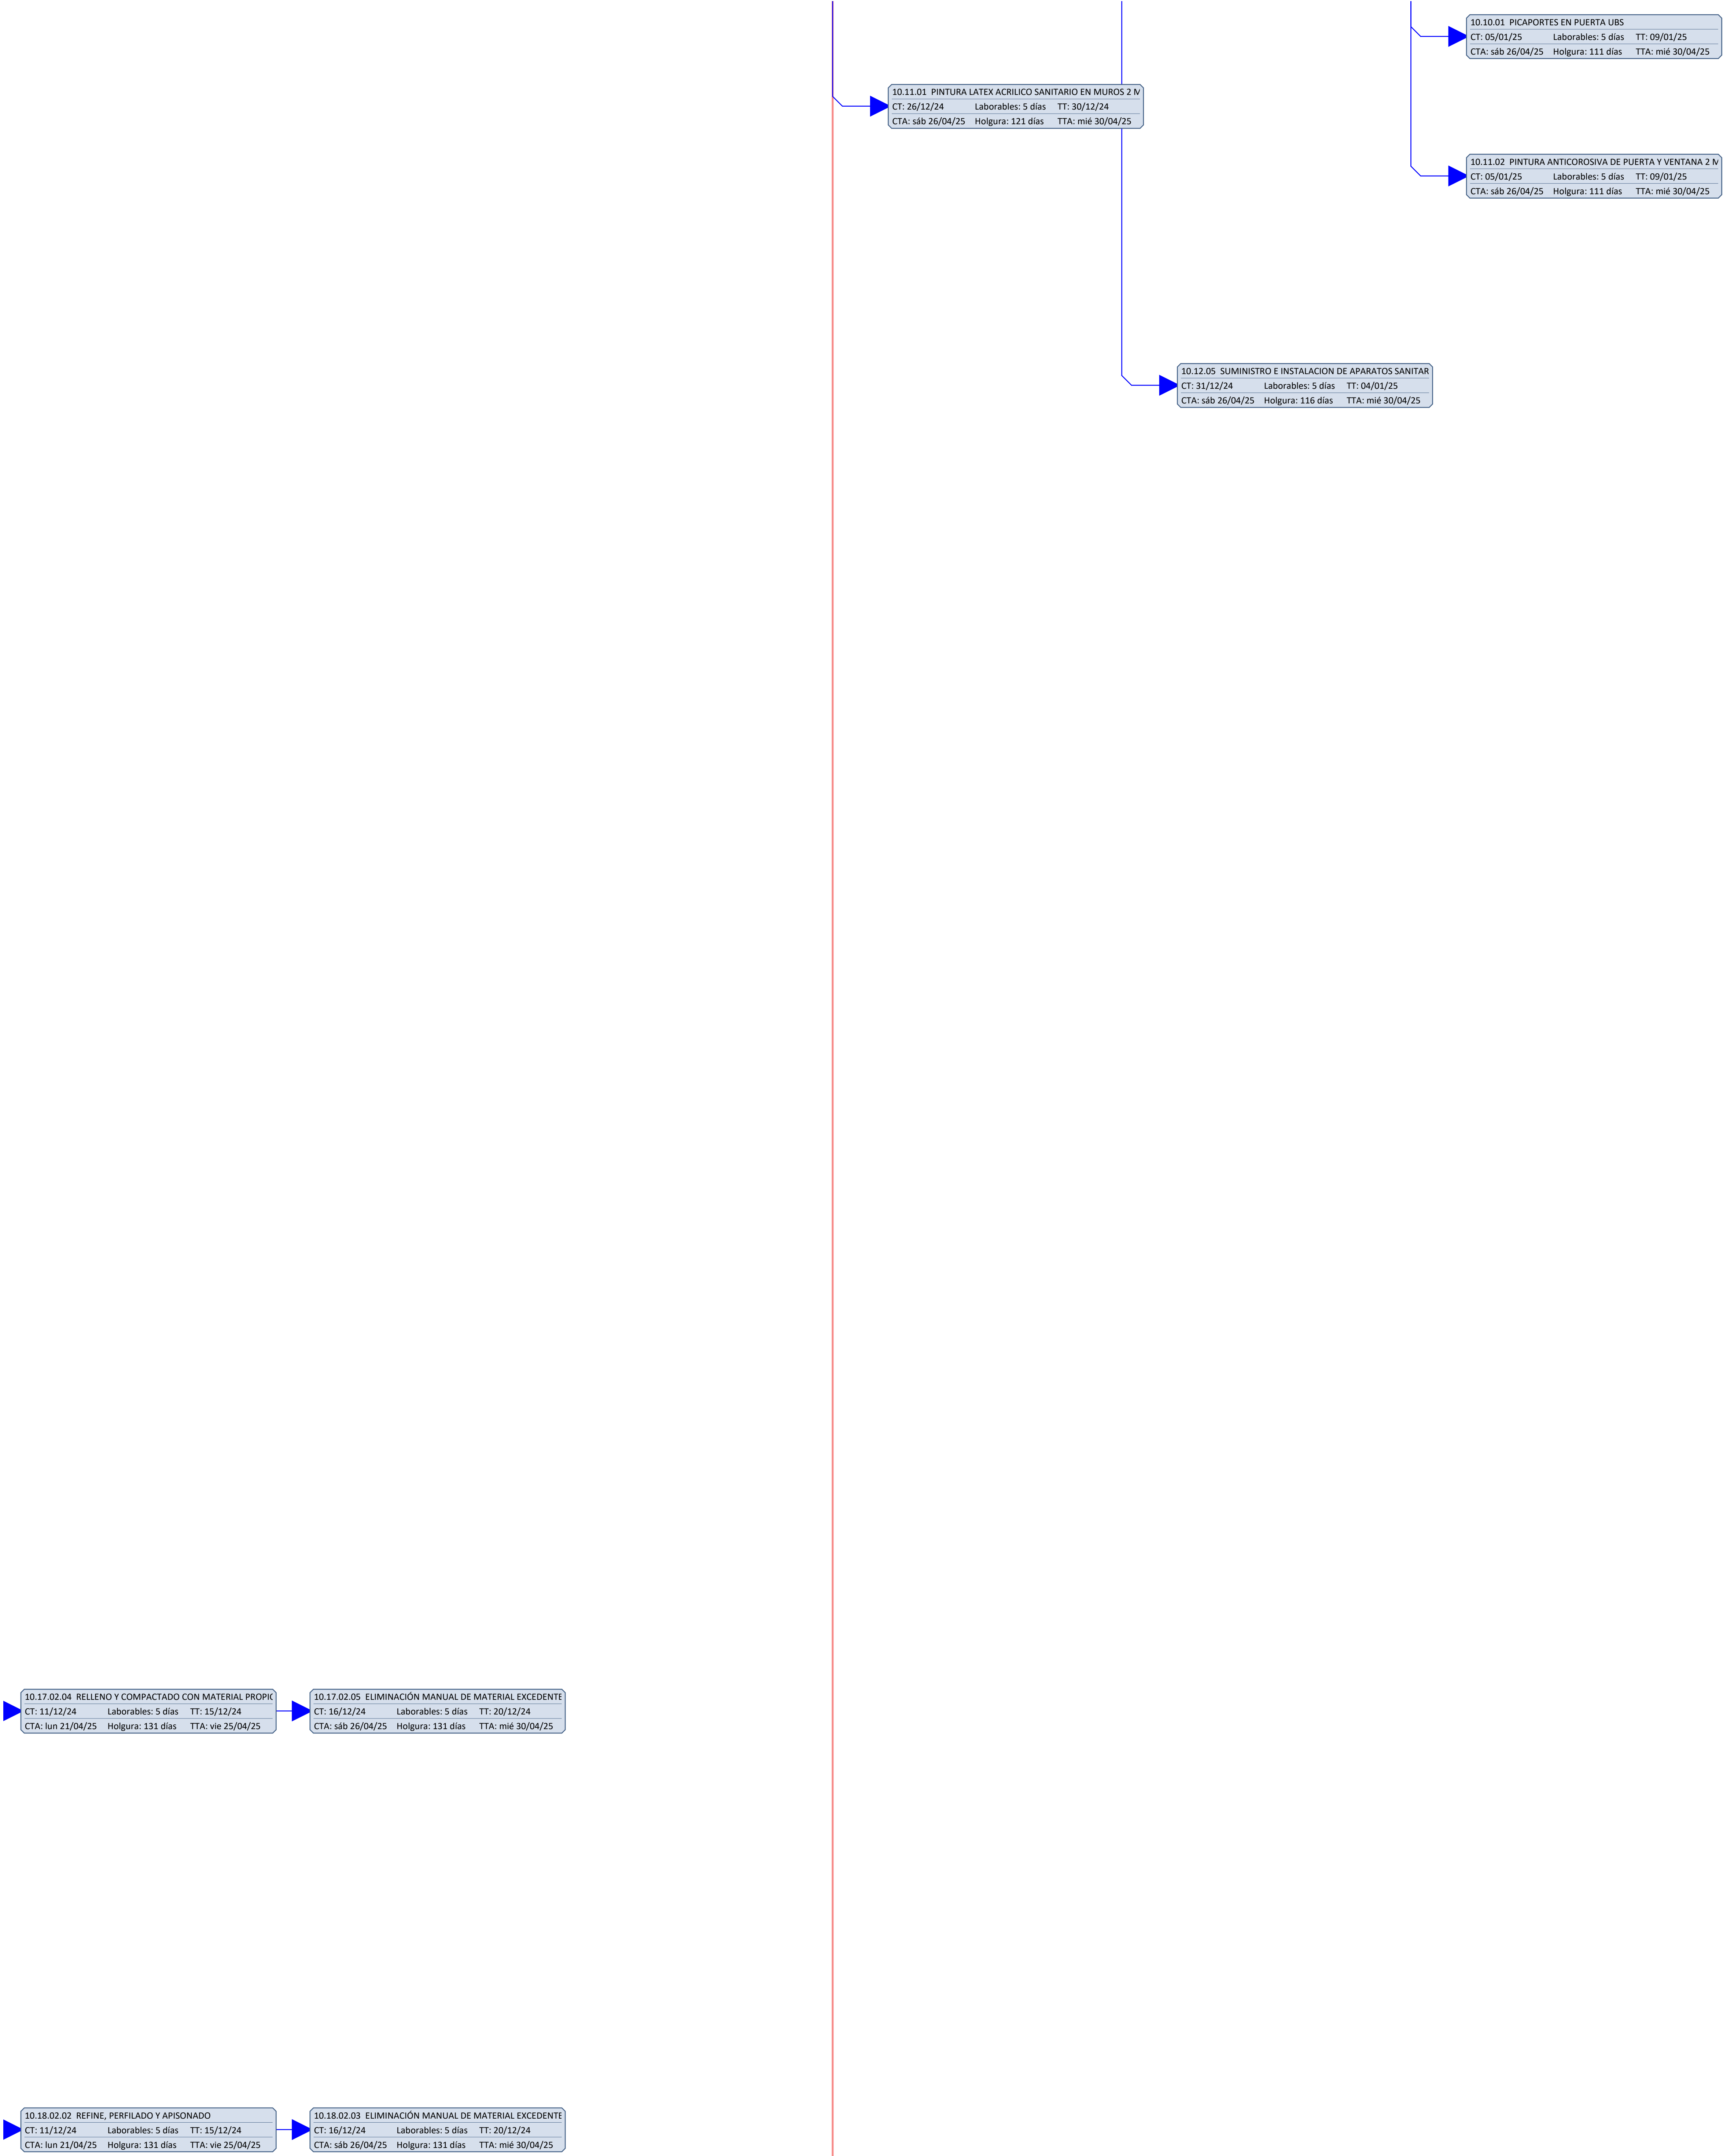





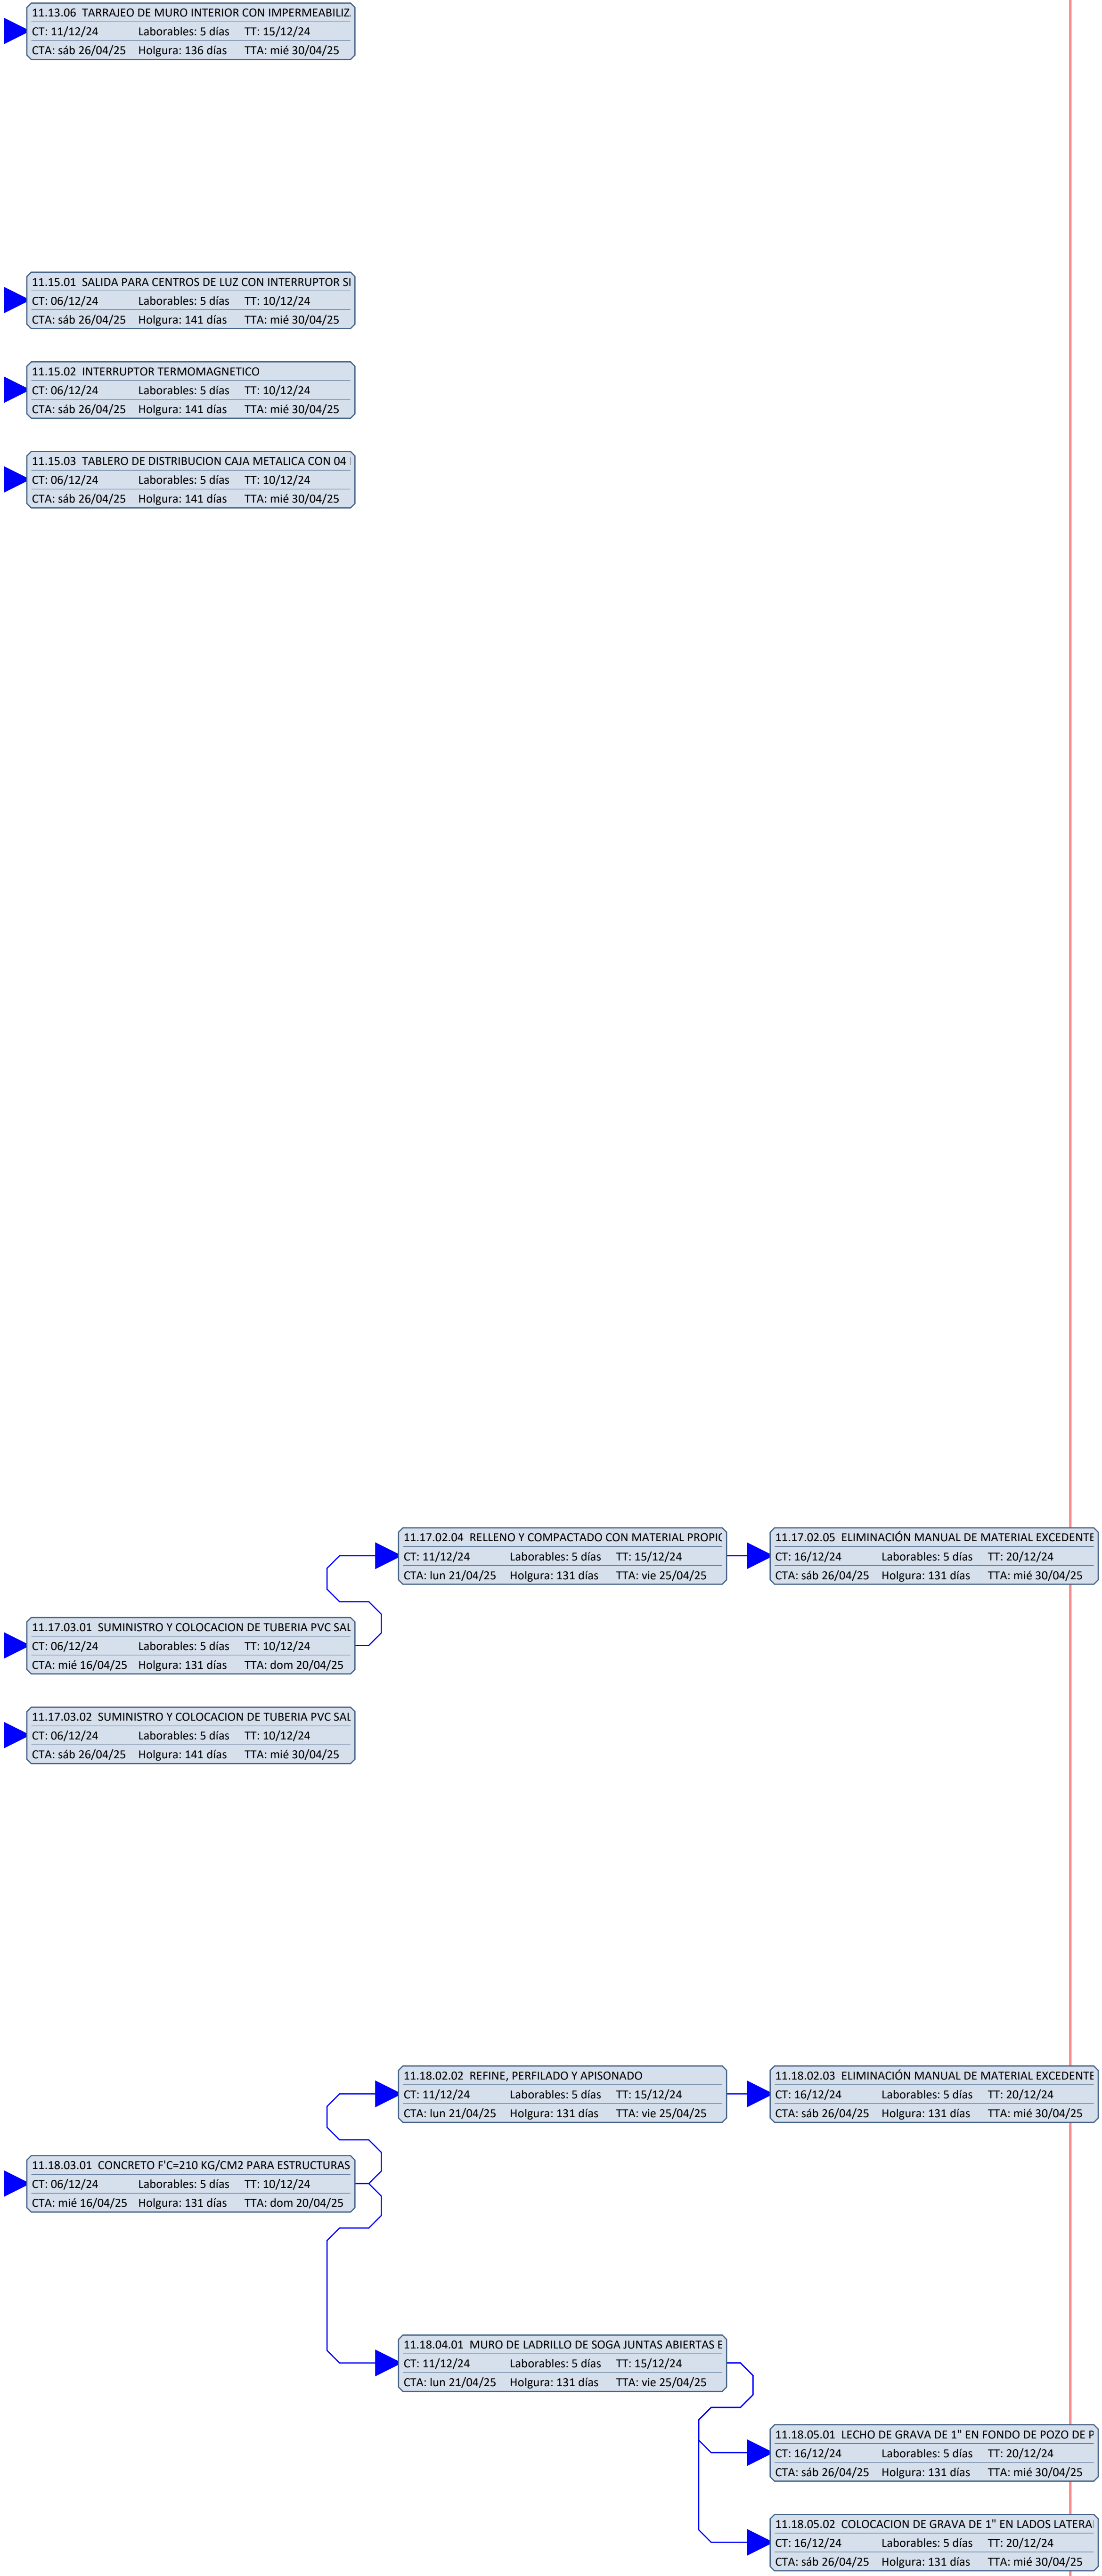

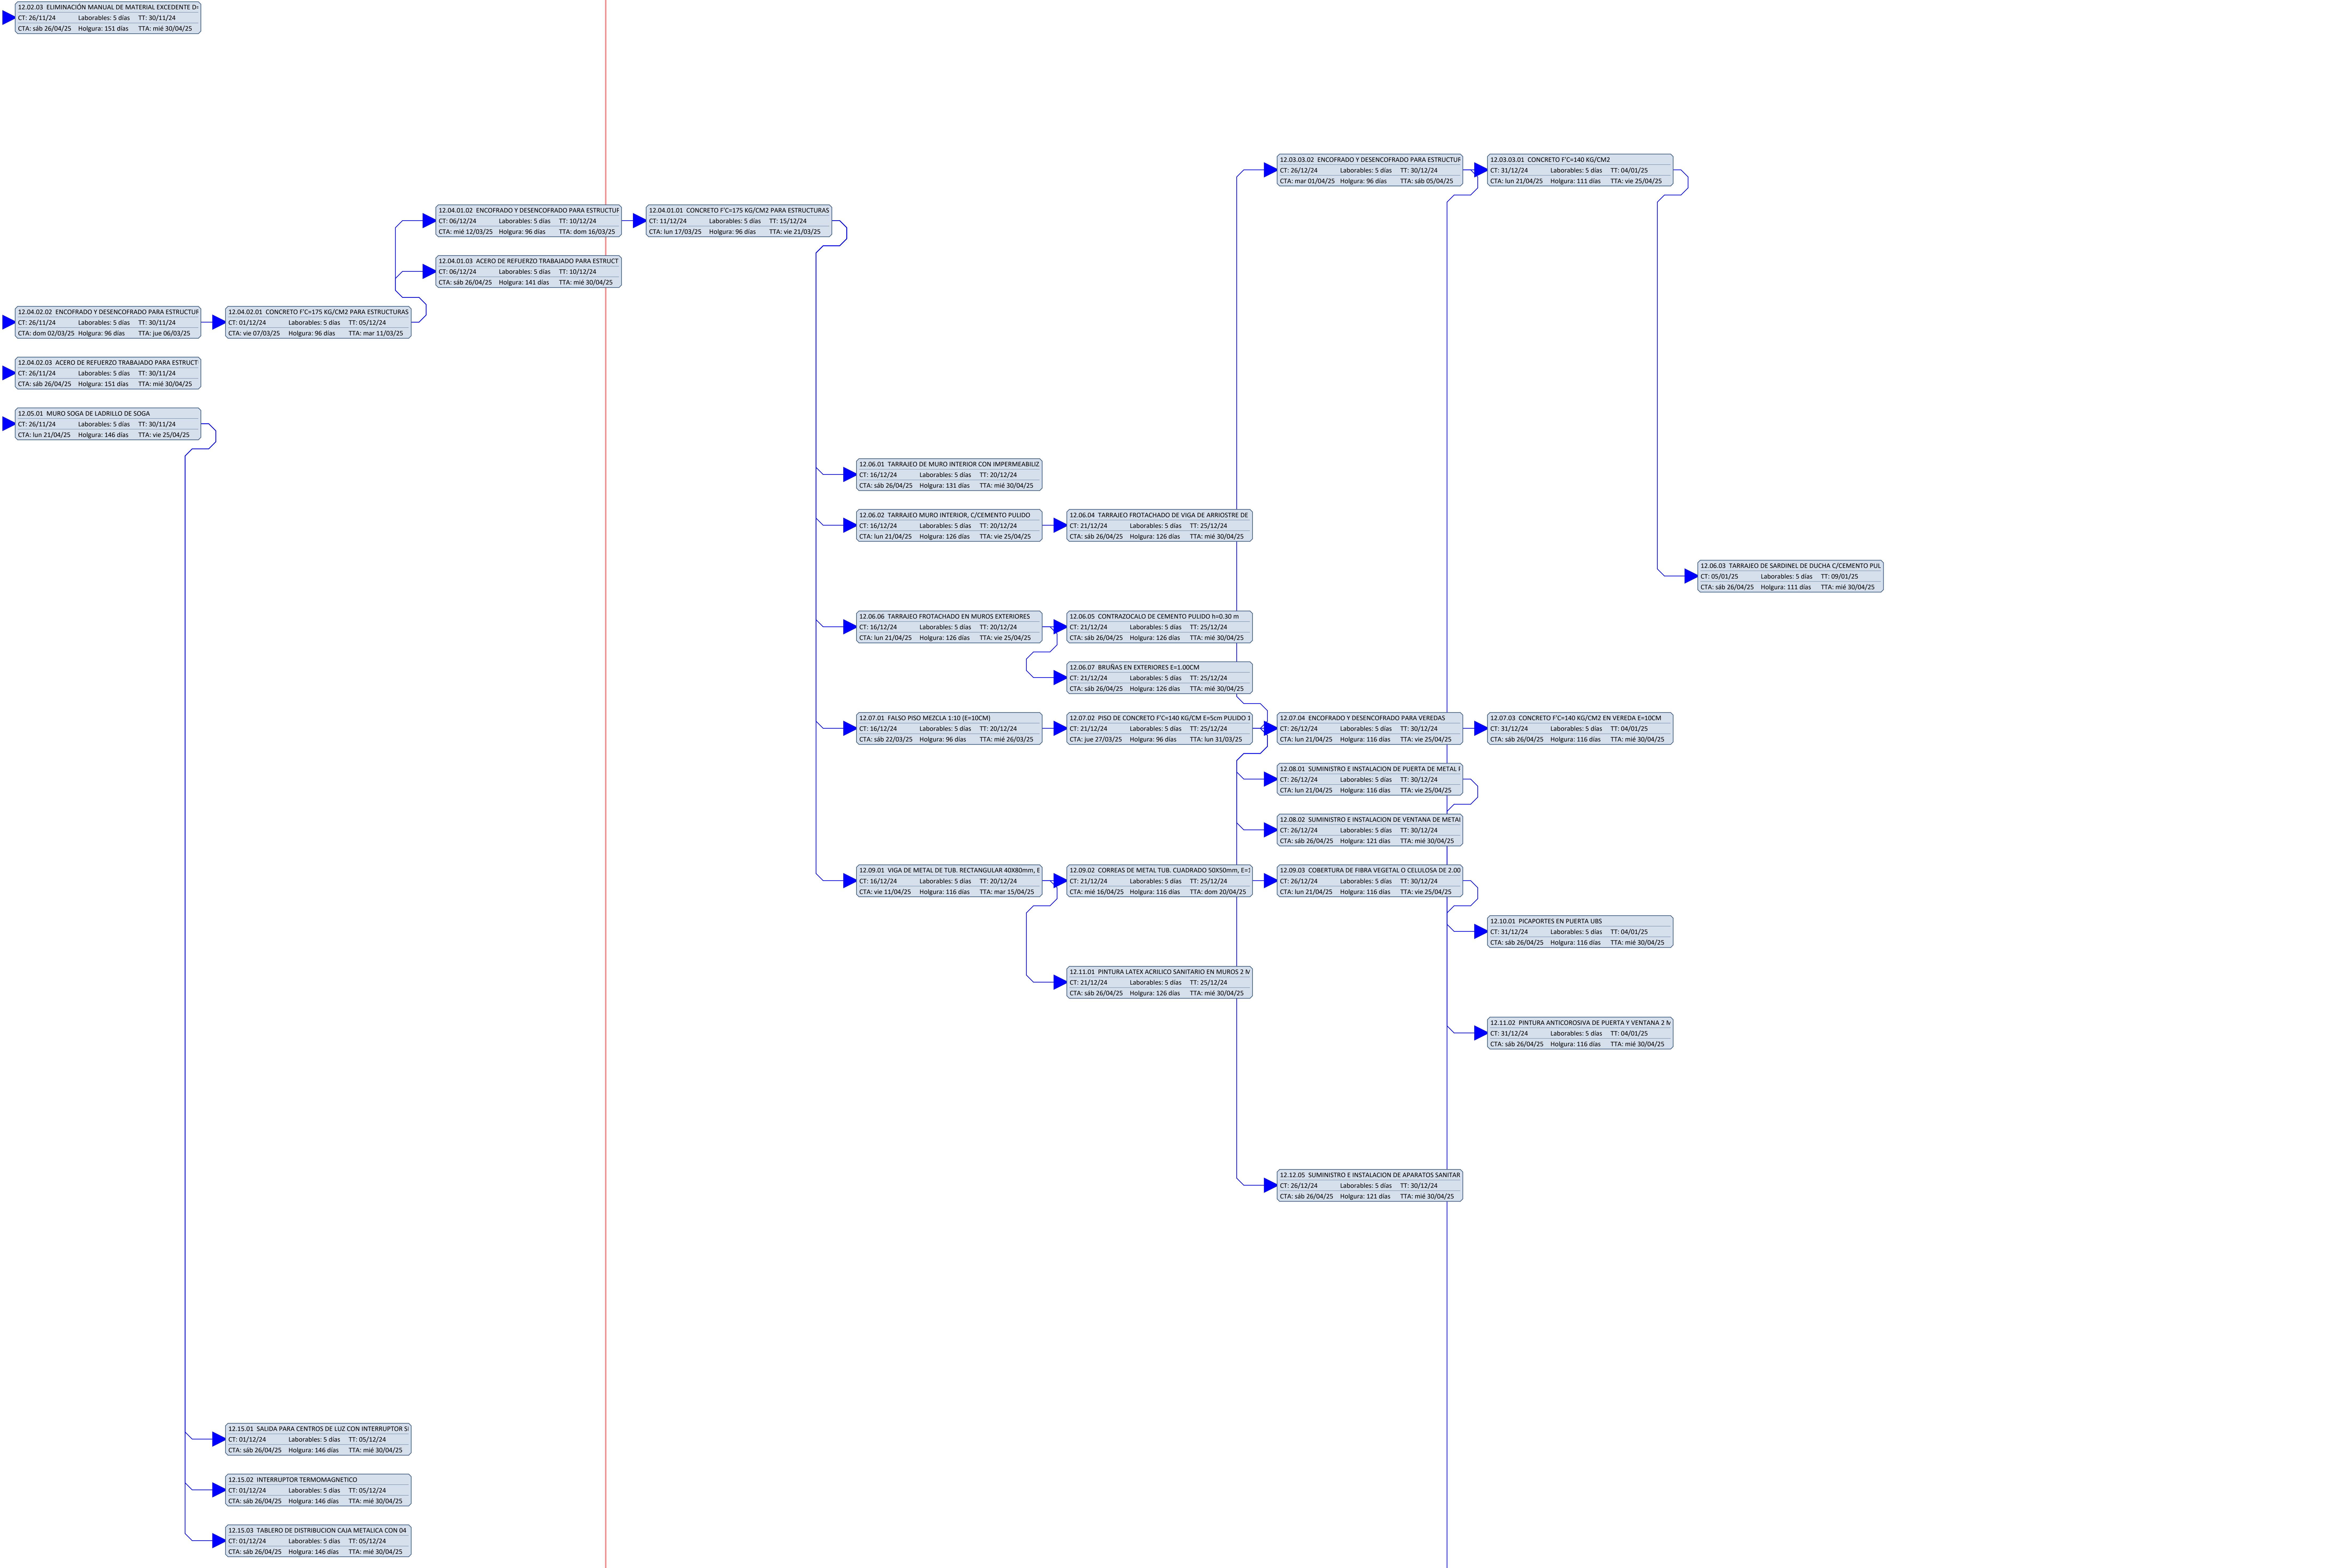



15.01.01. GESTION DEL SERVICIO  
CT: 01/11/24      Laborables: 181 días TT: 30/04/25  
CTA: vie 01/11/24      Holgura: 0 días      TTA: mié 30/04/25

15.02.01. EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL  
CT: 01/11/24      Laborables: 181 días TT: 30/04/25  
CTA: vie 01/11/24      Holgura: 0 días      TTA: mié 30/04/25

























































































▶

12.18.02.03 ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE			
CT: 20/01/25	Laborables: 5 días		TT: 24/01/25
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 96 días	TTA: mié 30/04/25	

▶

12.18.05.01 LECHO DE GRAVA DE 1" EN FONDO DE POZO DE P			
CT: 20/01/25	Laborables: 5 días		TT: 24/01/25
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 96 días	TTA: mié 30/04/25	

▶

12.18.06.02 COLOCACION DE GRAVA DE 1" EN LADOS LATERA			
CT: 20/01/25	Laborables: 5 días		TT: 24/01/25
CTA: sáb 26/04/25	Holgura: 96 días	TTA: mié 30/04/25	



