

199  
190




**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN**

# **CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA**

**“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION  
DE AGUA DE RIEGO EN EL SECTOR TIO PAIRA – COLAN – PAITA –  
PIURA**

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO EN EL SECTOR TÍO PAIRA – COLÁN – PIURA"

Id	Nombre	Comienzo	Fin	Duración Dias Calendario	Predecesor	tr 1, 2023 feb	mar	abr	may	jun	jul	ago
26	JUNTAS DE CONTRACCION SELLADA ELASTOMETRICAS E=1.5 C	dom 21/05/23	jue 01/06/23	12 días	24FF							
27	<b>PUENTE VEHICULAR</b>	<b>dom 21/05/23</b>	<b>jue 08/06/23</b>	<b>19 días</b>	<b>26CC</b>							
28	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADO	dom 21/05/23	mar 23/05/23	3 días	23CC							
29	CONCRETO FC=210 KG/CM2	dom 21/05/23	dom 28/05/23	8 días								
30	ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2	jue 01/06/23	jue 08/06/23	8 días	32							
31	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	dom 21/05/23	dom 28/05/23	8 días								
32	FABRICACION E INSTALACION DE PASAMANOS	dom 28/05/23	jue 01/06/23	5 días	29							
33	<b>TOMAS LATERALES</b>	<b>jue 08/06/23</b>	<b>lun 26/06/23</b>	<b>18 días</b>	<b>30</b>							
34	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADO	jue 08/06/23	vie 09/06/23	2 días	23CC							
35	CONCRETO SIMPLE FC=140 KG/CM2	jue 08/06/23	dom 11/06/23	4 días	34CC							
36	CONCRETO FC=210 KG/CM2	dom 18/06/23	vie 23/06/23	6 días	39							
37	ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2	vie 23/06/23	lun 26/06/23	4 días	36							
38	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS	jue 08/06/23	jue 15/06/23	8 días								
39	COMPUERTA METALICA DE 0.45X0.90	dom 11/06/23	dom 18/06/23	8 días	35							
40	<b>RETENCIONES</b>	<b>lun 26/06/23</b>	<b>vie 07/07/23</b>	<b>12 días</b>	<b>37</b>							
41	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADO	lun 26/06/23	mié 28/06/23	3 días	34CC							
42	CONCRETO FC=210 KG/CM2	lun 26/06/23	sáb 01/07/23	6 días	41CC							
43	ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2	sáb 01/07/23	vie 07/07/23	7 días	45							
44	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS	lun 26/06/23	jue 29/06/23	4 días								
45	COMPUERTA METALICA DE 1.25X0.90	lun 26/06/23	sáb 01/07/23	6 días	39CC							
46	COMPUERTA METALICA DE 1.10X0.73	lun 26/06/23	sáb 01/07/23	6 días	39CC							
47	<b>FLETE</b>	<b>lun 06/03/23</b>	<b>mar 07/03/23</b>	<b>2 días</b>	<b>46CC</b>							
48	TRANSPORTE DE MATERIALES	lun 06/03/23	mar 07/03/23	2 días								
49	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>	<b>lun 06/03/23</b>	<b>mar 11/04/23</b>	<b>37 días</b>	<b>5CC</b>							
50	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	lun 06/03/23	mar 11/04/23	37 días								

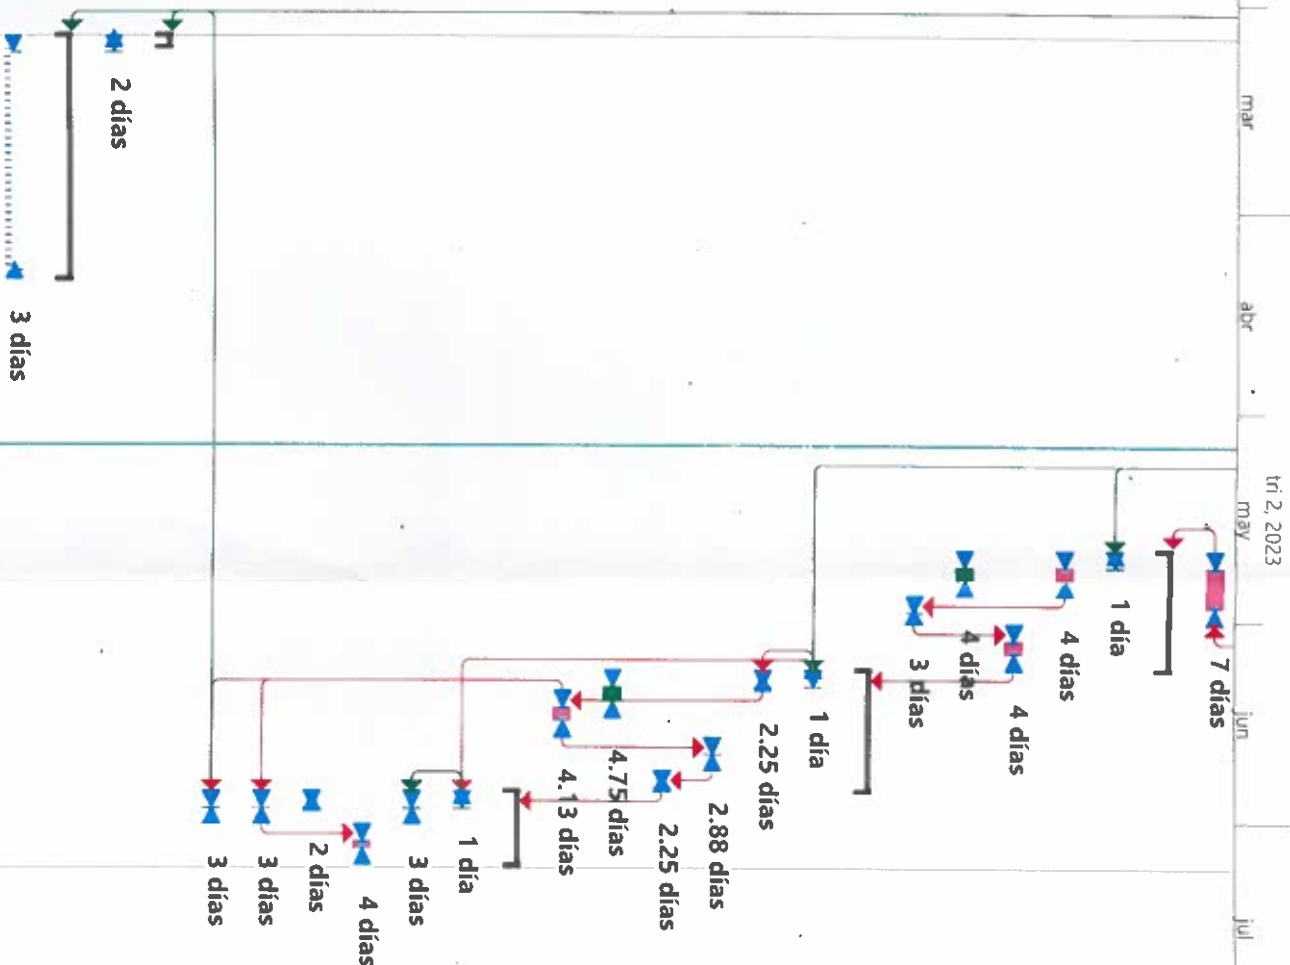

Tarea	Resumen inactivo
División	Tarea manual
Hito	solo duración
Resumen	Informe de resumen manual
Resumen del proyecto	Resumen manual
Tarea inactiva	solo el comienzo
Hito inactivo	solo fin

Proyecto:  
Canal Tío Paíra FINAL  
Fecha: sáb 06/05/23

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE COLÁN  
V. 001/2023  
D. 001/2023

Ing. Javier E. Gómez Cobena  
COP N° 80302  
RNC 08108



