


Proyecto: "MEJORAMIENTO DE Fecha: mar 29/10/24	Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	
	División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso	
	Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	



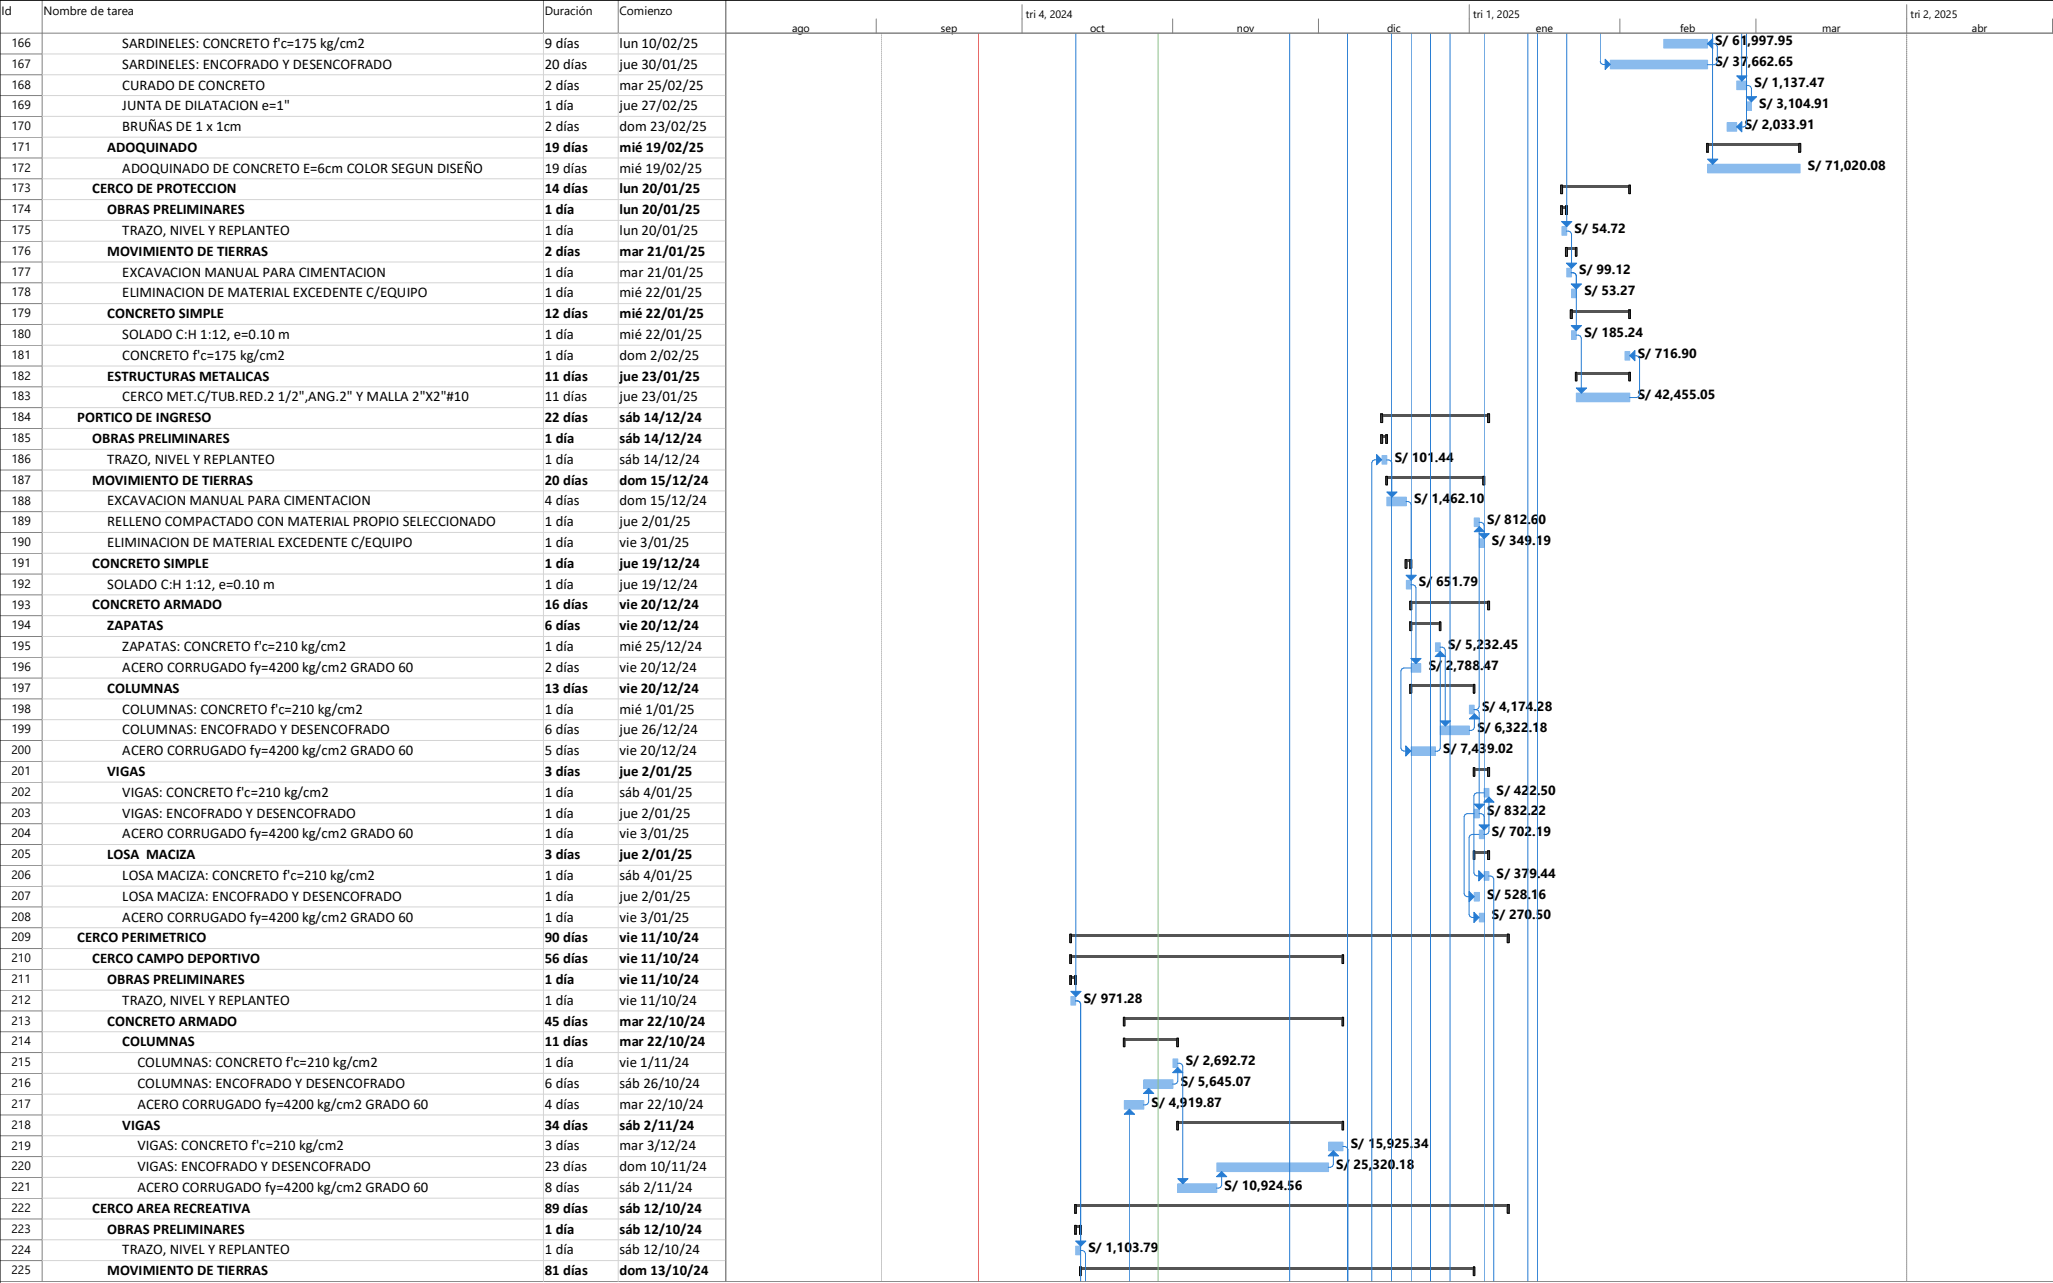


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	ago	sep	tri 4, 2024	oct	nov	dic	tri 1, 2025	ene	feb	mar	tri 2, 2025	abr
226	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION	16 días	dom 13/10/24												
227	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	2 días	lun 30/12/24												
228	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	1 día	mié 1/01/25												
229	CONCRETO SIMPLE	28 días	mar 29/10/24												
230	SOLADO	2 días	mar 29/10/24												
231	SOLADO C:H 1:12, e=0.10 m	2 días	mar 29/10/24												
232	CIMIENTO CORRIDO	3 días	jue 7/11/24												
233	CIMIENTO CORRIDO: CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G.	3 días	jue 7/11/24												
234	SOBRECIMIENTO	16 días	dom 10/11/24												
235	SOBRECIMIENTO: CONCRETO f'c=175 kg/cm2	2 días	dom 24/11/24												
236	SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	14 días	dom 10/11/24												
237	CONCRETO ARMADO	70 días	jue 31/10/24												
238	COLUMNAS	60 días	jue 31/10/24												
239	COLUMNAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2	2 días	sáb 28/12/24												
240	COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	14 días	sáb 14/12/24												
241	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	7 días	jue 31/10/24												
242	VIGAS	10 días	lun 30/12/24												
243	VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2	1 día	mié 8/01/25												
244	VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	6 días	jue 2/01/25												
245	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	3 días	lun 30/12/24												
246	SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES	115 días	mar 24/09/24												
247	OBRAS PRELIMINARES	1 día	mar 24/09/24												
248	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	1 día	mar 24/09/24												
249	MOVIMIENTO DE TIERRAS	39 días	mié 25/09/24												
250	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION	12 días	mié 25/09/24												
251	PERFILADO Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION	12 días	mié 25/09/24												
252	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	1 día	vie 1/11/24												
253	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	1 día	sáb 2/11/24												
254	CONCRETO SIMPLE	57 días	lun 7/10/24												
255	SOLADO	2 días	lun 7/10/24												
256	SOLADO C:H 1:12, e=0.10 m	2 días	lun 7/10/24												
257	CIMIENTO CORRIDO	4 días	sáb 19/10/24												
258	CIMIENTO CORRIDO: CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G.	4 días	sáb 19/10/24												
259	SOBRECIMIENTO	12 días	dom 20/10/24												
260	SOBRECIMIENTO: CONCRETO f'c=175 kg/cm2	2 días	mié 30/10/24												
261	SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	12 días	dom 20/10/24												
262	FALSO PISO	4 días	vie 29/11/24												
263	CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 E=10CM	4 días	vie 29/11/24												
264	CONCRETO ARMADO	100 días	mié 9/10/24												
265	COLUMNAS	43 días	mié 9/10/24												
266	COLUMNAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2	1 día	mié 20/11/24												
267	COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	14 días	mié 6/11/24												
268	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	13 días	mié 9/10/24												
269	VIGAS	19 días	jue 26/12/24												
270	VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2	2 días	dom 12/01/25												
271	VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	4 días	jue 26/12/24												
272	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	13 días	lun 30/12/24												
273	LOSA ALIGERADA	42 días	mar 3/12/24												
274	LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c=210 kg/cm2	2 días	dom 12/01/25												
275	LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	27 días	mar 3/12/24												
276	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	8 días	sáb 4/01/25												
277	LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO 15x30x30 cm	2 días	sáb 28/12/24												
278	ESTRUCTURAS DE APOYO PARA OVALINES	3 días	mar 14/01/25												
279	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	1 día	jue 16/01/25												
280	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	1 día	mar 14/01/25												
281	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	1 día	mié 15/01/25												
282	ARQUITECTURA	170 días	sáb 12/10/24												
283	CAMPO DEPORTIVO	65 días	mié 4/12/24												
284	CANCHA DE GRASS SINTETICO	21 días	vie 17/01/25												

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo																
					ago	sep	tri 4, 2024	oct			nov			dici	tri 1, 2025	ene	feb	mar	tri 2, 2025	abr
285		SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO	20 días	vie 17/01/25																
286		SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FUTBOL INCL. MALLA	1 día	mié 5/02/25																
287		MALLA DE NYLON PARA PARTE SUPERIOR DE CERCO H=3.00M	1 día	jue 6/02/25																
288		TRIBUNAS	28 días	lun 9/12/24																
289		MUROS Y TABIQUES	5 días	jue 19/12/24																
290		MURO DE LADRILLO KK ASENTADO EN SOGA	5 días	jue 19/12/24																
291		REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	15 días	lun 9/12/24																
292		TARRAJEO DE TRIBUNAS C:A 1:4 e=1.5cm	15 días	lun 9/12/24																
293		REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS ACABADO CEMENTO SEMIPULIDO	14 días	mar 10/12/24																
294		PINTURA	15 días	mié 11/12/24																
295		PINTURA ESMALTE EN TRIBUNAS	15 días	mié 11/12/24																
296		PINTURA ESMALTE PARA SEÑALIZACION DE MOVILIDAD REDUCIDA EN PISOS	1 día	mié 25/12/24																
297		COBERTURAS	10 días	vie 27/12/24																
298		COBERTURA DE POLICARBONATO GRIS REFLECTIVO e=6mm	10 días	vie 27/12/24																
299		CERCO DE PROTECCION	10 días	mié 4/12/24																
300		PINTURA ESMALTE EPOXICO PARA ESTRUCTURA METALICA	10 días	mié 4/12/24																
301		GRADERIAS Y RAMPAS	10 días	dom 12/01/25																
302		REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	6 días	dom 12/01/25																
303		TARRAJEO DE GRADERIA C:A 1:4 e=1.5cm	2 días	dom 12/01/25																
304		TARRAJEO DE MUROS C:A 1:4 e=1.5cm	4 días	mar 14/01/25																
305		REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS ACABADO CEMENTO SEMIPULIDO	1 día	lun 13/01/25																
306		PINTURA	4 días	sáb 18/01/25																
307		PINTURA LATEX 2 MANOS PARA MUROS	4 días	sáb 18/01/25																
308		AREA RECREATIVA	32 días	vie 3/01/25																
309		LOSA MULTIDEPORTIVA	32 días	vie 3/01/25																
310		REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	11 días	mar 14/01/25																
311		TARRAJEO DE MUROS DE GRADERIA C:A 1:4 e=1.5cm	11 días	mar 14/01/25																
312		REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS ACABADO CEMENTO SEMIPULIDO	4 días	mar 21/01/25																
313		PINTURA	32 días	vie 3/01/25																
314		PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS	10 días	sáb 25/01/25																
315		PINTURA ESMALTE EN LOSA DEPORTIVA	15 días	vie 3/01/25																
316		PINTURA ESMALTE PARA SEÑALIZACION DE MOVILIDAD REDUCIDA EN PISOS	1 día	lun 3/02/25																
317		VARIOS	2 días	sáb 18/01/25																
318		ARCO Y TABLERO FULBITO-BASKET INCL. MALLA	2 días	sáb 18/01/25																
319		TUBOS C. VOLEY INCL. RED Y DADOS DE CONCRETO	2 días	sáb 18/01/25																
320		ZONA DE JUEGOS INFANTILES	6 días	lun 23/12/24																
321		SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO	5 días	lun 23/12/24																
322		KIT BASICO DE JUEGOS RECREATIVOS	1 día	sáb 28/12/24																
323		PORTICO DE INGRESO	24 días	dom 5/01/25																
324		REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	13 días	dom 5/01/25																
325		TARRAJEO DE PORTICO DE INGRESO C:A 1:4 e=1.5cm	13 días	dom 5/01/25																
326		PINTURA	5 días	sáb 18/01/25																
327		PINTURA LATEX 2 MANOS PARA PORTICO DE INGRESO	5 días	sáb 18/01/25																
328		CARPINTERIA METALICA	6 días	jue 23/01/25																
329		PORTON METALICO DE FIERRO PARA INGRESO PRINCIPAL SEGUN DISEÑO	3 días	jue 23/01/25																
330		PORTON METALICO DE FIERRO PARA INGRESO SECUNDARIO SEGUN DISEÑO	1 día	dom 26/01/25																
331		SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS EN ALTO RELIEVE SEGUN DISEÑO	2 días	lun 27/01/25																
332		CERCO PERIMETRICO	128 días	sáb 12/10/24																
333		CERCO CAMPO DEPORTIVO	119 días	sáb 12/10/24																
334		MUROS Y TABIQUES	10 días	sáb 12/10/24																
335		MURO DE LADRILLO KK ASENTADO EN SOGA	10 días	sáb 12/10/24																
336		REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	61 días	vie 6/12/24																
337		TARRAJEO DE MUROS DE CERCO PERIMETRICO C:A 1:4 e=1.5cm	61 días	vie 6/12/24																
338		PINTURA	52 días	mié 18/12/24																

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE	Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
Fecha: mar 29/10/24	División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
	Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

<

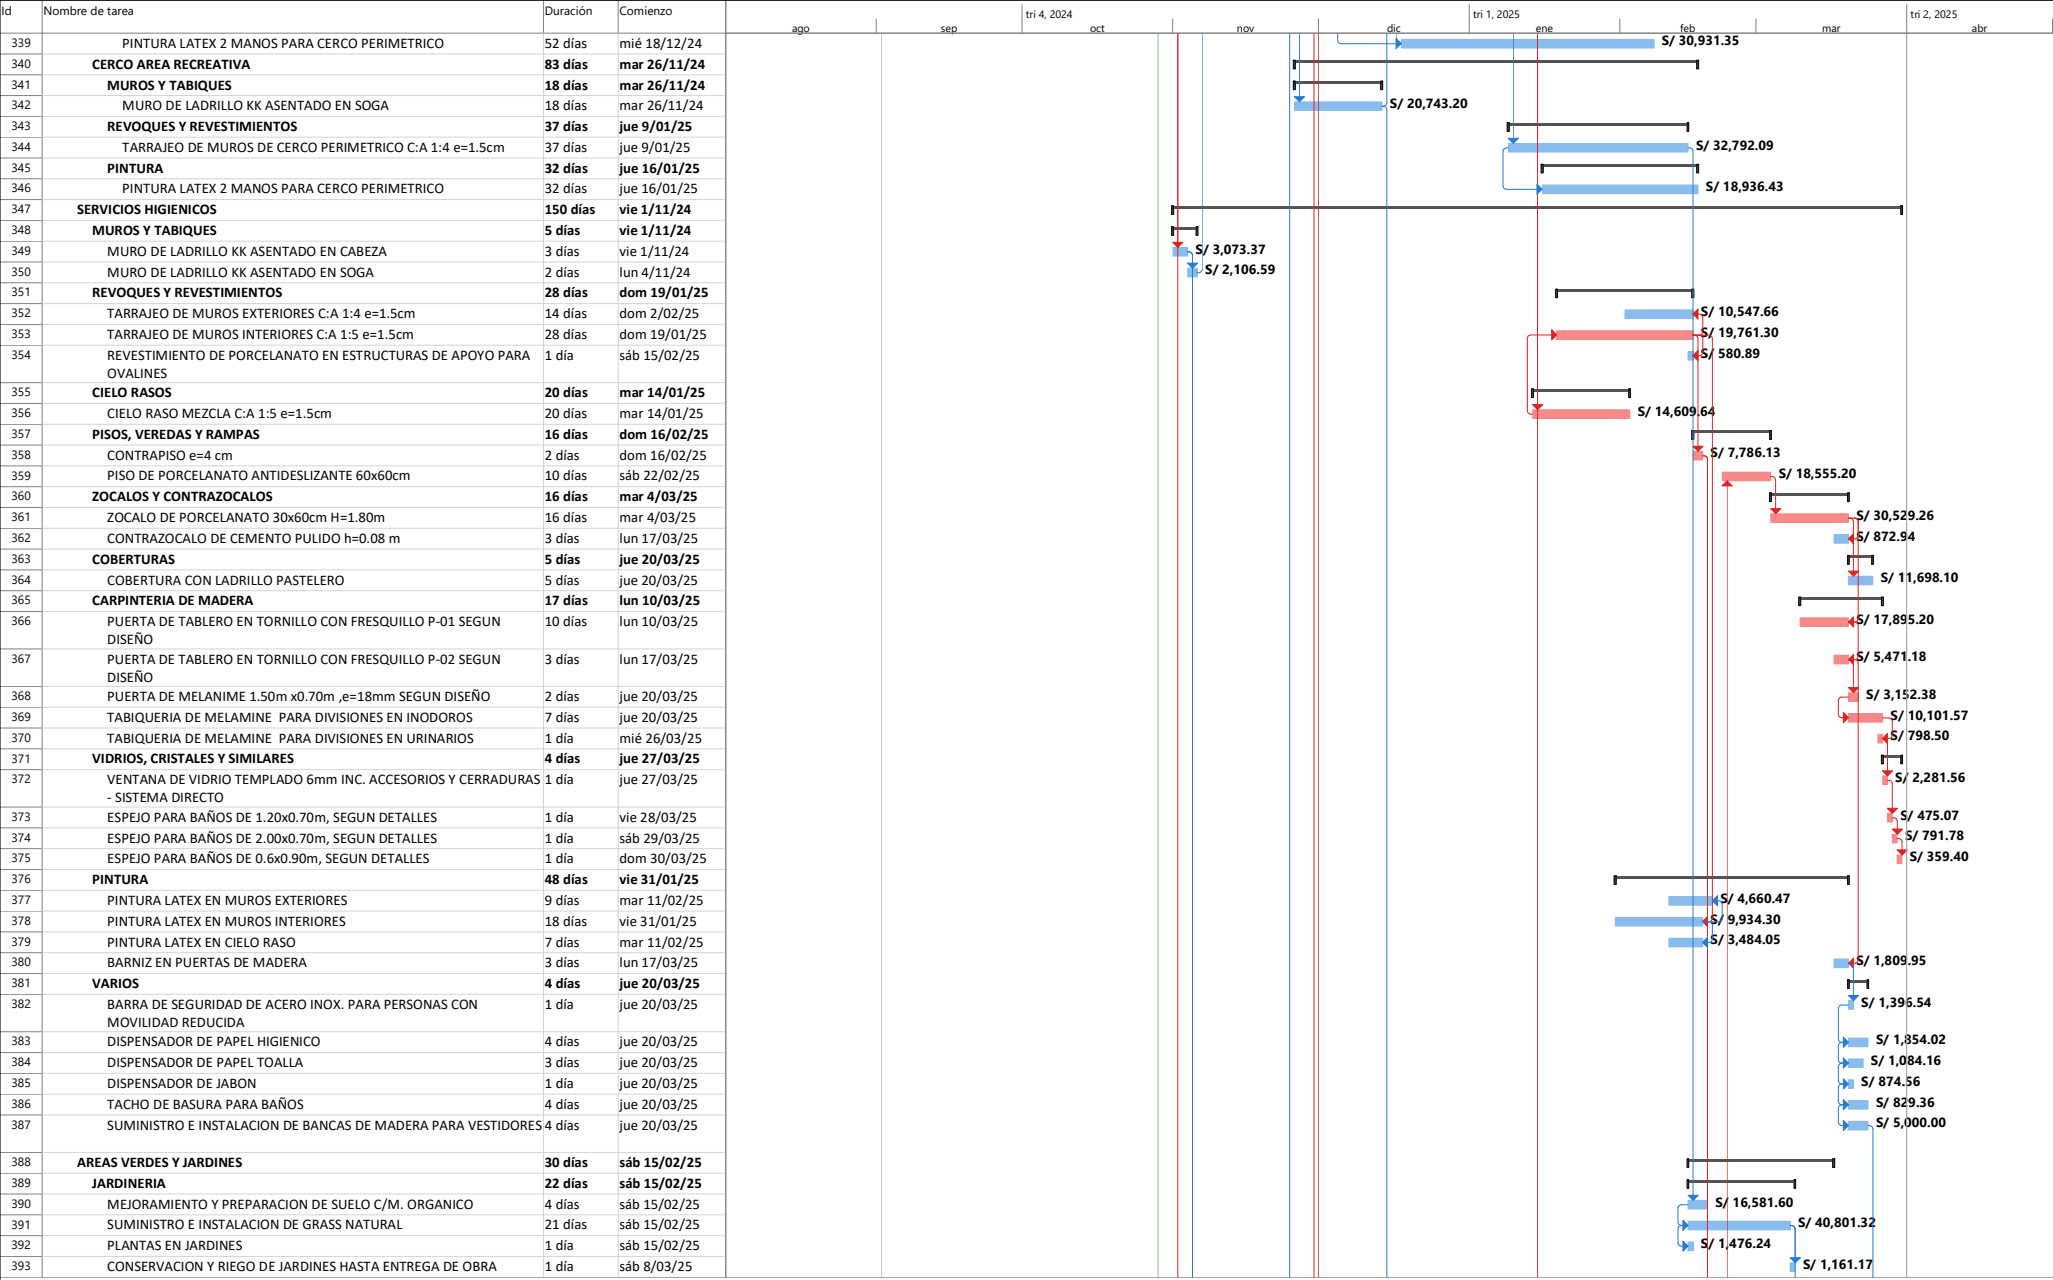

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE  
Fecha: mar 29/10/24

Tarea

División

Hito

Resumen

.....

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

◇

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

C

Hito externo

J

Fecha límite

Tareas críticas

◇

División crítica

↓

Progreso

Progreso manual

.....



Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo													ago	sep	tri 4, 2024	oct		nov	díc	ene	tri 1, 2025	feb	mar	abr	tri 2, 2025
450		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	1 día	mar 31/12/24																									
451		CONCRETO SIMPLE	5 días	sáb 28/12/24																									
452		CONCRETO F'c=175 kg/cm2	1 día	mié 1/01/25																									
453		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	4 días	sáb 28/12/24																									
454		VARIOS	6 días	jue 2/01/25																									
455		TUBERIA PVC SAP 4"	6 días	jue 2/01/25																									
456		REJILLA METALICA 30cm PARA CANAL DE EVACUACION PLUVIAL	5 días	vie 3/01/25																									
457		REDES COLECTORAS EN TECHO SS.HH. Y VIGA CANAL	6 días	mié 8/01/25																									
458		CANAleta 1/2 CAÑA DE CONCRETO EN PISO	1 día	mié 8/01/25																									
459		CANAleta 1/2 CAÑA PVC SAL Ø4"	2 días	jue 9/01/25																									
460		MONTANTE TUBERIA PVC SAL Ø4", INCL. ACCESORIOS	1 día	sáb 11/01/25																									
461		ABRAZADERA PARA TUBERIA Ø4"	2 días	dom 12/01/25																									
462		CAMARAS DE INSPECCION	1 día	mar 14/01/25																									
463		CAJA DE REGISTRO DE 45X45cm	1 día	mar 14/01/25																									
464		SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	26 días	lun 23/12/24																									
465		MOVIMIENTO DE TIERRAS	8 días	lun 23/12/24																									
466		EXCAVACION MANUAL PARA CISTERNA	7 días	lun 23/12/24																									
467		PERFILADO Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CISTERNA	3 días	vie 27/12/24																									
468		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	1 día	lun 30/12/24																									
469		VARIOS	19 días	lun 30/12/24																									
470		SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE CISTERNA 2500 LT.	2 días	sáb 4/01/25																									
471		MURO DE LADRILLO DE CONCRETO ASENTADO DE SOGA	4 días	mar 31/12/24																									
472		SOLADO C:H 1:12, e=0.10 m	1 día	lun 30/12/24																									
473		SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO Y ALIMENTACION PARA RED DE AGUA	2 días	sáb 4/01/25																									
474		SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 1100 LTS	2 días	mar 14/01/25																									
475		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO TIPO 01	2 días	jue 16/01/25																									
476		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO TIPO 02	2 días	jue 16/01/25																									
477		INSTALACIONES ELECTRICAS	145 días	lun 4/11/24																									
478		OBRAS PRELIMINARES	3 días	dom 24/11/24																									
479		TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	2 días	dom 24/11/24																									
480		REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO EXISTENTES	1 día	mar 26/11/24																									
481		MOVIMIENTO DE TIERRAS	54 días	mar 26/11/24																									
482		EXCAVACION PARA RED ELECTRICA	50 días	mar 26/11/24																									
483		EXCAVACION PARA BASES DE POSTES DE ALUMBRADO CON PANEL SOLAR	4 días	mié 15/01/25																									
484		CAMA DE ARENA	2 días	lun 13/01/25																									
485		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	10 días	dom 5/01/25																									
486		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	1 día	mié 15/01/25																									
487		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	16 días	mié 15/01/25																									
488		CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA BASES DE POSTES	1 día	mié 29/01/25																									
489		CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA BUZONES ELECTRICOS	1 día	sáb 18/01/25																									
490		DADOS DE CONCRETO PARA POSTES F'C=175 KG/CM2 CON ACABADO PULIDO	1 día	jue 30/01/25																									
491		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3 días	mié 15/01/25																									
492		SALIDAS ELECTRICAS	8 días	mar 3/12/24																									
493		SALIDA DE TECHO, CENTRO DE LUZ	8 días	mar 3/12/24																									
494		SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	2 días	lun 9/12/24																									
495		SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	2 días	lun 9/12/24																									
496		SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA	2 días	lun 9/12/24																									
497		SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA	1 día	mar 10/12/24																									
498		SISTEMA DE CONDUCTOS	35 días	mié 11/12/24																									
499		CAJA DE PASE CUADRADA 100 x 100 x100 mm	1 día	mié 11/12/24																									
500		CAJA DE PASE CUADRADA F9Gø 150x150x100MM	2 días	jue 12/12/24																									
501		TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA Ø 38.1mm (1 1/2")	11 días	sáb 4/01/25																									
502		TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA Ø 33mm (1")	3 días	sáb 14/12/24																									
503		TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA Ø 26.5mm (3/4")	4 días	mar 17/12/24																									
504		TUBERIA EMT Ø 33mm (1")	5 días	sáb 21/12/24																									
505		CONDUCTORES Y/O CABLES	13 días	mié 15/01/25																									
506		CONDUCTORES LSOH-80	6 días	mié 22/01/25																									

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE  
Fecha: mar 29/10/24

Tarea

División

Hito

Resumen

.....

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 9

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo												
				ago	sep	tri 4, 2024	oct	nov	dic	tri 1, 2025	ene	feb	mar	tri 2, 2025	abr
507	CABLE 1x2.5 mm2 (F) +1x2.5 mm2 (N) LSOH-80	2 días	mié 22/01/25												
508	CABLE 1x4 mm2 (F) +1x4 mm2 (N) + 1x4 mm2 (T) LSOH-80	1 día	vie 24/01/25												
509	CABLE 1x10 mm2 (F) +1x10 mm2 (N) + 1x4 mm2 (T) LSOH-80	2 días	sáb 25/01/25												
510	CABLE 1x10 mm2 LSOH-80	1 día	lun 27/01/25												
511	CONDUCTORES N2XOH	7 días	mié 15/01/25												
512	ALIMENTADOR 1x10 mm2 (F) +1x10 mm2 (N) N2XOH + 1x10 mm2 (CPT)	6 días	jue 16/01/25												
513	ALIMENTADOR 1x20 mm2 (F) +1x20 mm2 (N) N2XOH + 1x20 mm2 (CPT)	1 día	mié 15/01/25												
514	TABLEROS Y MEDIDORES	3 días	lun 4/11/24												
515	TABLERO GENERAL TG-01	1 día	lun 4/11/24												
516	TABLERO GENERAL TG-02	1 día	lun 4/11/24												
517	SUBTABLERO ST-01	1 día	lun 4/11/24												
518	SUBTABLERO ST-02	1 día	lun 4/11/24												
519	SUBTABLERO ST-03	1 día	lun 4/11/24												
520	SUBTABLERO ST-04	1 día	lun 4/11/24												
521	SUBTABLERO DE BOMBAS STB-1	1 día	lun 4/11/24												
522	SUBTABLERO DE BOMBAS STB-2	1 día	lun 4/11/24												
523	MURETE PARA SUMINISTRO ELECTRICO	3 días	lun 4/11/24												
524	ARTEFACTOS	71 días	jue 16/01/25												
525	LED CIRCULAR 18W LUZ BLANCA	4 días	lun 24/03/25												
526	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 300W.	6 días	sáb 1/02/25												
527	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 500W.	12 días	dom 26/01/25												
528	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE NIVEL DE AGUA AUTOMATICO EN CISTERNA	1 día	jue 16/01/25												
529	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE NIVEL DE AGUA AUTOMATICO EN TANQUE ELEVADO	1 día	vie 17/01/25												
530	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES F®G® INC. LUMINARIA SEGUN DISEÑO	9 días	mié 29/01/25												
531	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 13/300/180/375	4 días	mié 22/01/25												
532	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 9/200/120/255	3 días	dom 26/01/25												
533	PUESTA A TIERRA	6 días	mié 29/01/25												
534	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA R<15 OHMS	6 días	mié 29/01/25												
535	PRUEBAS ELECTRICAS (TODO EL SISTEMA)	1 día	vie 28/03/25												
536	PRUEBAS ELECTRICAS DE TODO EL SISTEMA ELECTRICO	1 día	vie 28/03/25												

