



Página 4

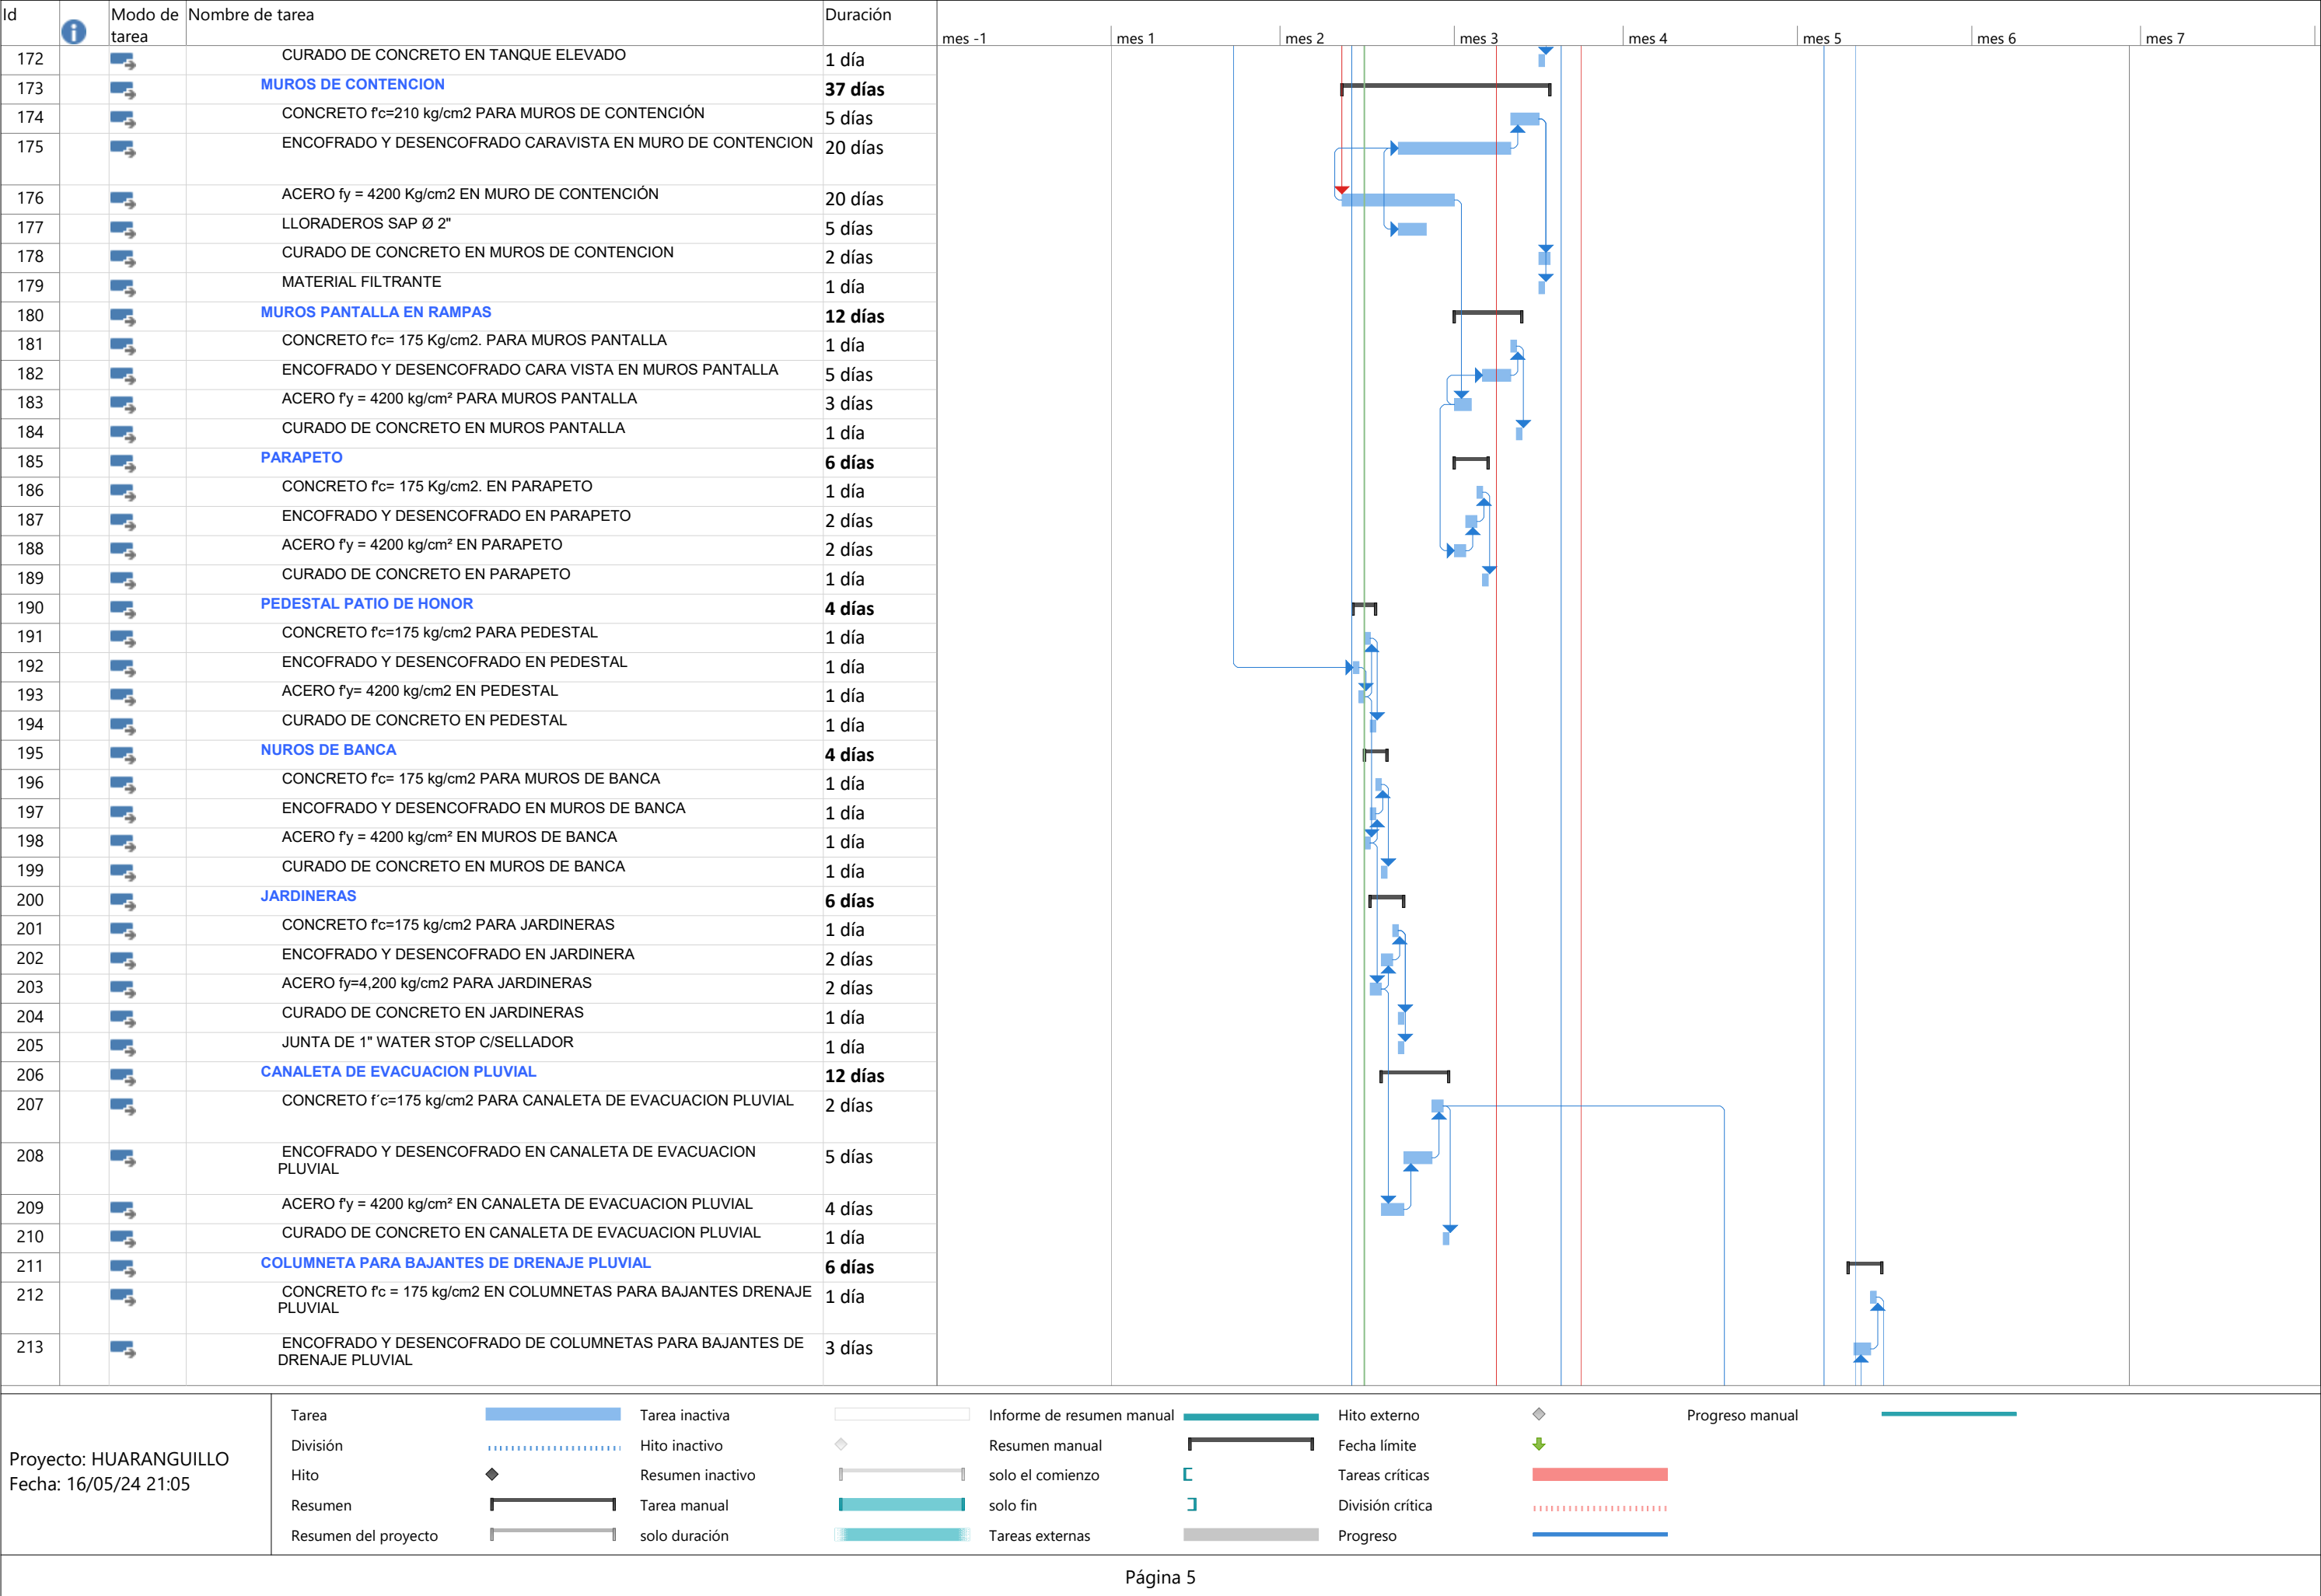

Página 5

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración									
					mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	
214			ACERO fy = 4200kg/cm2 EN COLUMNETAS PARA BAJANTES DE DRENAJE PLUVIAL	1 día									
215			CURADO DE CONCRETO PARA BAJANTES DE DRENAJE PLUVIAL	1 día									
216			ESTRUCTURAS METALICAS	40 días									
217			ANCLAJE EN VIGA DE CONCRETO	9 días									
218			SUMINISTRO DE PLACA BASE Ø 0.3m	5 días									
219			MONTAJE DE PLACA BASE Ø 0.3m	4 días									
220			ARMADO Y MONTAJE DE CERCHAS METALICAS EN ARCO	11 días									
221			ARMADO DE CERCHAS METALICAS EN ARCO	6 días									
222			MONTAJE DE CERCHAS METALICAS EN ARCO	5 días									
223			CORREAS METALICAS	20 días									
224			ARMADO DE CORREA METALICA: TUBO RECTANGULAR 2"X3"X2mm ASTM A500 GrA	5 días									
225			MONTAJE DE CORREA METALICA: TUBO RECTANGULAR 2"X3"X2mm ASTM A500 GrA	4 días									
226			ARMADO DE TENSORES ACERO LISO CIRCULAR 3/8" A36	6 días									
227			MONTAJE DE TENSORES ACERO LISO CIRCULAR 3/8" A36	5 días									
228			REJILLA DE DRENAJE PLUVIAL	4 días									
229			REJILLA METALICA EN CANAL PLUVIAL S/DISEÑO	4 días									
230			ARQUITECTURA, EVACUACION Y SEÑALIZACION	116 días									
231			MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA	31 días									
232			MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA	10 días									
233			MUROS DE LADRILLO K.K. 18H TIPO V (24x13x9), MORTERO 1:5, JUNTA 1.5 CM, APAREJO DE CABEZA,MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5	10 días									
234			MUROS DE LADRILLO K.K. 18H TIPO IV (23x12.5x9), MORTERO 1:5, JUNTA 1.5 CM, APAREJO DE CABEZA , MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5	5 días									
235			MUROS DE TABIQUERIA	31 días									
236			MUROS DE LADRILLO K.K. 18H TIPO IV (23x12.5x9), MORTERO 1:5, JUNTA 1.5 CM, APAREJO DE CABEZA , MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5	15 días									
237			MUROS DE LADRILLO K.K. 18H TIPO IV (23x12.5x9), MORTERO 1:5, JUNTA 1.5 CM, APAREJO DE SOGA , MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5	25 días									
238			JUNTA DE TECNOPOR e=1" CON SELLO ELASTOMERICO	6 días									
239			REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	50 días									
240			TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MEZ. 1:5	5 días									
241			TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO FROTACHADO CON CEMENTO:ARENA 1:5	18 días									
242			TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO FROTACHADO CON CEMENTO:ARENA 1:5	25 días									
243			TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS/ PLACAS ACABADO CON CEMENTO:ARENA 1:5	20 días									
244			TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNETAS ACABADO CON CEMENTO:ARENA 1:5	4 días									
245			TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS ACABADO CON CEMENTO:ARENA 1:5	25 días									
246			VESTIDURA DE DERRAME, C:A;1:5	15 días									
247			BRUÑAS E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE	10 días									
248			GRADAS Y DESCANSO CON CEMENTO SEMI PULIDO BRUÑADO @ 1.00M MEZCLA 1:4	5 días									
249			TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS ACABADO FROTACHADO CON CEMENTO:ARENA 1:5 CON IMPERMEABILIZANTE EN CISTERNA	2 días									
<div><div>Proyecto: HUARANGUILLO Fecha: 16/05/24 21:05</div><div><div>Tarea<div></div></div><div>División<div></div></div><div>Hito<div></div></div><div>Resumen<div></div></div><div>Resumen del proyecto<div></div></div></div><div><div>Tarea inactiva<div></div></div><div>Hito inactivo<div></div></div><div>Resumen inactivo<div></div></div><div>Tarea manual<div></div></div><div>solo duración<div></div></div></div><div><div>Informe de resumen manual<div></div></div><div>Resumen manual<div></div></div><div>solo el comienzo<div></div></div><div>solo fin<div></div></div><div>Tareas externas<div></div></div></div><div><div>Hito externo<div></div></div><div>Fecha límite<div></div></div><div>Tareas críticas<div></div></div><div>División crítica<div></div></div><div>Progreso<div></div></div></div><div>Progreso manual<div></div></div></div>													
Página 6													

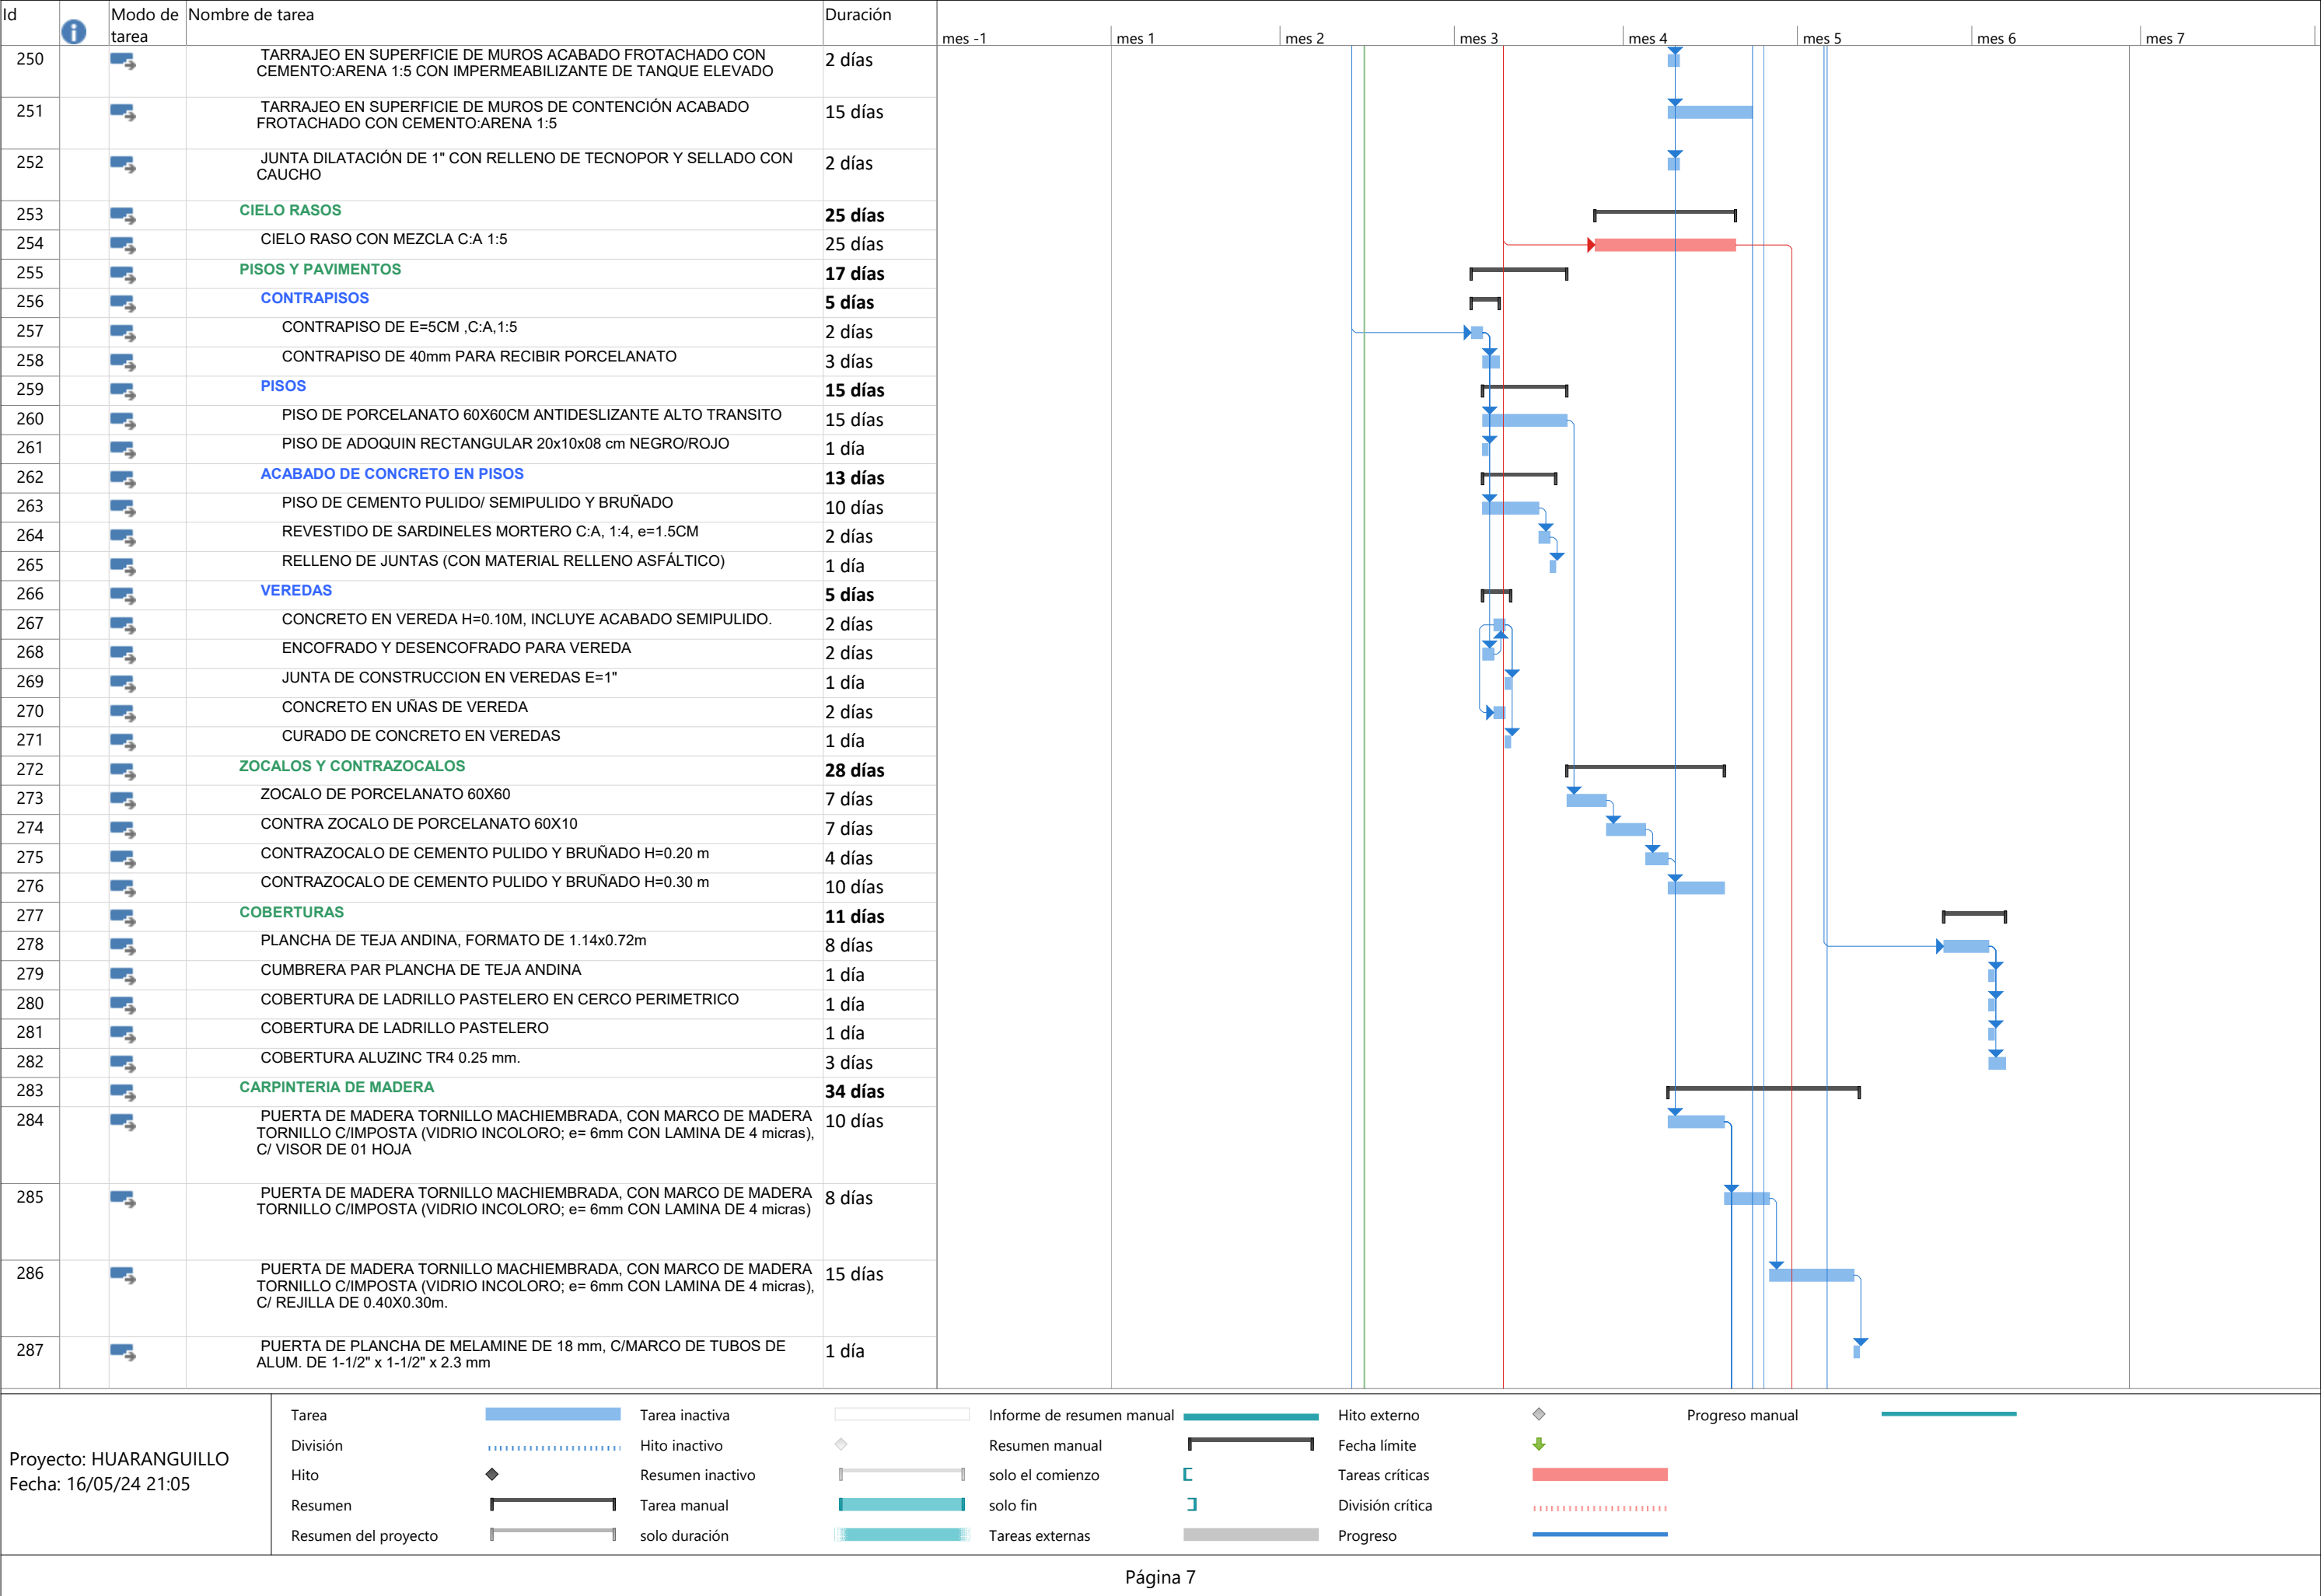

Página 7

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración									
					mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	
288			CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	16 días									
289			VENTANA TIPO REJA C/FIERRA MACIZO CUADRADO DE 3/4"	1 día									
290			PUERTA METALICA C/ PLANCHA METALICA DE 3/4", ESTRUCTURA DE METAL C/MANIJA DE PALANCA Y CERRADURA DE 02 GOLPES.	2 días									
291			REJA METALICA FIERRO RECTANGULAR Fe. 1" PINTADO AL SOPLETE COLOR NEGRO	5 días									
292			PASAMANOS TUBO DE F°G° 2" SEGÚN DISEÑO, ACABADO C/ PINTURA ESMALTE TIPO CROMADO	6 días									
293			PASAMANOS TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE Ø = 1-1/2" EN SS.HH.	1 día									
294			BARANDA TUBULAR DE F°N° DE 2" Y 1" INCL. PINTURA H=0.90m	1 día									
295			ESCALERA GATO, TUBO F.G 1 1/2" Y 1" TQE. ELEVADO	2 días									
296			CANASTILLA DE SEGURIDAD PL 2x1/4" P/ESC. GATO TQE ELEVADO, SEGUN DISEÑO	2 días									
297			ESCALERA DE GATO CISTERNA TUBO DE ALUMINIO 30mm, @ 25cm, e=3mm.	1 día									
298			TAPA METALICA EN CISTERNA Y TQE. ELEVADO, INC. ALDABA Y PINTURA	1 día									
299			ASTA DE BANDERA INC. SOPORTE METÁLICO	2 días									
300			LETRAS DE ACERO INOXIDABLE A=0.30m	2 días									
301			CANTONERA DE ALUMINIO 2"x1 1/8"	1 día									
302			CERCO PERIMÉTRICO DE POSTES DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS	3 días									
303			RODOPASO DE ALUMINIO CON ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS	1 día									
304			ESCALERA METÁLICA DE 1 TRAMO SEGÚN DETALLE	1 día									
305			BARANDILLA DE FIERRO CON MALLA GALVANIZADA SEGÚN DETALLE	1 día									
306			REJA METÁLICA, SEGÚN DETALLE INCLUYE PINTURA	2 días									
307			CERRAJERIA	11 días									
308			BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA	1 día									
309			BISAGRA DE 2 ALAS DE 4" PARA SOLDAR TIPO PIN DE ROTACION	1 día									
310			CERRADURA PESADA DE 2 GOLPES TIPO PALANCA	2 días									
311			CERRADURA PESADA DE 2 GOLPES	2 días									
312			CERRADURA TIPO PERILLA	1 día									
313			CERROJO DE 3" ALUMINIZADO	1 día									
314			JALADOR DE ALUMINIO 2"	1 día									
315			PICAPORTE DE 12" DE FIERRO CON ALDABA PARA CANDADO	1 día									
316			CANDADO TIPO FORTE DE 80 mm	1 día									
317			VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES	7 días									
318			VENTANA SISTEMA DIRECTO CON MARCO PERFIL H ALUMINIO 25mm + U PERFIL ALUMINIO 10 mm, VIDRIO INCOLORO; e= 6 mm CON LAMINA DE 4 micras	5 días									
319			VENTANA PIVOTANTE EN SOBRELUZ DE PUERTAS CON VIDRIO INCOLORO e=6 mm CON LAMINA DE 4 micras.	1 día									
320			VISOR EN PUERTAS DE VIDRIO INCOLORO e=6 mm CON LAMINA DE 4micras.	1 día									
321			PINTURA	57 días									
322			PINTURA LATEX SUPER MATE EN MUROS INTERIORES (2 MANOS)	10 días									
323			PINTURA OLEO MATE EN MUROS EXTERIORES (2 MANOS)	15 días									
324			PINTURA OLEO MATE EN COLUMNAS, COLUMNETAS Y VIGAS (2 MANOS)	20 días									
325			PINTURA LATEX SUPER MATE EN CIELO RASO (2 MANOS)	10 días									
326			PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO	7 días									
<div>Proyecto: HUARANGUILLO Fecha: 16/05/24 21:05</div>					<div><div>Tarea<div></div>Tarea inactiva<div></div></div><div>División<div></div>Hito inactivo<div></div></div><div>Hito<div></div>Resumen inactivo<div></div></div><div>Resumen<div></div>Tarea manual<div></div></div><div>Resumen del proyecto<div></div>solo duración<div></div></div><div>Informe de resumen manual<div></div>Resumen manual<div></div>solo el comienzo<div></div>solo fin<div></div>Tareas externas<div></div></div><div>Hito externo<div></div>Fecha límite<div></div>Tareas críticas<div></div>División crítica<div></div>Progreso<div></div></div><div>Progreso manual<div></div></div></div>								

Página 8

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración												
					mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7				
327			PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 3 MANOS	2 días												
328			PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA	1 día												
329			EMPASTE DE MUROS INTERIORES	10 días												
330			EMPASTE DE MUROS EXTERIORES	15 días												
331			EMPASTE DE COLUMNAS, COLUMNETAS Y VIGAS	15 días												
332			EMPASTADO DE CIELO RASO	10 días												
333			LIMPIEZA DE OBRA	1 día												
334			LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	1 día												
335			LIMPIEZA DE VIDRIOS	1 día												
336			AREAS VERDES	13 días												
337			SEMBRIO DE GRASS, INCLUYE TIERRA NEGRA	5 días												
338			SEMBRIO DE GERANIO	1 día												
339			SEMBRIO DE CAFÉ	1 día												
340			SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO MAS MALLA ANTIHIERBA	1 día												
341			RELLENO DE GRAVA (3/4") + RELLENO DE ARENA GRUESA (h=0.35m)	3 días												
342			CUBRESUELOS DE PIEDRA CHANCADA, GRAVILLA O SIMILAR (h=10cm)	3 días												
343			OTROS	2 días												
344			MURETE DE DRYWALL PARA TABLEROS ELECTRICOS L= 0.70 m	1 día												
345			TABIQUE DIVISORIO DE DRYWALL (Plancha de FIBROCEMENTO e=6mm)	1 día												
346			EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	5 días												
347			SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	1 día												
348			SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE EXTINTOR	1 día												
349			SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE DIRECCION DE SALIDA	1 día												
350			SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE SALIDA	1 día												
351			SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE ESTACION MANUAL ALARMA DE FUEGO (JALADOR)	1 día												
352			SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE ESTACION MANUAL ALARMA DE FUEGO (AVISADOR SONORO)	1 día												
353			SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO	1 día												
354			SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	1 día												
355			SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE RIESGO ELECTRICO	1 día												
356			SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE LUZ DE EMERGENCIA	1 día												
357			SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE NO HACER FUEGO GAS	1 día												
358			SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE SEÑAL DE CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO (C.A.C.I)	1 día												
359			SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA FOTOLUMINISCENTE DE SEÑAL AFORO	1 día												
360			SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVA EN SS.HH. HOMBRES/ MUJERES	1 día												
361			PINTURA TRAFICO	1 día												

Proyecto: HUARANGUILLO

Fecha: 16/05/24 21:05

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

<

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Gantt chart timeline												
					mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7					
362			MARCAS EN EL PAVIMENTO - SÍMBOLOS Y LETRAS	1 día													
363			VARIOS	3 días													
364			BASUREROS ECOLÓGICOS DE 240LT	2 días													
365			EXTINTOR PQS 6KG	1 día													
366			INSTALACIONES SANITARIAS	41 días													
367			APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	6 días													
368			SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	6 días													
369			INODORO DE LOSA VITRIFICADA CON DESCARGA INDIRECTA (TANQUE). MODELO: BABY FRESH, COLOR BLANCO - NIÑO	1 día													
370			INODORO DE LOSA VITRIFICADA CON DESCARGA INDIRECTA (TANQUE). MODELO: RAPID JET PREMIUN, COLOR BLANCO - ADULTO	1 día													
371			URINARIO DE LOSA VITRIFICADA, CON CON LLAVE NEOPLUS 1/2" TEMPORIZADA. MODELO BAMBI, COLOR BLANCO - NIÑO	1 día													
372			URINARIO DE LOSA VITRIFICADA, CON CON LLAVE NEOPLUS 1/2" TEMPORIZADA. MODELO CADET, COLOR BLANCO - ADULTO	1 día													
373			LAVATORIO SOBRE ENCIMERA DE LOSA VITRIFICADA DE 18 3/4" x 15 3/4" MODELO: SONNET/COLOR BLANCO, LLAVE PICO BAJO CON MANIJA TIPO PALANCA P/ AGUA FRIA MODELO: OXFORD O SIMILAR.	1 día													
374			LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA DE 17 7/8" x 13 3/8" - SIN PEDESTAL MODELO: FONTANA/COLOR BLANCO, LLAVE PICO BAJO CON MANIJA TIPO PALANCA P/ AGUA FRIA MODELO: OXFORD O SIMILAR	1 día													
375			LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE (01 POZA C/ ESCURRIDERO)	1 día													
376			GRIFERÍAS	2 días													
377			GRIFERÍA PICO BAJO CON MANIJA TIPO PALANCA P/ AGUA FRIA MODELO: OXFORD O SIMILAR	1 día													
378			GRIFERÍAS DE CUELLO DE GANZO	1 día													
379			SISTEMA DE AGUA FRIA	26 días													
380			SALIDA DE AGUA FRIA	2 días													
381			SALIDA DE AGUA FRÍA PVC D=1/2"	2 días													
382			REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA	1 día													
383			TUBERÍA PVC C-10 CR P/ AGUA FRÍA D=1/2" (SUM. E INST.)	1 día													
384			TUBERÍA PVC C-10 CR P/ AGUA FRÍA D=3/4" (SUM. E INST.)	1 día													
385			REDES DE ALIMENTACIÓN	15 días													
386			TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO P/ REDES SANITARIAS	1 día													
387			EXCAVACIÓN DE ZANJA P/ TUBERÍA EN TERRENO NORMAL	5 días													
388			REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA	4 días													
389			CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA GRUESA	1 día													
390			RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO	2 días													
391			ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (D=<30m)	1 día													
392			TUBERÍA PVC C-10 CR P/ AGUA FRÍA D=3/4" (SUM. E INST.)	1 día													
393			TUBERÍA PVC C-10 CR P/ AGUA FRÍA D=1" (SUM. E INST.)	2 días													
394			TUBERÍA PVC C-10 CR P/ AGUA FRÍA D=1 1/2" (SUM. E INST.)	1 día													
395			PRUEBAS HIDRAULICAS	1 día													
396			PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERIAS DE AGUA	1 día													
397			ACCESORIOS DE REDES DE AGUA	2 días													
398			CODO PVC CR 90° x 1/2"	1 día													
399			CODO PVC CR 90° x 3/4"	2 días													

Proyecto: HUARANGUILLO

Fecha: 16/05/24 21:05

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 10

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Gantt chart timeline											
					mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7				
400			TEE PVC CR 3/4"	1 día												
401			TEE PVC CR 1"	1 día												
402			TEE PVC CR 1 1/2"	1 día												
403			REDUCCIÓN PVC CR 3/4" A 1/2"	1 día												
404			REDUCCIÓN PVC CR 1" A 3/4"	1 día												
405			REDUCCIÓN PVC CR 1 1/2" A 3/4"	1 día												
406			VALVULAS	7 días												
407			VALVULA ESFÉRICA DE BRONCE PESADA D=1/2"	1 día												
408			VALVULA ESFÉRICA DE BRONCE PESADA D=3/4"	1 día												
409			VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA D=3/4"	1 día												
410			VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA D=11/2"	1 día												
411			VALVULA CHECK DE BRONCE PESADA D=3/4"	1 día												
412			VALVULA CHECK DE BRONCE PESADA D=11/2"	1 día												
413			LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 3/4" EN MURETE DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2	1 día												
414			VARIOS	4 días												
415			CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHOS DE MAYOLICA Y TAPA METALICA	1 día												
416			CAJA PARA VALVULA BY PASS EN PISO	1 día												
417			CAJA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA CON TAPA EN PISO	1 día												
418			EMPALME A LA RED EXISTENTE DE AGUA FRIA	1 día												
419			SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	11 días												
420			RED DE RECOLECCIÓN EN PISOS	9 días												
421			TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO P/ REDES SANITARIAS	1 día												
422			EXCAVACIÓN DE ZANJA P/ TUBERÍA PLUVIAL EN TERRENO NORMAL	2 días												
423			REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA P/ TUBERÍA	2 días												
424			CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA GRUESA	1 día												
425			RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO	1 día												
426			ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (D=<30m)	1 día												
427			TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL PVC CP D=4"	1 día												
428			RED DE RECOLECCIÓN EN TECHOS	4 días												
429			CANAleta SEMICIRCULAR DE 6" DE PLANCHA GALVANIZADA LISA DE 1/20"	2 días												
430			MONTANTE DE DRENAJE PLUVIAL TUBERIA DE PVC CP D=4"	2 días												
431			ABRAZADERA DE FIJACIÓN DE TUBO DE 4"	2 días												
432			CODO DRENAJE PVC 4"x90°	1 día												
433			PRUEBA HIDRAULICA	1 día												
434			PRUEBA HIDRÁULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTÍA	1 día												
435			CÁMARAS DE INSPECCIÓN	1 día												
436			CAJA DE REBOSE DE CONCRETO 12" x 24" C/ REJILLA	1 día												
437			SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN	21 días												
438			SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN	3 días												
439			SALIDA DE DESAGÜE PVC CP D=2"	1 día												
440			SALIDA DE DESAGÜE PVC CP D=4"	1 día												
441			SALIDA DE VENTILACIÓN PVC CP D=2"	1 día												
442			REDES DE DERIVACION	4 días												

Proyecto: HUARANGUILLO

Fecha: 16/05/24 21:05

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 11

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración									
					mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	
443			TUBERÍA DE DESAGÜE PVC CP D=2"	1 día									
444			TUBERÍA DE DESAGÜE PVC CP D=4"	1 día									
445			TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC CP D=2"	1 día									
446			MONTANTE DE VENTILACIÓN TUBERÍA PVC CP D=2"	1 día									
447			REDES COLECTORAS	16 días									
448			TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO P/ REDES SANITARIAS	1 día									
449			EXCAVACIÓN DE ZANJA P/ TUBERÍA EN TERRENO NORMAL	5 días									
450			REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA P/ TUBERÍA	3 días									
451			CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA GRUESA	2 días									
452			RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO	1 día									
453			ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (D=<30m)	1 día									
454			TUBERÍA DE DESAGÜE PVC CP D=4"	3 días									
455			PRUEBAS HIDRAULICAS	2 días									
456			PRUEBA HIDRÁULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTÍA	2 días									
457			ACCESORIOS	1 día									
458			CODO DESAGÜE PVC 45° x 2"	1 día									
459			CODO DESAGÜE PVC 90° x 2"	1 día									
460			YEE DESAGÜE PVC 2"	1 día									
461			YEE DESAGÜE PVC 4" A 2"	1 día									
462			TEE SIMPLE DESAGÜE PVC 2"	1 día									
463			TEE SANITARIA DESAGÜE PVC 2"	1 día									
464			SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC 2"	1 día									
465			SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	1 día									
466			REGISTRO DE BRONCE DE 2"	1 día									
467			REGISTRO DE BRONCE DE 4"	1 día									
468			CAMARAS DE INSPECCION	2 días									
469			CAJAS DE REGISTRO	2 días									
470			CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 12" x 24" C/ TAPA CONCRETO	2 días									
471			ALMACENAMIENTO DE AGUA	10 días									
472			CISTERNA DE 6.40m3 y TANQUE ELEVADO 3.49m3	10 días									
473			SUM. E INST. DE LÍNEA DE INGRESO A CISTERNA DE 3/4" F°G°, INC. VÁLVULAS Y ACCESORIOS	1 día									
474			SUM. E INST. DE EQUIPO DE BOMBEO, 02 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS Q=2.10l/s, HDT=17m.c.a.	1 día									
475			SUM. E INST. DE LINEA DE SUCCION 2" F°G°, INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS	1 día									
476			SUM. E INST. DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE 11/2" F°G°, INC. VÁLVULAS Y ACCESORIOS	1 día									
477			SUM. E INST. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE 11/2" F°G°, INC. VÁLVULAS Y ACCESORIOS	1 día									
478			SUM. E INST. DE LÍNEA DE REBOSE DE 2" F°G° PARA CISTERNA, INC. VÁLVULAS Y ACCESORIOS	1 día									
479			SUM. E INST. DE LÍNEA DE REBOSE Y PURGA DE 2" F°G° PARA TANQUE ELEVADO, INC. VÁLVULAS Y ACCESORIOS	1 día									
480			SUM. E INST. DE TUBERÍA BASTÓN DE VENTILACIÓN DE 3" F°G° PARA CISTERNA	1 día									

Proyecto: HUARANGUILLO

Fecha: 16/05/24 21:05

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual



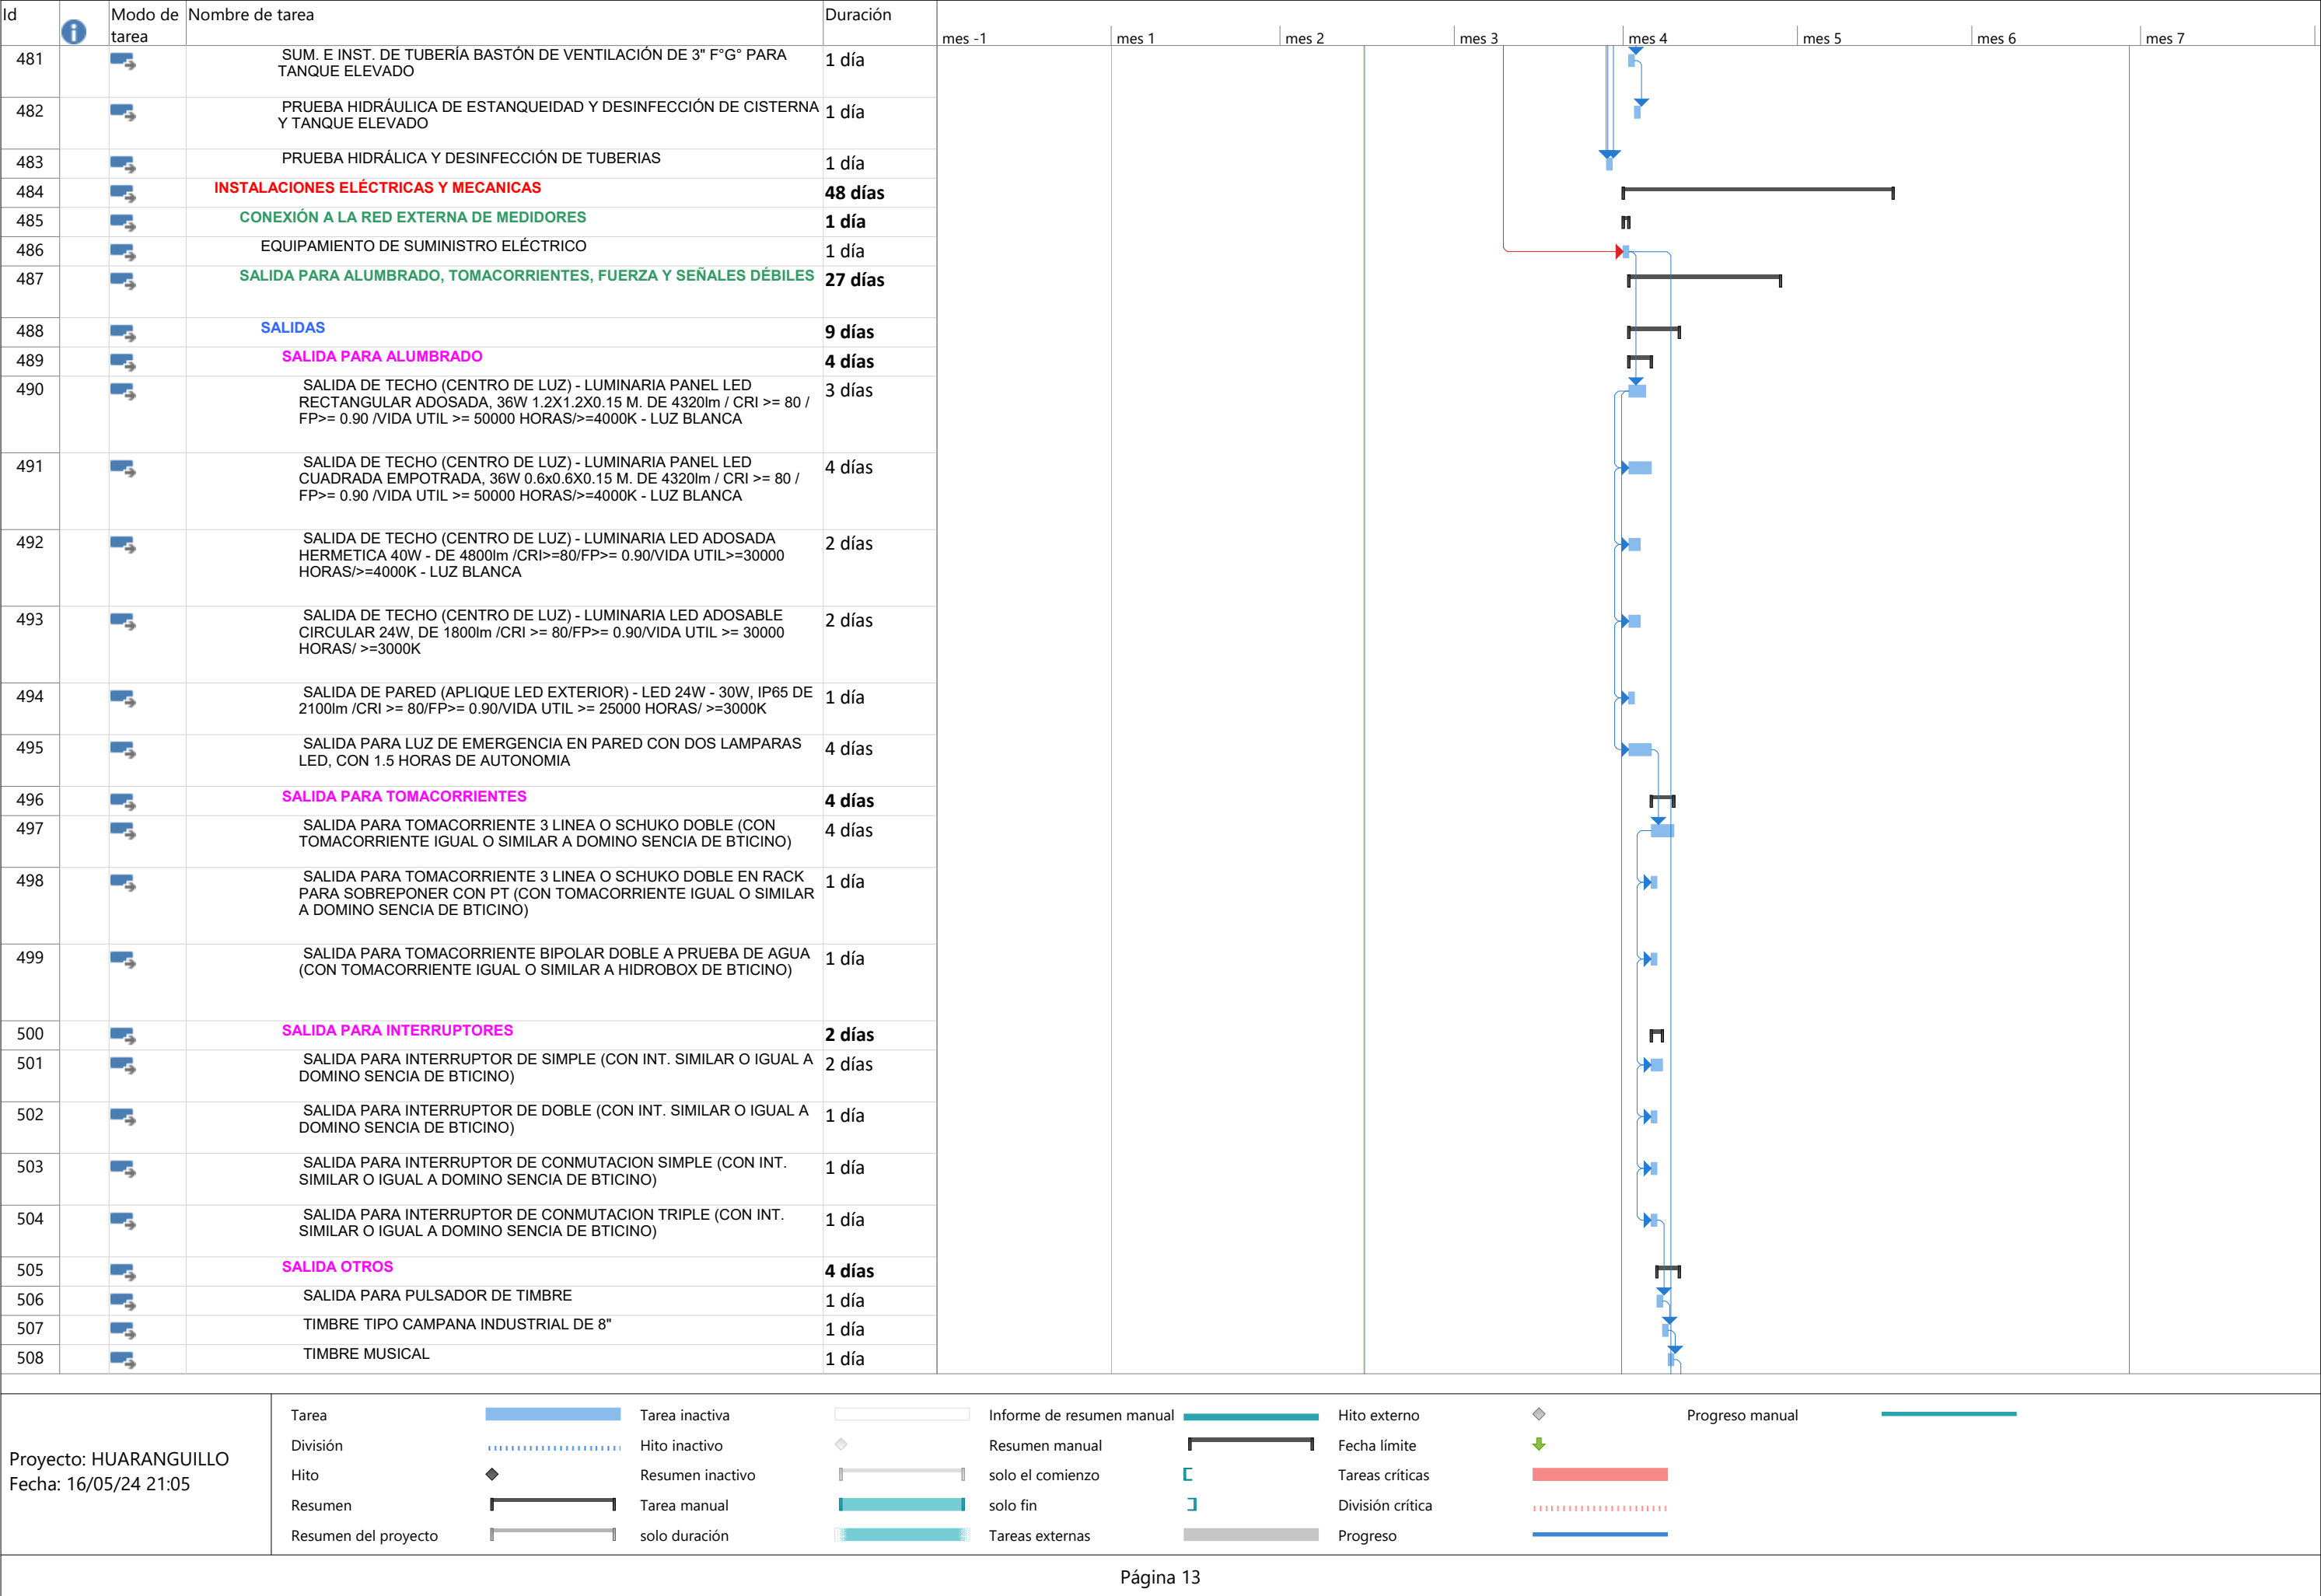





























Página 12




Página 13

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración								
					mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7
509			SALIDA PARA CONTROL DE PERSONAL (NO INCLUYE EQUIPO)	1 día								
510			SISTEMA DE CONDUCTOS	19 días								
511			CONDUCTOS	17 días								
512			TRAZO Y REPLANTEO	1 día								
513			EXCAVACION EN TERRENO NORMAL PARA ZANJA (0.5x0.75 m)	5 días								
514			CAMA DE APOYO E=0.10 M	1 día								
515			CINTA SEÑALIZADORA DE RIESGO ELECTRICO	1 día								
516			RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO	3 días								
517			ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día								
518			TUBERIA EMPOTRADA	8 días								
519			TUBERIA PVC - P 20mm Ø X 3M	5 días								
520			TUBERIA PVC - P 25mm Ø X 3M	1 día								
521			TUBERIA PVC - P 35mm Ø X 3M	1 día								
522			TUBERIA PVC - P 40mm Ø X 3M	1 día								
523			TUBERÍA VISIBLE	3 días								
524			TUBERIA PVC - FLEXIBLE CONDUIT 3/4"	1 día								
525			TUBO CONDUIT 3/4"	1 día								
526			ACCESORIOS PARA TUBERIA CONDUIT 3/4"	1 día								
527			CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS	10 días								
528			ALIMENTADORES	10 días								
529			SUMINISTRO E INST. DE ALIMENTADOR CAB LSOH-80 Ø 2.5 mm2	5 días								
530			SUMINISTRO E INST. DE ALIMENTADOR CAB LSOH-80 Ø 4mm2	2 días								
531			SUMINISTRO E INST. DE ALIMENTADOR CAB N2XOH Ø6mm2	1 día								
532			SUMINISTRO E INST. DE ALIMENTADOR CAB N2XOH Ø16mm2	1 día								
533			SUMINISTRO E INST. DE ALIMENTADOR CAB N2XOH Ø25mm2	1 día								
534			SISTEMA DE CONDUCTOS	1 día								
535			BUZON DE INSTALACIONES ELECTRICAS (0.65x0.65x0.85cm)	1 día								
536			TABLEROS PRINCIPALES	1 día								
537			TG C/BARRAS 2x80A: 1 Int. Ter. 2x25A, 2 Int. Ter. 2x32A, 1 Int. Ter. 2x40A, 2 Int. Ter. 2x16, 4 Int. Ter. 2x20A, 6 Int. Dif. 2x25A(30mA), 40 Polos	1 día								
538			TABLEROS DE DISTRIBUCION	1 día								
539			TD-01 C/BARRAS 2x25A: 3 int. 2x16A, 1 Int. Ter. 2x20A, 4 Int. Dif. 2x25A(30mA), 24 Polos	1 día								
540			TD-02 C/BARRAS 2x32A: 3 int. 2x16A, 1 Int. Ter. 2x20A, 1 Int. Ter. 2x25A, 4 Int. Dif. 2x25A(30mA), 26 Polos	1 día								
541			TD-02A C/BARRAS 2x25A: 2 int. 2x16A, 1 Int. Ter. 2x20A, 3 Int. Dif. 2x25A(30mA), 20 Polos	1 día								
542			TD-03 C/BARRAS 2x40A: 3 int. 2x16A, 3 Int. Ter. 2x20A, 1 Int. Ter. 2x25A, 6 Int. Dif. 2x25A(30mA), 36 Polos	1 día								
543			TD-03A C/BARRAS 2x25A: 3 int. 2x16A, 2 Int. Ter. 2x20A, 5 Int. Dif. 2x25A(30mA), 28 Polos	1 día								
544			TD-04 C/BARRAS 2x32A: 1 int. 2x16A, 1 Int. Ter. 2x20A, 1 Int. Ter. 2x25A, 2 Int. Dif. 2x25A(30mA), 1 Int. Dif. 2x25A(30mA - Superinmunizado)22 Polos	1 día								
545			TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO DE ELECTROBOMBAS	1 día								
546			DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN	3 días								
547			CAJA DE PASE OCTOGONAL C/TAPA CIEGA 100 X 55 mm	1 día								
Proyecto: HUARANGUILLO Fecha: 16/05/24 21:05			<div><div>Tarea<div></div></div><div>División<div></div></div><div>Hito<div></div></div><div>Resumen<div></div></div><div>Resumen del proyecto<div></div></div><div>Tarea inactiva<div></div></div><div>Hito inactivo<div></div></div><div>Resumen inactivo<div></div></div><div>Tarea manual<div></div></div><div>solo duración<div></div></div><div>Informe de resumen manual<div></div></div><div>Resumen manual<div></div></div><div>solo el comienzo<div></div></div><div>solo fin<div></div></div><div>Tareas externas<div></div></div><div>Hito externo<div></div></div><div>Fecha límite<div></div></div><div>Tareas críticas<div></div></div><div>División crítica<div></div></div><div>Progreso<div></div></div><div>Progreso manual<div></div></div></div>									
Página 14												

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración								
					mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7
548			CAJA DE PASE RECTANGULAR C/TAPA CIEGA 100 X 50 X 50 mm	1 día								
549			CAJA DE PASE F°G° 100X100X50 MM - (4" X 4" X 2")	1 día								
550			INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	6 días								
551			SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO PUESTA A TIERRA R< 10 OHMIOS (VARILLA DE 16mm - TABLEROS)	5 días								
552			COBRE DESNUDO DE 16mm2	1 día								
553			ARTEFACTOS	16 días								
554			LUMINARIAS	16 días								
555			LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR ADOSADA, 36W 1.2X1.2X0.15 M. DE 4320lm / CRI>=80 / FP>=0.90 /VIDA UTIL>=30000 HORAS/>=3000K - LUZ BLANCA	3 días								
556			LUMINARIA PANEL LED CUADRADA EMPOTRADA, 36W 0.6x0.6X0.15 M. DE 4320lm / CRI>=80 / FP>=0.90 /VIDA UTIL>=50000 HORAS/>=4000K - LUZ BLANCA	4 días								
557			LUMINARIA LED ADOSADA HERMETICA 40W - DE 4800lm /CRI>=80/FP>=0.90/VIDA UTIL>=30000 HORAS/>=4000K - LUZ BLANCA	2 días								
558			LUMINARIA LED ADOSABLE CIRCULAR 24W, DE 1800lm /CRI >= 80/FP>= 0.90/VIDA UTIL >= 30000 HORAS/ >=3000K	2 días								
559			LUMINARIA LED 24W - 30W, IP65 DE 2100lm /CRI >= 80/FP>= 0.90/VIDA UTIL >= 25000 HORAS/ >=3000K	1 día								
560			LUZ DE EMERGENCIA EN PARED CON DOS LAMPARAS LED, CON 1.5 HORAS DE AUTONOMIA	4 días								
561			EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS	4 días								
562			BOMBAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	4 días								
563			ELECTROBOMBA DE 1 HP (INCLUYE EQUIPAMIENTO)	2 días								
564			ELECTRONIVEL (INCLUYE EQUIPAMIENTO)	2 días								
565			PRUEBAS ELECTRICAS Y/O HERMETICIDAD	4 días								
566			PRUEBAS DEL NIVEL DE AISLAMIENTO EN CADA TABLERO	2 días								
567			MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS POZOS DE PUESTA A TIERRA	2 días								
568			INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	19 días								
569			SALIDAS	13 días								
570			SALIDAS RED	6 días								
571			SALIDA PARA GABINETE DE COMUNICACIONES (NO INCLUYE EQUIPO)	1 día								
572			SALIDA PARA DATA VOZ (NO INCLUYE EQUIPO)	2 días								
573			SALIDA PARA RELOJ REGISTRADOR DE PERSONAL (NO INCLUYE EQUIPO)	1 día								
574			SALIDA PARA PROYECTOR (SOLO INCLUYE TOMAS Y CABLEADO EN SUM)	2 días								
575			SALIDAS DE SISTEMA CONTRA INCENDIO	6 días								
576			SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NO INCLUYE EQUIPO)	1 día								
577			SALIDA PARA ACTIVACION MANUAL DE ALARMA (NO INCLUYE EQUIPO)	1 día								
578			SALIDA PARA SIRENA ALARMA CONTRA INCENDIO / LUZ ESTROBOSCOPICA (NO INCLUYE EQUIPO)	1 día								
579			SALIDA DE DETECTOR DE HUMO (NO INCLUYE EQUIPO)	2 días								
580			SALIDA DE DETECTOR DE TEMPERATURA (NO INCLUYE EQUIPO)	1 día								
581			SISTEMA DE SEGURIDAD	3 días								
582			SALIDA PARA CCTV (NO INCLUYE EQUIPO)	2 días								
<div>Proyecto: HUARANGUILLO Fecha: 16/05/24 21:05</div>					<div><div>Tarea<div></div>Tarea inactiva<div></div></div><div>División<div></div>Hito inactivo<div></div></div><div>Hito<div></div>Resumen inactivo<div></div></div><div>Resumen<div></div>Tarea manual<div></div></div><div>Resumen del proyecto<div></div>solo duración<div></div></div><div>Informe de resumen manual<div></div></div><div>Resumen manual<div></div></div><div>solo el comienzo<div></div></div><div>solo fin<div></div></div><div>Tareas externas<div></div></div><div>Hito externo<div></div></div><div>Fecha límite<div></div></div><div>Tareas críticas<div></div></div><div>División crítica<div></div></div><div>Progreso<div></div></div><div>Progreso manual<div></div></div></div>							
Página 15												

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	mes -1mes 1mes 2mes 3mes 4mes 5mes 6mes 7						
583			SALIDA PARA TV (NO INCLUYE EQUIPO)	1 día							
584			SISTEMA DE PERIFONEO	2 días							
585			SALIDA PARA CONSOLA AMPLIFICADA - SUM (NO INCLUYE EQUIPO)	1 día							
586			SALIDA PARA PARLANTES - SUM (NO INCLUYE EQUIPO)	1 día							
587			DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN	3 días							
588			CAJA DE PASE RECTANGULAR C/TAPA CIEGA 100 X 50 X 50 mm	1 día							
589			CAJA DE PASE F°G° 100X100X50 MM - (4" X 4" X 2")	1 día							
590			CAJA DE PASE F°G° 150X150X100 MM - (6" X 6" X 4")	1 día							
591			SISTEMA DE CONDUCTOS	18 días							
592			CONDUCTOS	18 días							
593			TRAZO Y REPLANTEO	1 día							
594			EXCAVACION EN TERRENO NORMAL PARA ZANJA (0.55x0.75 m)	5 días							
595			CAMA DE APOYO E=0.10 M	1 día							
596			CINTA SEÑALIZADORA DE RIESGO ELECTRICO	1 día							
597			RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO	5 días							
598			ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (D=5Km)	1 día							
599			CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS	9 días							
600			TUBERIA ELECTRICA PVC- SAP 20 mm. DIAMETRO	4 días							
601			TUBERIA ELECTRICA PVC- SAP 25 mm. DIAMETRO	4 días							
602			TUBERIA ELECTRICA PVC- SAP 35 mm. DIAMETRO	1 día							
603			SISTEMA DE BUZONES	1 día							
604			BUZON DE INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN (0.65x0.65x0.85cm)	1 día							
605			INSTALACIONES DE GAS	4 días							
606			TUBERIAS	1 día							
607			TUBERIA DE COBRE 1/2Ø:0.15m FROF x 0.10 ANCHO	1 día							
608			ARTEFACTOS (GLP O GNS)	1 día							
609			BALON DE 10KG GLP	1 día							
610			ACCESORIOS	1 día							
611			SALIDA PARA COCINA	1 día							
612			PRUEBAS DE HERMETICIDAD	1 día							
613			PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE GAS	1 día							



Proyecto: HUARANGUILLO
Fecha: 16/05/24 21:05

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
