


ID	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	01 abril 19/03	30/04	01 julio 11/06	23/07	03/09	01 octubre 15/10	26/11	01
1	PLAZO TOTAL	120 días	3,712,997.04	sáb 01/07/23	sáb 21/10/23								
2	Ejecucion de obra	120 días	3,673,482.53	sáb 01/07/23	sáb 21/10/23								
3	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD	91 días	46,573.37	sáb 01/07/23	dom 24/09/23								
4	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	4 días	24,874.32	sáb 01/07/23	mar 04/07/23								
5	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80x1.80 M	1 día	1,458.72	sáb 01/07/23	sáb 01/07/23								
6	CASITA PARA ALMACEN Y GUARDIANA	2 días	3,414.60	sáb 01/07/23	lun 03/07/23								
7	MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS DE OBRA	3 días	20,000.00	sáb 01/07/23	mar 04/07/23								
8	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	90 días	21,705.85	sáb 01/07/23	dom 24/09/23								
9	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2 días	4,000.00	sáb 01/07/23	lun 03/07/23								
10	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	90 días	12,259.00	sáb 01/07/23	dom 24/09/23								
11	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	90 días	1,400.00	sáb 01/07/23	dom 24/09/23								
12	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	90 días	3,946.05	sáb 01/07/23	dom 24/09/23								
13	CONSTRUCCION DE PISTAS	117 días	1,486,386.83	dom 02/07/23	vie 20/10/23								
14	TRABAJOS PRELIMINARES	90 días	136,528.75	dom 02/07/23	lun 25/09/23								
15	TRAZO Y REPLANTO PRELIMINAR	90 días	24,660.40	dom 02/07/23	lun 25/09/23								
16	PLETE TERRESTRE PARA LA QUEMAZON	30 días	105,868.35	dom 02/07/23	lun 31/07/23								
17	MOVIMIENTO DE TIERRAS	10 días	30,873.84	lun 03/07/23	jue 13/07/23								
18	CORTE DE MATERIAL SUPERFICIE EQUIPO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE	10 días	20,872.94	lun 03/07/23	jue 13/07/23								
19	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	35 días	185,588.59	jue 13/07/23	mar 15/08/23								
20	ESCARIFICADO DE SUBRASANTE	3 días	9,751.19	jue 13/07/23	dom 16/07/23								
21	RECONFORMACION DE SUBRASANTE	3 días	9,363.86	dom 16/07/23	mar 18/07/23								
22	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL TIPO HOMOCOM E-4-20M	3 días	47,799.35	mar 18/07/23	vie 21/07/23								
23	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE	6 días	22,013.59	vie 21/07/23	jue 27/07/23								
24	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO DP-5m	20 días	96,862.80	jue 27/07/23	mar 15/08/23								
25	PAVIMENTO	10 días	168,656.40	vie 21/07/23	lun 31/07/23								
26	BASE GRANULAR E-0-20 AREND-1000 MZDA FACT COMPACT=1.25	10 días	160,756.40	vie 21/07/23	lun 31/07/23								
27	PAVIMENTO RIGIDO E-0-20 M	51 días	537,278.41	sáb 02/09/23	vie 20/10/23								
28	CONCRETO fte-210 kg/cm2 PARA LOSA	51 días	537,278.41	sáb 02/09/23	vie 20/10/23								
29	PAVIMENTO RIGIDO E-0-15 M	51 días	318,239.44	sáb 02/09/23	vie 20/10/23								
30	CONCRETO fte-210 kg/cm2 PARA LOSA	35 días	204,125.81	dom 03/09/23	jue 05/10/23								
31	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS	51 días	114,113.53	sáb 02/09/23	vie 20/10/23								
32	JUNTAS DE DILATACION CON DOMELS	51 días	128,464.00	dom 03/09/23	vie 20/10/23								
33	ACERO LOSO 6x4.200 kg/cm2	30 días	25,943.55	dom 03/09/23	dom 01/10/23								
34	INSTALACION DE DOMELS EN PAVIMENTO	51 días	29,888.79	dom 03/09/23	vie 20/10/23								
35	JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA E-1"	15 días	48,405.12	jue 08/10/23	vie 20/10/23								
36	CIRADO DE CANALLETAS CON ADITIVO	51 días	25,416.55	dom 03/09/23	vie 20/10/23								



Proyecto: Presupuesto 2013.51
Fecha: jue 08/06/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

ID	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	01 abril 19/03	30/04	01 julio 11/06	23/07	01 octubre 03/09	15/10	28/11	01
37	SEÑALIZACION	7 días	4,333.50	lun 09/10/23	lun 16/10/23								
38	MARCOS SOBRE EL PAVIMENTO	7 días	3,201.89	lun 09/10/23	lun 16/10/23								
39	PINTADO DE LINEAS DISCONTINUAS	7 días	1,091.61	lun 09/10/23	lun 16/10/23								
40	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y BERMAS	98 días	961,871.66	vie 21/07/23	sab 24/10/23								
41	TRABAJOS PRELIMINARES	30 días	83,986.08	vie 21/07/23	vie 18/08/23								
42	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	30 días	17,404.68	vie 21/07/23	vie 18/08/23								
43	PLATE TERRESTRE PARA LA QUEMACION	4 días	66,615.40	vie 21/07/23	mar 25/07/23								
44	MOVIMIENTO DE TIERRAS	32 días	198,591.15	vie 21/07/23	dom 20/08/23								
45	VEREDAS	32 días	117,839.67	vie 21/07/23	dom 20/08/23								
46	CORTE DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUBRASANTE	30 días	21,665.86	vie 21/07/23	vie 18/08/23								
47	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE	10 días	19,264.15	sab 22/07/23	mar 01/08/23								
48	BASE DE AFIRMADO PARA VEREDA DE CONCRETO E-4*	30 días	58,346.28	dom 23/07/23	dom 20/08/23								
49	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO DP+ 3km	10 días	15,563.07	dom 23/07/23	mar 01/08/23								
50	BERMAS	22 días	80,741.68	dom 23/07/23	dom 13/08/23								
51	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE CUPO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE	4 días	9,868.07	dom 23/07/23	jue 27/07/23								
52	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE	4 días	6,048.52	jue 27/07/23	lun 31/07/23								
53	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO DP+ 3km	10 días	29,964.74	lun 31/07/23	mié 09/08/23								
54	BASE GRANULAR E-4* 15 MCM=100 M2/DA FACT COMPACT+ 75	4 días	34,829.35	mié 09/08/23	dom 13/08/23								
55	CONCRETO SIMPLE	74 días	680,217.57	dom 13/08/23	sab 24/10/23								
56	VEREDAS	35 días	428,172.54	dom 13/08/23	vie 15/09/23								
57	VEREDA DE CONCRETO F-C-175 MCM=2 E-4 PASTA 1:2 (ENCUPO ACABADO)	30 días	231,684.18	lun 14/08/23	lun 11/09/23								
58	SARDINEL DE VEREDA DE CONCRETO F-C-175 MCM=2 H=9.4M	30 días	64,792.48	lun 14/08/23	lun 11/09/23								
59	ENCORRADO DE SARDINEL H=9.4M	30 días	57,556.75	lun 14/08/23	lun 11/09/23								
60	RAPIA DE CONCRETO F-C-175 MCM=2 BRUNADO SEGUN DISEÑO	4 días	1,835.32	lun 14/08/23	jue 17/08/23								
61	JUNTA DE DILATACION EN VEREDA E-1/2*	14 días	5,733.81	vie 18/08/23	jue 31/08/23								
62	CURADO DE CONCRETO	30 días	10,191.05	vie 18/08/23	vie 15/09/23								
63	NIVELACION DE CALA DE DESAGUE EXISTENTE	20 días	16,882.00	dom 13/08/23	vie 01/09/23								
64	NIVELACION DE CALA DE AGUA EXISTENTE	20 días	11,456.35	dom 13/08/23	vie 01/09/23								
65	BERMAS	60 días	237,911.68	mié 23/08/23	jue 19/10/23								
66	COLOCACION DE MAMPONERIA DE BERMAS	60 días	230,886.94	mié 23/08/23	jue 19/10/23								
67	CURADO DE CONCRETO	60 días	6,544.74	mié 23/08/23	jue 19/10/23								
68	SEÑALIZACION	20 días	20,681.83	mié 20/09/23	lun 09/10/23								
69	PINTADO DE SARDINEL DE VEREDA	20 días	20,681.83	mié 20/09/23	lun 09/10/23								
70	VAROS	6 días	1,451.52	lun 16/10/23	sab 21/10/23								
71	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	6 días	1,451.52	lun 16/10/23	sab 21/10/23								
72	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y BERMAS	46 días	55,382.21	jue 17/08/23	vie 29/09/23								
73	TRABAJOS PRELIMINARES	7 días	2,278.11	jue 17/08/23	mié 23/08/23								
74	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	5 días	133.11	jue 17/08/23	lun 21/08/23								
75	PLATE TERRESTRE PARA LA QUEMACION	2 días	2,145.00	lun 21/08/23	mié 23/08/23								

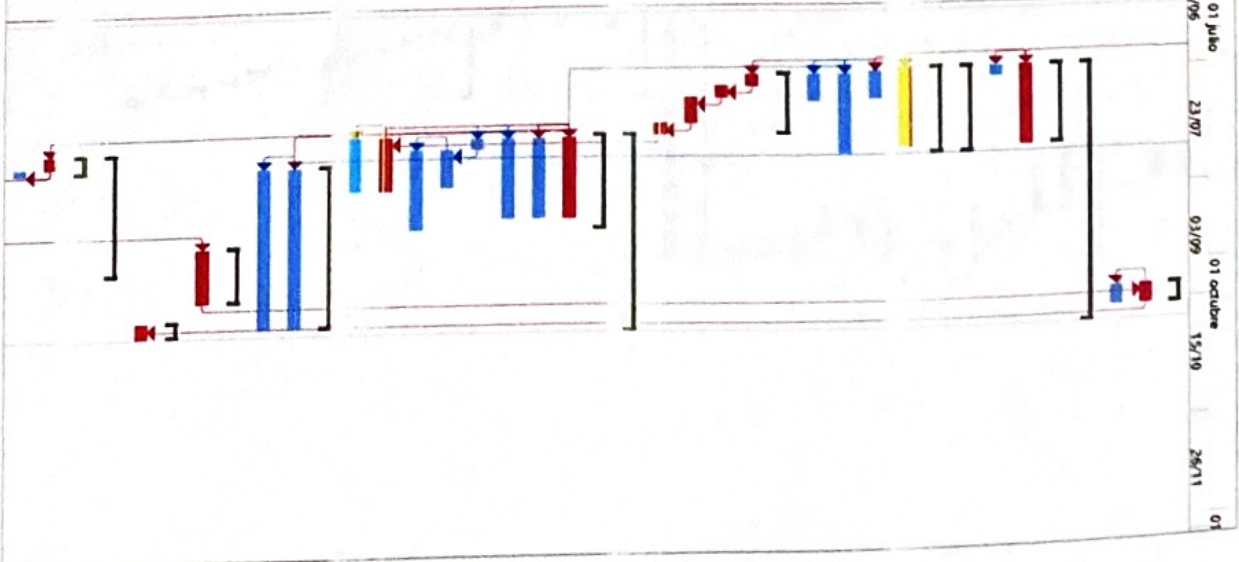


Proyecto: Presupuesto 2013 S1
Fecha: jue 08/06/23

Tarea: ☐ Tarea inactiva
 División: ☐ Resumen inactivo
 Hito: ☐ Resumen inactivo
 Resumen: ☐ Resumen inactivo
 Resumen del proyecto: ☐ Resumen inactivo

Informe de resumen manual: ☐ Resumen manual
 Hito externo: ☐ Hito externo
 Fecha límite: ☐ Fecha límite
 Tareas críticas: ☐ Tareas críticas
 División crítica: ☐ División crítica
 Progreso: ☐ Progreso

Id	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	01 abril 19/03	30/04	01 julio 17/06	23/07	01 octubre 09/09	19/10	26/11	01
76	MOVIMIENTO DE TIERRAS	12 días	1.154,15	lun 21/08/23	sáb 02/09/23								
77	EXCAVACION DE SARDINEL PERALTADO	10 días	54,68	lun 21/08/23	jue 31/08/23								
78	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO DP= 5m	2 días	610,47	jue 31/08/23	sáb 02/09/23								
79	CONCRETO SIMPLE	40 días	44.283,37	mar 22/08/23	vie 29/09/23								
80	SARDINEL PERALTADO CARAVISTA CONCRETO HC-1/3 AGUJAZ H=3,40 m	20 días	21.008,55	mar 22/08/23	dom 10/09/23								
81	SARDINEL PERALTADO CARAVISTA ENCONTRADO Y DESCONTRADO	20 días	26.634,29	mar 22/08/23	dom 10/09/23								
82	ALTA DE DILATACION DE SARDINEL E=1/2"	5 días	118,24	dom 10/09/23	vie 15/09/23								
83	CURADO DE CONCRETO	20 días	522,29	dom 10/09/23	vie 29/09/23								
84	SEÑALIZACION	5 días	1.585,48	mié 20/09/23	lun 25/09/23								
85	PERALTADO DE SARDINEL PERALTADO CARAVISTA	5 días	3.585,58	mié 20/09/23	lun 25/09/23								
86	HABILITACION DE AREAS VERDES	15 días	13.454,42	lun 11/09/23	lun 25/09/23								
87	TRABAJOS PRELIMINARES	5 días	3.343,61	lun 11/09/23	sáb 16/09/23								
88	TRAZO Y REPLANTEO	5 días	3.343,61	lun 11/09/23	sáb 16/09/23								
89	MOVIMIENTO DE TIERRAS	10 días	16.113,31	sáb 16/09/23	lun 25/09/23								
90	CORTE DE MATERIAL SUELO CIEQUPO HASTA NIVEL DE SOBRESANTE	5 días	2.583,66	sáb 16/09/23	mié 20/09/23								
91	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO DP= 5m	5 días	7.530,25	mié 20/09/23	lun 25/09/23								
92	MEDIO AMBIENTE	90 días	20.664,00	lun 03/07/23	mar 26/09/23								
93	RIEGO PERMANENTE PARA EVITAR POLVO	90 días	20.664,00	lun 03/07/23	mar 26/09/23								
94	PLAN COVID 19	30 días	27.905,73	sáb 01/07/23	sáb 29/07/23								
95	ELABORACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO	4 días	3.000,00	sáb 01/07/23	mar 04/07/23								
96	ELABORACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO	4 días	1.512,34	sáb 01/07/23	mar 04/07/23								
97	LIMPIEZA Y DESINFECTACION DE ZONAS LABORALES ANTES DE INICIO DE LABORES	4 días	28.675,81	sáb 01/07/23	mar 04/07/23								
98	LIMPIEZA Y DESINFECTACION DE ZONAS LABORALES ANTES DE INICIO DE LABORES	26 días	28.675,81	mar 04/07/23	sáb 29/07/23								
99	ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DE TRABAJO	3 días	242,24	mar 04/07/23	vie 07/07/23								
100	ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE ESPERA	2 días	1.388,14	vie 07/07/23	dom 09/07/23								
101	ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL	2 días	1.388,14	dom 09/07/23	mar 14/07/23								
102	ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE DESINFECTACION	2 días	1.388,14	mar 14/07/23	jue 19/07/23								
103	ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CASTILLOS	1 día	2.385,14	jue 19/07/23	vie 24/07/23								
104	ACONDICIONAMIENTO DE ZONA ROLA	3 días	1.507,34	vie 24/07/23	dom 26/07/23								
105	ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE OFICINAS	3 días	4.485,34	dom 26/07/23	mié 29/07/23								
106	ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE COMEDOR	3 días	1.785,88	mié 29/07/23	sáb 31/07/23								
107	ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE ALMACEN	3 días	1.289,34	sáb 31/07/23	lun 03/08/23								
108	ACONDICIONAMIENTO DE ZONA ALBERGUES DE OBRA	3 días	837,14	lun 03/08/23	mié 06/08/23								
109	ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE ATENCION COMUN	3 días	955,34	mié 06/08/23	sáb 09/08/23								
110	ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE BAÑOS	3 días	2.717,88	sáb 09/08/23	dom 12/08/23								
111	REDES PREVENTIVAS COLECTIVAS	4 días	2.271,20	dom 12/08/23	sáb 18/08/23								
112	EVALUACION DE LA CALIDAD DEL SALUD DEL TRABAJADOR	4 días	2.271,20	sáb 18/08/23	sáb 25/08/23								

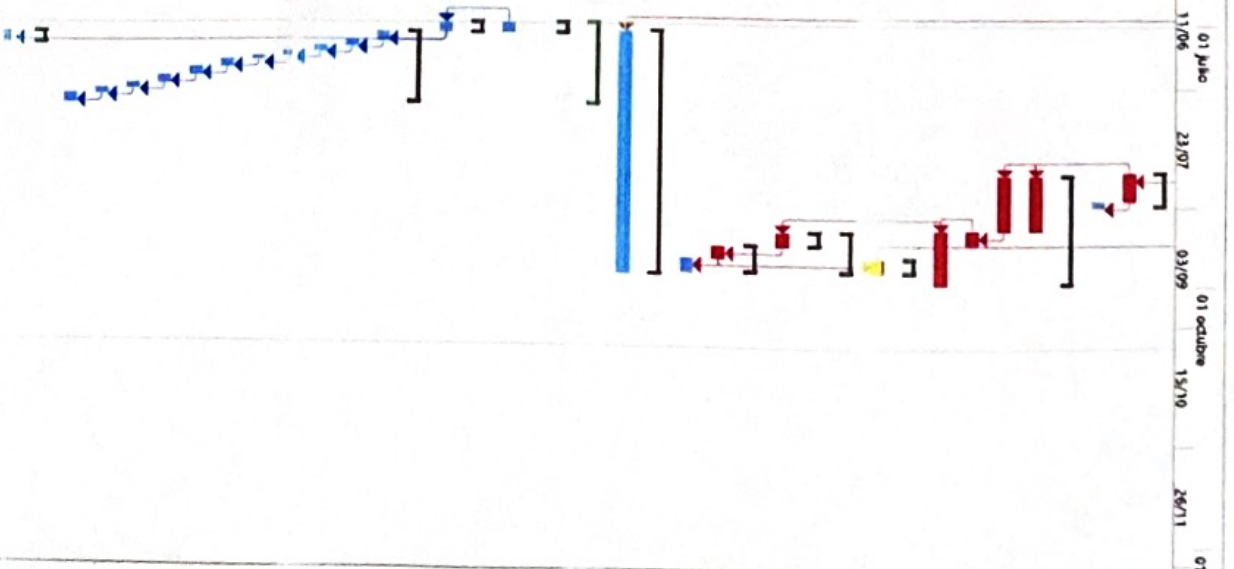

Proyecto: Presupuesto 2013.51
Fecha: jue 08/06/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso
