

EDT		Nombre de tarea	Duración	Costo	Predecesoras	Fin	S-2	S-1	M1	S2	S3	S4	S5	M2	S6	S7	S8	S9	M3	S10	S11	S12	S13	M4	S14	S15
0	0	"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA LOS RUBÍES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. "D" Y AV. BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA". CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2643034	90 días	S/ 2,405,026.79		lun 31/03/25																				
1	1	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	20 días	S/ 79,394.52		lun 20/01/25																				
2	1.1	OBRAS PROVICIONALES	1 día	S/ 10,575.64		mié 01/01/25																				
3	1.1.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m	1 día	S/ 1,575.64		mié 01/01/25																				
4	1.1.2	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN DE OBRA	1 día	S/ 9,000.00	3CC	mié 01/01/25																				
5	1.2	TRABAJOS PRELIMINARES	20 días	S/ 18,016.71		lun 20/01/25																				
6	1.2.1	PODA DE ARBOLES	1 día	S/ 1,749.00	3CC	mié 01/01/25																				
7	1.2.2	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EJECUCION DE OBRA	20 días	S/ 16,267.71	3CC	lun 20/01/25																				
8	1.3	INSTALACIONES PROVISIONALES	1 día	S/ 4,500.00		mié 01/01/25																				
9	1.3.1	ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES ESTÁNDAR (INC. LAVAMANOS)	1 día	S/ 4,500.00	3CC	mié 01/01/25																				
10	1.4	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2 días	S/ 7,840.44		jue 02/01/25																				
11	1.4.1	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	2 días	S/ 7,840.44	3CC	jue 02/01/25																				
12	1.5	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	2 días	S/ 1,611.86		jue 02/01/25																				
13	1.5.1	DESMONTAJE Y REMOCIÓN DE CERCOS Y TECHOS DE LA VIA	2 días	S/ 1,611.86	3CC	jue 02/01/25																				
14	1.6	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	20 días	S/ 36,849.87		lun 20/01/25																				
15	1.6.1	ELABORACION, INPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6 días	S/ 7,231.50	3CC	lun 06/01/25																				
16	1.6.2	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	6 días	S/ 6,206.43	15CC	lun 06/01/25																				
17	1.6.3	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	20 días	S/ 15,493.10	16CC	lun 20/01/25																				
18	1.6.4	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	20 días	S/ 1,818.14	17CC	lun 20/01/25																				
19	1.6.5	TRANQUERA DE MADERA PARA CIERRE DE AVENIDA DE 1.2 m	2 días	S/ 2,250.00	18CC	jue 02/01/25																				
20	1.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES TRANSITORIAS	2 días	S/ 3,480.59	19CC	jue 02/01/25																				
21	1.6.7	CERCO MALLA HDP DE 1 m. DE ALTURA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA	1 día	S/ 370.11	20CC	mié 01/01/25																				
22	2	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	23 días	S/ 55,121.91		jue 23/01/25																				
23	2.1	PREVENCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES	4 días	S/ 7,036.71		sáb 04/01/25																				
24	2.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN OBRA	4 días	S/ 1,219.80	21CC	sáb 04/01/25																				
25	2.1.2	SEÑALIZACION AMBIENTAL	4 días	S/ 5,816.91	24CC	sáb 04/01/25																				
26	2.2	MITIGACION DE LOS IMPACTOS EN EL MEDIO AMBIENTE	23 días	S/ 48,085.20		jue 23/01/25																				
27	2.2.1	CONTROL DE POLVOS (RIEGO DE AGUA A FRENTES DE TRABAJO Y CAMINOS DE ACCESO A LA ZONA DE INTERVENCION)	15 días	S/ 40,345.20	25CC+8 días	jue 23/01/25																				
28	2.2.2	MONITOREO DE CALIDAD DEL MEDIO FISICO Y BIOLOGICO	3 días	S/ 5,000.00	27CC	sáb 11/01/25																				
29	2.2.3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2 días	S/ 1,440.00		jue 02/01/25																				
30	2.2.4	RESTAURACION DE ZONAS AFECTADAS	2 días	S/ 1,300.00		jue 02/01/25																				
31	3	SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	33 días	S/ 325,620.58		lun 03/02/25																				
32	3.1	SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE	26 días	S/ 143,105.58		lun 27/01/25																				
33	3.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	6 días	S/ 19,935.80		mar 07/01/25																				
34	3.1.1.1	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO	5 días	S/ 1,997.82	3CC+1 día	lun 06/01/25																				
35	3.1.1.2	DESMONTAJE Y ACARREO DE TUBERIA EXISTENTE	4 días	S/ 3,137.99	34CC	dom 05/01/25																				
36	3.1.1.3	DESMONTAJE Y ACARREO DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EXISTENTE	4 días	S/ 265.60	35CC+1 día	lun 06/01/25																				
37	3.1.1.4	DESMONTAJE Y ACARREO DE ACCESORIOS EXISTENTES	4 días	S/ 355.20	36CC+1 día	mar 07/01/25																				
38	3.1.1.5	PUENTE DE MADERA PROVISIONAL P/ PASE PEATONAL	4 días	S/ 3,874.40	37CC	mar 07/01/25																				
39	3.1.1.6	CACHACOS DE CONCRETO Y CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA	4 días	S/ 1,920.00	36CC	lun 06/01/25																				
40	3.1.1.7	EXTRACCION DE TUBERIA EXISTENTE DE AGUA DE Ø110MM Y 160MM	4 días	S/ 8,384.79	39CC	lun 06/01/25																				
41	3.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	25 días	S/ 42,954.76		lun 27/01/25																				
42	3.1.2.1	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL C/EQUIPO A=0.60M	3 días	S/ 9,615.77	34CC+1 día	dom 05/01/25																				
43	3.1.2.2	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA A=0.60 m.	2 días	S/ 2,603.22	42	mar 07/01/25																				
44	3.1.2.3	CAMA DE MATERIAL PROPIO P/TUBERIA E=0.10M. DE DN 110 A 160 MM	3 días	S/ 6,265.89	43CC	mié 08/01/25																				
45	3.1.2.4	RELLENO PROTECTOR C/MAT. PROPIO ZARANDEADO HASTA H=0.30M, S/CLAVE DE TUBERIA DN 160 MM, A=0.60M	4 días	S/ 10,806.39	53	jue 23/01/25																				
46	3.1.2.5	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA P/TUBERIA CON MATERIAL PROPIO C/MAQUINARIA	8 días	S/ 11,512.69	45CC	lun 27/01/25																				
47	3.1.2.6	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE C/EQUIPO Dprom = 15km	4 días	S/ 2,150.80	45	lun 27/01/25																				
48	3.1.3	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE PVC ISO 16422	2 días	S/ 34,235.37		mar 07/01/25																				
49	3.1.3.1	SUMIN. DE TUB. UF PVC NTP ISO 16422 PN 8 DN 160MM	2 días	S/ 34,235.37	44CC	mar 07/01/25																				
50	3.1.4	INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC ISO 16422	10 días	S/ 4,641.40		vie 17/01/25																				
51	3.1.4.1	INST. DE TUB. UF PVC NTP ISO 16422 PN 8 DN 160MM	10 días	S/ 4,641.40	49	vie 17/01/25																				
52	3.1.5	PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION	2 días	S/ 2,724.30		dom 19/01/25																				
53	3.1.5.1	DOBLE PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUB. DN 160MM	2 días	S/ 2,724.30	51	dom 19/01/25																				
54	3.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS	10 días	S/ 6,733.95		vie 17/01/25																				
55	3.1.6.1	SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC-UF C-10 160MM	10 días	S/ 1,651.95	51CC	vie 17/01/25																				
56	3.1.6.2	SUMINISTRO E INST. DE CODO 90° PVC-UF C-10 160MM	10 días	S/ 205.56	55CC	vie 17/01/25																		</		

Proyecto: "AMPLIACIÓN DEL SE  
Fecha: jue 10/04/25

Tarea

División

Hito

.....

◆

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

◇

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

C

solo fin

Fecha límite

Tarea crítica

◻

Progreso



EDT		Nombre de tarea	Duración	Costo	Predecesoras	Fin	S-2	S-1	M1	S1	S2	S3	S4	S5	M2	S6	S7	S8	S9	M3	S10	S11	S12	S13	M4	S14	S15
58	3.1.6.4	SUMINISTRO E INST. VALVULA COMPUERTA H° DUCTIL ISO 7259 D=160MM CON MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL	10 días	S/ 3,710.40	57CC	vie 17/01/25																					
59	3.1.7	EMPALMES DE RED PROYECTADA A TUBERIA EXISTENTE	6 días	S/ 2,236.20		sáb 18/01/25																					
60	3.1.7.1	EMPALMES DE RED PROYECTADA Ø 160 MM A EXISTENTE AC Ø 110MM	6 días	S/ 1,083.42	58CC+5 días	sáb 18/01/25																					
61	3.1.7.2	EMPALMES DE RED PROYECTADA Ø 160 MM A EXISTENTE AC Ø 160MM	6 días	S/ 366.90	60CC	sáb 18/01/25																					
62	3.1.7.3	EMPALMES DE RED PROYECTADA Ø 160 MM A EXISTENTE AC Ø 200MM	6 días	S/ 785.88	61CC	sáb 18/01/25																					
63	3.1.8	CONEXIONES DOMICILIARIAS	12 días	S/ 29,643.80		dom 26/01/25																					
64	3.1.8.1	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO	1 día	S/ 277.20	62CC+2 días	mié 15/01/25																					
65	3.1.8.2	EXCAVACION NORMAL EN TN PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS P/AGUA	3 días	S/ 1,163.40	64CC	vie 17/01/25																					
66	3.1.8.3	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL	3 días	S/ 581.00	65CC+1 día	sáb 18/01/25																					
67	3.1.8.4	CAMA DE ARENA MANUAL E=0.10M ZANJA P/TUB. CONEX. DOMIC.	3 días	S/ 1,062.60	66CC	sáb 18/01/25																					
68	3.1.8.5	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO CON. DOM.	3 días	S/ 1,372.00	69	dom 26/01/25																					
69	3.1.8.6	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN CONEXION DOMICILIARIA	1 día	S/ 226.80	70	jue 23/01/25																					
70	3.1.8.7	CONEXION DOMICILIARIA CORTA DE RED DE AGUA POTABLE DN 160MM PVC A DN 1/2"	6 días	S/ 12,979.20	67CC+1 día	mié 22/01/25																					
71	3.1.8.8	SUMINISTRO DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE	8 días	S/ 5,066.80	70CC	vie 24/01/25																					
72	3.1.8.9	AFERICION DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE	8 días	S/ 720.00	71CC	vie 24/01/25																					
73	3.1.8.10	INSTALACION DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE	8 días	S/ 3,363.60	72CC	vie 24/01/25																					
74	3.1.8.11	LOSA DE CONCRETO DE 1.00 X 1.00 x 0.15M PARA ESTABILIZAR CAJA DE AGUA Y DESAGUE FC=175 KG/CM2	8 días	S/ 2,831.20	73CC	vie 24/01/25																					
75	3.2	SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO	29 días	S/ 182,515.00		lun 03/02/25																					
76	3.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES	4 días	S/ 4,659.10		jue 09/01/25																					
77	3.2.1.1	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO	4 días	S/ 801.90	34CC+4 días	jue 09/01/25																					
78	3.2.1.2	PUENTE DE MADERA PROVISIONAL P/ PASE PEATONAL	2 días	S/ 1,937.20	77CC	mar 07/01/25																					
79	3.2.1.3	CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA	2 días	S/ 1,920.00	78CC	mar 07/01/25																					
80	3.2.2	OBRAS PRELIMINARES	3 días	S/ 10,015.57		mié 08/01/25																					
81	3.2.2.1	REPOSICION TEMPORAL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	1 día	S/ 466.80	77CC	lun 06/01/25																					
82	3.2.2.2	PROTECCION DE REDES EXISTENTES DE TELEFONIA INC. RETIRO Y REPOSICION DE CAJAS TELEFONICAS	3 días	S/ 5,798.40	81CC	mié 08/01/25																					
83	3.2.2.3	DESMONTAJE Y ACARREO DE TUBERIA EXISTENTE 8"	3 días	S/ 2,515.05	82CC	mié 08/01/25																					
84	3.2.2.4	DESMONTAJE Y ACARREO DE CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE EXISTENTE	3 días	S/ 565.60	83CC	mié 08/01/25																					
85	3.2.2.5	RETIRO Y ACARREO DE BUZONES EXISTENTES Hprom=1.50M	3 días	S/ 669.72	84CC	mié 08/01/25																					
86	3.2.3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	16 días	S/ 63,716.84		jue 23/01/25																					
87	3.2.3.1	EXCAVACION PARA BUZONES PARA H<3.00	2 días	S/ 442.12	77CC+2 días	jue 09/01/25																					
88	3.2.3.2	EXCAVACION C/EQUIPO ALCANTARILLADO HPROM <1.50M	4 días	S/ 5,208.30	87CC	sáb 11/01/25																					
89	3.2.3.3	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=1.50M	3 días	S/ 895.05	88CC+2 días	dom 12/01/25																					
90	3.2.3.4	CAMA DE APOYO CON ARENA DE E=10cm, HASTA H=2.00M	4 días	S/ 4,689.90	89CC	lun 13/01/25																					
91	3.2.3.5	RELLENO PROTECTOR C/MAT. PROPIO ZARANDEADO HASTA H=0.30M, S/CLAVE DE TUB. DESAGUE HASTA H<2.00	3 días	S/ 5,414.85	98	sáb 18/01/25																					
92	3.2.3.6	RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 1.50M	3 días	S/ 14,511.15	91CC	sáb 18/01/25																					
93	3.2.3.7	ENTIBADO/DESENTIBADO METALICO H=1.00M A 2.00M	10 días	S/ 29,135.70	88CC	vie 17/01/25																					
94	3.2.3.8	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE C/EQUIPO Dprom = 15km	5 días	S/ 3,419.77	92	jue 23/01/25																					
95	3.2.4	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO	2 días	S/ 19,954.35		sáb 11/01/25																					
96	3.2.4.1	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP ISO 4435 SN8 D=200 mm	2 días	S/ 19,954.35	90CC	sáb 11/01/25																					
97	3.2.5	INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO	4 días	S/ 2,523.15		mié 15/01/25																					
98	3.2.5.1	INST. DE TUBERIA PVC DESAGUE U.F NTP ISO 4435 SN8 DN 200MM	4 días	S/ 2,523.15	96	mié 15/01/25																					
99	3.2.6	PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA	2 días	S/ 1,607.85		vie 17/01/25																					
100	3.2.6.1	PRUEBA HIDRAULICA MAS ESCORRENTIA PARA TUBERIA DE DESAGUE DN=200MM	2 días	S/ 1,607.85	98	vie 17/01/25																					
101	3.2.7	BUZONES	13 días	S/ 15,661.29		vie 24/01/25																					
102	3.2.7.1	BUZONES DE INSPECCION	8 días	S/ 13,628.34		dom 19/01/25																					
103	3.2.7.1.1	CONCRETO PARA SOLADO DE BUZONES f'c=100 kg/cm2 E=4"	2 días	S/ 1,160.88	98CC	lun 13/01/25																					
104	3.2.7.1.2	BUZON Ø=1.00M HASTA H=1.50M F'C=280 kg/cm2	8 días	S/ 12,467.46	103CC	dom 19/01/25																					
105	3.2.7.2	DADOS DE ANCLAJE DE TUBERIA	5 días	S/ 2,032.95		vie 24/01/25																					
106	3.2.7.2.1	DADOS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 0.50 x 0.50 x 0.50	5 días	S/ 2,032.95	104	vie 24/01/25																					
107	3.2.8	CONEXIONES DOMICILIARIAS	17 días	S/ 64,376.85		lun 03/02/25																					
108	3.2.8.1	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO	1 día	S/ 976.69	100	sáb 18/01/25																					
109	3.2.8.2	EXCAVACION PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS P/ALCANTARILLADO	4 días	S/ 11,010.01	108	mié 22/01/25																					
110	3.2.8.3	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=1.50M	2 días	S/ 1,090.15	109	vie 24/01/25																					
111	3.2.8.4	CAMA DE APOYO CON ARENA DE E=10cm, HASTA H=2.00M	6 días	S/ 5,712.18	110	jue 30/01/25																					

Proyecto: "AMPLIACIÓN DEL SE  
Fecha: jue 10/04/25

Tarea

División

Hito

.....

◆

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

◇

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

┌

solo fin


Fecha límite

Tarea crítica

┐

△

Progreso

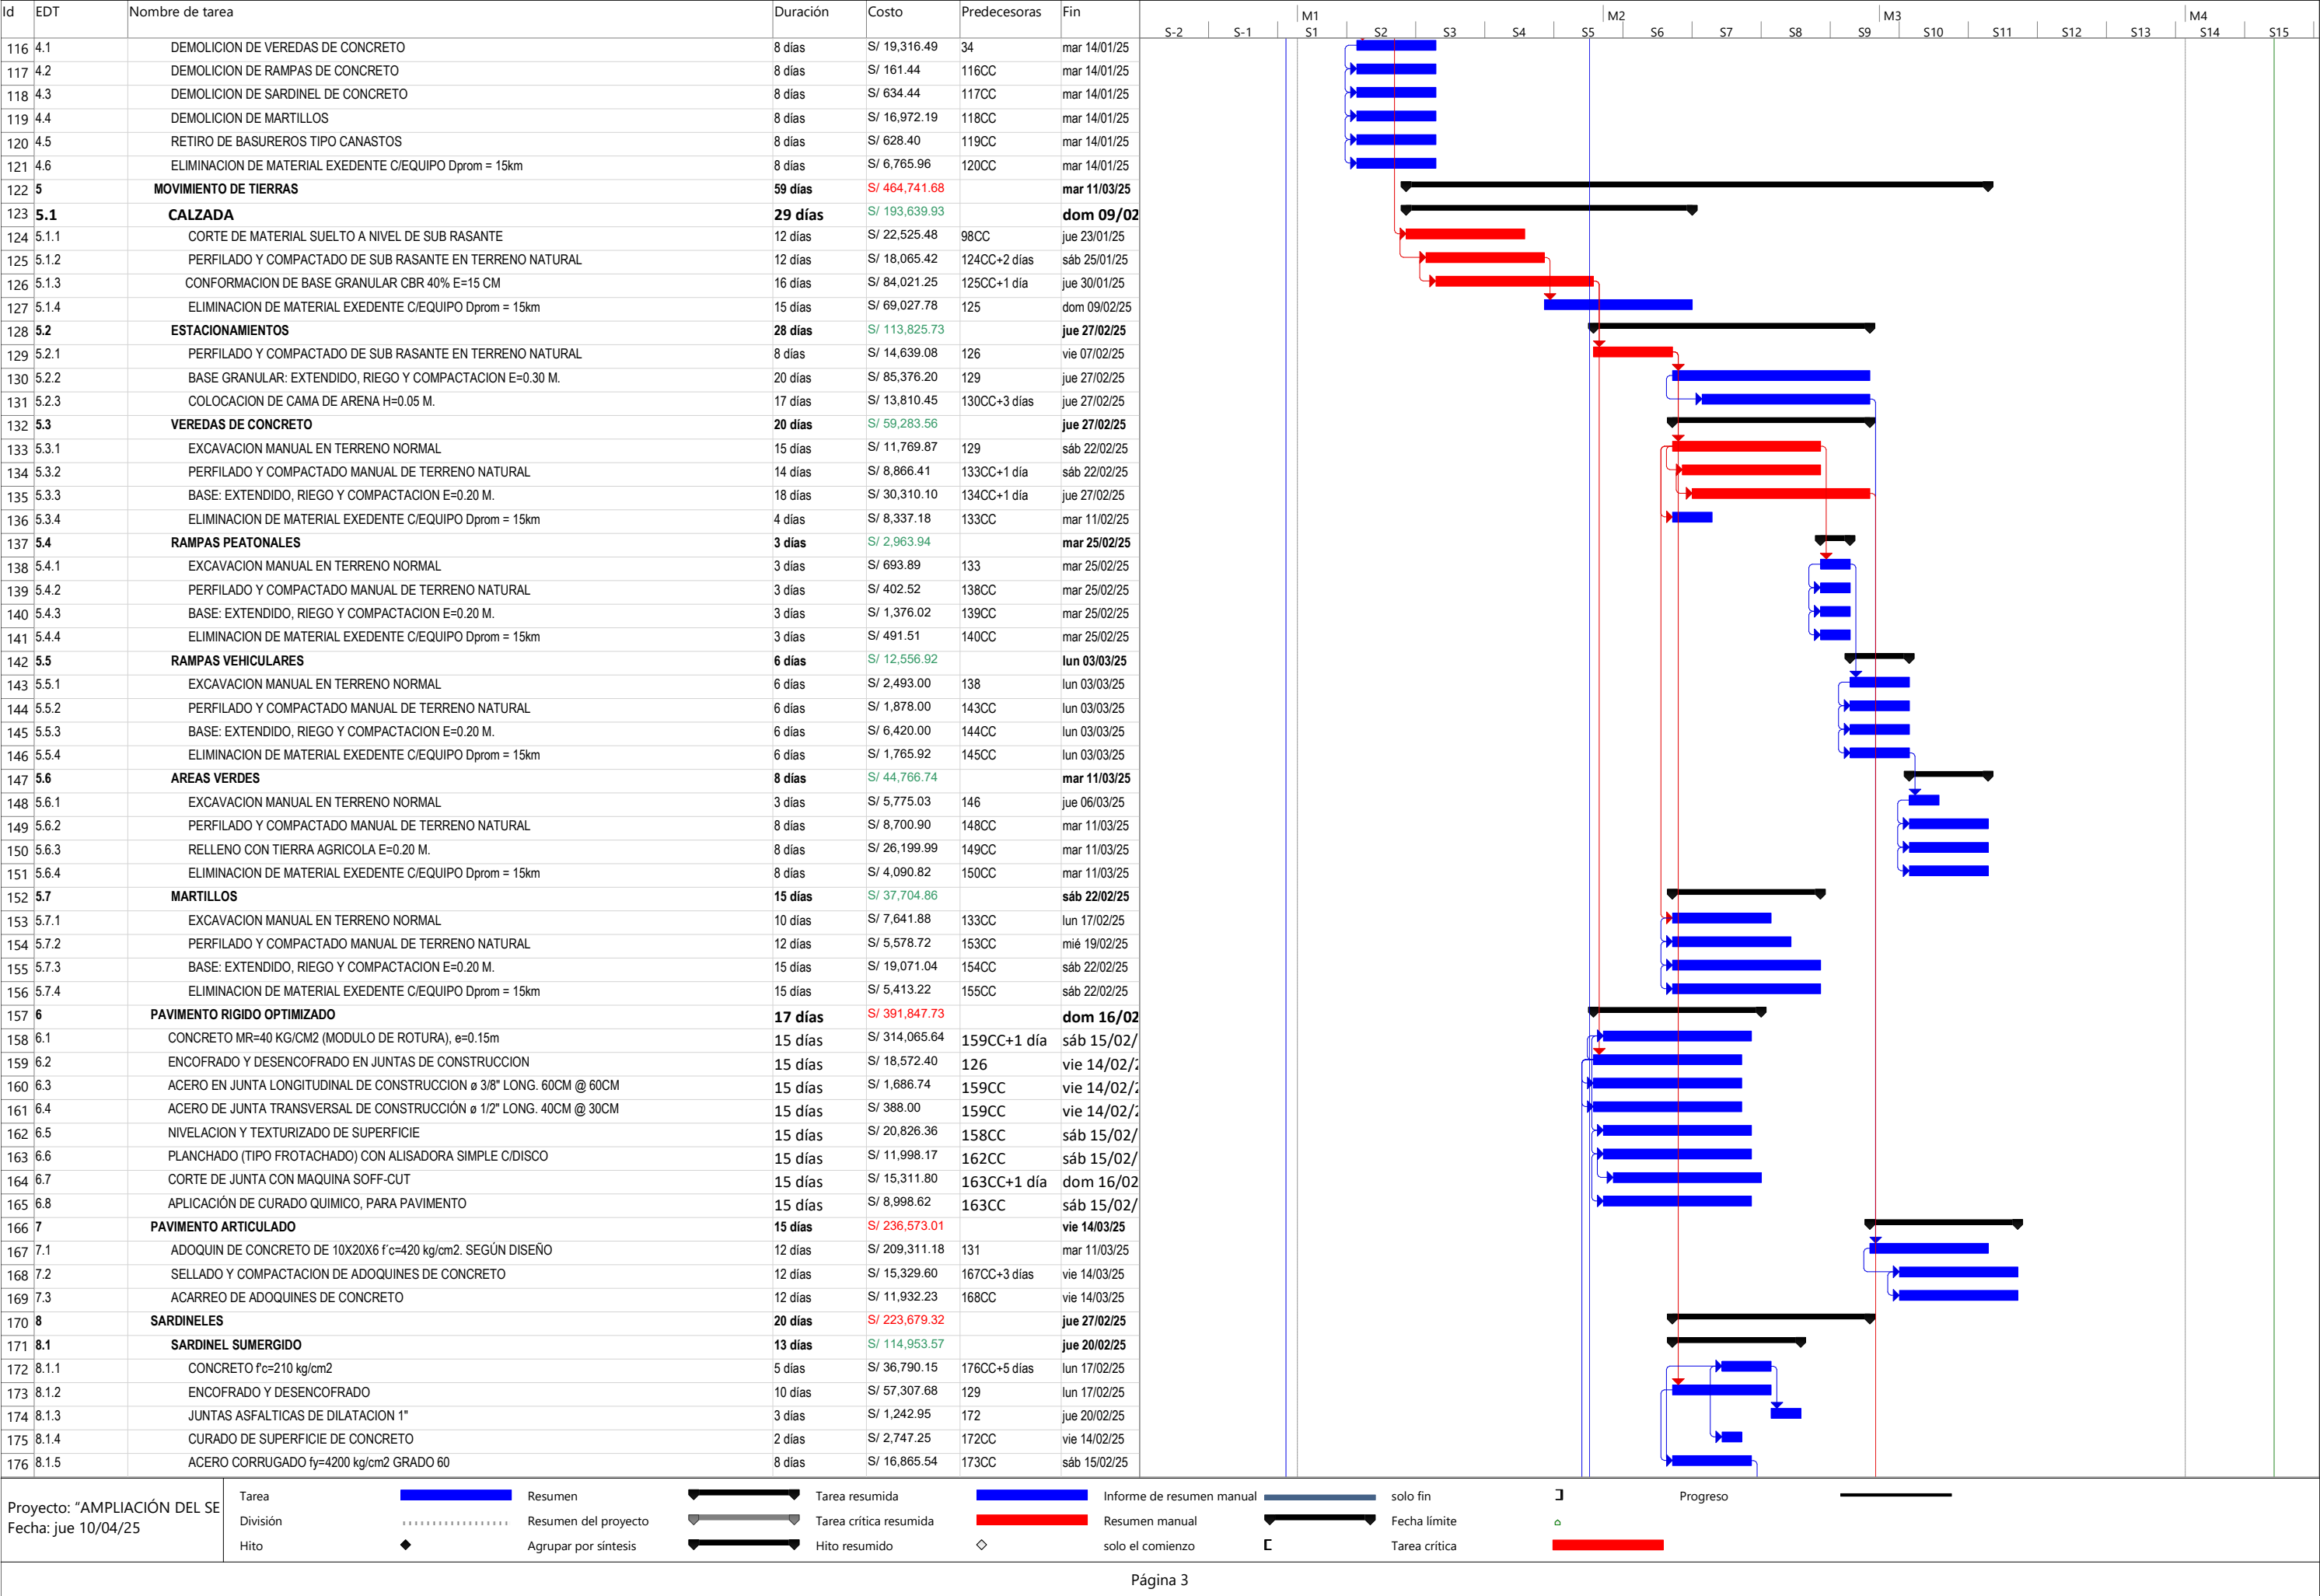

Página 3

id		EDT	Nombre de tarea	Duración	Costo	Predecesoras	Fin	S-2				S-1				M1				M2				M3				M4			
								S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15									
177	8.2		SARDINEL PERALTADO	12 días	S/ 108,725.75		jue 27/02/25																								
178	8.2.1		CONCRETO f'c=210 kg/cm2	7 días	S/ 34,883.64	179CC+3 días	jue 27/02/25																								
179	8.2.2		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	10 días	S/ 54,775.84	182CC+2 días	jue 27/02/25																								
180	8.2.3		JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION 1"	10 días	S/ 1,160.08	179CC	jue 27/02/25																								
181	8.2.4		CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO	5 días	S/ 2,490.96	178CC	mar 25/02/25																								
182	8.2.5		ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	8 días	S/ 15,415.23	176	dom 23/02/25																								
183	9		VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	25 días	S/ 410,298.70		lun 24/03/25																								
184	9.1		VEREDAS	25 días	S/ 316,930.09		lun 24/03/25																								
185	9.1.1		VEREDA CONCRETO f'c=175 kg/cm2-INC. BRUÑADO	6 días	S/ 89,060.72	187CC+4 días	dom 09/03/25																								
186	9.1.2		UÑAS CONCRETO f'c=175 kg/cm2-INC. BRUÑADO	6 días	S/ 28,948.52	185CC	dom 09/03/25																								
187	9.1.3		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	10 días	S/ 13,913.35	135	dom 09/03/25																								
188	9.1.4		JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION 1"	8 días	S/ 4,102.30	187CC+2 días	dom 09/03/25																								
189	9.1.5		CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO	6 días	S/ 3,848.54	185CC	dom 09/03/25																								
190	9.1.6		SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSAS PODOTACTILES	15 días	S/ 177,056.66	185	lun 24/03/25																								
191	9.2		RAMPAS PEATONALES	3 días	S/ 7,419.01		mié 12/03/25																								
192	9.2.1		RAMPAS CONCRETO f'c=175 kg/cm2-INC. BRUÑADO	3 días	S/ 4,043.18	194CC	mié 12/03/25																								
193	9.2.2		UÑAS CONCRETO f'c=175 kg/cm2-INC. BRUÑADO	3 días	S/ 1,074.30	192CC	mié 12/03/25																								
194	9.2.3		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3 días	S/ 1,316.35	185	mié 12/03/25																								
195	9.2.4		JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION 1"	2 días	S/ 783.43	192CC+1 día	mié 12/03/25																								
196	9.2.5		CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO	3 días	S/ 201.75	192CC	mié 12/03/25																								
197	9.3		RAMPAS VEHICULARES	6 días	S/ 30,011.74		sáb 15/03/25																								
198	9.3.1		RAMPAS CONCRETO f'c=175 kg/cm2-INC. BRUÑADO	6 días	S/ 18,864.00	200CC	sáb 15/03/25																								
199	9.3.2		UÑAS CONCRETO f'c=175 kg/cm2-INC. BRUÑADO	6 días	S/ 3,940.86	198CC	sáb 15/03/25																								
200	9.3.3		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	6 días	S/ 4,479.52	192CC	sáb 15/03/25																								
201	9.3.4		JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION 1"	4 días	S/ 1,908.36	198CC+2 días	sáb 15/03/25																								
202	9.3.5		CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO	6 días	S/ 819.00	200CC	sáb 15/03/25																								
203	9.4		MARTILLOS	14 días	S/ 55,937.86		dom 23/03/25																								
204	9.4.1		MARTILLOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2-INC. BRUÑADO	12 días	S/ 44,753.58	206CC+2 días	dom 23/03/25																								
205	9.4.2		UÑAS CONCRETO f'c=175 kg/cm2-INC. BRUÑADO	12 días	S/ 3,726.00	204CC	dom 23/03/25																								
206	9.4.3		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	12 días	S/ 3,582.96	198CC	vie 21/03/25																								
207	9.4.4		JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION 1"	4 días	S/ 1,932.30	204CC+5 días	jue 20/03/25																								
208	9.4.5		CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO	3 días	S/ 1,943.02	204CC	vie 14/03/25																								
209	10		REDUCTOR DE VELOCIDAD	5 días	S/ 14,742.10		mar 04/02/25																								
210	10.1		CONCRETO f'c=280 kg/cm2	2 días	S/ 10,242.59	211CC+1 día	lun 03/02/25																								
211	10.2		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	2 días	S/ 2,436.23	214	dom 02/02/25																								
212	10.3		JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION 2"	1 día	S/ 113.12	213	mar 04/02/25																								
213	10.4		CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO	2 días	S/ 196.56	210CC	lun 03/02/25																								
214	10.5		ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	1 día	S/ 1,753.60	159CC	vie 31/01/25																								
215	11		AREAS VERDES	6 días	S/ 71,560.83		vie 21/03/25																								
216	11.1		SEMBRADO DE GRASS NATURAL	6 días	S/ 30,166.23	198	vie 21/03/25																								
217	11.2		RIEGO DE ARBOLES	6 días	S/ 41,394.60	216CC	vie 21/03/25																								
218	12		PINTURA	4 días	S/ 9,677.24		jue 27/03/25																								
219	12.1		PINTURA DE TRAFICO EN PAVIMENTO	4 días	S/ 3,391.84	204	jue 27/03/25																								
220	12.2		PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES	4 días	S/ 4,847.44	219CC	jue 27/03/25																								
221	12.3		PINTURA DE TRAFICO EN REDUCTORES DE VELOCIDAD	1 día	S/ 1,437.96	220CC	lun 24/03/25																								
222	13		SEÑALIZACION VERTICAL	6 días	S/ 12,337.46		sáb 29/03/25																								
223	13.1		SEÑALES INFORMATIVAS	6 días	S/ 3,247.02	219CC	sáb 29/03/25																								
224	13.2		SEÑALES REGLAMENTARIAS	6 días	S/ 3,692.64	223CC	sáb 29/03/25																								
225	13.3		SEÑALES PREVENTIVAS	6 días	S/ 5,397.80	224CC	sáb 29/03/25																								
226	14		VARIOS	90 días	S/ 44,952.79		lun 31/03/25																								
227	14.1		DESARMADO DE MATERIALES INSTALADOS TEMPORALMENTE	2 días	S/ 1,000.00	225	lun 31/03/25																								
228	14.2		REPARACION DE RED EXISTENTE DE GAS (EN CASO DE ROTURA DE RED)	12 días	S/ 6,325.33	114	lun 10/02/25																								
229	14.3		SUMINISTRO E INSTALACION DE BASUREROS TIPO CANASTA INC. BASE DE CONCRETO	2 días	S/ 20,427.20	225	lun 31/03/25																								
230	14.4		LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE LA OBRA	89 días	S/ 17,200.26	4CC	dom 30/03/25																								
231	15		PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	60 días	S/ 20,000.00		sáb 01/03/25																								
232	15.1		PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	60 días	S/ 20,000.00		sáb 01/03/25																								

Proyecto: "AMPLIACIÓN DEL SE  
Fecha: jue 10/04/25

Tarea

División

Hito

.....

◆

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

◇

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

C

solo fin

Fecha límite

Tarea crítica

Progreso
