

001025



EXPEDIENTE TECNICO:

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA CON CODIGO DE INVERSION N° 2312861"




N.DIAGRAMA DE GANTT

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.L

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ-TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

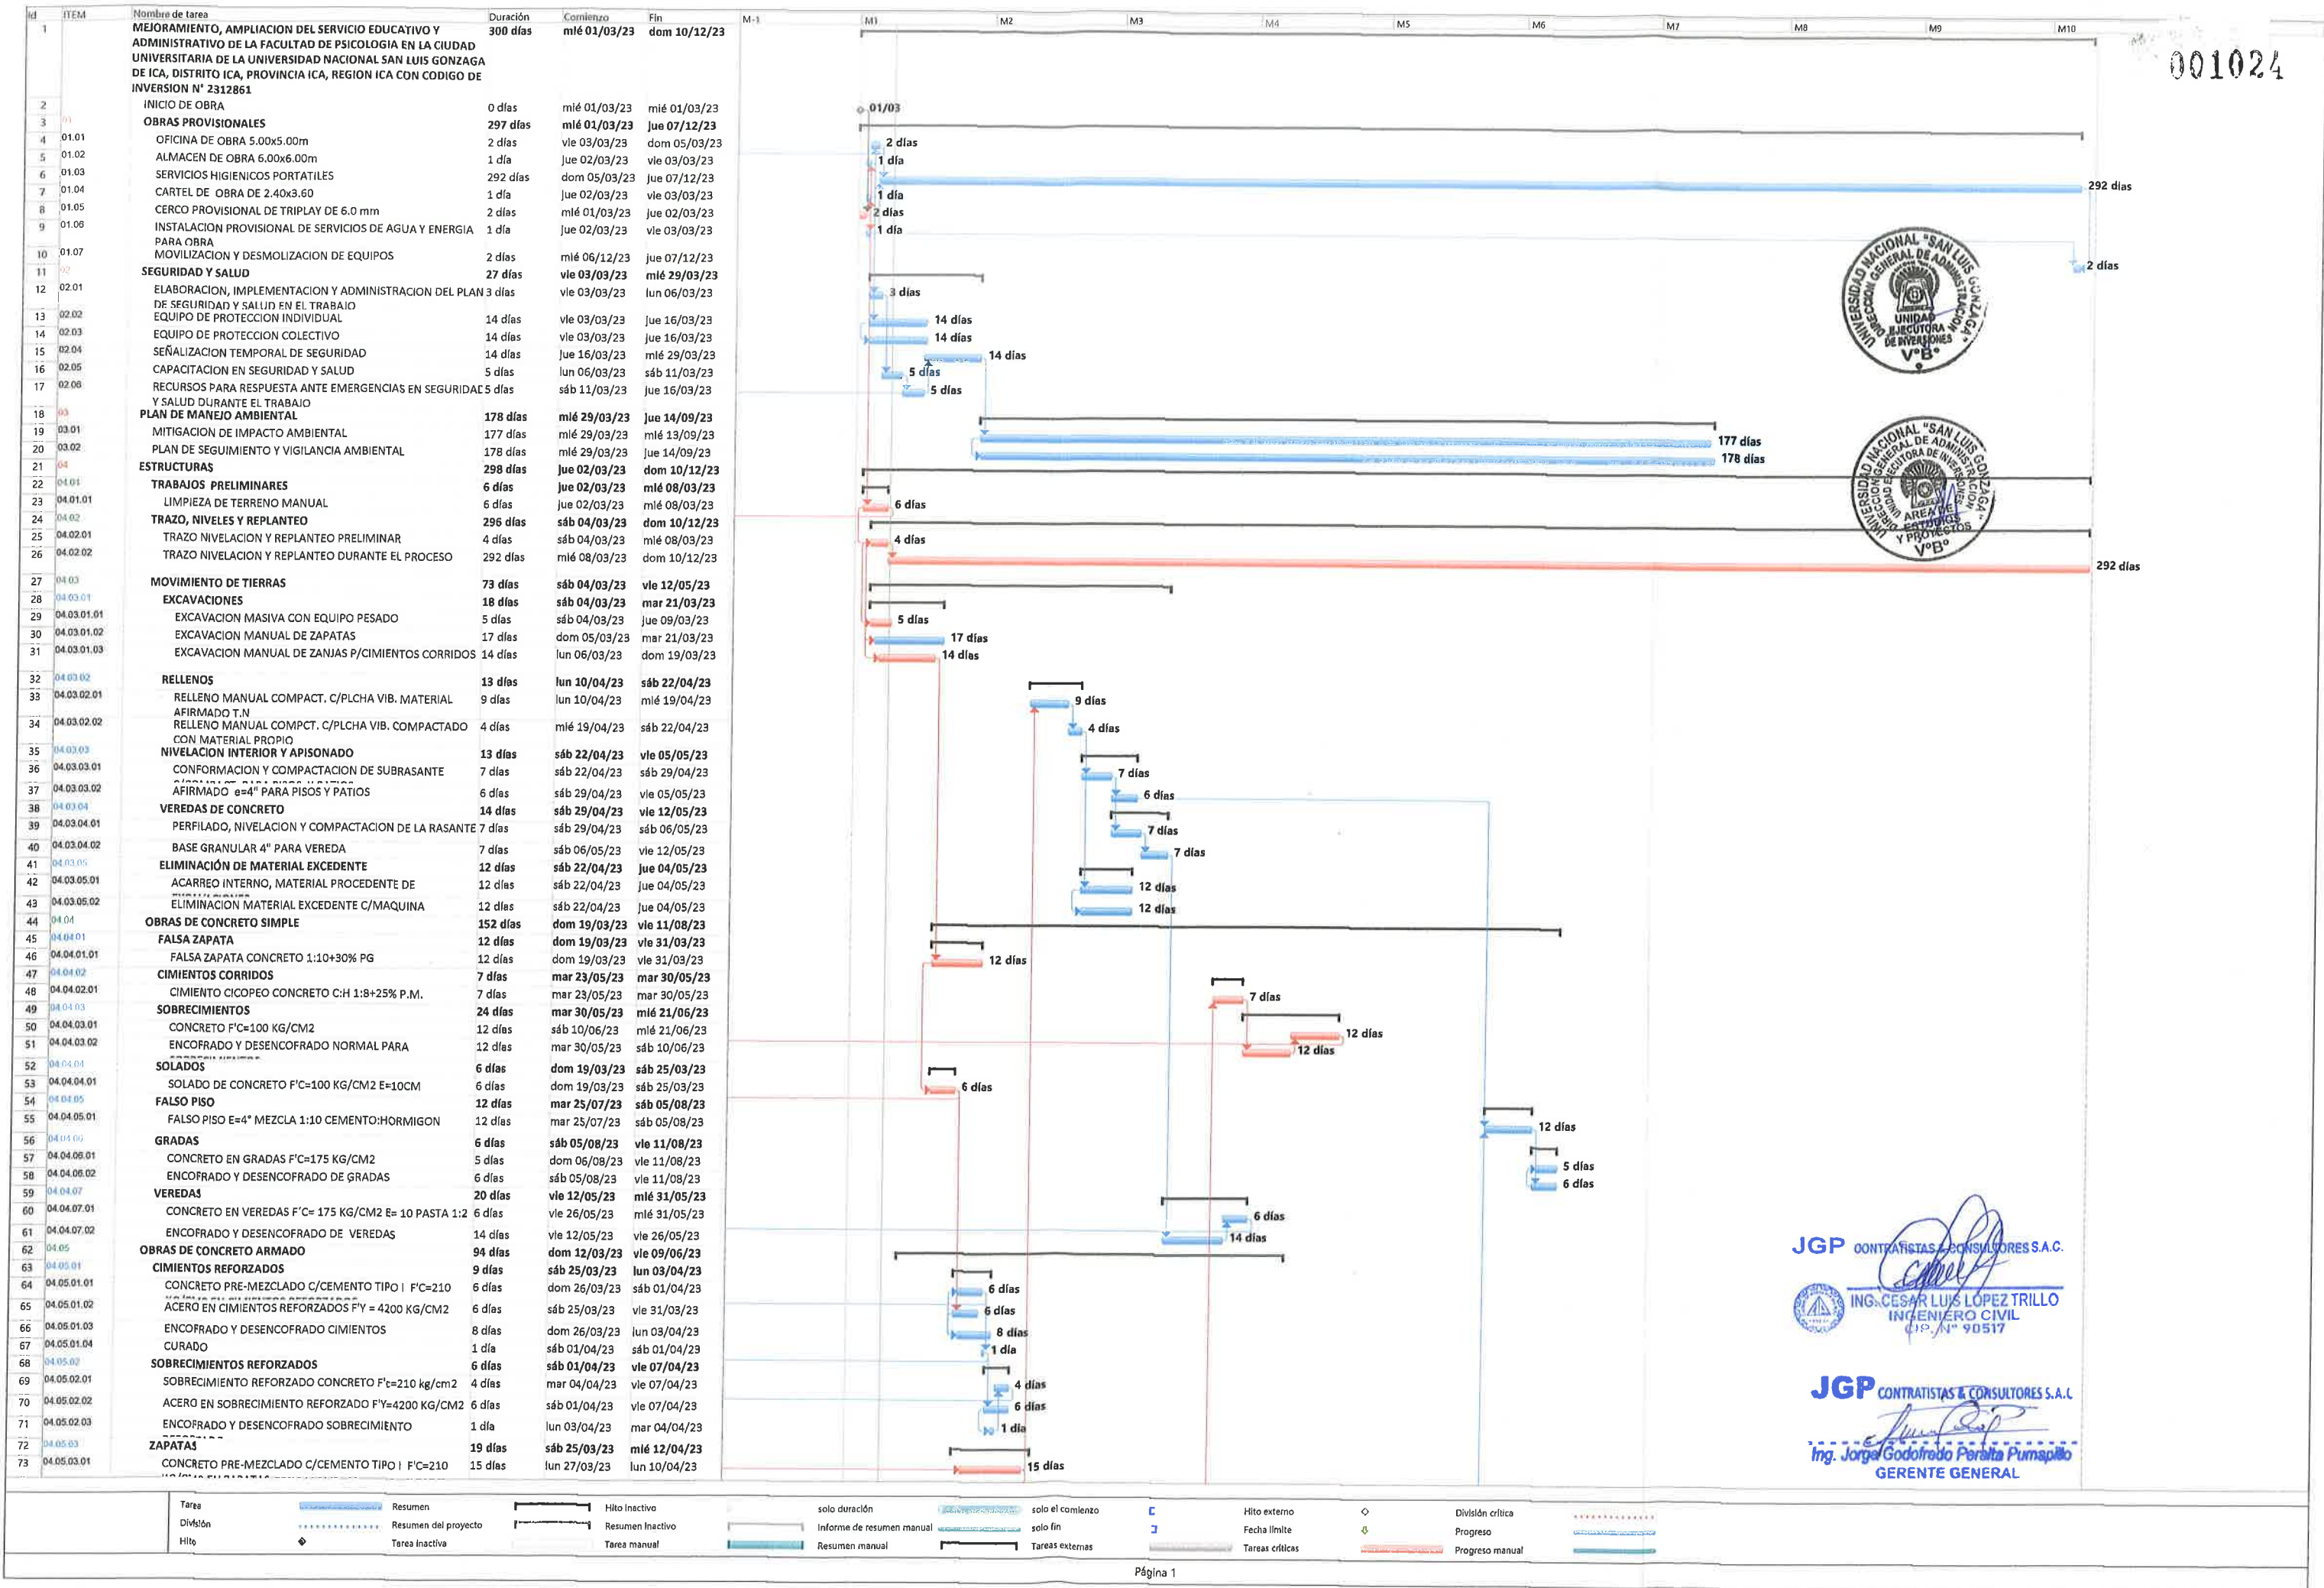


JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
C.P. N° 90517

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.


Ing. Jorgel Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL



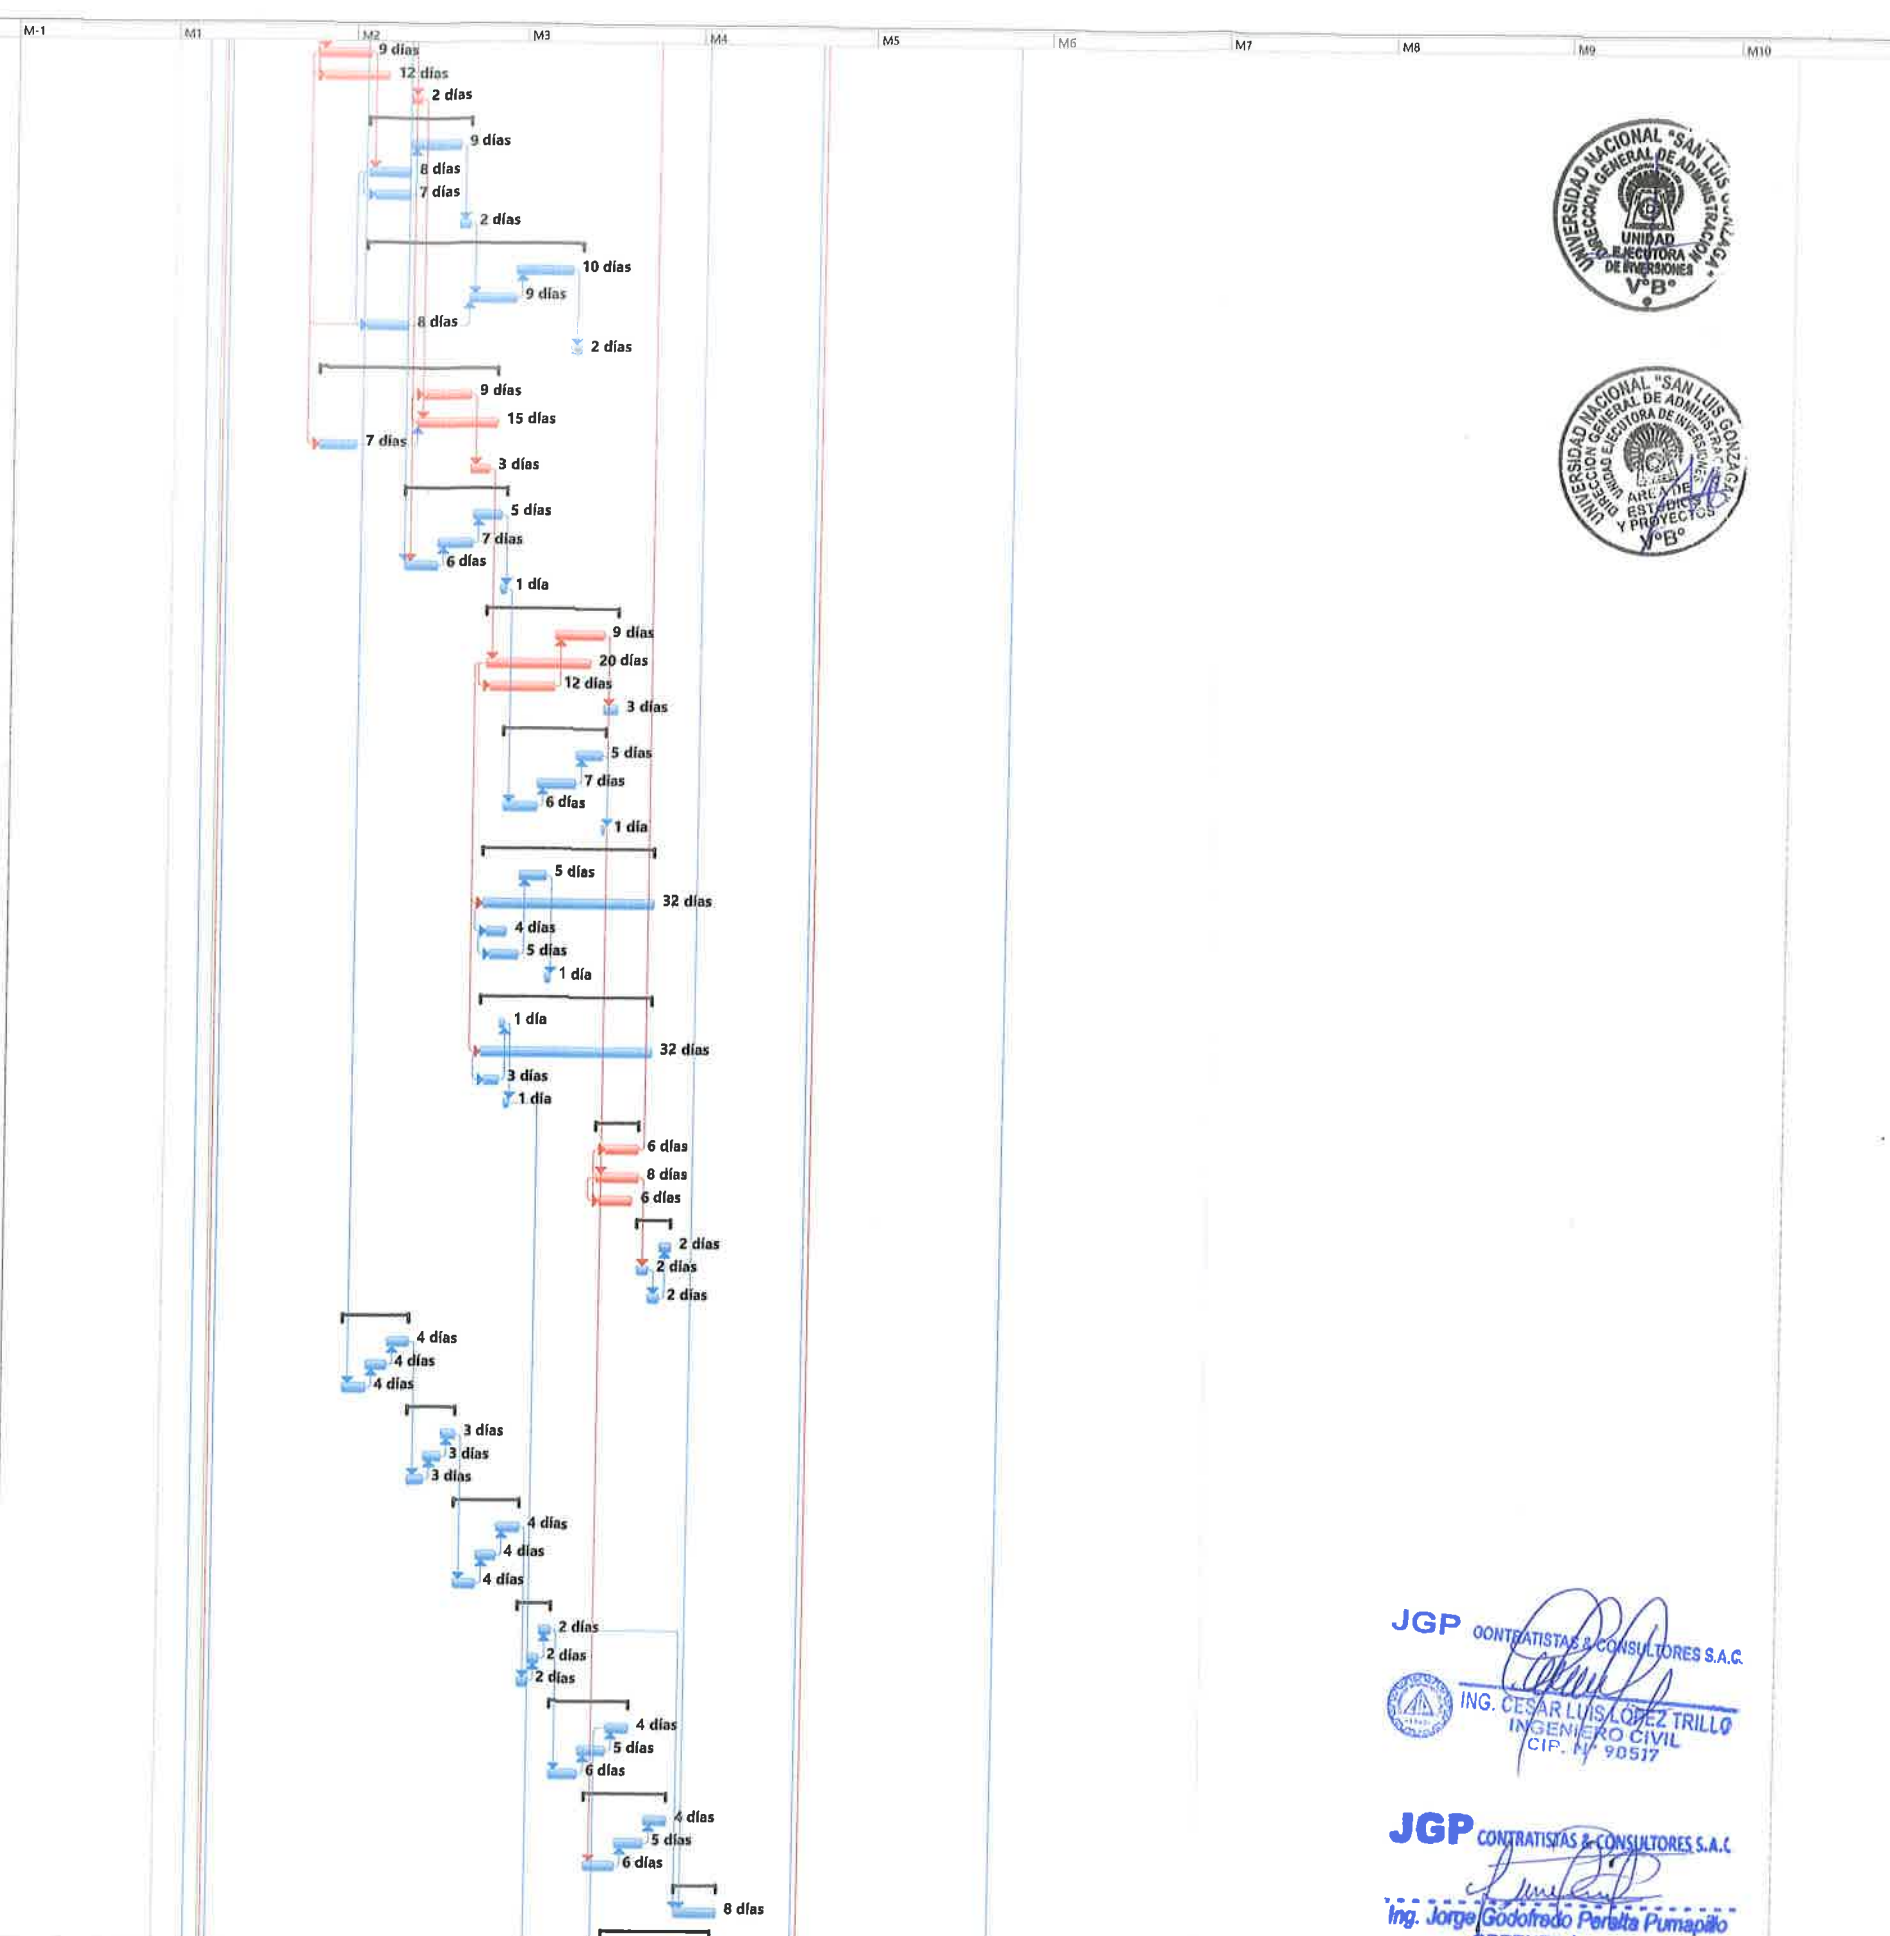



ID	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
74	04.05.03.02	ACERO EN ZAPATAS F'Y = 4200 KG/CM2	9 días	sáb 25/03/23	lun 03/04/23
75	04.05.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ZAPATAS	12 días	dom 26/03/23	jue 06/04/23
76	04.05.03.04	CURADO	2 días	lun 10/04/23	mié 12/04/23
77	04.05.04	VIGAS DE CIMENTACIÓN	19 días	lun 03/04/23	vie 21/04/23
78	04.05.04.01	CONCRETO PARA VIGAS DE AMARRE F'C= 210 KG/CM2	9 días	lun 10/04/23	mié 19/04/23
79	04.05.04.02	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	8 días	lun 03/04/23	lun 10/04/23
80	04.05.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS DE	7 días	mar 04/04/23	lun 10/04/23
81	04.05.04.04	CURADO	2 días	mié 19/04/23	vie 21/04/23
82	04.05.05	MUROS REFORZADOS	40 días	lun 03/04/23	jue 11/05/23
83	04.05.05.01	CONCRETO PRE-MEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F'C=210	10 días	sáb 29/04/23	mar 09/05/23
84	04.05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS	9 días	vie 21/04/23	sáb 29/04/23
85	04.05.05.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 EN MUROS REFORZADOS	8 días	lun 03/04/23	lun 10/04/23
86	04.05.05.04	CURADO	2 días	mar 09/05/23	jue 11/05/23
87	04.05.06	COLUMNAS	33 días	dom 26/03/23	mié 26/04/23
88	04.05.06.01	CONCRETO PRE-MEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F'C=210	9 días	jue 13/04/23	vie 21/04/23
89	04.05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	15 días	mié 12/04/23	mié 26/04/23
90	04.05.06.03	ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	7 días	dom 26/03/23	sáb 01/04/23
91	04.05.06.04	CURADO	3 días	vie 21/04/23	mar 25/04/23
92	04.05.07	COLUMNETAS	19 días	lun 10/04/23	vie 28/04/23
93	04.05.07.01	COLUMNETAS DE AMARRE- CONCRETO F'C=210 kg/cm2	5 días	sáb 22/04/23	jue 27/04/23
94	04.05.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	7 días	dom 16/04/23	sáb 22/04/23
95	04.05.07.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS	6 días	lun 10/04/23	dom 16/04/23
96	04.05.07.04	CURADO	1 día	jue 27/04/23	vie 28/04/23
97	04.05.08	VIGAS	25 días	mar 25/04/23	jue 18/05/23
98	04.05.08.01	CONCRETO PRE-MEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F'C=210	9 días	dom 07/05/23	lun 15/05/23
99	04.05.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	20 días	mar 25/04/23	sáb 13/05/23
100	04.05.08.03	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	12 días	mar 25/04/23	dom 07/05/23
101	04.05.08.04	CURADO	3 días	lun 15/05/23	jue 18/05/23
102	04.05.09	VIGUETAS DE AMARRE	19 días	vie 28/04/23	mar 16/05/23
103	04.05.09.01	CONCRETO EN VIGUETAS DE AMARRE F'C= 210 KG/CM2	5 días	jue 11/05/23	lun 15/05/23
104	04.05.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGUETAS	7 días	jue 04/05/23	jue 11/05/23
105	04.05.09.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 EN VIGUETAS	6 días	vie 28/04/23	jue 04/05/23
106	04.05.09.04	CURADO	1 día	lun 15/05/23	mar 16/05/23
107	04.05.10	LOSA ALIGERADA E=0.20	32 días	mar 25/04/23	jue 25/05/23
108	04.05.10.01	CONCRETO PRE-MEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F'C=210	5 días	lun 01/05/23	sáb 06/05/23
109	04.05.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS	32 días	mar 25/04/23	jue 25/05/23
110	04.05.10.03	ACERO EN LOSA ALIGERADA F'Y = 4200 KG/CM2	4 días	mar 25/04/23	sáb 29/04/23
111	04.05.10.04	LADRILLO PARA TECHO 15X30X30 cm.	5 días	mié 26/04/23	lun 01/05/23
112	04.05.10.05	CURADO	1 día	sáb 06/05/23	dom 07/05/23
113	04.05.11	LOSAS MACIZAS	32 días	mar 25/04/23	jue 25/05/23
114	04.05.11.01	CONCRETO PRE-MEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F'C=210	1 día	vie 28/04/23	sáb 29/04/23
115	04.05.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS	32 días	mar 25/04/23	jue 25/05/23
116	04.05.11.03	ACERO EN LOSA MACIZA F'Y = 4200 KG/CM2	3 días	mar 25/04/23	vie 28/04/23
117	04.05.11.04	CURADO	1 día	sáb 29/04/23	dom 30/04/23
118	04.05.12	ESCALERA E=0.15 MTS.	8 días	lun 15/05/23	mar 23/05/23
119	04.05.12.01	CONCRETO PRE-MEZCLADO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2	6 días	mié 17/05/23	mar 23/05/23
120	04.05.12.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERA	8 días	lun 15/05/23	mar 23/05/23
121	04.05.12.03	ACERO EN ESCALERAS FY=4200 KG/CM2	6 días	mar 16/05/23	lun 22/05/23
122	04.05.13	MESA DE CONCRETO	6 días	mar 23/05/23	lun 29/05/23
123	04.05.13.01	CONCRETO EN LOSA PARA MESA F'C=210 KG/CM2	2 días	sáb 27/05/23	lun 29/05/23
124	04.05.13.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MESA DE CONCRETO	2 días	mar 23/05/23	jue 25/05/23
125	04.05.13.03	ACERO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60	2 días	jue 25/05/23	sáb 27/05/23
126	04.05.14	CISTERNAS SUBTERRANEAS	12 días	sáb 01/04/23	jue 13/04/23
127	04.05.14.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - CISTERNA	4 días	dom 09/04/23	jue 13/04/23
128	04.05.14.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA	4 días	mié 05/04/23	dom 09/04/23
129	04.05.14.03	ACERO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60	4 días	sáb 01/04/23	mié 05/04/23
130	04.05.15	JARDINERAS	9 días	jue 13/04/23	vie 21/04/23
131	04.05.16.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 JARDINERAS	3 días	mié 19/04/23	vie 21/04/23
132	04.05.16.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN JARDINERAS	3 días	dom 16/04/23	mié 19/04/23
133	04.05.16.03	ACERO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60	3 días	jue 13/04/23	dom 16/04/23
134	04.05.17	BANCAS DE CONCRETO	12 días	vie 21/04/23	mié 03/05/23
135	04.05.18.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 BANCAS DE CONCRETO	4 días	sáb 29/04/23	mié 03/05/23
136	04.05.18.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BANCAS DE CONCRETO	4 días	mar 25/04/23	sáb 29/04/23
137	04.05.18.03	ACERO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60	4 días	vie 21/04/23	mar 25/04/23
138	04.05.19	RAMPAS	6 días	mié 03/05/23	mar 09/05/23
139	04.05.19.01	CONCRETO PRE-MEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F'C=210	2 días	dom 07/05/23	mar 09/05/23
140	04.05.19.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS	2 días	vie 05/05/23	dom 07/05/23
141	04.05.19.03	ACERO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60	2 días	mié 03/05/23	vie 05/05/23
142	04.05.20	PEDESTALES	15 días	mar 09/05/23	mar 23/05/23
143	04.05.20.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN PEDESTALES	4 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23
144	04.05.20.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PEDESTAL	5 días	dom 14/05/23	vie 19/05/23
145	04.05.20.03	ACERO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60	6 días	mar 09/05/23	dom 14/05/23
146	04.05.21	DINTELES	15 días	lun 15/05/23	mar 30/05/23
147	04.05.21.01	CONCRETO EN DINTELES F'C=175 KG/CM2	4 días	vie 26/05/23	mar 30/05/23
148	04.05.21.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DINTELES	5 días	dom 21/05/23	vie 26/05/23
149	04.05.21.03	ACERO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60	6 días	lun 15/05/23	dom 21/05/23
150	04.05.22	JUNTAS	8 días	mié 31/05/23	jue 08/06/23
151	04.05.23	JUNTA SISMICA DE 1"	8 días	mié 31/05/23	jue 08/06/23
152	04.05.24	ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURA DE	20 días	vie 19/05/23	mié 07/06/23

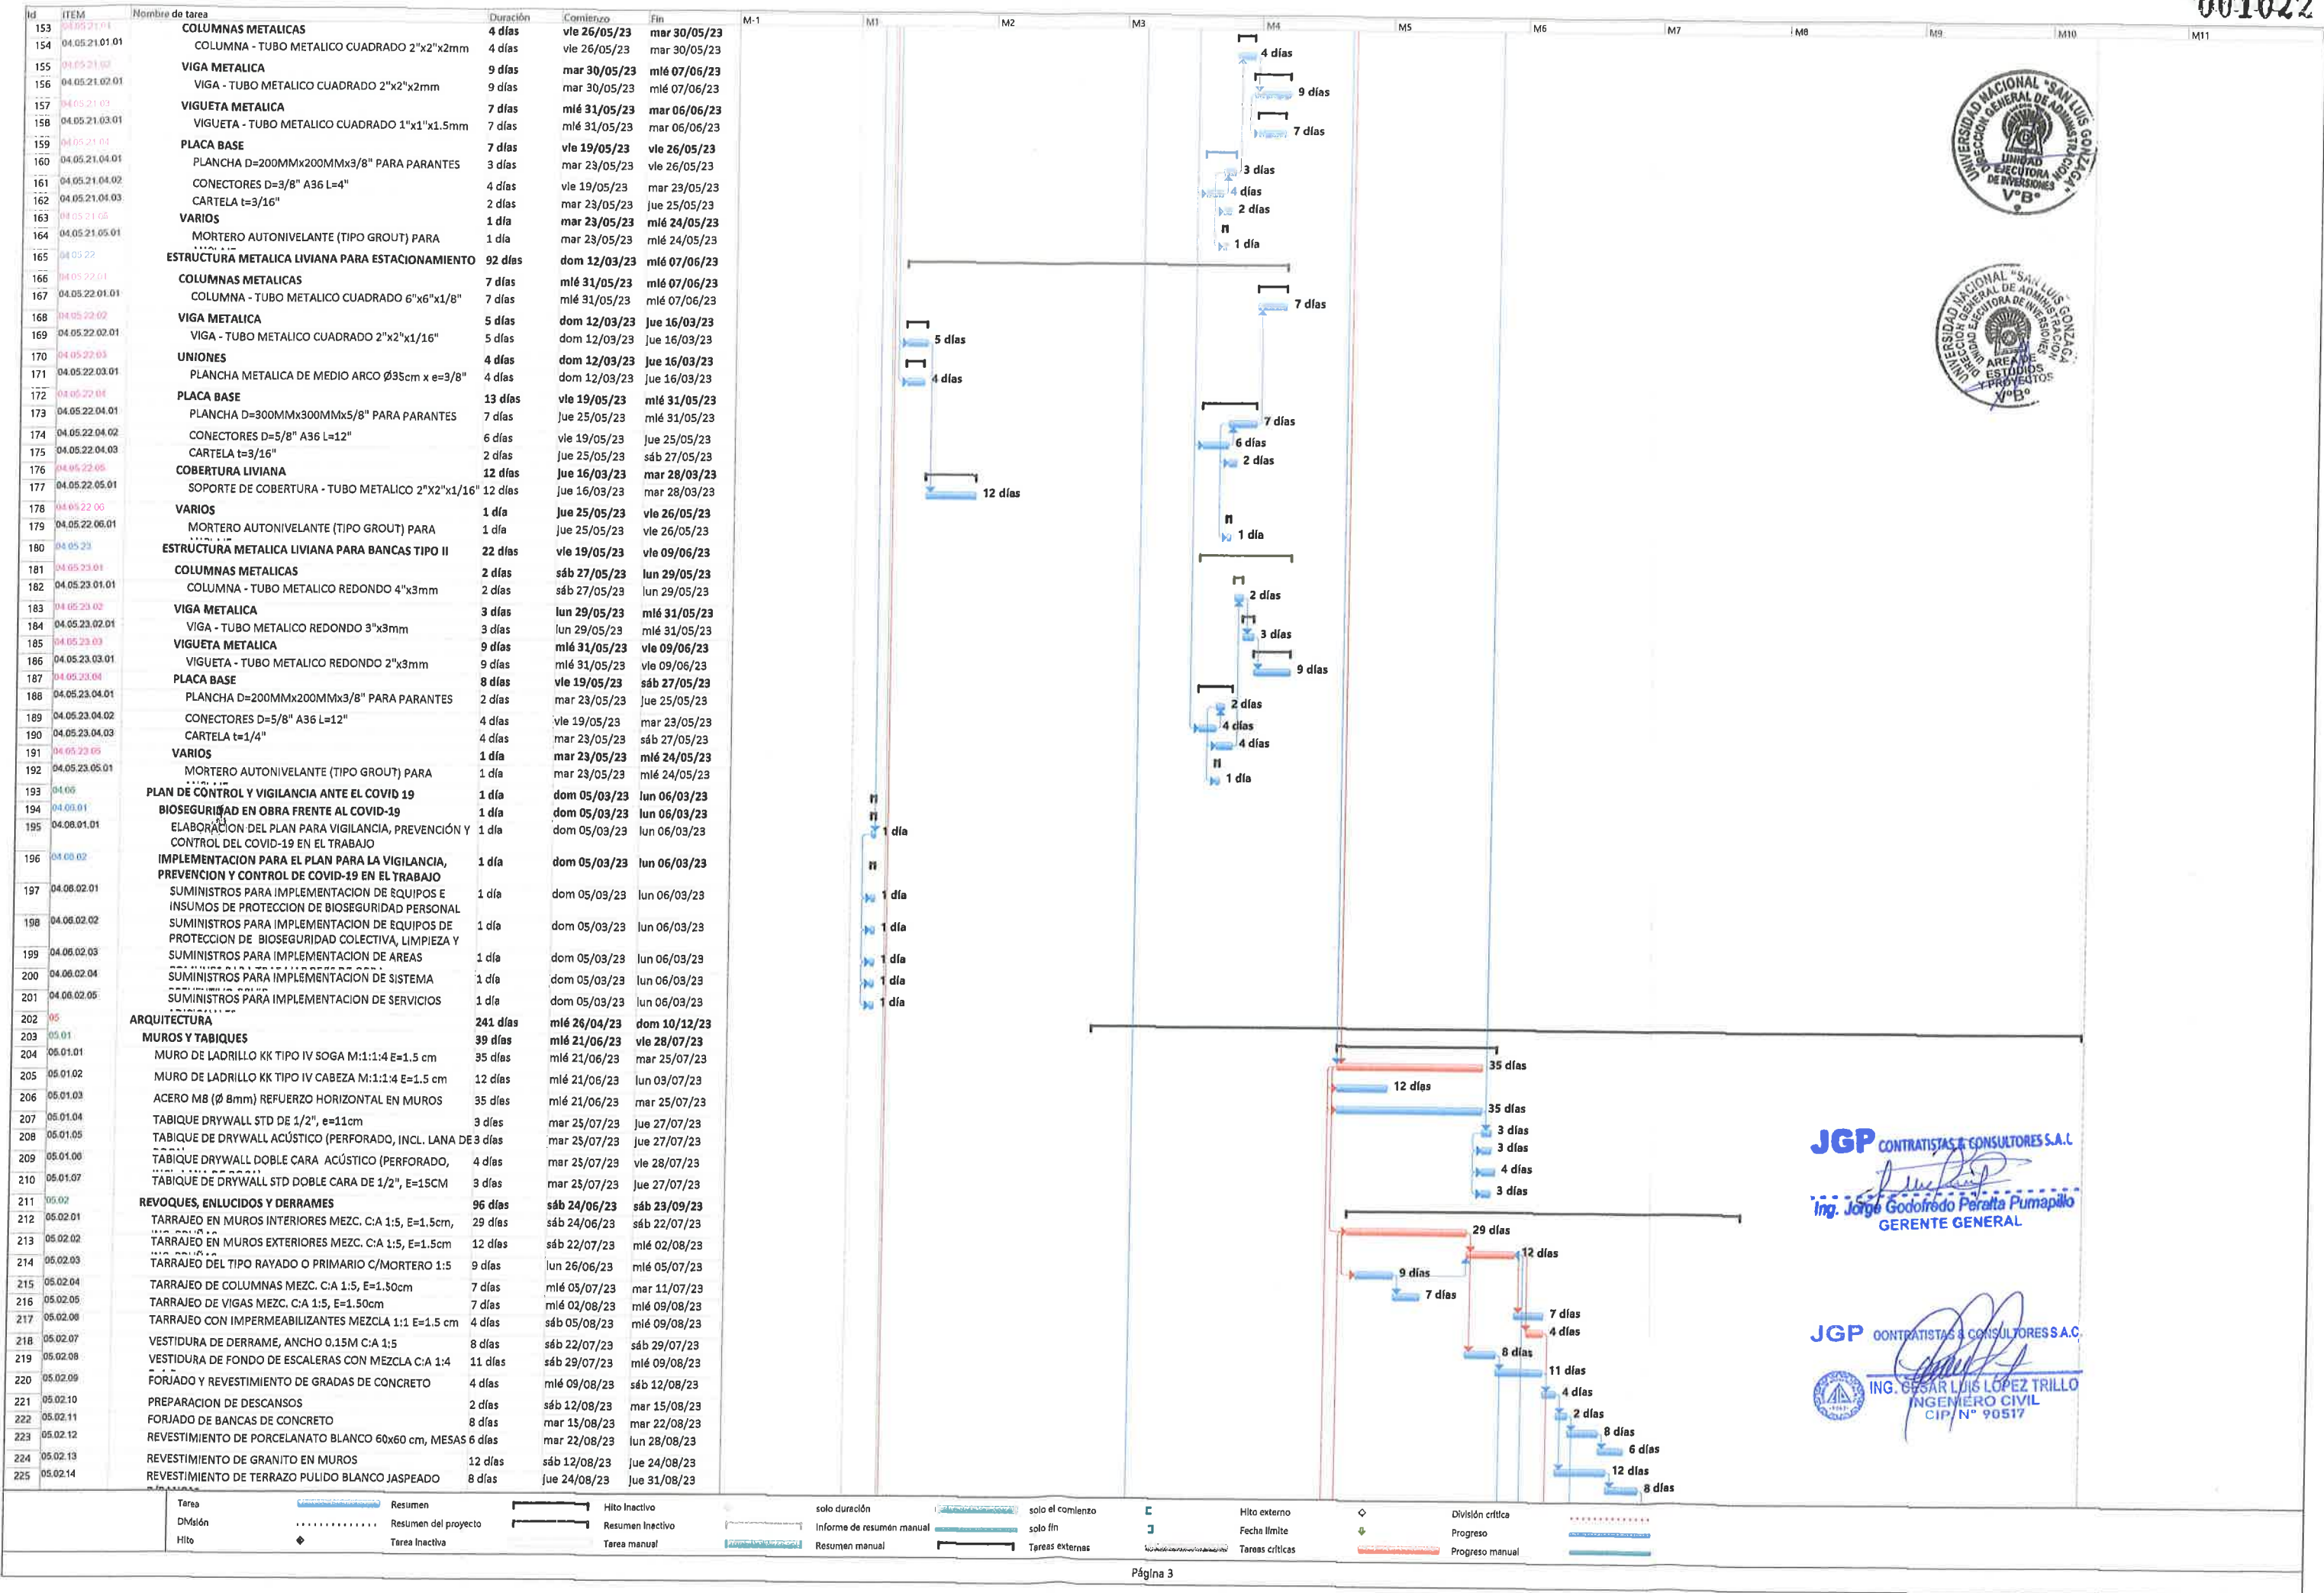

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
 ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 90517

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
 Ing. Jorge Godofredo Perilla Pumapillo
 GERENTE GENERAL



Tarea		Resumen		Hito inactivo
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual



001020

Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
302	05.09.20	TAPA JUNTAS DE ACERO INOXIDABLE A=15CM, E=1MM,	3 días	mié 19/07/23	sáb 22/07/23											
303	05.09.21	P6, PUERTA METALICA GALVANIZADO (2.10M x 1.10M)	2 días	sáb 22/07/23	lun 24/07/23											
304	05.09.22	P9, PUERTA METALICA GALVANIZADO +VIDRIO TEMPLADO DE 2 días	2 días	lun 24/07/23	mié 26/07/23											
305	05.10	CERRAJERIA	3 días	dom 06/08/23	mié 09/08/23											
306	05.10.01	BISAGRAS	3 días	dom 06/08/23	mié 09/08/23											
307	05.10.01.01	BISAGRA ACERADA 3 1/2"x3 1/2" PESADA PARA PUERTA	3 días	dom 06/08/23	mié 09/08/23											
308	05.10.02	CERRADURAS	2 días	dom 06/08/23	mar 08/08/23											
309	05.10.02.01	CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR TIPO PARCHÉ 2	2 días	dom 06/08/23	mar 08/08/23											
310	05.10.02.02	CERRADURA TIPO MANIJA	2 días	dom 06/08/23	mar 08/08/23											
311	05.11	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES	14 días	sáb 29/07/23	vie 11/08/23											
312	05.11.01	V1, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	sáb 29/07/23	mar 01/08/23											
313	05.11.02	V2, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	sáb 29/07/23	mar 01/08/23											
314	05.11.03	V3, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	mar 01/08/23	jue 03/08/23											
315	05.11.04	V4, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	mar 01/08/23	vie 04/08/23											
316	05.11.05	V5, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	mar 01/08/23	vie 04/08/23											
317	05.11.06	V6, VENTANA DE VIDRIO ESPIA TEMPLADO ESPEJ DE 4MM	3 días	mar 01/08/23	vie 04/08/23											
318	05.11.07	V7, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	mar 01/08/23	vie 04/08/23											
319	05.11.08	V8, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	mar 01/08/23	vie 04/08/23											
320	05.11.09	V9, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	mar 01/08/23	vie 04/08/23											
321	05.11.10	V10, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	mar 01/08/23	jue 03/08/23											
322	05.11.11	V11, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	mar 01/08/23	jue 03/08/23											
323	05.11.12	V12, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	mar 01/08/23	jue 03/08/23											
324	05.11.13	V13, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	mar 01/08/23	jue 03/08/23											
325	05.11.14	V14, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	mar 01/08/23	vie 04/08/23											
326	05.11.15	V15, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	mar 01/08/23	vie 04/08/23											
327	05.11.16	V16, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	mar 01/08/23	vie 04/08/23											
328	05.11.17	V17, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	mar 01/08/23	vie 04/08/23											
329	05.11.18	V18, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	mar 01/08/23	jue 03/08/23											
330	05.11.19	V19, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	mar 01/08/23	jue 03/08/23											
331	05.11.20	V20, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	mar 01/08/23	jue 03/08/23											
332	05.11.21	V21, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	mar 01/08/23	vie 04/08/23											
333	05.11.22	V22, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	mar 01/08/23	vie 04/08/23											
334	05.11.23	V23, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	vie 04/08/23	lun 07/08/23											
335	05.11.24	V24, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	vie 04/08/23	lun 07/08/23											
336	05.11.25	V25, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	vie 04/08/23	lun 07/08/23											
337	05.11.26	V26, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	vie 04/08/23	lun 07/08/23											
338	05.11.27	V27, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	vie 04/08/23	lun 07/08/23											
339	05.11.28	V28, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	vie 04/08/23	lun 07/08/23											
340	05.11.29	V29, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	vie 04/08/23	lun 07/08/23											
341	05.11.30	V30, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	vie 04/08/23	lun 07/08/23											
342	05.11.31	V31, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	3 días	vie 04/08/23	lun 07/08/23											
343	05.11.32	V32, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	vie 04/08/23	dom 06/08/23											
344	05.11.33	V33, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	vie 04/08/23	dom 06/08/23											
345	05.11.34	V34, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	dom 06/08/23	mar 08/08/23											
346	05.11.35	V35, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	dom 06/08/23	mar 08/08/23											
347	05.11.36	V36, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	dom 06/08/23	mar 08/08/23											
348	05.11.37	V37, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	dom 06/08/23	mar 08/08/23											
349	05.11.38	V38, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	dom 06/08/23	mar 08/08/23											
350	05.11.39	V39, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	dom 06/08/23	mar 08/08/23											
351	05.11.40	V40, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	dom 06/08/23	mar 08/08/23											
352	05.11.41	V41, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	dom 06/08/23	mar 08/08/23											
353	05.11.42	V42, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	dom 06/08/23	mar 08/08/23											
354	05.11.43	V43, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	dom 06/08/23	mar 08/08/23											
355	05.11.44	V44, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	dom 06/08/23	mar 08/08/23											
356	05.11.45	V45, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	dom 06/08/23	mar 08/08/23											
357	05.11.46	V46, VENTANA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	2 días	dom 06/08/23	mar 08/08/23											
358	05.11.47	P11, PUERTA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 8MM	2 días	dom 06/08/23	mar 08/08/23											
359	05.11.48	M1,MAMPARA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 8MM	2 días	mar 08/08/23	jue 10/08/23											
360	05.11.49	M2,MAMPARA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 8MM	2 días	mar 08/08/23	jue 10/08/23											
361	05.11.50	M3,MAMPARA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 8MM	2 días	mar 08/08/23	jue 10/08/23											
362	05.11.51	ESPEJO INCOLORO 6 mm (EMPOTRADO)	2 días	jue 10/08/23	vie 11/08/23											
363	05.12	PINTURA	212 días	vie 19/05/23	mié 06/12/23											
364	05.12.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS, INCLUYE IMPRIMANTE	35 días	mié 20/09/23	lun 23/10/23											
365	05.12.02	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	12 días	lun 23/10/23	vie 03/11/23											
366	05.12.03	PINTURA DE CIELORRASOS C/LATEX 2 MANOS,	35 días	vie 03/11/23	mié 06/12/23											
367	05.12.04	PINTURA DE TRAFICO PARA DEMARCACIÓN EN	3 días	vie 19/05/23	lun 22/05/23											
368	05.12.05	PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN	3 días	lun 22/05/23	jue 25/05/23											
369	05.13	SEÑALÉTICA Y SEGURIDAD	4 días	mié 06/12/23	dom 10/12/23											
370	05.13.01	SEÑALÉTICA AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE (medidas	9 días	mié 06/12/23	sáb 09/12/23											

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.L
Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Tarea	Resumen	Hito Inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen Inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea Inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

Página 5

M-1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

5 días
2 días
8 días
14 días
5 días
6 días
5 días
4 días
5 días
1 día
2 días
2 días
1 día

3 días
1 día
5 días
5 días
4 días
4 días
3 días
2 días
3 días
11 días
2 días
4 días
2 días
2 días
2 días
2 días
7 días
5 días
2 días
2 días
2 días
3 días
2 días
7 días
6 días
2 días
7 días
7 días
8 días
2 días
1 día
7 días
4 días
3 días
3 días
3 días
3 días
3 días
3 días
5 días
3 días
3 días
3 días
1 día
1 día
1 día
3 días

UNIVERSIDAD NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA
UNIDAD EJECUTIVA DE INGENIERÍA
VTE


UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA DE ESTUDIOS
VTE

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 90517

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
C.P. N° 90517

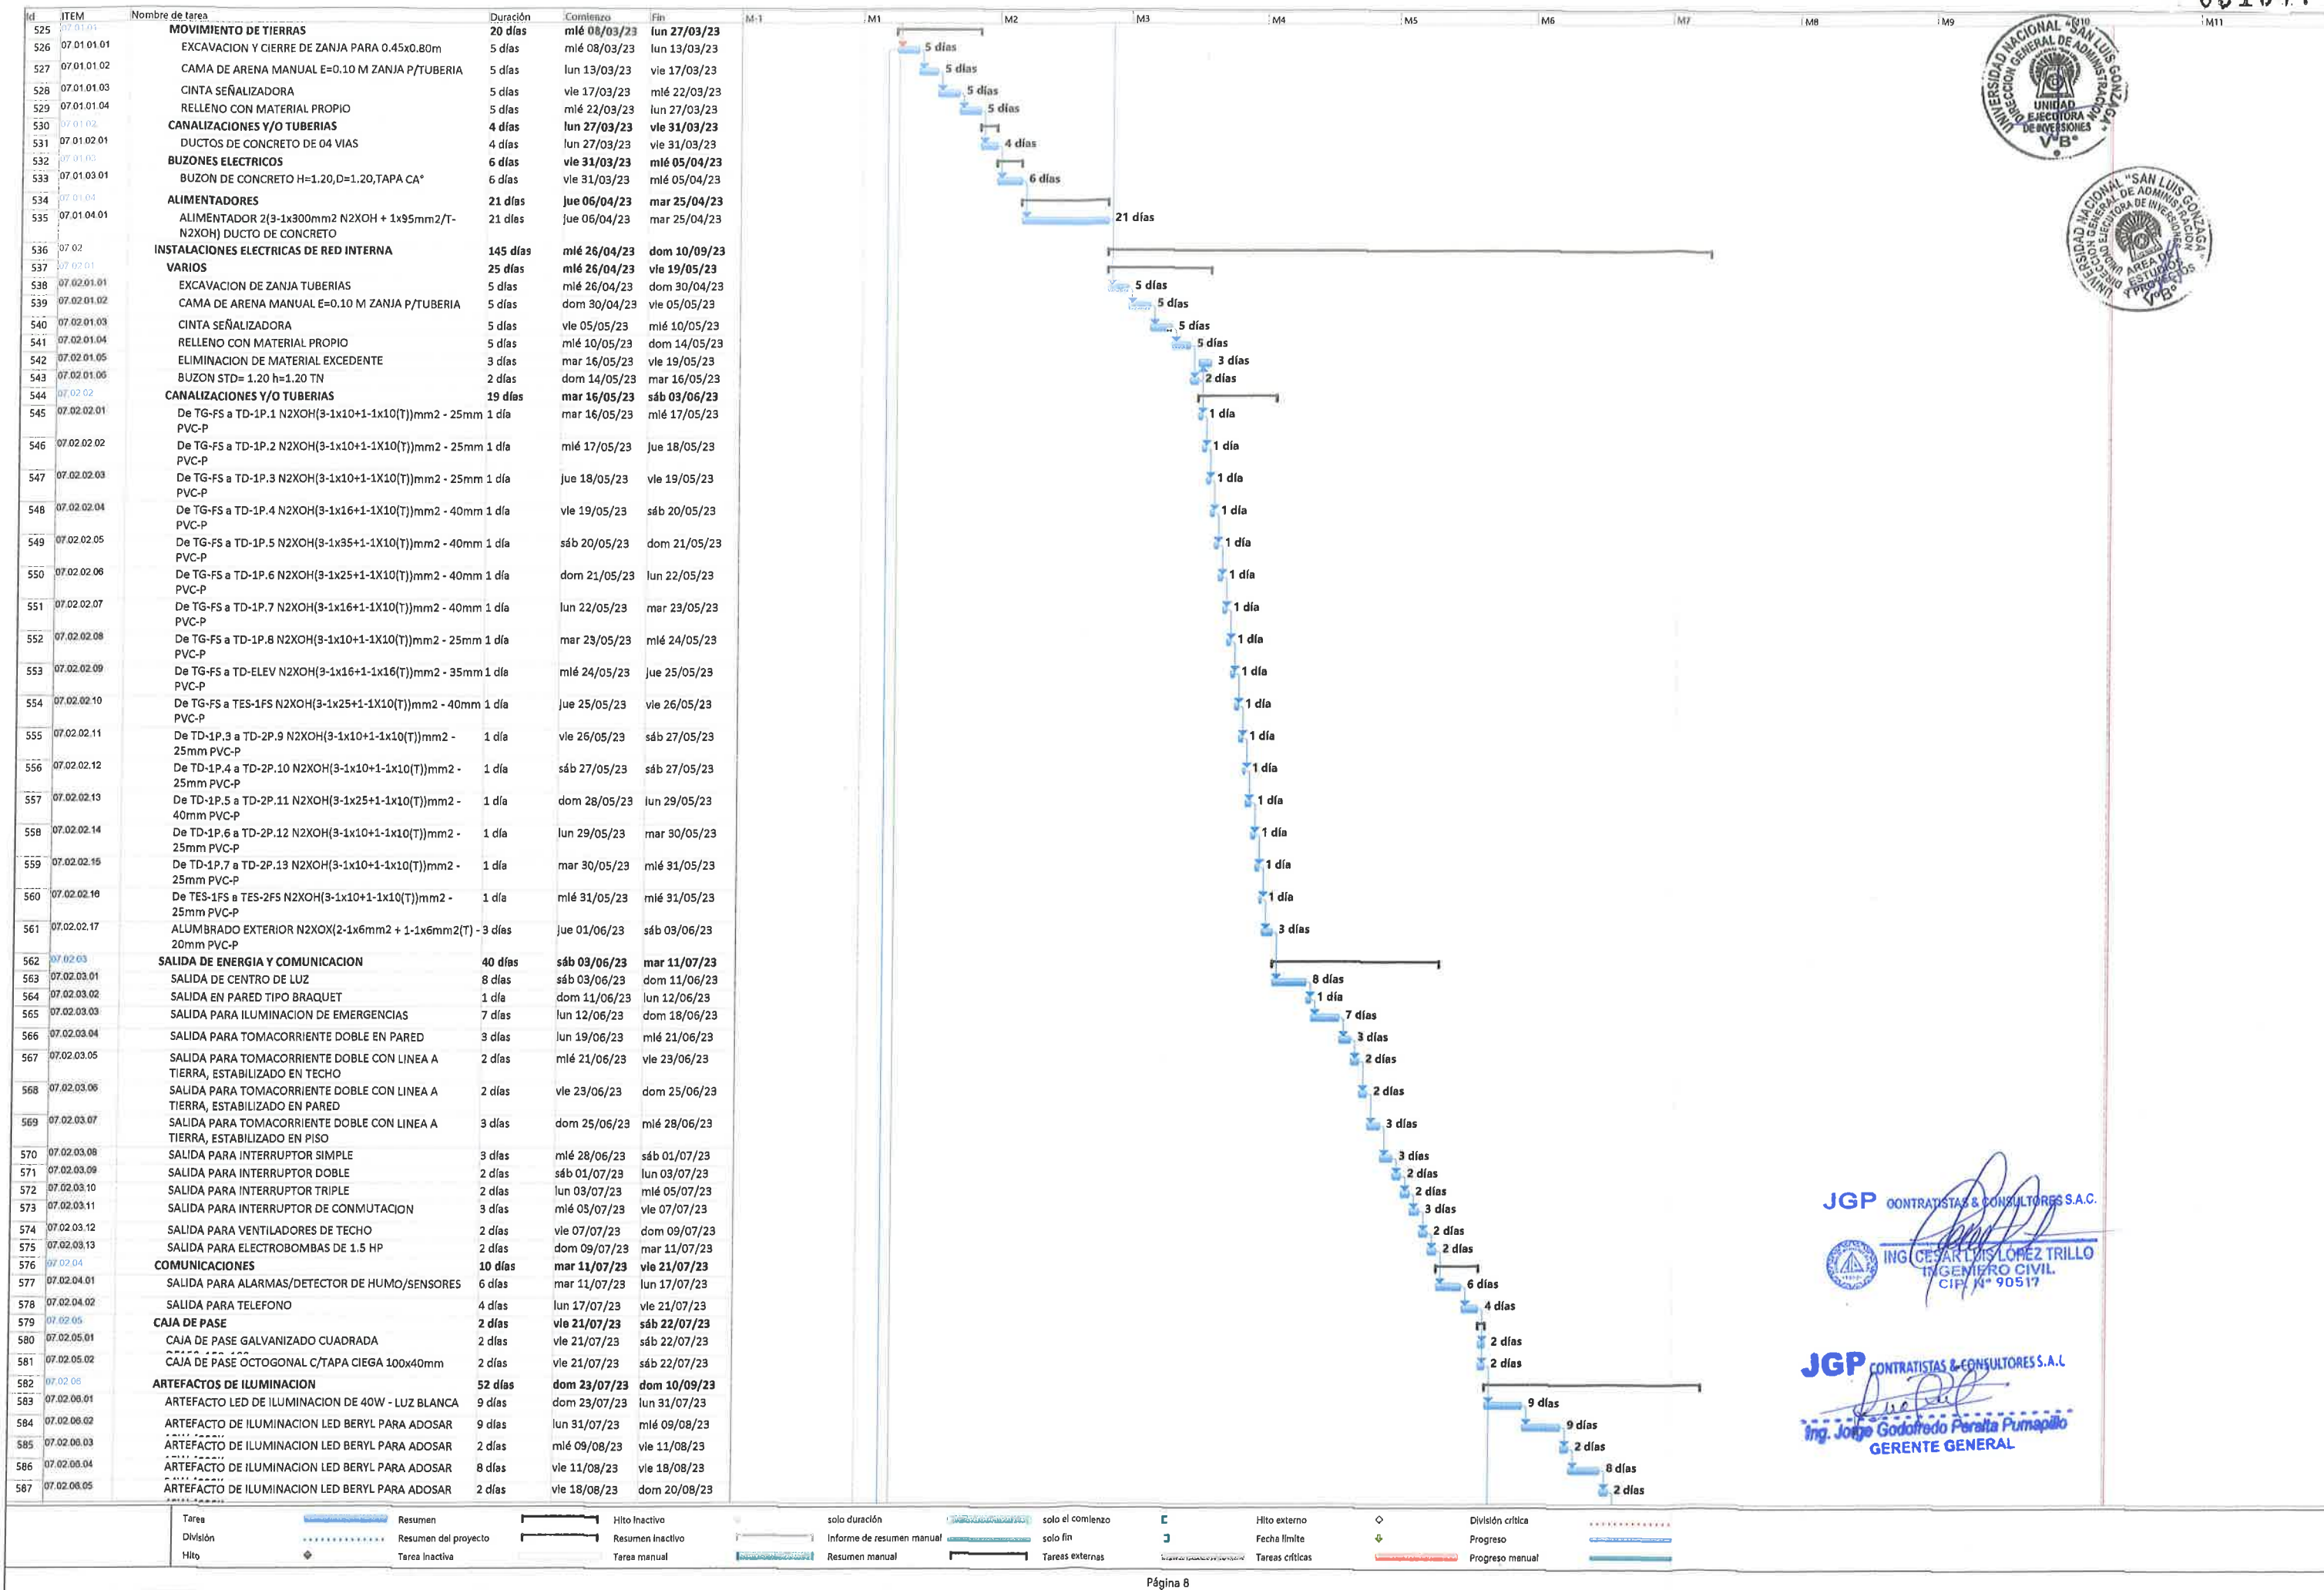

ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
588	ARTEFACTO DE ILUMINACION BRIX LED PARA ADOSAR 36W	12 días	dom 20/08/23	jue 31/08/23											
589	ARTEFACTO DE ILUMINACION BRIX LED PARA ADOSAR 18W	1 día	vie 01/09/23	vie 01/09/23											
590	ARTEFACTO DE ILUMINACION NIX LED PARA ADOSAR 24W	1 día	vie 01/09/23	sáb 02/09/23											
591	ARTEFACTO DE ILUMINACION BALI LED TIPO BALIZA 15W	1 día	sáb 02/09/23	dom 03/09/23											
592	ARTEFACTO DE ILUMINACION PLG LED POSTE 50W 4000K	1 día	dom 03/09/23	lun 04/09/23											
593	ARTEFACTO DE LUCES DE EMERGENCIA LED 2X20W	4 días	mar 05/09/23	vie 08/09/23											
594	DETECTOR DE HUMOS	1 día	vie 08/09/23	sáb 09/09/23											
595	ALARMA SONORA CONTRA INCENDIOS	1 día	sáb 09/09/23	dom 10/09/23											
596	TABLEROS E INTERRUPTORES	20 días	dom 23/07/23	vie 11/08/23											
597	TABLERO GENERAL TG-FS	1 día	dom 23/07/23	lun 24/07/23											
598	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1P.1	1 día	lun 24/07/23	mar 25/07/23											
599	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1P.2	1 día	mar 25/07/23	mié 26/07/23											
600	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1P.3	1 día	mié 26/07/23	mié 26/07/23											
601	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1P.4	1 día	jue 27/07/23	jue 27/07/23											
602	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1P.5	1 día	jue 27/07/23	vie 28/07/23											
603	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1P.6	1 día	vie 28/07/23	sáb 29/07/23											
604	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1P.7	1 día	sáb 29/07/23	dom 30/07/23											
605	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1P.8	1 día	dom 30/07/23	lun 31/07/23											
606	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-ELEV	1 día	lun 31/07/23	mar 01/08/23											
607	TABLERO DE DISTRIBUCION TES-1FS	1 día	mar 01/08/23	mié 02/08/23											
608	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2P.9	1 día	mié 02/08/23	jue 03/08/23											
609	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2P.10	1 día	jue 03/08/23	vie 04/08/23											
610	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2P.11	1 día	vie 04/08/23	sáb 05/08/23											
611	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2P.12	1 día	sáb 05/08/23	dom 06/08/23											
612	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2P.13	1 día	dom 06/08/23	lun 07/08/23											
613	TABLERO DE DISTRIBUCION TES-2FS	1 día	lun 07/08/23	mar 08/08/23											
614	TABLERO ESTABILIZADO BIBLIOTECA VIRTUAL	1 día	mar 08/08/23	mié 09/08/23											
615	TABLERO ESTABILIZADO CENTRO DE COMPUTO	1 día	mié 09/08/23	jue 10/08/23											
616	ESTABILIZADOR TRIFASICO 100% ESTADO SOLIDO CON	1 día	jue 10/08/23	vie 11/08/23											
617	POZO A TIERRA	1 día	vie 11/08/23	vie 11/08/23											
618	POZO DE PUESTA A TIERRA	1 día	vie 11/08/23	vie 11/08/23											
619	PRUEBAS ELECTRICAS	2 días	sáb 12/08/23	dom 13/08/23											
620	PRUEBAS DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA	1 día	sáb 12/08/23	sáb 12/08/23											
621	OTRAS PRUEBA ELECTRICA	1 día	sáb 12/08/23	dom 13/08/23											
622	SISTEMA DE COMUNICACIONES	61 días	mié 08/03/23	vie 05/05/23											
623	OBRAS PRELIMINARES	28 días	mié 08/03/23	mar 04/04/23											
624	TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPOS PARA TUBERIAS	1 día	mié 08/03/23	jue 09/03/23											
625	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS	3 días	jue 09/03/23	dom 12/03/23											
626	RELLENO DE ZANJA PARA CABLEADO ELÉCTRICO	1 día	dom 12/03/23	lun 13/03/23											
627	RELLENO DE ZANJA PARA CABLEADO ELÉCTRICO C/TIERRA	1 día	lun 13/03/23	mar 14/03/23											
628	RELLENO DE AFIRMADO E=0.10M	3 días	mar 14/03/23	jue 16/03/23											
629	CAMA DE APOYO E=0.10M PARA ZANJA	3 días	vie 17/03/23	dom 19/03/23											
630	TUBERIA PVC SAP Ø 4"PARA FIBRA OPTICA	2 días	dom 19/03/23	mar 21/03/23											
631	CURVA PVC-P Ø 4"	2 días	mar 21/03/23	jue 23/03/23											
632	BUZON DE CONCRETO H=1.20,D=1.20,TAPA CA°	2 días	jue 23/03/23	sáb 25/03/23											
633	ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIONES	9 días	sáb 25/03/23	lun 03/04/23											
634	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	lun 03/04/23	mar 04/04/23											
635	CABLEADO ESTRUCTURADO	45 días	jue 23/03/23	vie 05/05/23											
636	ALIMENTACION DE FIBRA OPTICA	11 días	jue 23/03/23	lun 03/04/23											
637	EMPALME A RED DE FIBRA OPTICA EXISTENTE (POR	3 días	jue 23/03/23	dom 26/03/23											
638	TUBERIA PVC SAP Ø 4"PARA FIBRA OPTICA	3 días	dom 26/03/23	mié 29/03/23											
639	CURVA PVC-P Ø 4"	3 días	dom 26/03/23	mié 29/03/23											
640	CABLE DE FIBRA OPTICA 12 HILOS	8 días	dom 26/03/23	lun 03/04/23											
641	GABINETE DE COMUNICACIONES	3 días	lun 03/04/23	mié 05/04/23											
642	SALIDA PARA GABINETE DE COMUNICACIONES 37RU EN	1 día	lun 03/04/23	mar 04/04/23											
643	SALIDA PARA GABINETE DE COMUNICACIONES 18RU EN	1 día	lun 03/04/23	mar 04/04/23											
644	GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES 37RU	2 días	mar 04/04/23	mié 05/04/23											
645	GABINETE DE COMUNICACIONES 18RU (SAL.	1 día	mar 04/04/23	mié 05/04/23											
646	GABINETE DE COMUNICACIONES 18RU (SAL. COMPUTO)	1 día	mar 04/04/23	mié 05/04/23											
647	GABINETE DE COMUNICACIONES 18RU (AULA TEORICA	1 día	mar 04/04/23	mié 05/04/23											
648	EMPALME DE RED FIBRA OPTICA A GABINETE DE	1 día	mié 05/04/23	mié 05/04/23											
649	SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO	33 días	mar 04/04/23	vie 05/05/23											
650	SALIDA SIMPLE DE RED DATA PARA MUEBLE	14 días	mar 04/04/23	lun 17/04/23											
651	SALIDA SIMPLE DE RED HDMI PARA TECHO	2 días	lun 17/04/23	mié 19/04/23											
652	SALIDA SIMPLE DE RED DATA PARA PARED	7 días	mié 19/04/23	mar 25/04/23											
653	SALIDA PARA WIFI INTERIOR	5 días	mié 26/04/23	dom 30/04/23											
654	SALIDA PARA WIFI EXTERIOR	5 días	dom 30/04/23	vie 05/05/23											
655	CABLEADO	14 días	mié 05/04/23	mar 18/04/23											
656	CABLE F/UTP CAT. 6 SOLIDO DE COBRE 23 AWG,4PARES	12 días	mié 05/04/23	dom 16/04/23											
657	CABLE DE FIBRA OPTICA 1 HILO	2 días	dom 16/04/23	mar 18/04/23											
658	CABLE HDMI	2 días	mié 05/04/23	jue 06/04/23											
659	TUBERIAS	12 días	lun 03/04/23	vie 14/04/23											
660	TUBERIA 2"PVC SAP - NTP:399.006,NTE:024	4 días	lun 03/04/23	jue 06/04/23											
661	TUBERIA 1 1/2"PVC SAP - NTP:399.006,NTE:024	5 días	lun 03/04/23	vie 07/04/23											
662	TUBERIA 1"PVC SAP - NTP:399.006,NTE:024	12 días	lun 03/04/23	vie 14/04/23											
663	TUBERIA 1/2"CONDUIT FLEXIBLE PVC	2 días	lun 03/04/23	mié 05/04/23											

Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
664	07.03.02.05.05	CURVA PVC-P 1"	2 días	lun 03/04/23	mié 05/04/23			2 días								
665	07.03.02.05.06	CURVA PVC-P 1 1/2"	2 días	lun 03/04/23	mié 05/04/23			2 días								
666	07.03.02.05.07	CURVA PVC-P 2"	2 días	lun 03/04/23	mié 05/04/23			2 días								
667	07.03.02.05.08	UNION PVC-P 1"	2 días	lun 03/04/23	mié 05/04/23			2 días								
668	07.03.02.05.09	UNION PVC-P 1 1/2"	2 días	lun 03/04/23	mié 05/04/23			2 días								
669	07.03.02.05.10	UNION PVC-P 2"	2 días	lun 03/04/23	mié 05/04/23			2 días								
670	07.03.02.06	CAJAS DE PASE	3 días	lun 03/04/23	mié 05/04/23			2 días								
671	07.03.02.06.01	CAJA DE PASE RECTANGULAR F° G° DE 100X55X50MM	2 días	lun 03/04/23	mié 05/04/23			2 días								
672	07.03.02.06.02	CAJA DE PASE CUADRADA F° G° DE 100X100X55MM	2 días	lun 03/04/23	mié 05/04/23			2 días								
673	07.03.02.06.03	CAJA DE PASE CUADRADA F° G° DE 150X150X80MM	3 días	lun 03/04/23	mié 05/04/23			3 días								
674	07.03.02.06.04	CAJA DE PASE CUADRADA F° G° DE 250X250X100MM	2 días	lun 03/04/23	mié 05/04/23			2 días								
675	07.03.02.06.05	CAJA DE PASE CUADRADA F° G° DE 300X300X100MM	2 días	lun 03/04/23	mié 05/04/23			2 días								
676	07.04	SISTEMA DE AUDIO - VIDEO	19 días	jue 06/04/23	mar 25/04/23											
677	07.04.01	TUBERIAS	3 días	jue 06/04/23	dom 09/04/23			3 días								
678	07.04.01.01	TUBERIA 1" PVC SAP - NTP:399.006,NTE:024	3 días	jue 06/04/23	dom 09/04/23											
679	07.04.02	CAJAS DE PASE	2 días	dom 09/04/23	mar 11/04/23			2 días								
680	07.04.02.01	CAJA DE PASE CUADRADA F° G° DE 150X150X80MM	2 días	dom 09/04/23	mar 11/04/23											
681	07.04.03	SISTEMA DE VIDEO	14 días	mar 11/04/23	mar 25/04/23			3 días								
682	07.04.03.01	CABLE 6 A UTP PARA CAMARAS Y MONITOR	3 días	mar 11/04/23	vie 14/04/23			2 días								
683	07.04.03.02	GRABADOR DE VIDEO DE RED (VND)	2 días	vie 14/04/23	dom 16/04/23			8 días								
684	07.04.03.03	CAMARA DE VIDEO TIPO DOMO DE 8 MP	8 días	dom 16/04/23	dom 23/04/23			1 día								
685	07.04.03.04	CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL	1 día	lun 24/04/23	mar 25/04/23											
686	07.04.04	SISTEMA DE AUDIO	7 días	jue 06/04/23	jue 13/04/23			2 días								
687	07.04.04.01	CABLEADO DE SONIDO AMBIENTAL	2 días	vie 07/04/23	dom 09/04/23			1 día								
688	07.04.04.01.01	CABLE FLEXIBLE MELLIZO (CFM) 16 AWG	2 días	vie 07/04/23	dom 09/04/23			1 día								
689	07.04.04.01.02	CABLE MULTI-CONDUCTOR 2x24 AWG	1 día	vie 07/04/23	sáb 08/04/23			1 día								
690	07.04.04.02	SALIDA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO	1 día	jue 06/04/23	vie 07/04/23			1 día								
691	07.04.04.02.01	SALIDA DE ALTAVOZ ADOSADO A LA PARED (AULA	1 día	jue 06/04/23	vie 07/04/23			1 día								
692	07.04.04.02.02	SALIDA DE MICROFONO TIPO PUPITRE	1 día	jue 06/04/23	vie 07/04/23			1 día								
693	07.04.04.02.03	SALIDA DE MICROFONO AMBIENTAL	1 día	jue 06/04/23	vie 07/04/23			4 días								
694	07.04.04.03	EQUIPO DE SONIDO AMBIENTAL	5 días	sáb 08/04/23	jue 13/04/23			1 día								
695	07.04.04.03.01	GABINETE PARA EL SISTEMA MULTIMEDIA	4 días	sáb 08/04/23	mié 12/04/23											
696	07.04.04.03.02	CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE PERIFONEO	1 día	mié 12/04/23	jue 13/04/23											
697	07.05	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	260 días	vie 07/04/23	dom 10/12/23			1 día								
698	07.05.01	SALIDA DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 24000	1 día	vie 07/04/23	sáb 08/04/23			1 día								
699	07.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	1 día	sáb 08/04/23	dom 09/04/23			1 día								
700	07.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	1 día	dom 09/04/23	lun 10/04/23			1 día								
701		FIN DE OBRA	0 días	dom 10/12/23	dom 10/12/23											

001015



10/12

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
C.P. N° 90517

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Penalta Pumapillo
GERENTE GENERAL

Tarea		Resumen		Hito Inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		División crítica	
División		Resumen del proyecto		Resumen Inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite		Progreso	
Hito		Tarea Inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Tareas críticas		Progreso manual	
