


Id	<div><div></div><div></div></div>	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1825abr '2401081522may '242906											
0			PLAN DE CONTINGENCIA I.E JUAN VELASCO ALVARADO	30 días	lun 01/04/24	mar 30/04/24												
1			1 PLAN DE CONTINGENCIA	30 días	lun 01/04/24	mar 30/04/24												
2			1.1 OBRAS PROVISIONALES	30 días	lun 01/04/24	mar 30/04/24												
3			1.1.1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	30 días	lun 01/04/24	mar 30/04/24												
4			1.1.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES	30 días	lun 01/04/24	mar 30/04/24												
5			1.1.1.1.1 ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	1 día	lun 01/04/24	lun 01/04/24												
6			1.1.1.1.2 CARTEL DE OBRA 2.40 x 3.60	1 día	lun 01/04/24	lun 01/04/24												
7			1.1.1.1.3 ALQUILER DE SS.HH. PROVISIONALES	30 días	lun 01/04/24	mar 30/04/24												
8			1.1.1.1.4 CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY	3 días	lun 01/04/24	mié 03/04/24												
9			1.1.1.2 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2 días	lun 01/04/24	mar 02/04/24												
10			1.1.1.2.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2 días	lun 01/04/24	mar 02/04/24												
11			1.1.2 TRABAJOS PRELIMINARES	3 días	mié 03/04/24	vie 05/04/24												
12			1.1.2.1 TRAZOS, NIVELACION Y REPLANTEO	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24												
13			1.1.2.1.1 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24												
14			1.1.2.2 DEMOLICIONES	3 días	mié 03/04/24	vie 05/04/24												
15			1.1.2.2.1 DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS EN SISTEMA DE ALBAÑILERIA	1 día	mié 03/04/24	mié 03/04/24												
16			1.1.2.2.2 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24												
17			1.1.2.2.3 DEMOLICION DE VEREDAS Y PATIO	1 día	vie 05/04/24	vie 05/04/24												
18			1.1.2.2.4 ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIÓN C C/CARGADOR	1 día	mié 03/04/24	mié 03/04/24												
19			1.1.2.2.5 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES C/MAQUINA Dprom. 15 km.	1 día	mié 03/04/24	mié 03/04/24												
20			1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	30 días	lun 01/04/24	mar 30/04/24												
21			1.1.3.1 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5 días	lun 01/04/24	vie 05/04/24												
22			1.1.3.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	30 días	lun 01/04/24	mar 30/04/24												
23			1.1.3.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	30 días	lun 01/04/24	mar 30/04/24												
24			1.1.3.4 SEÑALES TEMPORALES DE SEGURIDAD	30 días	lun 01/04/24	mar 30/04/24												
25			1.1.3.5 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	30 días	lun 01/04/24	mar 30/04/24												
26			1.1.4 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	30 días	lun 01/04/24	mar 30/04/24												
27			1.1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	30 días	lun 01/04/24	mar 30/04/24												
28			1.2 ESTRUCTURAS	20 días	lun 01/04/24	sáb 20/04/24												
29			1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS	10 días	lun 01/04/24	mié 10/04/24												
30			1.2.1.1 EXCAVACIONES	6 días	jue 04/04/24	mar 09/04/24												
31			1.2.1.1.1 EXCAVACION PARA LOSA MACISA EN TERRENO ARENOSO Hmax = 1.60 M	3 días	jue 04/04/24	sáb 06/04/24												
32			1.2.1.1.2 EXCAVACION PARA CIMENTACION EN TERRENO ARENOSO Hmax=1.70 M	3 días	dom 07/04/24	mar 09/04/24												
33			1.2.1.2 RELLENOS	3 días	lun 01/04/24	mié 03/04/24												
Proyecto: PLAN DE CONTINGENCIA Fecha: mié 17/01/24			Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual	<div></div>						
			División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>								
			Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>								
			Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>								
			Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>								

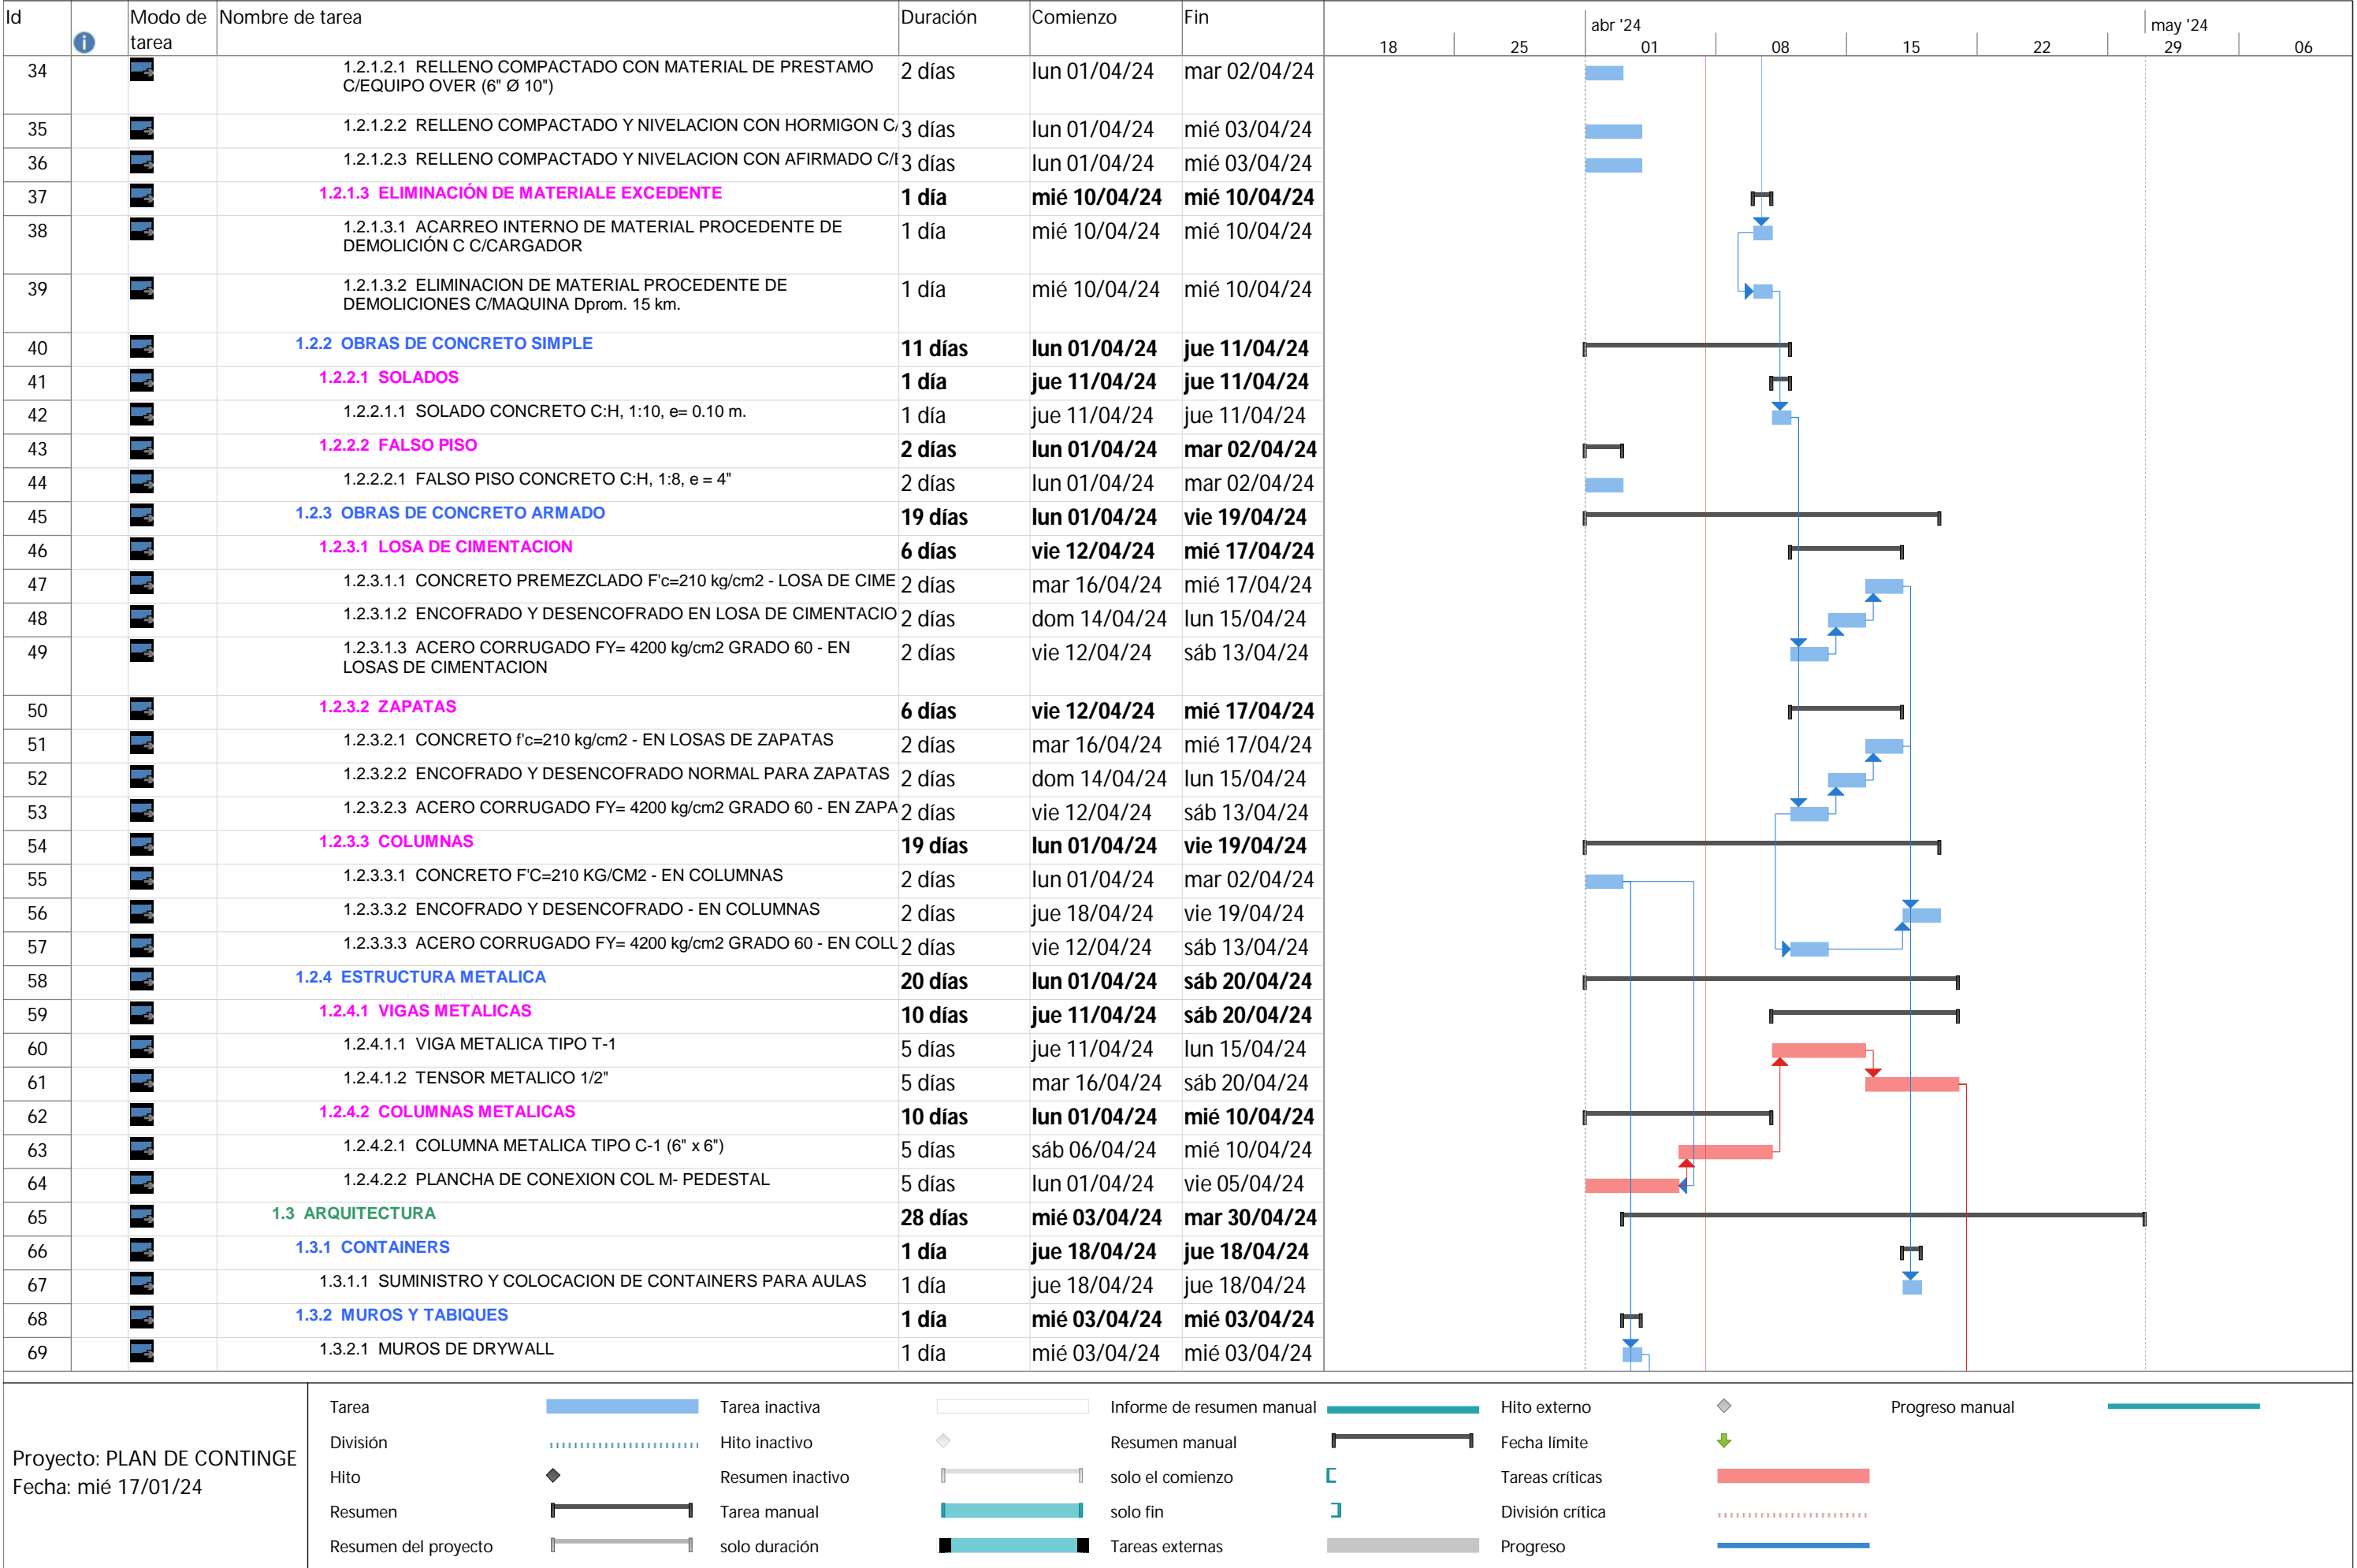

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	18	25	abr '24	08	15	22	may '24	06
									01				29	
70			1.3.3 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLADURAS	2 días	mié 03/04/24	jue 04/04/24								
71			1.3.3.1 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 e=1	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24								
72			1.3.3.2 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5, e=	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24								
73			1.3.3.3 TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5 e=1.5 cm	1 día	mié 03/04/24	mié 03/04/24								
74			1.3.3.4 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 e=1.5 cm	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24								
75			1.3.4 PISOS Y PAVIMENTOS	22 días	mar 09/04/24	mar 30/04/24								
76			1.3.4.1 PISOS	8 días	dom 21/04/24	dom 28/04/24								
77			1.3.4.1.1 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO F'c= 175 Kg/cm2, e= 4" BRUÑADO @3.00M INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	4 días	dom 21/04/24	mié 24/04/24								
78			1.3.4.1.2 JUNTA DE DILATACION 1", ARENA FINA + ASFALTO RC-250 F	2 días	jue 25/04/24	vie 26/04/24								
79			1.3.4.1.3 PISO DE GRAVILLA	2 días	sáb 27/04/24	dom 28/04/24								
80			1.3.4.2 AREA DE JUEGOS	2 días	lun 29/04/24	mar 30/04/24								
81			1.3.4.2.1 SUMINISTRO Y SEMBRIO DE GRASS NATURAL	2 días	lun 29/04/24	mar 30/04/24								
82			1.3.4.3 ZOCALOS	4 días	mar 09/04/24	vie 12/04/24								
83			1.3.4.3.1 ZOCALO DE CERAMICA DE COLOR 45 x 45 cm	4 días	mar 09/04/24	vie 12/04/24								
84			1.3.5 COBERTURAS	19 días	jue 04/04/24	lun 22/04/24								
85			1.3.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA RASCHEL	1 día	dom 21/04/24	dom 21/04/24								
86			1.3.5.2 COBERTURA ALUZING TR4	2 días	dom 21/04/24	lun 22/04/24								
87			1.3.5.3 FALSO CIELO DRYWALL	4 días	jue 04/04/24	dom 07/04/24								
88			1.3.6 CARPINTERIA DE MADERA	2 días	lun 08/04/24	mar 09/04/24								
89			1.3.6.1 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA - P-03 (0.80 x 2.10)	1 día	lun 08/04/24	lun 08/04/24								
90			1.3.6.2 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA - P-04 (0.90 x 2.10)M	1 día	mar 09/04/24	mar 09/04/24								
91			1.3.6.3 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA - P-05 (0.90 x 2.10 M)	1 día	mar 09/04/24	mar 09/04/24								
92			1.3.6.4 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA - P-06 (0.60 x 2.10)M	1 día	mar 09/04/24	mar 09/04/24								
93			1.3.7 CARPINTERIA Y CUBIERTAS METALICAS	2 días	lun 08/04/24	mar 09/04/24								
94			1.3.7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA - P-02 - (2.83 x 2.55)M	1 día	lun 08/04/24	lun 08/04/24								
95			1.3.7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA - P-01 - (1.00 x 2.60)M	1 día	mar 09/04/24	mar 09/04/24								
96			1.3.8 CERRAJERIA	1 día	lun 08/04/24	lun 08/04/24								
97			1.3.8.1 BISAGRAS DE ACERO ALUMINIZADO 180° - 4" x 4"	1 día	lun 08/04/24	lun 08/04/24								
98			1.3.8.2 CERRADURA DE MANIJA TIPO PALANCA ACERO INOXIDABLE	1 día	lun 08/04/24	lun 08/04/24								
99			1.3.8.3 CERROJO BICROMATADO DE 2"	1 día	lun 08/04/24	lun 08/04/24								
100			1.3.9 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES	2 días	lun 08/04/24	mar 09/04/24								
101			1.3.9.1 VIDRIO TEMPLADO 6 MM, EN VENTANAS CON PERFILES DE ALUMINIO - SISTEMA DIRECTO	2 días	lun 08/04/24	mar 09/04/24								
102			1.3.10 PINTURAS	6 días	mié 10/04/24	lun 15/04/24								
103			1.3.10.1 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASOS, INCL. EMPASTAD	2 días	mié 10/04/24	jue 11/04/24								
104			1.3.10.2 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES, INCL. EMPA	2 días	vie 12/04/24	sáb 13/04/24								
105			1.3.10.3 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES, INCL. EMP	2 días	dom 14/04/24	lun 15/04/24								
Proyecto: PLAN DE CONTINGE Fecha: mié 17/01/24			Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual			Hito externo		Progreso manual		
			División		Hito inactivo		Resumen manual			Fecha límite				
			Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo			Tareas críticas				
			Resumen		Tarea manual		solo fin			División crítica				
			Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			Progreso				

Id	<div><div></div><div></div></div>	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>											
----	-----------------------------------	---------------	-----------------	----------	----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart											
							18	25	abr '24		01	08	15	22	may '24		29	06
130			1.4.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO SIFON JET	2 días	vie 05/04/24	sáb 06/04/24												
131			1.4.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ONE PIECE RIVOLI P	1 día	dom 07/04/24	dom 07/04/24												
132			1.4.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DELAVATORIO MANANTIAL DE PEI	1 día	lun 08/04/24	lun 08/04/24												
133			1.4.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIE	1 día	mar 09/04/24	mar 09/04/24												
134			1.4.1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQU	1 día	mié 10/04/24	mié 10/04/24												
135			1.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA	3 días	lun 08/04/24	mié 10/04/24												
136			1.4.2.1 GRIFERIA PARA LAVATORIO	1 día	lun 08/04/24	lun 08/04/24												
137			1.4.2.2 GRIFERIA PARA RIEGO	1 día	mié 10/04/24	mié 10/04/24												
138			1.4.3 SISTEMA DE AGUA FRÍA	4 días	mar 02/04/24	vie 05/04/24												
139			1.4.3.1 SALIDA DE AGUA	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24												
140			1.4.3.1.1 SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2"	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24												
141			1.4.3.2 RED DE DE DISTRIBUCIÓN	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24												
142			1.4.3.2.1 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 - Ø 1/2" - ROSCADA	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24												
143			1.4.3.3 ACCESORIOS	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24												
144			1.4.3.3.1 CODO PVC SAP Ø 1/2" x 90° P/AGUA	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24												
145			1.4.3.3.2 TEE PVC SAP 1/2" P/AGUA	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24												
146			1.4.3.4 VALVULAS	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24												
147			1.4.3.4.1 VALVULA BOLA DE BRONCE DE 1/2"	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24												
148			1.4.3.4.2 CAJA DE REG. P/VALVULA DE BOLA 1/2" - 3/4"	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24												
149			1.4.3.5 EMPALME A CONEXION EXISTE	3 días	mar 02/04/24	jue 04/04/24												
150			1.4.3.5.1 PICADO DE MURO P/EMPALME DE TUBERIA	1 día	mar 02/04/24	mar 02/04/24												
151			1.4.3.5.2 RESTAURACION DE MURO Y ESTRUCTURAS P/EMPLAME DE TUBERIA.	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24												
152			1.4.3.6 PRUEBAS HIDRAULICAS	1 día	vie 05/04/24	vie 05/04/24												
153			1.4.3.6.1 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DE AG	1 día	vie 05/04/24	vie 05/04/24												
154			1.4.4 SISTEMA DE DESAGUE	12 días	mar 02/04/24	sáb 13/04/24												
155			1.4.4.1 SALIDA DE DESAGÜE	2 días	dom 07/04/24	lun 08/04/24												
156			1.4.4.1.1 SALIDA DE DESAGUE EN PVC Ø 2"	1 día	lun 08/04/24	lun 08/04/24												
157			1.4.4.1.2 SALIDA DE DESAGUE EN PVC Ø 4"	1 día	dom 07/04/24	dom 07/04/24												
158			1.4.4.2 RED DE DE DISTRIBUCIÓN - RAMALES Y MONTANTES	4 días	mar 09/04/24	vie 12/04/24												
159			1.4.4.2.1 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES, A=0.50 m H menor 1.	1 día	mar 09/04/24	mar 09/04/24												
160			1.4.4.2.2 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T.N. P/TUB.	1 día	mié 10/04/24	mié 10/04/24												
161			1.4.4.2.3 CAMA DE ARENA E=0.10M, A=0.50M	1 día	jue 11/04/24	jue 11/04/24												
162			1.4.4.2.4 RELLENO DE ZANJAS, A=0.50M, H menor 1.00M	1 día	vie 12/04/24	vie 12/04/24												
163			1.4.4.2.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	mié 10/04/24	mié 10/04/24												
164			1.4.4.2.6 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGÜE Ø 2"	1 día	mié 10/04/24	mié 10/04/24												
165			1.4.4.2.7 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGÜE Ø 4"	1 día	jue 11/04/24	jue 11/04/24												
166			1.4.4.3 ACCESORIOS DE REDES DE DESAÜE	2 días	mié 10/04/24	jue 11/04/24												
167			1.4.4.3.1 CODO PVC SAL Ø 2" x 90° P/DESAGÜE	1 día	mié 10/04/24	mié 10/04/24												

Proyecto: PLAN DE CONTINGE Fecha: mié 17/01/24	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Página 5

This document was created by an application that isn't licensed to use **newPDF**

Página 6

This document was created by an application that isn't licensed to use [novaPDF](#).
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	18		25		abr '24		08		15		22		may '24		06	
											01								29			
202			1.5.3.1.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS	3 días	mié 10/04/24	vie 12/04/24																
203			1.5.3.2 TUBERÍAS EMPOTRADAS	4 días	sáb 13/04/24	mar 16/04/24																
204			1.5.3.2.1 TUBERIA FLEXIBLE LH - 20 MM Ø	2 días	sáb 13/04/24	dom 14/04/24																
205			1.5.3.2.2 TUBERIA PVC - P 25mm Ø x 3M	2 días	lun 15/04/24	mar 16/04/24																
206			1.5.4 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERÍAS	4 días	sáb 13/04/24	mar 16/04/24																
207			1.5.4.1 ALIMENTADORES	4 días	sáb 13/04/24	mar 16/04/24																
208			1.5.4.1.1 SUMINISTRO E INST. DE ALIMENTADOR CAB NH-80 Ø 2.5 mm	2 días	sáb 13/04/24	dom 14/04/24																
209			1.5.4.1.2 SUMINISTRO E INST. DE ALIMENTADOR CAB NH-80 Ø 4.0 mm	2 días	sáb 13/04/24	dom 14/04/24																
210			1.5.4.1.3 SUMINISTRO E INST. DE ALIMENTADOR CAB N2XOH Ø 6mm	2 días	lun 15/04/24	mar 16/04/24																
211			1.5.4.1.4 SUMINISTRO E INST. DE ALIMENTADOR CAB N2XOH Ø 10mm	2 días	lun 15/04/24	mar 16/04/24																
212			1.5.4.2 SISTEMA DE CONDUCTOS	2 días	sáb 13/04/24	dom 14/04/24																
213			1.5.4.2.1 BUZÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS (0.80x0.80x0.90 cm)	2 días	sáb 13/04/24	dom 14/04/24																
214			1.5.5 TABLEROS PRINCIPALES	2 días	sáb 20/04/24	dom 21/04/24																
215			1.5.5.1 TG C/BARRAS 2x40: 1 Int. Ter. 2x32A, 2 Int. Ter. 2x25A, 1 Int. Ter. 2x20A, 12 Polos Empotrado	2 días	sáb 20/04/24	dom 21/04/24																
216			1.5.6 TABLERO DE DISTRIBUCION	1 día	dom 21/04/24	dom 21/04/24																
217			1.5.6.1 TD-1 C/RIEL DIN 2x25A: 1 Int. Ter. 2x16A, 1 Int. Ter. 2x20A, 2 Int. Dif. 2x25A(30mA), 8 Polos Empotrado	1 día	dom 21/04/24	dom 21/04/24																
218			1.5.6.2 TD-2 C/RIEL DIN 1 Int. Ter. 2x16A, 1 Int. Dif. 2x25A(30mA), 6 Polos Empotrado	1 día	dom 21/04/24	dom 21/04/24																
219			1.5.6.3 TD-3 C/BARRAS DIN 2x32A, 2 Int. Ter. 2x25A, 2 Int. Dif. 2x25A(30mA), 12 Polos Empotrado	1 día	dom 21/04/24	dom 21/04/24																
220			1.5.7 INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	1 día	lun 15/04/24	lun 15/04/24																
221			1.5.7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO PUESTA A TIERRA R< 10 OHMIOS (VARILLA DE CU 3/4)	1 día	lun 15/04/24	lun 15/04/24																
222			1.5.7.2 COBRE FORRADO DE 16mm2	1 día	lun 15/04/24	lun 15/04/24																
223			1.5.8 ARTEFACTOS	8 días	lun 22/04/24	lun 29/04/24																
224			1.5.8.1 LUMINARIAS	6 días	lun 22/04/24	sáb 27/04/24																
225			1.5.8.1.1 LUMINARIA LED CIRCULAR 24W, DE 1800lm /VIDA UTIL ? 30000 HORAS/ 6500K	2 días	lun 22/04/24	mar 23/04/24																
226			1.5.8.1.2 LUMINARIA DE EMERGENCIA LAMPARAS DE 32 LEDS, 90MIN DE AUTONOMIA	2 días	mié 24/04/24	jue 25/04/24																
227			1.5.8.1.3 LUMINARIA REFLECTOR 50W, IP65	2 días	vie 26/04/24	sáb 27/04/24																
228			1.5.8.2 PRUEBAS ELECTRICAS Y/O HERMETICIDAD	2 días	dom 28/04/24	lun 29/04/24																
229			1.5.8.2.1 PRUEBAS DEL NIVEL DE AISLAMIENTO EN CADA TABLERO	1 día	dom 28/04/24	dom 28/04/24																
230			1.5.8.2.2 MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS POZOS DE PUESTA	1 día	lun 29/04/24	lun 29/04/24																
231			1.5.9 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	7 días	mié 24/04/24	mar 30/04/24																
232			1.5.9.1 CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFI	2 días	mié 24/04/24	jue 25/04/24																
233			1.5.9.1.1 CABLES EN TUBERIAS	2 días	mié 24/04/24	jue 25/04/24																
234			1.5.9.1.1.1 CABLES PARA SISTEMA DE EMERGENCIA FLP BLINDADO 4X18, CERTIFICACION CL/NEC	2 días	mié 24/04/24	jue 25/04/24																
Proyecto: PLAN DE CONTINGENCIA Fecha: mié 17/01/24			Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual			Hito externo		Progreso manual										
			División		Hito inactivo		Resumen manual			Fecha límite												
			Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo			Tareas críticas												
			Resumen		Tarea manual		solo fin			División crítica												
			Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			Progreso												

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	18		25	abr '24		01	08	15	22	may '24		29	06
235			1.5.9.2 CANALETAS, CONDUCTOS O TUBERIAS	5 días	mié 24/04/24	dom 28/04/24													
236			1.5.9.2.1 TUBERIA PVC - P 20mm Ø x 3M	3 días	mié 24/04/24	vie 26/04/24													
237			1.5.9.2.2 TUBERIA PVC - P 25mm Ø x 3M	2 días	sáb 27/04/24	dom 28/04/24													
238			1.5.9.3 SALIDAS	2 días	lun 29/04/24	mar 30/04/24													
239			1.5.9.3.1 SALIDA DE SISTEMA CONTA INCENDIO	2 días	lun 29/04/24	mar 30/04/24													
240			1.5.9.3.1.1 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO (INCLUYE EQUIPO)	1 día	lun 29/04/24	lun 29/04/24													
241			1.5.9.3.1.2 SALIDA PARA ACTIVACION MANUAL DE ALARMA (INCLUYE EQUIPO)	1 día	mar 30/04/24	mar 30/04/24													
242			1.5.9.3.1.3 SALIDA PARA SIRENA ALARMA CONTRA INCENDIO / LUZ ESTROBOSCOPICA, INCLUYE	1 día	mar 30/04/24	mar 30/04/24													
243			1.5.9.3.1.4 SALIDA DE DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE INTELIGENTE, INCLUYE EQUIPAMIENTO	1 día	mar 30/04/24	mar 30/04/24													
244			1.5.9.4 VARIOS	1 día	mié 24/04/24	mié 24/04/24													
245			1.5.9.4.1 CAJAS DE PASE	1 día	mié 24/04/24	mié 24/04/24													
246			1.5.9.4.1.1 CAJA DE PASE F°G° 150 x 150 x 100 MM - (6"	1 día	mié 24/04/24	mié 24/04/24													
247			1.5.9.4.1.2 CAJA DE PASE F°G° 200 x 200 x 100 MM - (8"	1 día	mié 24/04/24	mié 24/04/24													

Proyecto: PLAN DE CONTINGENCIA
Fecha: mié 17/01/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite


Tareas críticas

División crítica


Progreso



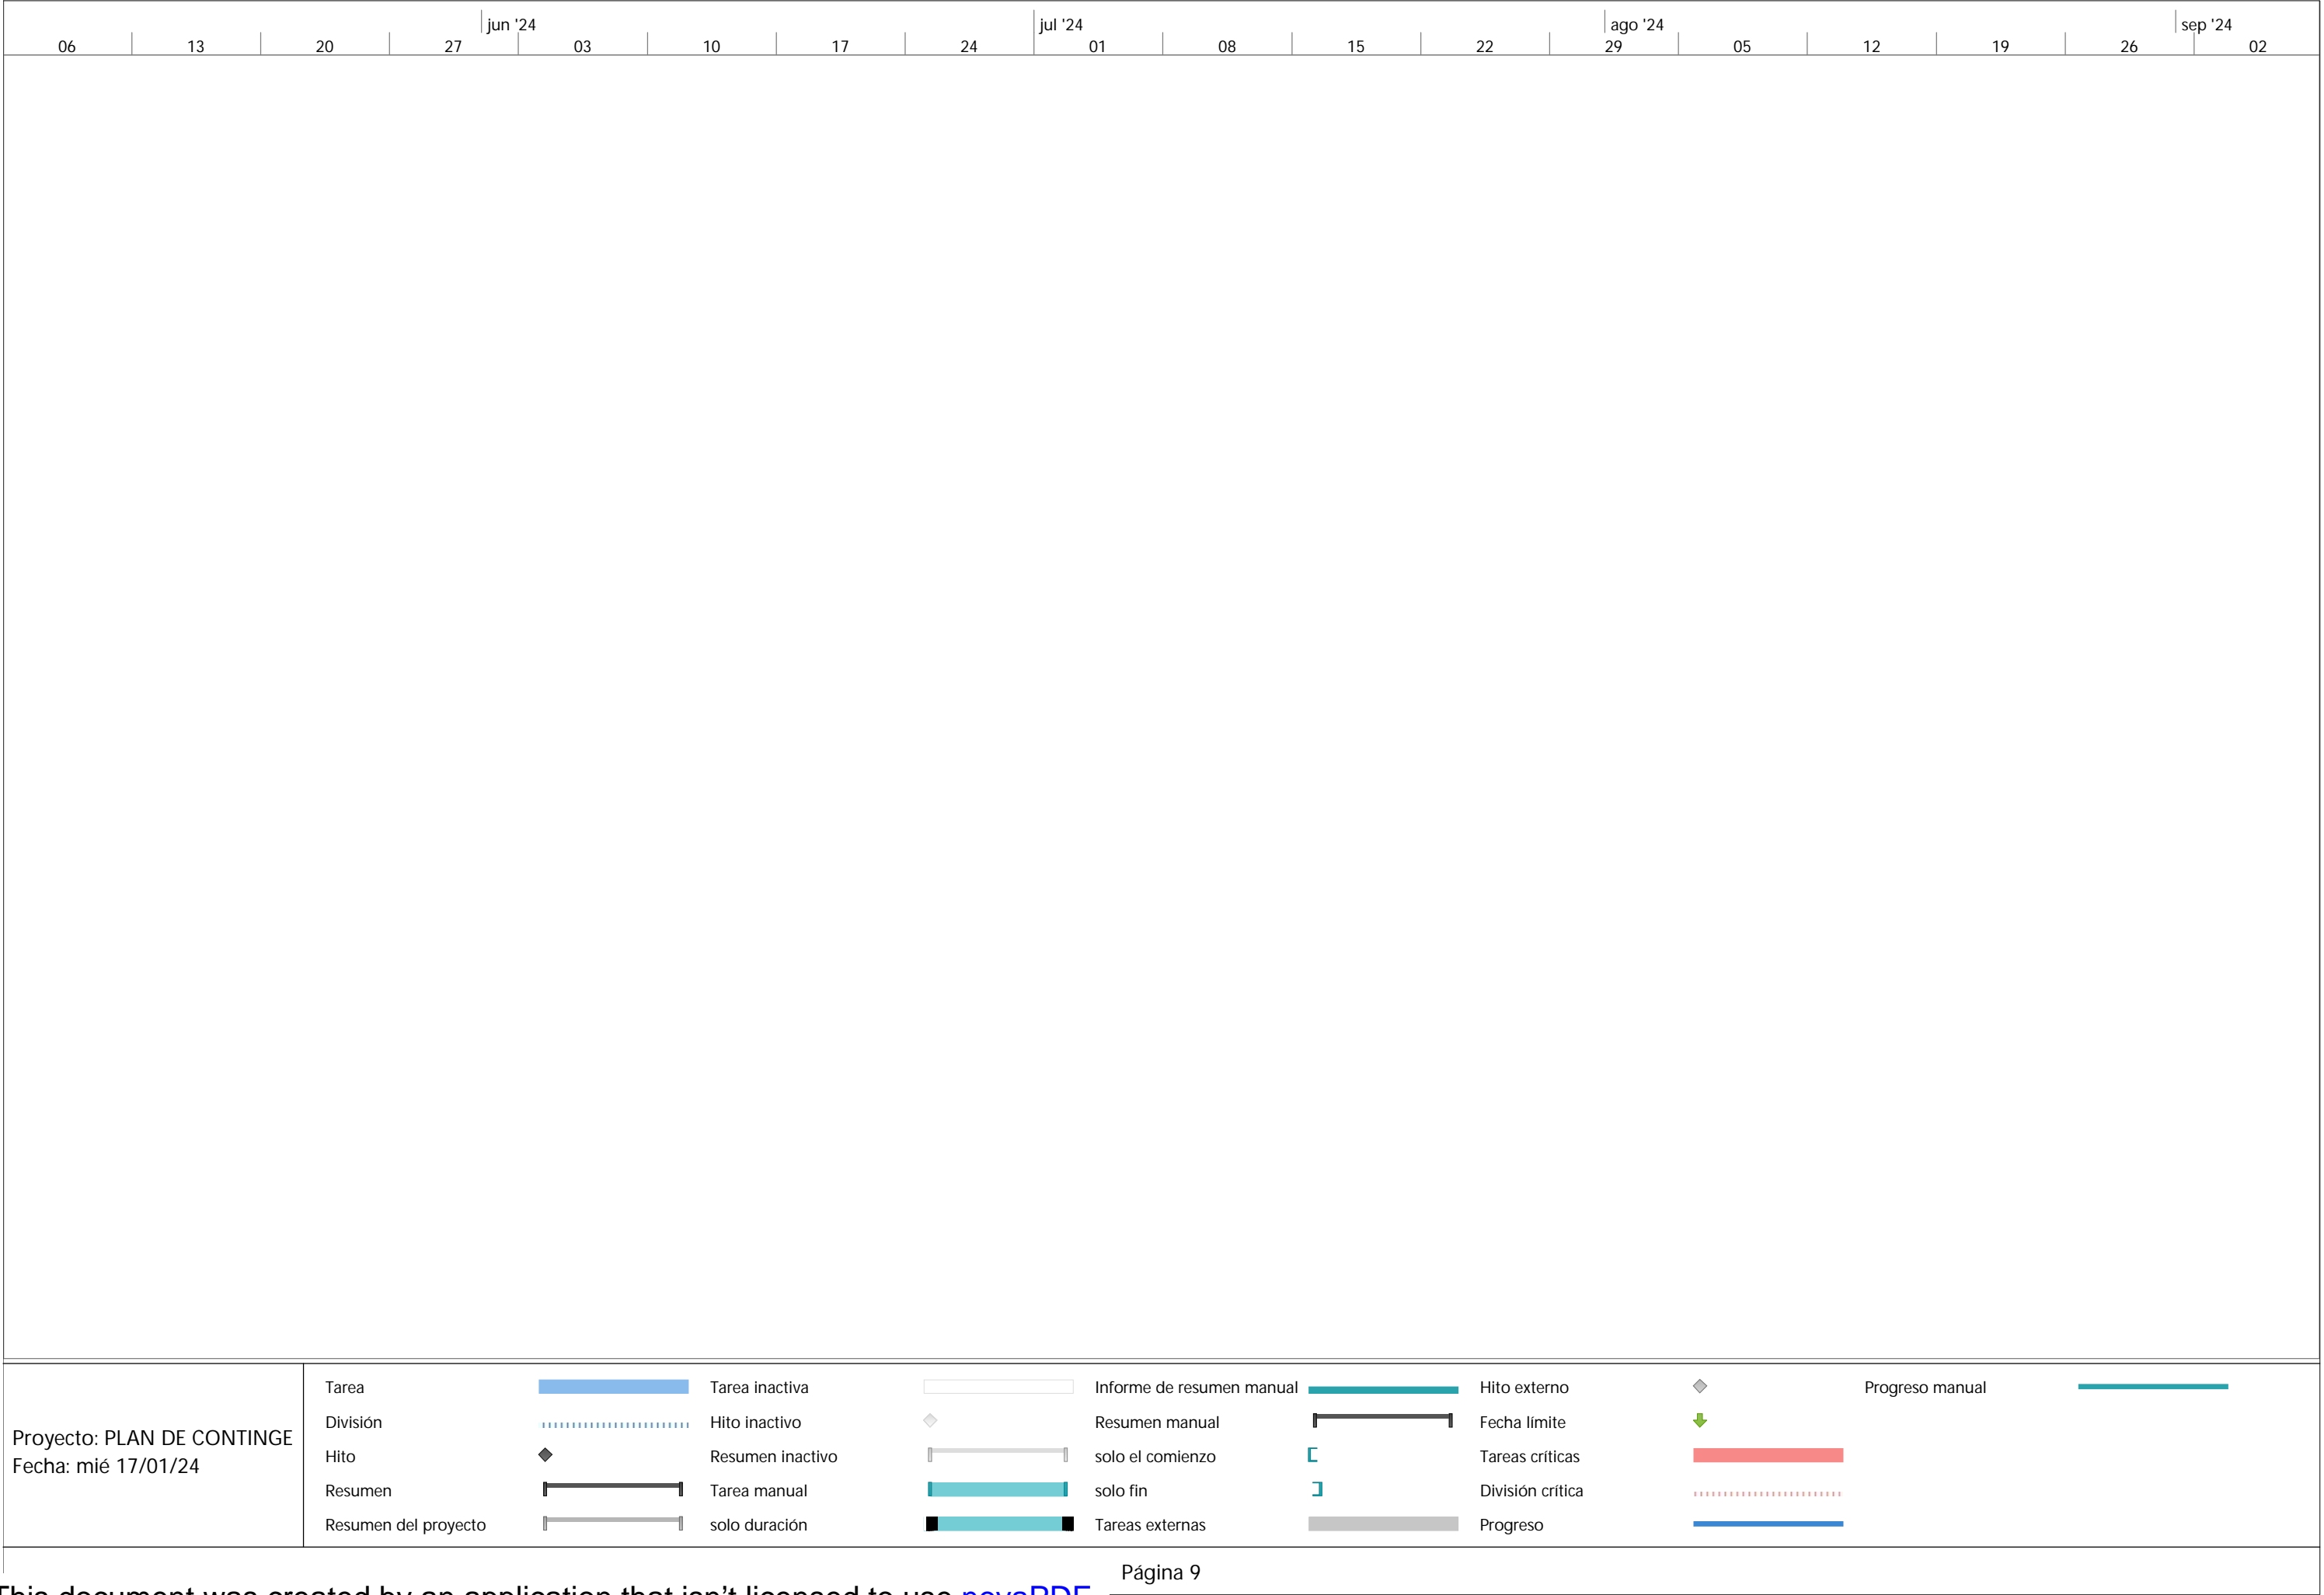


















Progreso manual




























Proyecto: PLAN DE CONTINGE Fecha: mié 17/01/24	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			
























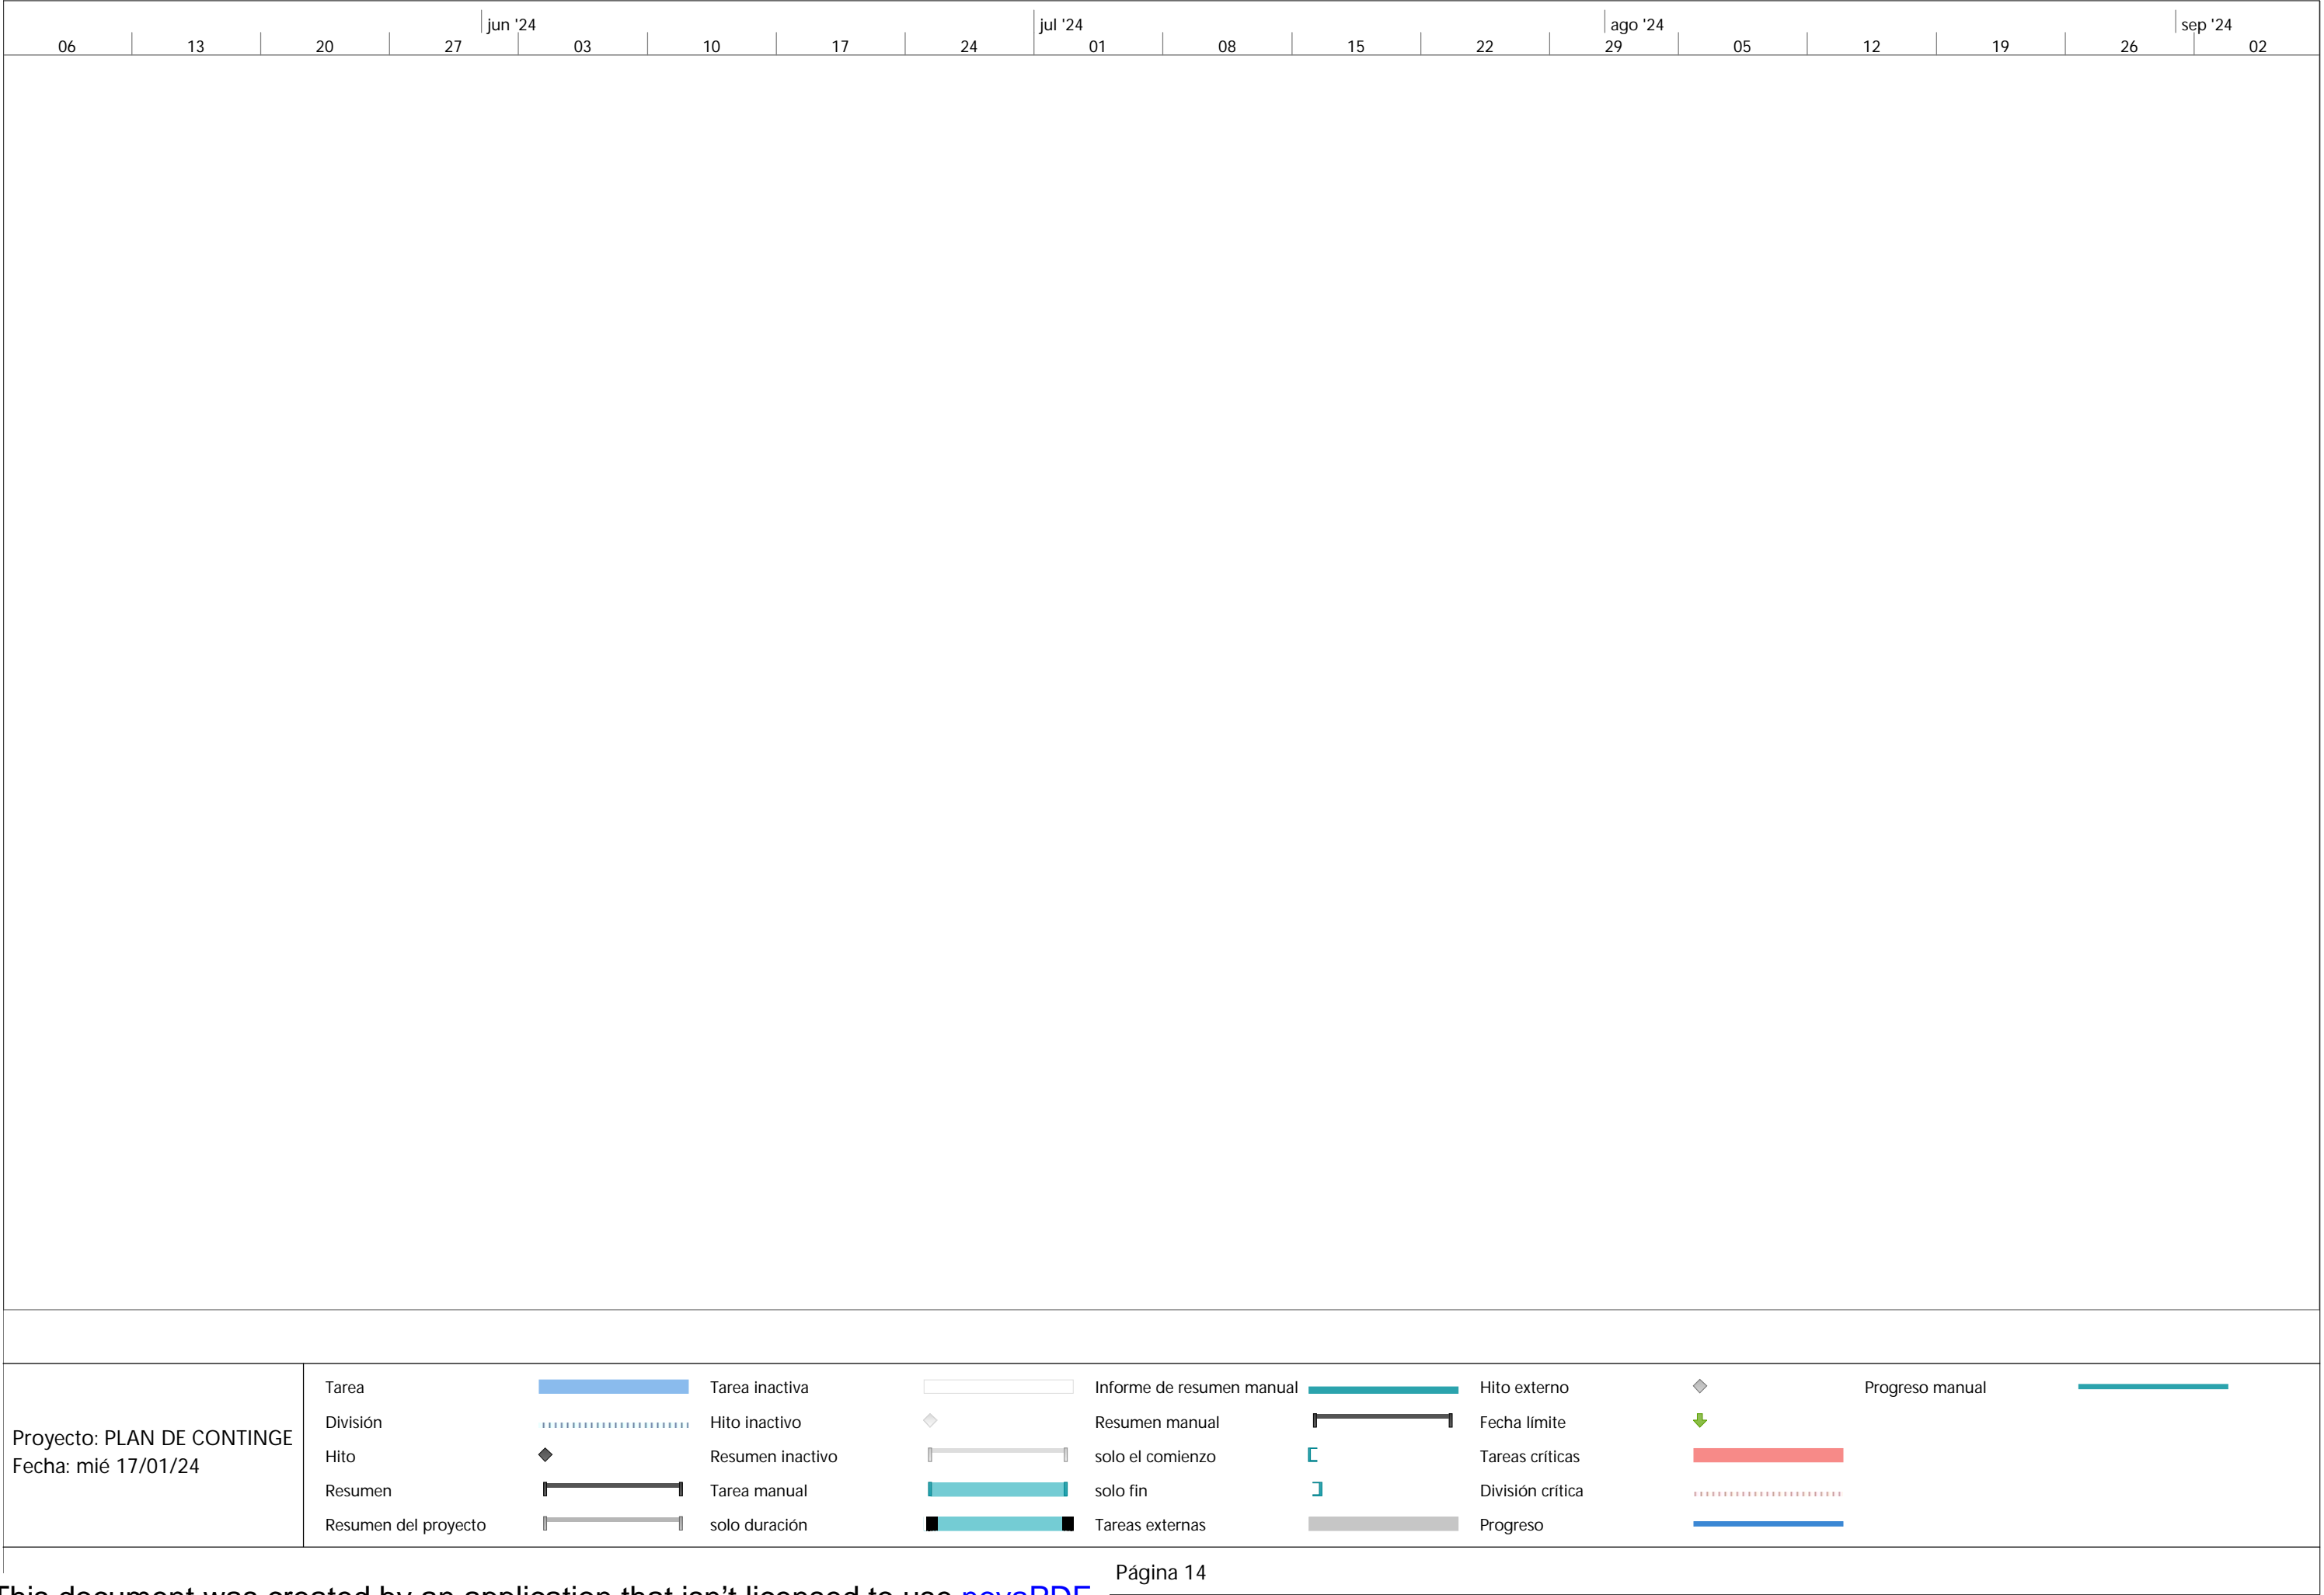
Proyecto: PLAN DE CONTINGE Fecha: mié 17/01/24	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			



Proyecto: PLAN DE CONTINGE Fecha: mié 17/01/24	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

























Proyecto: PLAN DE CONTINGE Fecha: mié 17/01/24	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			




Página 14

This document was created by an application that isn't licensed to use [novaPDF](#).
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



Proyecto: PLAN DE CONTINGE Fecha: mié 17/01/24	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

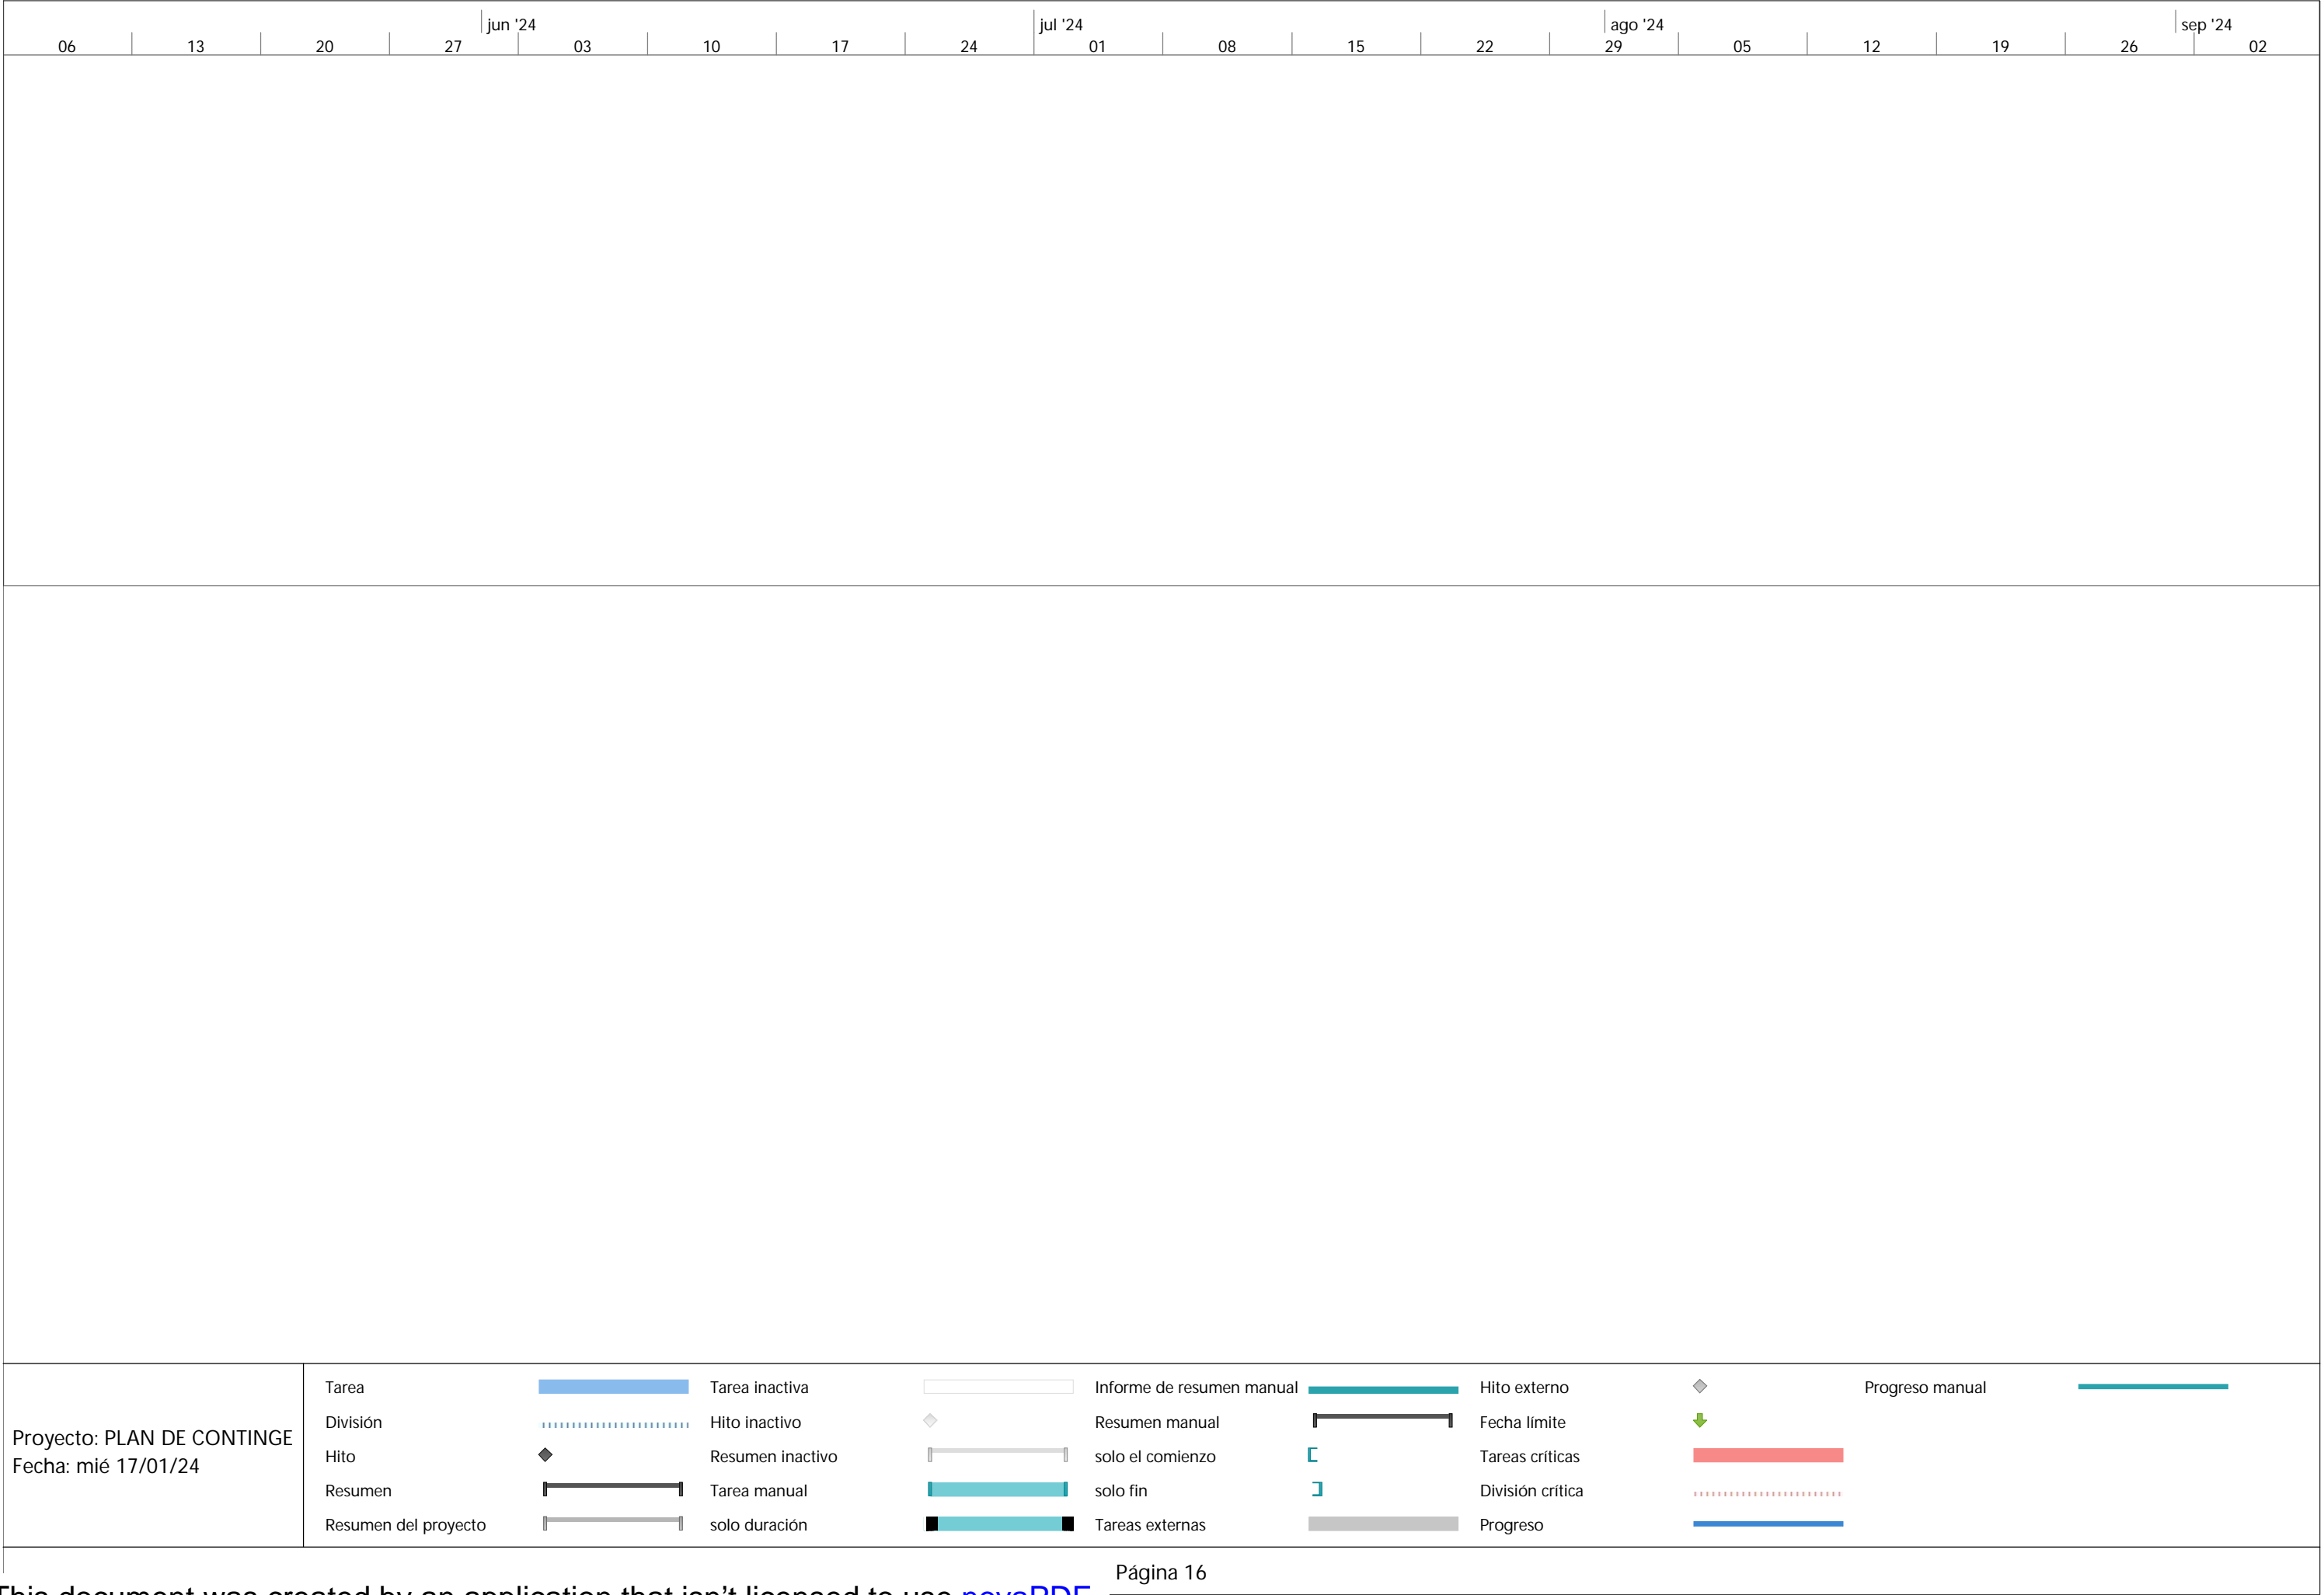

Página 16

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF. Purchase a license to generate PDF files without this notice.
