



Id	Item	Partida	Parcial (S/.)	Duración	Comienzo	Fin	septiembre 2024	octubre 2024	noviembre 2024	diciembre 2024
							29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28	01 04 07 10 13 16 19 22 25 28	31 03 06 09 12 15 18 21 24 27	30 03 06 09 12
0		OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOLAR CON COBERTURA METÁLICA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 22770 – SAN ANTONIO DE COPRODELI – HUERTOS DESAN ANTONIO, DE LA LOCALIDAD DE SUBTANJALLA, DISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA, ICA"	S/932,135.01	90 días	01/09/24 08:00	29/11/24 17:00				
1		INICIO DE OBRA	S/0.00	0 días	01/09/24 08:00	01/09/24 08:00				
2	01	OBRAS PROVISIONALES	S/21,427.39	90 días	01/09/24 08:00	29/11/24 17:00				
3	01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 2.40x3.60 M	S/2,153.67	1 día	01/09/24 08:00	01/09/24 17:00				
4	01.02	CERCO PROVISIONAL CON MANTA DE POLIPROPILENO	S/9,423.72	1 día	01/09/24 08:00	01/09/24 17:00				
5	01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	S/2,500.00	2 días	01/09/24 08:00	02/09/24 17:00				
6	01.04	SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA	S/2,850.00	90 días	01/09/24 08:00	29/11/24 17:00				
7	01.05	ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	S/4,500.00	90 días	01/09/24 08:00	29/11/24 17:00				
8	02	OBRAS PRELIMINARES	S/24,316.87	7 días	06/09/24 08:00	12/09/24 17:00				
9	02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	S/10,516.91	2 días	06/09/24 08:00	07/09/24 17:00				
10	02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE OBRA	S/13,799.96	5 días	07/09/24 17:00	12/09/24 17:00				
11	03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	S/13,775.23	90 días	01/09/24 08:00	29/11/24 17:00				
12	03.01	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	S/3,214.40	90 días	01/09/24 08:00	29/11/24 17:00				
13	03.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	S/7,224.00	90 días	01/09/24 08:00	29/11/24 17:00				
14	03.03	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	S/933.48	90 días	01/09/24 08:00	29/11/24 17:00				
15	03.04	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	S/2,403.35	90 días	01/09/24 08:00	29/11/24 17:00				
16	04	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	S/6,099.82	90 días	01/09/24 08:00	29/11/24 17:00				
17	04.01	RIEGO PARA MITIGACION DE POLVO	S/3,600.00	90 días	01/09/24 08:00	29/11/24 17:00				
18	04.02	ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS	S/774.52	90 días	01/09/24 08:00	29/11/24 17:00				
19	04.03	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	S/1,725.30	90 días	01/09/24 08:00	29/11/24 17:00				
20	05	DESMONTAJE, DEMOLICION Y REPOSICION	S/18,678.82	87 días	02/09/24 08:00	27/11/24 17:00				
21	05.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE	S/4,300.00	4 días	02/09/24 08:00	05/09/24 17:00				
22	05.01.01	RETIRO DE MALLA EXISTENTE	S/1,800.00	2 días	02/09/24 08:00	03/09/24 17:00				
23	05.01.02	RETIRO DE POSTE DE MADERA	S/2,500.00	2 días	04/09/24 08:00	05/09/24 17:00				
24	05.02	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE	S/4,382.67	3 días	13/09/24 08:00	15/09/24 17:00				
25	05.02.01	DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO	S/3,503.33	3 días	13/09/24 08:00	15/09/24 17:00				
26	05.02.02	DEMOLICION DE BANCA DE CONCRETO	S/534.20	3 días	13/09/24 08:00	15/09/24 17:00				
27	05.02.03	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE DE CONCRETO SIMPLE E= 0.20	S/345.14	3 días	13/09/24 08:00	15/09/24 17:00				
28	05.03	REPOSICION DE ESTRUCTURA	S/9,996.15	20 días	07/11/24 17:00	27/11/24 17:00				
29	05.03.01	BANCAS DE CONCRETO	S/1,651.63	8 días	07/11/24 17:00	15/11/24 17:00				
30	05.03.01.01	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	S/344.96	4 días	08/11/24 08:00	11/11/24 17:00				
31	05.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BANCAS	S/1,024.85	4 días	07/11/24 17:00	11/11/24 17:00				
32	05.03.01.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA BANCAS.	S/281.82	4 días	11/11/24 17:00	15/11/24 17:00				
33	05.03.02	PISOS	S/2,604.48	6 días	15/11/24 17:00	21/11/24 17:00				
34	05.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PISO	S/1,127.98	3 días	15/11/24 17:00	18/11/24 17:00				
35	05.03.02.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN PISO	S/1,476.50	3 días	18/11/24 17:00	21/11/24 17:00				
36	05.03.03	SARDINELES	S/5,740.04	6 días	21/11/24 17:00	27/11/24 17:00				
37	05.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL	S/4,744.92	5 días	21/11/24 17:00	26/11/24 17:00				
38	05.03.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL	S/995.12	1 día	26/11/24 17:00	27/11/24 17:00				
39	06	INTERVENCION EN CANCHA DEPORTIVA	S/12,300.00	90 días	01/09/24 08:00	29/11/24 17:00				

OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEM	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual
	División		Hito inactivo		Resumen manual solo el comienzo		Tareas críticas		División crítica
	Hito		Resumen inactivo		Tarea manual		Tareas externas		Progreso
	Resumen		Tarea manual		Tarea manual		Tarea manual		Tarea manual
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Tarea manual		Tarea manual		Tarea manual

Id	Item	Partida	Parcial (S/.)	Duración	Comienzo	Fin	septiembre 2024												octubre 2024												noviembre 2024												diciembre 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
40	06.01	RECOJO Y TENDIDO DE GRASS	S/1,100.00	2 días	16/09/24 08:00	17/09/24 17:00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

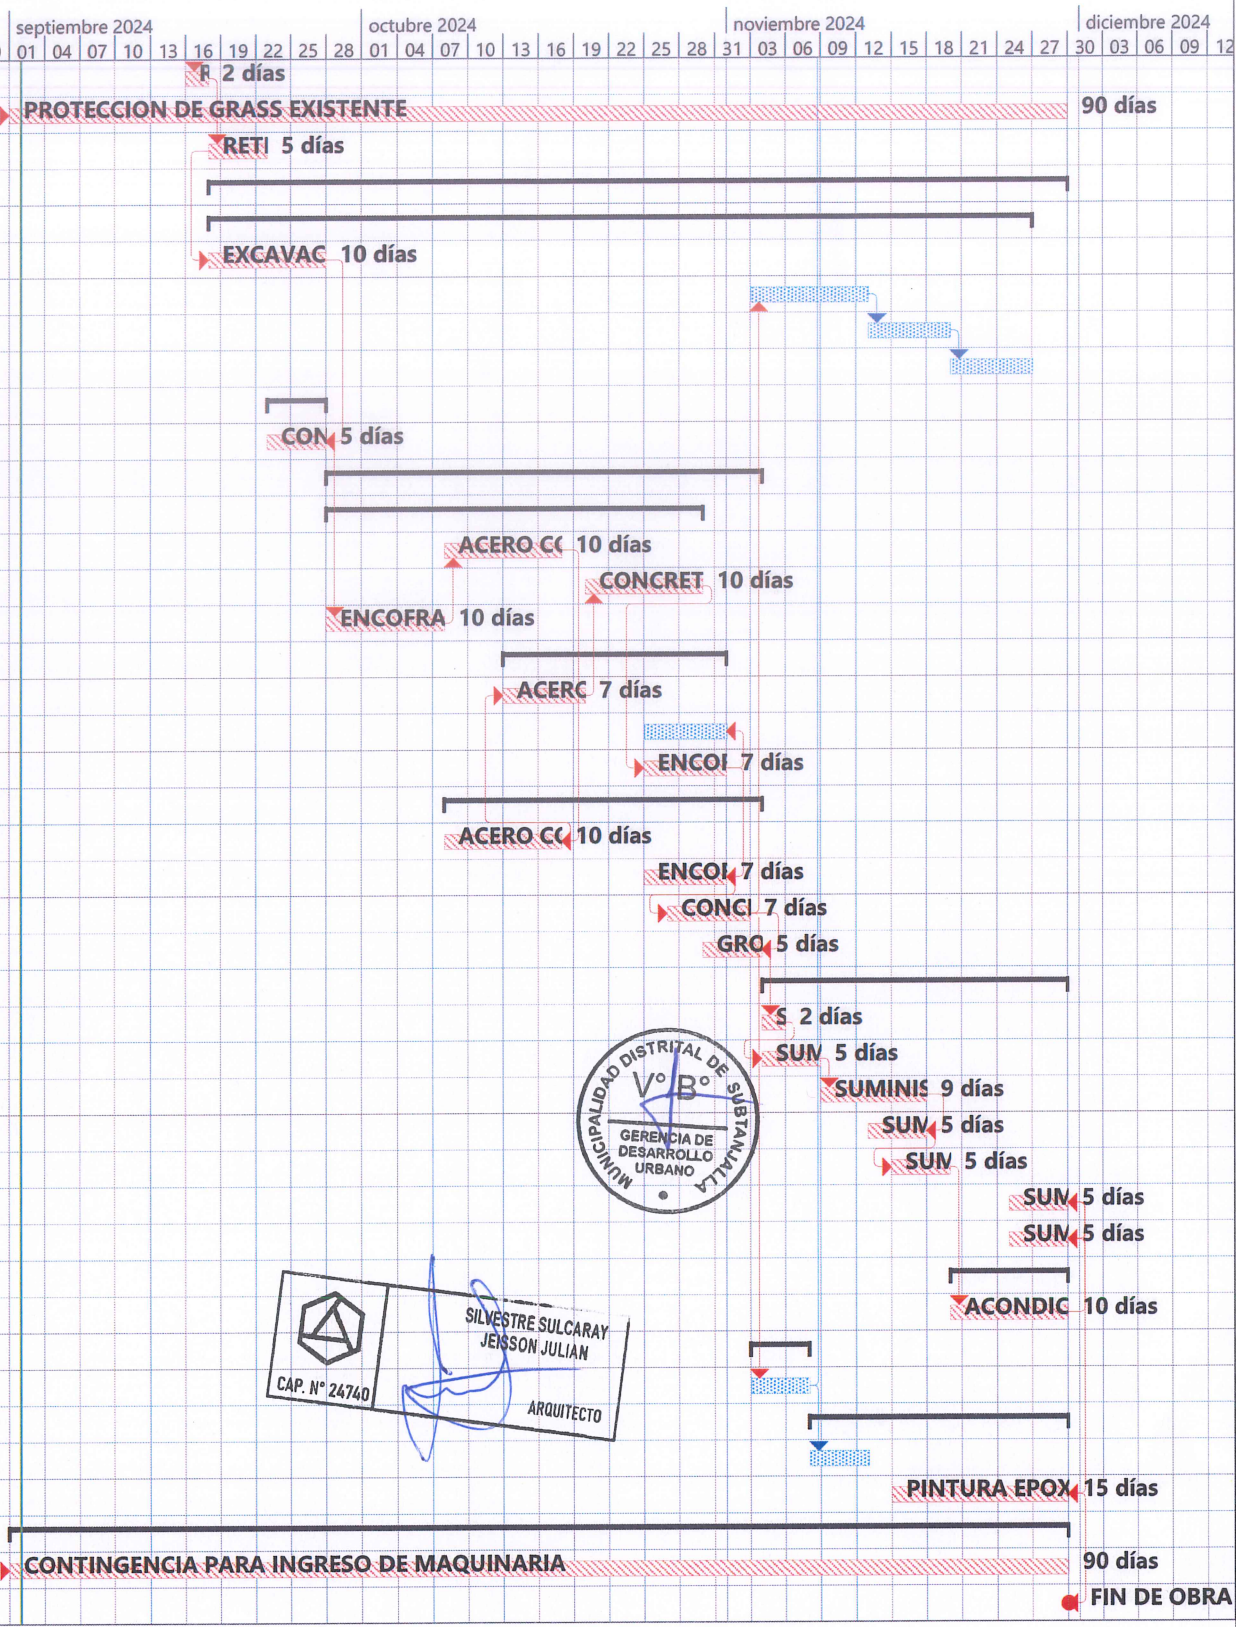

OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEM	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			
