

FORMATO N° 21 - AS_11_2024-MDCH 1°CONV.						
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS: SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
1	NÚMERO DE ACTA		09 -&- - AS_11_2024-MDCH 1°CONV.			
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL					
En, CHAO, a los 21 días del mes de junio del año 2024, en el local de la Oficina de OFICINA DE ABASTECIMIENTO, a las 15:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO N° 04 - AS_11_2024-MDCH 1°CONV., encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2024-MDCH, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CAMPO DEPORTIVO SAN JORGE DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, a fin de efectuar la APERTURA , ADMISIÓN,CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.						
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN					
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:						
Presidente	JUAN CARLOS BENITES PUMA	Titular	x	Dependencia:	GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	
		Suplente	-			
Primer Miembro	HILDA ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Titular	x	Dependencia:	JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO	
		Suplente	-			
Segundo Miembro	ELVIS GUZMAN GERONIMO	Titular	x	Dependencia:	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	
		Suplente	-			
4	LLAMADO A LOS PARTICIPANTES EN EL ORDEN EN QUE SE REGISTRARON EN EL PROCEDIMIENTO					
Nº	Nombre o razón social del postor	RUC	Fecha de Registro	Estado		
1	VITOR BENAVENTE FORTUNATO JOSE	10105873650	2024-06-16 14:01:11.0	Válido		
2	LIZA MORI WALTER	10167886707	2024-06-13 23:24:36.0	Válido		
3	CABRERA CHINGAY EDWIN RAUL	10180837332	2024-06-13 12:23:51.0	Válido		
4	CAMACHO CASTILLO FREDY FERNANDO	10180857686	2024-06-07 14:38:16.0	Válido		
5	TENORIO FLORES VICTOR ALBERTO	10181337341	2024-06-16 16:58:20.0	Válido		
6	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	10181420761	2024-06-06 02:30:52.0	Válido		
7	DIAZ ROJAS ROBERT JULIO	10182165421	2024-06-10 23:43:33.0	Válido		
8	FLORES CRUZ CLARA JUDITH	10412742473	2024-06-10 22:53:49.0	Válido		
9	RUIZ SEGURA MIGUEL ANGEL	10418950582	2024-06-06 23:52:22.0	Válido		
10	SULLUCHUCO HUARI ITALO JOSE	10422478740	2024-06-09 22:04:26.0	Válido		
11	RAMOS MORALES ALEJANDRO LENER	10714914745	2024-06-12 19:17:31.0	Válido		
12	MOSCOL VILCHEZ JORGE ANDRES	10770340620	2024-06-12 00:29:20.0	Válido		
13	CONSTRUCCIONES NOR ANDINO S.A.C.	20477708821	2024-06-12 02:03:45.0	Válido		
14	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S	20518861604	2024-06-10 10:32:19.0	Válido		
15	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIM	20555976268	2024-06-10 10:37:58.0	Válido		
16	JAF CONSULTORES & CONTRATISTAS GEN	20560041145	2024-06-13 12:17:03.0	Válido		
17	DE HONG E.I.R.L.	20601299799	2024-06-15 13:46:02.0	Válido		
18	LF INGENIERIA E.I.R.L.	20602049907	2024-06-07 11:06:06.0	Válido		
19	A & V SUPERVISIONES S.A.C.	20603970714	2024-06-13 15:45:41.0	Válido		
20	PENDULO INGENIEROS E.I.R.L.	20605064966	2024-06-09 21:17:52.0	Válido		
21	VOLCANO S.A.C.	20607387436	2024-06-08 20:29:35.0	Válido		
Artículo 90. Presentación de ofertas La presentación de las ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el periodo establecido en la convocatoria, salvo que este se postergue de acuerdo a lo establecido en el Reglamento la Ley de contrataciones del Estado						
5	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN					
Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:						
Nº	Nombre o razón social del postor	RUC	Ítem(s) a los que postula			
1	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES	20518861604	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2024-MDCH			
2	CONSORCIO EMPRESARIAL	10167886707	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2024-MDCH			
3	CONSORCIO SUPERVISOR SAN JORGE	20560041145	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2024-MDCH			
4	CONSORCIO SUPERVISOR A V	20603970714	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2024-MDCH			
5	PENDULO INGENIEROS E.I.R.L.	20605064966	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2024-MDCH			
6	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN					
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:						
Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula				
1	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	- AS_11_2024-MDCH 1°CONV.				
2	CONSORCIO EMPRESARIAL					
3	CONSORCIO SUPERVISOR SAN JORGE					
4	CONSORCIO SUPERVISOR A V					
5	PENDULO INGENIEROS E.I.R.L.					

FORMATO Nº 21 - AS_11_2024-MDCH 1ºCONV.										
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS: SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS										
7	CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS									
	7.1	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS				MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC				
						CUMPLE	NO CUMPLE			
		A. CAPACIDAD LEGAL				X				
		B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				X				
		B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE				X				
		B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE				X				
		B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO				X				
		C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				X				
	7.2	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS				CONSORCIO EMPRESARIAL				
						CUMPLE	NO CUMPLE			
		A. CAPACIDAD LEGAL				X				
		B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				X				
		B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE				X				
		B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE				X				
		B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO				X				
		C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				X				
	7.3	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS				CONSORCIO SUPERVISOR SAN JORGE				
						CUMPLE	NO CUMPLE			
		A. CAPACIDAD LEGAL				X				
		B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				X				
		B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE				X				
		B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE				X				
		B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO				X				
		C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				X				
	7.4	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS				CONSORCIO SUPERVISOR A V				
						CUMPLE	NO CUMPLE			
		A. CAPACIDAD LEGAL				X				
		B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				X				
		B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE				X				
		B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE				X				
		B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO				X				
		C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				X				
	ZS	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS				PENDULO INGENIEROS E.I.R.L.				
						CUMPLE	NO CUMPLE			
		A. CAPACIDAD LEGAL				X				
		B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				X				
		B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE				X				
		B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE				X				
		B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO				X				
		C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				X				
	CALIFICA									
8	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN									
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación previstos en las bases, por lo que se procederá con su evaluación:									
	Nº	Nombre o razón social del postor				Ítem(s) a los que postula				
	1	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC				- AS_11_2024-MDCH 1ºCONV.				
	2	CONSORCIO EMPRESARIAL								
	3	CONSORCIO SUPERVISOR SAN JORGE								
	4	CONSORCIO SUPERVISOR A V								
	5	PENDULO INGENIEROS E.I.R.L.								

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

9.1 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

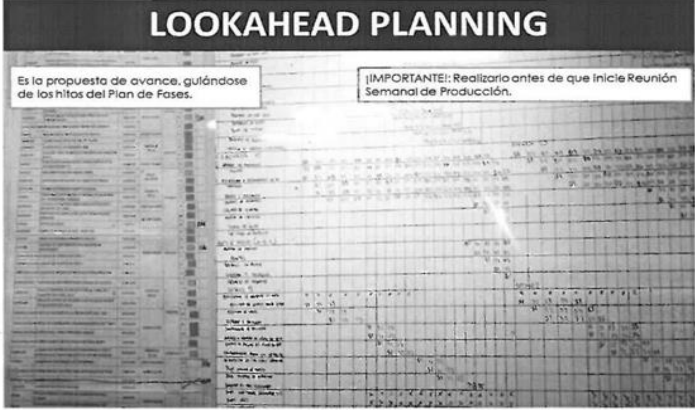
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC
FACTORES		PUNTAJES
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 Puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA. Las actividades mencionadas no concuerdan con las de la obra. LA RUTINA DE TRABAJO, NO CONCUERDA CON EL TIPO DE OBRA A REALIZARSE. Ademas presenta graficos ilegibles el diagrama de flujo no es apreciado, impidiendo la revisión correcta e) <u>SEGUIMIENTO DE CALIDAD</u> <ul style="list-style-type: none">CONTROL DE CALIDAD Sistema de actividades designadas para evaluar la calidad de un producto o servicio, si el trabajo ha sido realizado de acuerdo a los requerimientos.ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Sistema de gestión designado para controlar las actividades en todas las etapas de la construcción, para prevenir problemas de calidad y asegurar que la estructura cumpla con los estándares de calidad. <p>Para actividades como la construcción de elementos estructurales, suministro y/o colocación de ascensor, grupo electrógeno, aire acondicionado, entre otras, se recomienda hacer un seguimiento de la calidad en el tiempo. Para efectuar lo anterior, se usará el método de la media móvil con sus gráficos de control respectivos, como se indica a continuación. Este procedimiento, le indicará al contratista y supervisor la homogeneidad del material producido y le permitirá realizar las correcciones respectivas.</p>	0 Puntos

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2		CONSORCIO EMPRESARIAL
FACTORES		PUNTAJES
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 Puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA: EL CRONOGRAMA GANT PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA TIENE UNA DU CRONOGRAMA GANT PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCT	0 Puntos

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	may	tri 1, 2025	jun	jul
1		1	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE OBRA	0 días				
2		2	ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE OBRA	17 días?				
3		2.1	INICIO ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE OBRA	0 días?				
4		2.1.1	Inspección in situ de las condiciones de la obra.	5 días				
5		2.1.2		1 día?				
6		2.1.3		1 día?				
7		2.1.4	Verificar las condiciones de acceso a la obra	1 día				

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3		CONSORCIO SUPERVISOR SAN JORGE
FACTORES		PUNTAJES
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 Puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA: Presenta metodologia descontextualizada a la supervision de la obra objeto de la convocatoria. En la Ejecucion de obras no se ha previsto el uso de explosivos. <p>El ingeniero supervisor podrá detener procesos constructivos que presenten un alto riesgo de accidentes, así como suspender a aquellos trabajadores que no respeten las disposiciones de seguridad establecidas en obra. En caso que el ejecutor no de cumplimiento a alguna instrucción del jefe de la supervisión, éste podrá aplicar las sanciones establecidas en los documentos del contrato.</p> <p>Las siguientes son las principales actividades previsibles para el control y la supervisión de la obra:</p> <p>a) Uso de explosivos: La supervisión debe verificar que la ubicación del pólvorin para almacenamiento de los materiales explosivos, esté en zona segura y con la estructura que correspondan al caso.</p> <p>b) Seguridad para personal de obra</p> <p>Disponer que todo el personal relacionado con la obra transite por el tramo de campo de obra dotado de elementos de seguridad como son: cascos, botas y chalecos con cintas reflectoras. También, disponer que los obreros perforistas y operadores de equipo mecánico usen sorderas y lentes.</p> <p>c) Tráfico durante proceso de obra:</p> <p>El problema fundamental que suele presentarse en este tipo de obra es la</p>	0 Puntos

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS

	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 4		CONSORCIO SUPERVISOR A V
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 Puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA <p>El postor no usa la terminología adecuada para la explicación de su metodología Hace mención que los responsables e involucrados directos y en la supervisión de obra solamente hay un jefe de supervisión. Así mismo, la ilustración esta ilegible.</p> <p>RESPONSABLES. La responsabilidad principal recae en el ingeniero de proyecto o el encargado del LPS, no obstante, los involucrados directos deben comprometerse en la liberación de restricciones de acuerdo al trabajo que desempeñan, por lo que puede decirse que todos los involucrados comparten la responsabilidad.</p>  <p>Ilustración 2: Aplicación de Lookaead en la Supervisión de Obra.</p> <p>Alcance DICE: abarca todas las actividades del proyecto DEBE DECIR: abarca las actividades de la supervisión.</p> <p>ALCANCE. Abarca todas las actividades del proyecto, no incluye labores administrativas. Es un procedimiento propiamente de campo que involucra mucho al maestro de obras por ser el que se encuentra constantemente en la obra.</p>	0 Puntos
	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 5		PENDULO INGENIEROS E.I.R.L.
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 Puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA: Según la estructura de la metodología de laas bases integradas se omitio el Organigrama estructural, nominal y funcional de la supervisión, considerando la incidencia de participación del personal de la supervisión y liquidación de la supervisión.	0 Puntos
10	ACUERDO ADOPTADO		
	Los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la admisión, calificación y evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado se DECLARA DESIERTO .		
11			
	JUAN CARLOS BENITES PUMA	HILDA ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ELVIS GUZMAN GERONIMO
	NOMBRE Y FIRMA - DEL COMITÉ DE SELECCIÓN		
