


# BASES CONTRATACION DIRECTA






## BASES

### CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI -PSI

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE  
DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Y PROTECCIÓN  
CON ENROCADO AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA  
DEL DREN CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA  
DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA**






## SECCIÓN ESPECÍFICA

### CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

2.

Nombre : PROGRAMA DE SUBSECTORIAL DE IRRIGACION  
RUC N° : 20414868216  
Domicilio legal : Av. República de Chile N° 485 Urb. Santa Beatriz Jesús María -  
Lima  
Teléfono: : 01-424-4488  
Correo electrónico: : Log.especialista08@psi.gob.pe

### 2.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA REFERIDO AL SERVICIO DE REPARACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Y PROTECCIÓN CON ENROCADO AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL DREN CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

### 2.2. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante el FORMATO 2 AE-31-2023 CD04 de fecha 12 de junio de 2023

### 2.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

### 2.4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 2.5. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO


NO APLICA

### 2.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 2.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de hasta 30 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.



## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

---

### 2.8. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.
- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2023.
- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado
- Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 30225.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Resolución Ministerial N° 098-2023-MIDAGRI, de fecha 09 de marzo del 2023, se aprueba los "lineamientos básicos que regula las actividades de emergencia referidas a la limpieza y descolmatación de cauces, defensa ribereñas, sistema de drenaje y canales de riego del Programa Presupuestal N° 068".
- Decreto Supremo N° 029-2023-PCM
- Decreto Supremo N° 043-2023-PCM

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>1</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia


*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>2</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)
- e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (**Anexo N° 4**)<sup>3</sup>

<sup>1</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>2</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>3</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.





## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) El precio de la oferta en SOLES.
- g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de ser el caso.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>4</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- g) Correo electrónico para efectos de notificación durante la ejecución del servicio.
- h) Estructura de costos<sup>5</sup>.

#### Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*

<sup>4</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>5</sup> Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta.



## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

- En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
- En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.



### Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>6</sup>.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

## 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto de acuerdo al artículo 100° y dentro del plazo de regularización, debe presentar la documentación requerida a través de la mesa de partes virtual <http://tramitedigital.psi.gob.pe/mpv/>, y/o mesa de partes del programa Subsectorial de Irrigaciones (para entrega de carta fianza), en el horario de 8:30 a 16:00 horas, en Av. República de Chile N° 485 Urb. Santa Beatriz Jesús María.

## 2.5. ADELANTOS<sup>7</sup>

"La Entidad otorgará un adelanto directo del 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) días calendarios contados a partir de la suscripción, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos<sup>8</sup> mediante carta fianza

<sup>6</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

<sup>7</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento.

<sup>8</sup> De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 7 días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista”.

### 2.6. FORMA DE PAGO

La forma de pago por la ejecución del servicio realizado por la Contratista será en pago único, para lo cual, la Entidad requerirá de la siguiente documentación:

- Informe final aprobado por la Entidad.
- Estructura de costos por Precios Unitarios Ofertados.
- Cronograma de ejecución y Utilización de Maquinaria según el siguiente detalle:


Marca	Modelo	Serie	Potencia	Placa (de corresponder)

- Informe descriptivo de las actividades ejecutadas firmadas por el Contratista y el ingeniero de Control Técnico o personal encargado por la UGIRD.
- Fotografía del BM monumentado.
- Panel fotográfico, georeferenciado, del periodo ejecutado, cada una con su descripción (indicando progresivas).
- Planilla de metrados finales ejecutados y planos finales de sustento (considerar cuadro de volúmenes por progresivas).
- Copia de cuaderno de control.
- Comprobante de Pago.
- Código de cuenta Interbancario.

Para efecto de los pagos, esto se efectuará previa opinión favorable de conformidad del Ingeniero de Control Técnico o personal encargado por la UGIRD.

La Entidad debe de pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el Contrato.

Dicha documentación se debe presentar en mayo a través de la mesa de partes virtual <http://tramitedigital.psi.gob.pe/mpv/>, y/o mesa de partes del programa Subsectorial de Irrigaciones, en el horario de 8:30 horas a 17:30 horas, en Av. República de Chile N° 485 Urb. Santa Beatriz Jesús María.






**CAPÍTULO III  
REQUERIMIENTO**

**Importante**

*De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.*

**TERMINOS DE REFERENCIA**




**ACTIVIDADES DE EMERGENCIA MIDAGRI**

**TERMINOS DE REFERENCIA**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:**

" REPARACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Y PROTECCIÓN CON ENROCADO AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL DREN CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA "



Lima, mayo del 2023

CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

1. DENOMINACION DEL SERVICIO

Contratación del servicio de: "REPARACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Y PROTECCIÓN CON ENROCADO AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL DREN CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

2. FINALIDAD PÚBLICA

Ejecutar acciones inmediatas y necesarias en respuesta de las intensas precipitaciones pluviales ocurridas en el departamento de Piura, en salvaguardia de la vida, salud e integridad de las personas y el patrimonio público y privado.

3. ANTECEDENTES

- a) Mediante Ley N° 28675 se crea el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, como Unidad Ejecutora 006, encargándose de desarrollar las actividades del Programa de Riego Tecnificado, así como aquellas que venía ejecutando la Unidad Ejecutora UCPSI en el marco de los compromisos asumidos con organismos internacionales concertados y en proceso, además de las actividades que se le encargue al Sector en materia de riego.
- b) El Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, es un organismo descentralizado del sector agricultura, que tiene por objetivo principal promover el desarrollo sostenible de los sistemas de riego en la costa y sierra, el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, el desarrollo de capacidades de gestión, así como la difusión del uso de tecnologías modernas de riego, para contribuir con el incremento de la producción y productividad agrícola, que permitirá mejorar la rentabilidad del agro y elevar los estándares de vida de los agricultores, el accionar del PSI está orientado a impulsar el crecimiento técnico y económico de la agricultura a nivel nacional, modernizando el uso eficiente del agua por parte de los agricultores.
- c) Dentro de los objetivos del PSI está, contribuir al incremento de la producción y la productividad de la agricultura de riego mediante acciones que permitan el desarrollo de la capacidad y gestión de las Juntas de Usuarios, el mejoramiento en aprovechamiento de los recursos hídricos y el incremento de la eficiencia en el uso del suelo cultivable.
- d) La temporada de lluvias en el territorio nacional, en muchos casos, ha venido generando daños de magnitud, habiéndose registrado en los últimos 10 años en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y la Rehabilitación (SINPAD), un número importante de emergencias generadas por dicho fenómeno, asociadas principalmente a desbordes de ríos que ocasionan inundaciones, deslizamientos de laderas, activación de quebradas (huaicos), así como aluviones, entre otros.
- e) Mediante Resolución Ministerial N° 0098-2023-MIDAGRI, de fecha 29 de marzo 2023, se aprueba los lineamientos de Alcance Sectorial LI N° 003-2023-MIDAGRI/SG-ODNGRD "Lineamientos Básicos que regulan las actividades de emergencia referidas a la limpieza y descolmatación de cauces, defensas ribereñas, sistemas de drenaje y canales de riego del Programa Presupuestal N° 0068" Derogar los "Lineamientos básicos que establecen el procedimiento de elaboración, ejecución, monitoreo y seguimiento del desarrollo de Actividades de Emergencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, referido a acciones comunes – Producto N° 8: Actividad 4 – 5006144 "Atención de actividades de emergencia" del Programa Presupuestal N° 068" aprobados mediante Resolución Ministerial N° 0261-2021-MIDAGRI.



*[Handwritten signature]*

**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI**

0 0025

- f) Según consta en el **Decreto Supremo N.º 029-2023- PCM**, Oficio N.º D000145-2023-INDECI-JEF INDECI, de fecha 26 de marzo de 2023, el Jefe del INDECI remite y hace suyo el Informe Situacional N.º D000004-2023-INDECI-DIRES, de fecha 26 de marzo de 2023, emitido por el Director de Respuesta de dicha entidad, en el cual se señala que, en base al sustento emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI y por la Sub Dirección de Sistematización de Información sobre Escenarios de Riesgo de Desastres – SD SIERD de la Dirección de Preparación del INDECI, se ha determinado que varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, son los más expuestos al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales
- g) Según consta en el **Decreto Supremo N.º 043-2023- PCM**, Oficio N.º D000218-2023-INDECI-JEF INDECI, de fecha 1 de marzo de 2023, el Jefe del INDECI remite y hace suyo el Informe Situacional N.º D000004-2023-INDECI-DIRES, de fecha 1 de marzo de 2023, emitido por el Director de Respuesta de dicha entidad, en el cual se señala que, en base al sustento emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI y por la Sub Dirección de Sistematización de Información sobre Escenarios de Riesgo de Desastres – SD SIERD de la Dirección de Preparación del INDECI, se ha determinado que varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, son los más expuestos al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales; asimismo, autorizar la continuación de las acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación iniciadas en el marco del Decreto Supremo N° 029-2023-PCM y el Decreto Supremo N° 034-2023-PCM
- h) Mediante OFICIO Nro. 00344-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI, de fecha 21 de abril del 2023, se solicita la atención por desastre y ejecución de 07 actividades de emergencias.
- i) Mediante Memorando N° 363-2023-MIDAGRI-SG/ODNGRD, de fecha 03 de mayo del 2023, se emite la opinión favorable para que el Programa Subsectorial de Irrigaciones continúe con la gestión de financiamiento.
- j) Mediante Oficio N°0100-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UPPPS, fecha 18 de mayo 2023, se solicita la aprobación de la Nota de Modificación N°080-2023 del SIAF en línea, con la propuesta de Nota de Modificación Presupuestal N°080-2023, que corresponde a actividades que serán ejecutadas.

**4. MARCO LEGAL**

La ejecución del servicio deberá realizarse de acuerdo a los dispositivos legales y Normas Técnicas Vigentes que se indican a continuación, las cuales no son limitativas, siendo que es aplicable toda norma pertinente adicional:

- Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Política de Estado 32 Gestión del Riesgo de Desastres, Aprobado con acuerdo Nacional.
- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre-SINAGERD y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N°048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el reglamento de la Ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (SINAGERD).



## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

- Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que dispone la aprobación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como Política de Obligatorio cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional.
- Resolución Ministerial N°046-2013-PCM, que aprueba la Directiva N°001-2013-PCM-SINAGERD "Lineamientos que definen el Marco de Responsabilidades en Gestión de Riesgo de Desastres, de las Entidades del Estado en los Tres niveles de Gobierno" y su anexo en el marco de la Ley N° 29664 y su Reglamento.
- Decreto Supremo N°034-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres- (PLANAGERD).
- Resolución Ministerial N°0602-2016-MIDAGRI, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual Actualizado-PESEM 2015-2021 (diciembre 2016).
- Ley N° 31075, Ley que aprueba la Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
- Ley de Procedimiento N°27444, Ley que aprueba el Procedimiento Administrativo en General.
- Ley de Presupuesto del Sector Público del Año 2023.
- Decreto de Urgencia N°024-2010, Decreto de Urgencia que dicta Medidas Económicas y Financieras para la creación del Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención a Emergencias por Desastres en el Marco del Presupuestos por Resultados.
- Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público.
- Decreto Supremo N°132-2017-EF, Decreto Supremo que aprueba la conformación y funciones de la Comisión Multisectorial del "Fondo para Intervención ante Ocurrencias de Desastres Naturales", dicta Normas Reglamentarias.
- Resolución Ministerial N°0054-2019-MINAGRI, que aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022 del Ministerio de Agricultura y Riego.
- Resolución Ministerial N°0440-2019-MINAGRI, que aprueba el "Plan de Contingencias del Sector de Agricultura y Riego Ante Lluvias Intensas".
- Resolución Ministerial N°003-2020-MINAGRI, que actualiza la constitución del grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres del Ministerio de Agricultura y Riego-GTGRD-MINAGRI.
- Resolución Ministerial N° 194-2020-MINAGRI, que aprueba el "Plan de Contingencias del Sector de Agricultura y Riego, ante el sismo de gran magnitud y seguido de Tsunami frente a la Costa Central del Perú".
- Mediante Resolución Ministerial N° 0098-2023-MIDAGRI, de fecha 29 de marzo 2023, se aprueba los lineamientos de Alcance Sectorial LI N° 003-2023-MIDAGRI/SG-ODNGRD "Lineamientos Básicos que regulan las actividades de emergencia referidas a la limpieza y descolmatación de cauces, defensas ribereñas, sistemas de drenaje y canales de riego del Programa Presupuestal N° 0068"
- Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Decreto Supremo N° 029-2023- PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.
- Decreto Supremo N° 043-2023- PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional, por desastre de gran magnitud, a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, asimismo, autorizar la continuación de las acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación iniciadas en el marco del Decreto Supremo N° 029-2023-PCM y el Decreto Supremo N° 034-2023-PCM



*[Handwritten signature]*

0 0024

## 5. OBJETIVO DEL SERVICIO

El objetivo es la contratación del Servicio denominado "REPARACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Y PROTECCIÓN CON ENROCADO AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL DREN CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

## 6. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Considerando que el Anexo No. 2, de Contenidos Mínimos del Informe para actividades de Emergencia de Atención Inmediata – MIDAGRI, establece las metas del servicio (Puntos Críticos), determinando la cantidad de horas máquina, para la reparación de dique con material de préstamo y habilitación de roca en cantera.

Las actividades que se han contemplado en el presente servicio son las siguientes:

### Reparación de Dique con enrocado al volteo

- ❖ Tramo I: Reparación de dique con material de préstamo y protección con enrocado al volteo, en una longitud de 40.00 ml.
- ❖ Tramo II: Reparación de dique con material de préstamo, protección con enrocado al volteo en ambas caras del talud del dique y la conformación del enrocado de la base del dique en una longitud de 36.00 ml.
- ❖ Tramo III: Reparación de dique con material de préstamo y protección con enrocado al volteo, en una longitud de 45.00 ml.

1. Reparación de dique con material de préstamo y protección de enrocado al volteo en la margen derecha del Dren Curumuy, sector San Juan de Curumuy, distrito de Piura, provincia y departamento de Piura".	121.00 ml
--	-----------

## 6.1 EJECUCION DELSERVICIO

### 6.1.1 Plazo de ejecución del servicio

El inicio del cómputo del plazo de ejecución del servicio se rige desde el día siguiente del la firma del "Acta de Inicio del Servicio" hasta los 30 días calendarios (El Acta de Inicio del Servicio lo firma el contratista y Encargado de la UGIRD como parte de la Entidad).

La firma del "Acta de Inicio de Servicio" se realizará el día de la notificación de la adjudicación.

### 6.1.2 Plan de Trabajo con Cronograma de Ejecución del servicio

El contratista dentro de los tres (03) días posteriores a la suscripción del Acta de Inicio del Servicio remitirá el "Plan de Trabajo", al Control Técnico, el cual, previa revisión y aprobación remitirá, en un plazo de dos (02) días calendarios, a la Entidad el mencionado "Plan de Trabajo y cronograma de utilización de maquinaria" mediante, Mesa de Partes Virtual o físico el cual debe de contener como minimo lo siguiente.



**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI**

- Cronograma de Ejecución de maquinaria.
- Cronograma de Utilización de maquinaria, según el siguiente detalle:

Marca	Modelo	Serie	Potencia	Placa (de corresponder)

- Informe Topográfico (con planos Iniciales), según el siguiente detalle:
  - Memoria descriptiva
  - Video de reconocimiento de campo (10 minutos mínimos)
  - Planos de ubicación general
  - Planos de Planta.
  - Planos de Perfil longitudinal (incluir el cuadro de volúmenes de movimiento de tierras y enrocado).
  - Planos de secciones transversales
  - Plano de Ubicación de canteras de roca
  - Plano de Ubicación de botaderos (de corresponder)
- Versión digital y editable de la nube de puntos obtenido del levantamiento topográfico inicial.

Los planos Iniciales proporcionados por el contratista deberán de ser presentados con el mayor detalle posible, debido a que estos serán de utilidad para el control de los trabajos ejecutados en campo; en el Cronograma de Ejecución se debe de visualizar la secuencia de las actividades a ejecutar, en el Cronograma de Ejecución debe de contemplar estrictamente el plazo de ejecución fijado en la propuesta y el contrato.


La Contratista deberá efectuar un levantamiento topográfico inicial que abarque como mínimo toda el área a intervenir establecida en la (Anexo No. 2 Actividades de Emergencia de Atención Inmediata en el marco de la Resolución Ministerial N°0261-2021-MIDAGRI), que permitan identificar el estado antes de la intervención, lo cual está contemplado dentro de su plazo contractual. Una vez culminada la actividad, el contratista deberá realizar el levantamiento Topográfico Final, en el cual, deberá de indicar a detalle todos los trabajos ejecutados, debido a que estos serán los que determinen los metrados finales ejecutados.

El Levantamiento Topográfico antes indicado deberá efectuarse bajo la estricta supervisión del ingeniero de Control Técnico o en coordinación con el Personal encargado por la UGIRD, el cual bajo responsabilidad deberá garantizar la calidad e idoneidad del referido levantamiento topográfico.

La contratista deberá garantizar en campo la existencia permanente (hasta la culminación de la relación contractual) de **por lo menos 1 BMs monumentado** a lo largo de toda la longitud a intervenir, los BMs antes indicados deberán ser fijos, evitando la probabilidad de que por motivos de la ejecución de la prestación sean alterados, modificados o eliminados, pudiendo monumentar alternativamente en la roca fija o en infraestructura existente permanente, la ubicación de los BMs será determinada por el Control Técnico.

#### 6.1.3 De la Ejecución del Servicio.

La contratista deberá *iniciar los trabajos al día siguiente de suscrita el Acta de Inicio del Servicio, con labores de Movilización de maquinaria, luego de realizado el Levantamiento Topográfico después del tercer día solicitará al Control Técnico la autorización para el Ingreso de Maquinaria.*



*[Handwritten signature]*

## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

0 0023

El servicio se ejecutará a través de actividades que se encuentran en los (*Anexo No. 2 de las Actividades de Emergencia de Atención Inmediata en el marco de la Resolución Ministerial N° 098-2023-MIDAGRI*), estas serán realizadas en base al "Plan de Trabajo, cronogramas de ejecución y utilización de maquinaria" aprobados por el control técnico o personal encargado por la UGIRD, con los montos establecidos para su ejecución y utilización de maquinaria.

El contratista se encuentra obliga a:

- Ejecutar los trabajos en concordancia al "*Anexo No. 2 de las Actividades de Emergencia de Atención Inmediata en el marco de la Resolución Ministerial N° 098-2023-MIDAGRI*", y Plan de Trabajo aprobado por el Control Técnico o personal encargado por la UGIRD, en estricta sujeción al cronograma de ejecución y utilización de maquinaria.
- Todas las actividades deberán ser ejecutadas de acuerdo a la Normatividad Nacional Aplicable.
- Es responsabilidad del contratista disponer (según el cronograma de utilización de maquinaria) de los **equipos mínimos necesarios permanentemente** para ejecutar las actividades que correspondan con la finalidad de cumplir lo establecido en los TDR y "Plan de Trabajo" aprobado por el control técnico o Control Técnico Encargado por la UGIRD.

Los trabajos deberán de ejecutarse empleándose maquinaria de acuerdo a las características indicadas en el presente TDR (numeral A.3. *equipamiento*), o con maquinaria distinta (sustentada en el plan de trabajo aprobado por el control técnico o personal encargado por la UGIRD), bajo cuenta y riesgo del contratista en relación a los rendimientos y plazos de ejecución; del mismo modo el contratista deberá garantizar la cantidad mínima de maquinaria requerida según el presente TDR, para la ejecución y culminación de los trabajos en el plazo de ejecución previsto.

El desarrollo de las actividades materia de la presente contratación podrá realizarse en doble turno, a fin de culminar las actividades contratadas dentro de los plazos establecidos, para lo cual el contratista deberá considerar la logística y los equipos necesaria para tal fin.

### 6.1.4 Metrado a Ejecutar.

#### HOJA DE METRADOS

Descripción	Und.	Metrado
<b>TRABAJOS PRELIMINARES Y PROVICIONALES</b>		
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA	vje	4.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA	vje	10.00
TOPOGRAFIA INICIAL - FINAL	glb	100
<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
HALITACION DE CAMINOS DE ACCESO	km	0.50
CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	4,915.00
<b>PROTECCION CON ENROCADO AL VOLTEO</b>		
HALITACION Y SELECCION DE ROCA EN CANTERA	m3	2,851.20
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA	m3	2,851.20
ADECUACION DE ROCA AL VOLTEO	m3	2,851.20

Fuente: "Anexo No. 2", de contenido Mínimo de la Actividad de Emergencia.

## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

### 6.1.5 Formas de Pago

La forma de pago por la ejecución del servicio realizado por la Contratista será en pago único, para lo cual, la Entidad requerirá de la siguiente documentación:

- Informe final aprobado por la Entidad.
- Estructura de costos por Precios Unitarios Ofertados.
- Cronograma de ejecución y Utilización de Maquinaria según el siguiente detalle:

Marca	Modelo	Serie	Potencia	Placa (de corresponder)

- Informe descriptivo de las actividades ejecutadas firmadas por el Contratista y el ingeniero de Control Técnico o personal encargado por la UGIRD.
- Fotografía del BM monumentado.
- Panel fotográfico, georeferenciado, del periodo ejecutado, cada una con su descripción (indicando progresivas).
- Planilla de metrados finales ejecutados y planos finales de sustento (considerar cuadro de volúmenes por progresivas).
- Copia de cuaderno de control.
- Comprobante de Pago.
- Código de cuenta Interbancario.

Para efecto de los pagos, esto se efectuará previa opinión favorable de conformidad del Ingeniero de Control Técnico o personal encargado por la UGIRD.

La Entidad debe de pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el Contrato.

No se reconocerán bajo ninguna circunstancia mayores prestaciones ejecutadas sin tener en cuenta el párrafo anterior.


### 6.1.6 Adelantos

Se establece un adelanto directo de 30% del monto del contrato original para lo cual el contratista tiene un plazo de 8 días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato, para solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía (entiéndase carta fianza emitida por la empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la SBS, y deben estar autorizadas para la emisión de dicha garantía) y el comprobante de pago correspondiente.

Vencido dicho plazo no procede la solicitud del adelanto. La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los 7 días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

### 6.1.7 Cuaderno de Control

Tanto la contratista a través del Director Técnico, como el ingeniero de Control Técnico, están obligados a llenar todos los días un Cuaderno de Control, en el que se anotara todas las ocurrencias relevantes del día, indicando además el personal técnico clave presente, así como la relación de la maquinaria utilizada, debiendo indicar marca, modelo y estado del mismo, avance diario realizado en m3 y su respectivo acumulado.





0 0022

En cuanto al personal, el contratista deberá mantener el personal ofertado y acreditado cumpliendo todas las normas de seguridad. Solo después de iniciada la actividad, podrá solicitar el cambio de personal clave, el cual deberá de ser evaluado de acuerdo al perfil indicado, pudiendo este ser igual o mayor al perfil solicitado.

La omisión de la anotación diaria por parte de la contratista será considerada como falta ausencia del personal técnico lo que será considerado para la aplicación de penalidades que corresponda.

## 6.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS A CONSIDERAR:

Los trabajos a ejecutarse serán de conformidad con lo establecido en el "Anexo N° 02" Formato con carácter de Declaración jurada que sustenta la actividad de Emergencia en el marco de la Resolución Ministerial N° 0098-2023-MIDAGRI, debiendo considerar las siguientes especificaciones cuando correspondan.

### 6.2.1 Alcances de los términos de referencia

Los presentes Términos de Referencia, conjuntamente con el Contrato, el Anexo No. 2 de Contenido Mínimo del Actividades de Emergencia de Atención Inmediata y la oferta de la contratista, tienen como objeto normar las condiciones generales de intervención a ser aplicadas por el CONTRATISTA en la ejecución del servicio.

El CONTRATISTA suministrará todos los elementos necesarios para la ejecución del servicio tales como; herramientas, maquinarias, equipos, mano de obra, seguros, dirección técnica y todo lo necesario para la realización del servicio, así como el mantenimiento durante el desarrollo de las actividades, desmontaje y remoción de las construcciones provisionales. Detalles de la actividad y materiales no mostrados en la el Anexo No. 2 de Contenido Mínimo del Actividades de Emergencia de Atención Inmediata y en los presentes Términos de Referencia, pero necesarios para la ejecución o instalaciones deberán ser incluidos en los trabajos del CONTRATISTA.

Más allá de lo establecido en estos TDR, el Control Técnico, tiene autoridad suficiente para ampliar las especificaciones técnicas, en cumplimiento de la Normativa Vigente, en lo que respecta a la ingeniería y la correcta metodología constructiva a seguir en la ejecución de la actividad.

Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá presentar al Control Técnico, el Calendario que visualice la secuencia de las actividades a ejecutar.

### 6.2.2 Normas técnicas

La ejecución de las actividades del servicio, se efectuará cumpliendo con los presentes Términos de Referencia que resultan obligatorios a la materialización del servicio. Si en determinadas cuestiones surgieran dudas respecto a la aplicación de Normas, la decisión del Control Técnico es la única determinante y válida.

### 6.2.3 Rectificación y Complemento de Especificaciones

El Control Técnico, previa autorización y pleno conocimiento de la Entidad contratante y en acuerdo con el CONTRATISTA, tendrá la facultad durante el curso de la ejecución de las actividades de modificar, complementar o adaptar a



**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI**

situaciones reales las presentes especificaciones técnicas para la ejecución de las partidas, a fin de asegurar una adecuada ejecución de los trabajos de acuerdo a lo previsto en el Anexo No. 2, sin desnaturalizar el objetivo y metas del mencionado Anexo.

**6.2.4 Estructuras y Servicios Existentes**

El CONTRATISTA previamente al inicio de los trabajos, determinará con exactitud las estructuras y servicios existentes en la zona de trabajo, en coordinación con las entidades correspondientes, responsabilizándose por los daños que ocasione a éstas.

También será responsable de la conservación del buen estado de las estructuras y servicios existentes, no indicados en los planos y/o croquis.

**6.2.5 Especificaciones Técnicas para la ejecución de las partidas.**

**6.2.5.1 Movilización y desmovilización de maquinaria con cama baja**

Esta partida consiste en el traslado del equipo mecánico al lugar en la cual se desarrollará la actividad de emergencia, la movilización de maquinaria pesada con Cama baja incluye la obtención y pago de permisos y seguros.

La movilización y desmovilización de la maquinaria pesada, y desplazamientos largos se deberá realizar con el uso de cama baja o plataforma.

El contratista se encuentra en la obligación de someter a una inspección técnica a toda la maquinaria que será transportada a la zona en la cual se ejecutará el servicio, garantizando de esta manera su operatividad para el desarrollo de sus actividades.

La movilización se efectuará considerando en el caso de equipo pesado, el peso de la unidad a transportarse y la medición se realizará por viaje de maquinaria efectuada.

**6.2.5.2 Movilización y desmovilización de maquinaria con cama baja**

Esta partida consiste en el traslado del equipo mecánico al lugar en la cual se desarrollará la actividad de emergencia, la movilización de maquinaria pesada con Cama baja incluye la obtención y pago de permisos y seguros.


La movilización y desmovilización de la maquinaria pesada, y desplazamientos largos se deberá realizar con el uso de cama baja o plataforma.

El contratista se encuentra en la obligación de someter a una inspección técnica a toda la maquinaria que será transportada a la zona en la cual se ejecutará el servicio, garantizando de esta manera su operatividad para el desarrollo de sus actividades.

La movilización se efectuará considerando en el caso de equipo pesado, el peso de la unidad a transportarse y la medición se realizará por viaje de maquinaria efectuada

**6.2.5.3 Movilización y desmovilización de maquinaria con rodado**

Esta partida consiste en el traslado del equipo mecánico autopropulsado por sus propios medios al lugar en la cual se desarrollará la actividad de emergencia, la movilización de este tipo de maquinaria incluye la obtención y pago de permisos y seguros.





0 0021

El contratista se encuentra en la obligación de someter a una inspección técnica a toda la maquinaria que será transportada por sus propios medios a la zona en la cual se ejecutará el servicio.

La medición de esta partida se realizará por viaje de maquinaria efectuada

#### **6.2.5.4 Servicio de Control Topográfico**

Comprende el suministro de mano de obra y equipos (según el numeral A.3 Equipamiento de los TDR), para realizar los trabajos de control de la actividad a ejecutar: rasante, progresivas, BM's, alineaciones, cota de los trabajos de perfilado, en la longitud de los trabajos de roca acomodada en la margen correspondiente donde se ejecutará la actividad.

El control topográfico será realizado de forma permanente durante toda la ejecución de la prestación, y en coordinación con el personal encargado del equipo de maquinaria pesada a fin de evitar interferir en la operación y producción de la maquinaria. Es decir, de ser necesario, el equipo encargado del control topográfico deberá adecuarse al cronograma de ejecución y utilización de maquinaria.

El equipo topográfico mínimo para utilizar deberá ser: 01 estación total, GPS diferencial, 01 Nivel, 01 Mira Plegable de 4 m, Winchas de 5.00, 25.00, 50.00 y 100 m, jalones y libreta de campo, pudiéndose usar alternativamente Dron, debiendo garantizar la precisión deseada.

Luego de culminado la ejecución del servicio el personal encargado de esta actividad entregará al encargado de la Dirección Técnica del servicio, la planilla de movimiento de tierras real ejecutado con su respectivo plano de secciones transversales conforme a la actividad (contemplando en formato digital y editable la nube de puntos editable), el mismo que deberá ser contrastado con los metrados proporcionados en el "Anexo No. 2" de Actividades de Emergencia de Atención Inmediata. Cualquier modificación, deberá comunicarse previamente al Ingeniero de Control Técnico, con la finalidad de coordinar el criterio técnico y obtener la autorización respectiva por la UGIRD.

- Extensión del Trabajo. - Comprende los trabajos topográficos de trazo, nivelación y replanteo de obras tanto para dar inicio a los trabajos, así como durante los trabajos que se desarrollen y dar sustento a la Planilla de Metrados.
- Medición. - Se medirá en forma Global.

#### **6.2.5.5 Habilitación de caminos.**

- Alcance del Trabajo. - Este trabajo comprenderá el suministro de materiales, equipos, y operaciones necesarias para la habilitación de caminos y/o carretera, para facilitar el acceso de la maquinaria a la zona de trabajo y/o cantera.

La habilitación y mantenimiento de caminos de acceso permitirá reducir los tiempos de recorrido de la maquinaria de transporte y la conservación de los mismos, evitando mayores costos de reparación y reduciendo el tiempo de ejecución de las actividades.

- La maquinaria a emplearse en esta partida será con tractor sobre orugas y/o conforme a la evaluación realizada por el Contratista y el Control Técnico en Campo; con el cual se conseguirá realizar de manera adecuada los trabajos programados en esta partida.
- Medición. - La habilitación de accesos será cuantificado por kilómetro de acceso y/o



**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI**

carretera habilitada.

**6.2.5.6 Conformación de Dique con Material de Prestamo.**

• Alcance del Trabajo. - Este trabajo consistirá en la reparación de dique con material de préstamo en una longitud total de 121ml, la cantera de material de préstamo se encuentra ubicada a una distancia aproximada de 8 km de la zona de trabajo y a las dimensiones indicadas según el Anexo No. 2.

Para la ejecución de esta partida se emplearán excavadoras sobre orugas y volquetes de 15m3.

• Medición. - La conformación de dique con material propio se medirá en metros cúbicos, considerando las dimensiones de la sección típica indica en el "Anexo N° 2".

**6.2.5.7 Habilitación y selección de roca en cantera**

• Alcance del Trabajo. - Comprende el suministro de materiales, equipos y operaciones necesarias para la habilitación y selección de roca en cantera.

Se considerará servicio de voladura de roca si el contratista lo considera necesario.

• El material estará formado por rocas cuyo tamaño sea de 80cm a 150cm, de diámetro nominal cuyos fragmentos individuales deberán ser densos y resistentes a la abrasión y deberán estar libres de grietas, hendiduras y otros defectos que pudieran aumentar injustificadamente la destrucción del enrocado por el agua u otros factores meteorológicos.

• Los materiales de desecho deberán ser colocados en áreas agotadas o en áreas aprobadas por el Ing. Director Técnico.

• La maquinaria a emplearse debe contar con 02 Excavadora según características indicadas en el Anexo No. 2. El contratista podrá utilizar maquinaria adicional y del tipo que considere necesario para cumplir con la actividad, esto último, no significa pagos adicionales por cualquier rubro que el contratista suponga o crea le corresponda (la maquinaria indicada en el Anexo No. 2, puede ser reemplazada por la maquinaria adicional, bajo cuenta y riesgo del contratista para el cumplimiento del plazo).

• Medición. - La habilitación de roca en cantera se medirá en metros cúbicos, para el efecto se estimará en la cantera el volumen de las rocas habilitadas y colocadas en su lugar adecuado para realizar posteriormente el carguío

**6.2.5.8 Carguío y transporte de roca frente al área de trabajo**

• Alcance del Trabajo. - Comprende el suministro de materiales, equipos y operaciones necesarias para el carguío de las rocas a los volquetes su transporte hasta la zona de trabajo.

• La maquinaria a emplearse en el carguío de roca será básicamente con volquetes, y excavadora, según características indicadas en el Anexo No. 2. El contratista podrá utilizar maquinaria adicional y del tipo que considere necesario para cumplir con la actividad, esto último, no significa pagos adicionales por cualquier rubro que el contratista suponga o crea le corresponda (la maquinaria indicada el Anexo No. 2, puede ser reemplazada por la maquinaria adicional, bajo cuenta y riesgo del contratista para el cumplimiento del plazo).

• El transporte de roca entre la cantera y el lugar de colocación final será realizado a través de la ruta más corta posible o aquella que señale el ingeniero de Control Técnico, quedando obligado al Ing. Director Técnico a construir los caminos de acceso o empalme necesarios para estos fines.



**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI**

G 0020

- Medición. - El carguio de roca se medirá en metros cúbicos, para el efecto se medirá el volumen de transporte de los volquetes que se utilizaran para el transporte multiplicado por número de viajes efectuados (30% de vacíos, es decir el volumen de roca por viaje es igual al 0.70 x volumen geométrico).

**6.2.5.9 Adecuación de roca al volteo**

Consiste en la actividad de colocación de roca, en los lugares establecidos en el Anexo No. 2 y lo indicado por el Control Técnico. Se considera un 10% de vacío en la adecuación de la roca.

El tamaño y peso de la roca a utilizarse será verificada por el Control técnico en función de la cantera elegida, debiéndose asegurar que tanto el tamaño y peso de la roca cumpla los objetivos para los cuales se instala por el Control Técnico y especificada en la Anexo No. 2.

- Alcance del Trabajo. - Comprende el suministro de materiales, equipos y operaciones necesarias para la adecuación de las rocas dejadas al volteo por los volquetes con la finalidad de optimizar su funcionalidad.
- Las rocas deberán ser colocadas y acomodadas de manera que queden regularmente distribuidos, con las más pequeñas en la parte superior y las más grandes en la parte inferior del talud y que sus caras más planas queden expuestas.

No se colocará roca en uña

- La maquinaria a emplearse en la adecuación deberá ser compuesto básicamente de excavadora sobre orugas, según características indicadas el Anexo No. 2. El contratista podrá utilizar maquinaria adicional y del tipo que considere necesario para cumplir con la actividad esto último, no significa pagos adicionales por cualquier rubro que el contratista suponga o crea le corresponda (la maquinaria indicada en el Anexo No. 2, puede ser reemplazada por la maquinaria adicional, bajo cuenta y riesgo del contratista para el cumplimiento del plazo).
- Medición. - La adecuación de roca al volteo se medirá en metros cúbicos, para el efecto se medirá el volumen de acuerdo a la geometría del talud del dique se estimará teniendo en cuenta el área cubierta y el espesor promedio de la roca. El acabado final de la roca a volteo será determinado por el ingeniero de Control Técnico

**7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO**

**"REPARACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Y PROTECCIÓN CON ENROCADO AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL DREN CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**

**Ubicación de la intervención (distrito/provincia/departamento/sector)**

DISTRITO	: Piura
PROVINCIA	: Piura
DEPARTAMENTO	: Piura
SECTOR	: San Juan De Curumuy
DREN	: Curumuy

**Planos o Croquis: contiendo la ubicación en planta, indicando las coordenadas UTM del punto de INCIO y punto FINAL**



CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

CROQUIS, UBICACIÓN EN PLANTA, REPARACIÓN DIQUE SECTOR DE SAN JUAN DE CURUMUY

SECTOR SAN JUAN DE CURUMUY - PLANTA GENERAL



TRAMO I: Reparación de dique con material de préstamo y protección con enrocado al volteo en el talud del dique




*[Handwritten signature]*




0 0019

**TRAMO II:** Reparación de dique con material de préstamo y protección de ribera con enrocado al volteo en ambos lados del talud del dique

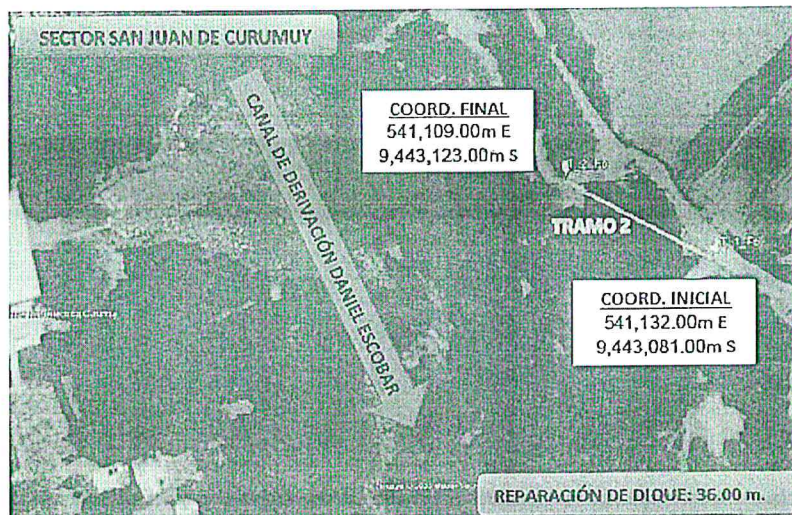


**TRAMO III:** Reparación de dique con material de préstamo y protección con enrocado al volteo en el talud del dique

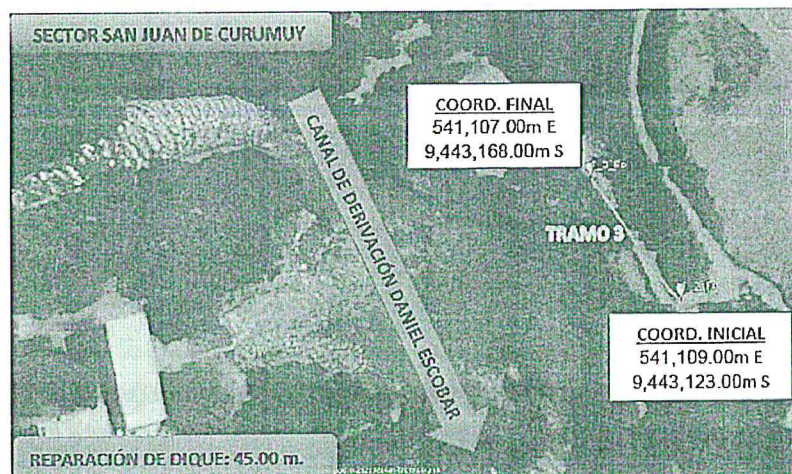

**CROQUIS PERFIL LONGITUDINAL, REPARACIÓN DIQUE DREN CURUMUY**

**PERFIL DEL DIQUE AFECTADO POR EL DESBORDE DEL CANAL DE DANIEL ESCOBAR**



**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI**

**8. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR:**

**Del Postor:**

Será una persona Jurídica que cuente con RUC y RNP en el capítulo de servicios y que no se encuentre impedido, suspendido, ni inhabilitado para contratar con el estado. Con experiencia en servicios similares.

Se considera servicios similares a los siguientes:

- Servicios o ejecución de obras **Descolmatación** de ríos o canales o drenes o cauces o quebradas o servicios.
- Servicios o Ejecución de obras de **encauzamiento** de ríos o canales o drenes o cauces o quebradas o servicios.
- Servicios o Ejecución de obras de **defensa ribereñas** de ríos o cauces o quebradas o servicios.
- Servicios o Ejecución de obras de **conformación de bordos** en ríos o cauces o quebradas.
- Servicio de Limpieza de ríos o quebradas o canales o drenes.

**9. PERSONAL CLAVE**

Personal requerido para la ejecución de la actividad:

- Director Técnico: Ingeniero Agrícola y/o Civil a tiempo completo, encargado de la coordinación y ejecución física del servicio en campo.
- Especialista en Topografía: Técnico en topografía, encargado del desarrollo del levantamiento, procesamiento y control topográfico en campo.

**10. SISTEMA DE CONTRATACION**

- A PRECIOS UNITARIOS.

**11. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO**

Se le otorga a la empresa contratada para la ejecución del servicio un plazo de hasta 30 días calendario, contabilizados desde el siguiente día de suscrita el Acta de Inicio de Actividades, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.1.1.



ACTIVIDAD	EJECUCION DEL SERVICIO (días calendario)
"REPARACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Y PROTECCIÓN CON ENROCADO AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL DREN CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	30

**12. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS.**

La conformidad de ejecución del servicio por parte de la Entidad, no enerva su derecho a reclamar posterior por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto en el inciso 40.2 del artículo 40° de la Ley de Contratación del Estado Congruentes con el Artículo 173 de su Reglamento.

El Plazo de responsabilidad del contratista es de 01 (un) año.



**13. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

Las garantías que deben otorgar el postor y/o contratista, serán mediante Fianza otorgada por la Entidad que se encuentre bajo la supervisión de la SBS. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe de entregar a la



**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI**

C 0018

Entidad la Garantía de Fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al 10% (diez por ciento) del Monto del Contrato Original, de conformidad con lo señalado en el artículo 148 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado

Esta debe de mantenerse vigente hasta la aprobación del Informe final.

**14. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO**

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras:  $F = 0.40$ .

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías:  $F = 0.25$ .


Estas penalidades se deducen de los pagos que la entidad debe efectuar al contratista.

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

**14.1 OTRAS PENALIDADES**

Con el objeto de asegurar una mejor calidad de la ejecución de los trabajos; se establecen estas otras penalidades:

PENALIDADES				
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Unidad	Forma de Cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	Por cada día de ausencia del personal.	0.50 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento



*Handwritten signature*



## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

2	En caso el responsable de la Dirección Técnica no se encuentre presente en el lugar de la prestación de la actividad, excepto en Caso Fortuito o Fuerza Mayor, debidamente acreditado.	Por ocurrencia	0.15 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
3	Cuando el Contratista no cumple en presentar el Informe Final correspondiente, dentro del plazo señalado	Por cada día de incumplimie nto	0.20 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
4	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Por cada ocurrencia	0.50 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
5	Por no presentar el Plan de Trabajo y cronograma de utilización de maquinaria al Control Técnico en el plazo establecido.	Por cada día de incumplimie nto	0.10 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
6	Por no iniciar los trabajos materia de la prestación dentro del plazo establecido, luego de suscrita el Acta de Inicio del Servicio.	Por cada día de atraso	0.30 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
7	No cumple con proveer la maquinaria indicada según el cronograma de utilización y ejecución de maquinarias, aprobado según el Plan de Trabajo y que esta última no se encuentre 100% operativa.	Por ocurrencia en el incumplimie nto y por cada maquinaria	0.3 UIT	Según informe del Control Técnico o Inspector o Monitor o Ingeniero de Seguimiento

- El PSI durante la etapa de ejecución contractual, tomara las medidas preventivas necesarias, a fin de verificar el cumplimiento en lo concerniente a la maquinaria, el equipo y personal propuesto. A fin del cumplimiento de la actividad en las mejores condiciones.

### 15. RECEPCIÓN DEL SERVICIO

Culminada la prestación del servicio, el Contratista en un plazo máximo de dos (02) días siguientes a la culminación, deberá solicitar al Control Técnico, la recepción del mismo, en un plazo máximo de dos (02) días siguientes, el Control Técnico emite y entrega a la

**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI**

C 0017

Entidad un Informe Técnico pronunciándose sobre la culminación o no del servicio, debiendo actuar de acuerdo al siguiente detalle:

- En caso el Informe Técnico del Control Técnico concluya con la culminación de la ejecución del servicio por parte del contratista, deberá detallar los trabajos culminados (de presentarse una modificación al Contrato, será de responsabilidad del Contratista realizar el trámite de la solicitud de modificación contractual de forma oportuna, para su aprobación respectiva por la Entidad).
- En caso el Informe del Control Técnico corrobore la no culminación de los servicios por parte del Contratista, deberá evaluar la posibilidad, pertinencia, y de ser el caso solicitar el inicio del procedimiento de resolución de contrato con el objeto de requerir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones referidas a la culminación del servicio dentro del plazo contractual.

Para todos los casos el "Informe Técnico" del Ingeniero de Control Técnico deberá adjuntar en original y unas copias, en formato físico y digital lo siguiente:

1. Memoria Descriptiva
2. Planilla de metrados.
3. Comparativo de metrados del el Anexo No. 2 y lo realmente ejecutado.
4. Planos definitivos.
5. Fotografías (05 unidades) y videos (01 filmación de 10 minutos como mínimo).

En un plazo máximo de 03 días hábiles de recibido el Informe Técnico del Ingeniero de Control Técnico y demás actuados, la UGIRD designará a un equipo de tres (03) Ingenieros con conocimiento técnico, con el objetivo de verificar los trabajos realizados y de corresponder se suscriban un Acta de Recepción del Servicio u observación.

En un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de habersele notificado a los ingenieros integrantes, el especialista encargado comunicará a la UGIRD, para que mediante esta unidad se notifique al Contratista y al Control Técnico, la fecha y hora en que se llevará a cabo la recepción del servicio, la cual no podrá exceder de los diez (10) días calendario siguientes.

- En caso no encuentre conforme los trabajos, se levantará un Acta de Observaciones detallando cada una de estas, y otorgará al Contratista un plazo máximo de diez (10) días calendario para su subsanación. Para la verificación de la subsanación, y de corresponder la recepción, el equipo de ingenieros encargados de la recepción, se apersonarán al lugar de actividades sin necesidad de aviso previo.
- En caso persista la observación, el especialista encargado levantará un Acta de No Recepción del Servicio, e informará a la UGIRD para que evalúe si corresponde resolver el contrato, de ser el caso que se considere otorgar un plazo adicional al contratista para que subsane las observaciones persistentes, estas se encontrarán sujetas a la aplicación de penalidades.
- En caso que los encargados de la recepción, adviertan que el servicio manifiestamente no cumple las características y condiciones ofrecidas, levantará un Acta de No Recepción del Servicio, e informará a la UGIRD.

En el mismo día, luego de efectuada la recepción del servicio, el equipo de ingenieros encargados de la recepción, remitirá a la UGIRD el original del Acta de Recepción.

**16. INFORME FINAL DEL SERVICIO**

Una vez culminada al 100% la ejecución del servicio, con el Acta de Recepción del servicio, el Contratista entregará al Control Técnico en un plazo máximo de cinco (05)



*Handwritten signature*

## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

días calendario el Informe Final para su evaluación, teniendo el Control Técnico un periodo de dos (02) días para emitir su Informe Técnico pronunciándose sobre el Informe Final.

El Informe Final del servicio tendrá la siguiente estructura:

- Resumen General.
- Descripción de la actividad.
- Avance físico de la actividad por partida.
- Planilla de metrados y valorización única del servicio.
- Relación de personal, maquinaria pesada y equipos del contratista (respecto al cronograma de utilización y ejecución de maquinaria y equipos aprobados en el plan de trabajo).
- Informe de estado de operatividad de las maquinarias.
- Adjuntar SCTR del personal durante la ejecución del servicio.
- Resumen de documentación y reuniones técnicas.
- Conclusiones y recomendaciones.
- Anexos.
  - Acta de Inicio del Servicio.
  - Acta de Recepción del Servicio.
- Panel fotográfico.
- Cuaderno de Control.
- Planos: Iniciales de replanteo y finales.
  - Nube de puntos obtenido del levantamiento inicial y final topográfico digital
  - Planos de ubicación general
  - Planos de Planta final
  - Planos de Perfil longitudinal (incluir el cuadro de volúmenes de movimiento de tierras y enrocados finales).
  - Planos de secciones transversales finales
  - Plano de Ubicación de canteras de roca
    - Plano de Ubicación de botaderos, en el cual se indique las coordenadas de los botaderos y los volúmenes de materiales que fueron depositados en esa zona (cuadro de metrados de material eliminado).
- Informe de aprobación por parte del Control Técnico

Se debe de realizar una descripción de las ocurrencias del trabajo, en las que se indicaran detalladamente entre otros, los métodos utilizados, personal en la actividad, metrados, fotografías (panel fotográfico digital que registre el desarrollo de la actividad); incidencias en la labor de la dirección Técnica.

En caso de existir observaciones, el Control Técnico comunicará inmediatamente al contratista para que sean absueltas en un plazo no mayor de tres (03) días calendario de notifica dichas observaciones, y una vez encontrada conforme, el Control Técnico remitirá a la Entidad el Informe Final.

### 17. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio estará a cargo de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, previo informe de conformidad del Ingeniero de control técnico o personal encargado por la UGIRD e Informe Técnico del Ingeniero de Seguimiento de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje.

### 18. CONSTANCIA DE PRESTACION

La constancia de prestación por el servicio prestado estará a cargo y será otorgado por la Unidad de Administración de conformidad con el Artículo 169° del Reglamento de la Ley de contrataciones con el estado.



0 0016

19. OTRAS CONSIDERACIONES

- El contratista será responsable por los daños y/o perjuicios causados a terceros y responderá directamente, excluyendo al PSI de cualquier responsabilidad por su acción u omisión.
- Prestaciones Adicionales: No se reconocerán adicionales por mayores prestaciones del servicio.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

**A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL**

**A.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA**

Requisitos:

01 Director Técnico: Ingeniero Agrícola y/o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

01 Especialista en Topografía: Ingeniero Agrícola o Ingeniero Civil o ingeniero Topógrafo o Técnico Topógrafo.

Acreditación:

Se verificará el Grado académico o Título Profesional en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> // o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <http://www.titulosinstitutos.pe/>, según corresponda; o declaración jurada de cumplimiento de requisitos, en cuyo caso tendrá dos (02) días calendarios de plazo, a partir del día siguiente de la adjudicación, para presentar los documentos que acrediten.

**A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE**

Requisitos:

01 Director Técnico: Experiencia mínima de 02 años como Director Técnico y/o Responsable y/o Residente y/o Control Técnico, en obras y/o servicios en general.

01 Especialista en Topografía: Experiencia mínima de 2 años como topógrafo y/o Jefe de Topografía y/o residente y/o Control Técnico, en obras y/o servicios en general.

Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto; o declaración jurada de cumplimiento de requisitos, en cuyo caso tendrá dos (02) días calendarios de plazo, a partir del día siguiente de la adjudicación, para presentar los documentos que acrediten.

**A.3 EQUIPAMIENTO**


Requisitos mínimos:

TIPO DE MAQUINARIA	POTENCIA	CANTIDAD	ANTIGÜEDAD	CALIBRACION
Excavadora sobre Orugas	170-250 hp	02	Max. 10 Años	-
Camión Volquere 15m3		04	Max. 10 Años	
Estación Total (Incluye Prismas)	-	01		Menor a 6 Meses
Nivel de Ingeniero (Incluye Miras)	-	01		Menor a 6 Meses

Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido, carta de compromiso de presentación y acreditación de equipamiento requerido; o declaración jurada de cumplimiento de requisitos, en cuyo caso tendrá dos (02) días calendarios de plazo, a partir del día siguiente de la adjudicación, para presentar los documentos que acrediten.

REQUISITOS DE EVALUACIÓN



## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

### B. EXPERIENCIA DEL POSTOR

#### Requisitos:

Se evaluará considerando un monto facturado acumulado hasta S/ 693,750.00 (seiscientos noventa y tres mil Setecientos cincuenta con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considera servicios similares a los siguientes:

- Servicios o ejecución de obras Descolmatación de ríos o canales o drenes o cauces o quebradas o servicios.
- Servicios o Ejecución de obras de encauzamiento de ríos o canales o drenes o cauces o quebradas o servicios.
- Servicios o Ejecución de obras de defensa ribereñas de ríos o cauces o quebradas o servicios.
- Servicios o Ejecución de obras de conformación de bordos en ríos o cauces o quebradas.
- Servicio de Limpieza de ríos o quebradas o canales o drenes.

#### Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación; o (iv) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación o (vi) o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones, o declaración jurada de cumplimiento de requisitos, en cuyo caso tendrá dos (02) días calendarios de plazo, a partir del día siguiente de la adjudicación, para presentar los documentos que acrediten.

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

2 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehacientemente en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".





ANEXO N° 02

**FORMATO CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA QUE SUSTENTA LA  
ACTIVIDAD DE EMERGENCIA**

**TÍTULO DE LA ACTIVIDAD**

"REPARACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO Y PROTECCIÓN CON ENROCADO AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL DREN CURUMUY, SECTOR SAN JUAN DE CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

a) Código y nombre de la Unidad Ejecutora

006-956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

b) Ubicación de la intervención (departamento/provincia/distrito)

Distrito	:	Piura
Provincia	:	Piura
Departamento	:	Piura
Sector	:	San Juan de Curumuy
Dren	:	Curumuy

c) Norma de Declaratoria de Emergencia

DECRETO SUPREMO N° 043-2023-PCM

d) Coordenadas UTM (Datum WGS 84); Se tiene 03 tramos consecutivos:

TRAMO 1

TRAMO I. REPARACIÓN DE DIQUE Y PROTECCIÓN CON ENROCADO			
INICIAL:		FINAL:	
ESTE : 541,153.00		ESTE : 541,132.00	Zona 17 M
NORTE : 9,443,043.00		NORTE : 9,443,081.00	

TRAMO 2


TRAMO II. REPARACIÓN DE DIQUE Y PROTECCIÓN CON ENROCADO			
INICIAL:		FINAL:	
ESTE : 541,132.00		ESTE : 541,109.00	Zona 17 M
NORTE : 9,443,081.00		NORTE : 9,443,123.00	

TRAMO 3

TRAMO III. REPARACIÓN DE DIQUE Y PROTECCIÓN CON ENROCADO			
INICIAL:		FINAL:	
ESTE : 541,109.00		ESTE : 541,107.00	Zona 17 M
NORTE : 9,443,123.00		NORTE : 9,443,168.00	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES  
Dr. Ing. Jorge Luis Alvarez Deza  
JEFE REGIONAL  
UNIDAD DE GESTIÓN ZONAL PIURA





e) Breve descripción de los daños

Como consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales presentados en la región de Piura, se ha generado el incremento de caudal del canal de derivación Daniel Escobar, ocasionando la pérdida del dique y camino de guardiania (margen derecha) del Dren Curumuy, afectando de manera permanente a 60.00 ha. de cultivo de banano y pan llevar, correspondiente a 70 usuarios y 350 personas.

f) Breve descripción de la actividad de emergencia

Con la finalidad de poder salvaguardar las 60.00 ha. de área agrícola en el sector de San Juan de Curumuy, se debe reponer el dique de encauzamiento y camino de guardiania, el cual fue dañado producto del desborde de las aguas del canal de derivación Daniel Escobar, lo que trajo consigo la inundación de los terrenos de cultivo de banano y pan llevar, estas intervenciones se identificaron en campo de la siguiente manera:

- ❖ Tramo I: Desde las coordenadas UTM WGS 84 Zona 17M; 541,153.00 m E - 9,443,043 m S, hasta las coordenadas UTM WGS 84 Zona 17M; 541,132.00 m E - 9,443,081.00 m S. (Reparación de dique con material de préstamo y protección con enrocado al volteo en el talud del dique).
- ❖ Tramo II: Desde las coordenadas UTM WGS 84 Zona 17M; 541,132.00m E - 9,443,081.00 m S, hasta las coordenadas UTM WGS 84 Zona 17M; 541,109.00 m E - 9,443,123.00 m S. (Reparación de dique con material de préstamo, protección con enrocado al volteo en ambos lados del talud del dique y enrocado de base de dique).
- ❖ Tramo III: Desde las coordenadas UTM WGS 84 Zona 17M; 541,109.00m E - 9,443,123.00 m S, hasta las coordenadas UTM WGS 84 Zona 17M; 541,107.00 m E - 9,443,168.00 m S. (Reparación de dique con material de préstamo y protección con enrocado al volteo en el talud del dique).

Las maquinarias para realizar los trabajos correspondientes a la reposición del dique y protección con enrocado al volteo en los tramos indicados, son los siguientes: Excavadoras sobre Orugas de 170-250HP o superior y maquinaria liviana como volquetes roqueros, capacidad mínima de 15 m<sup>3</sup>; se efectuarán las siguientes actividades:

- ❖ Tramo I: Reparación de dique con material de préstamo y protección con enrocado al volteo, en una longitud de 40.00 ml.
- ❖ Tramo II: Reparación de dique con material de préstamo, protección con enrocado al volteo en ambas caras del talud del dique y la conformación del enrocado de la base del dique en una longitud de 36.00 ml.
- ❖ Tramo III: Reparación de dique con material de préstamo y protección con enrocado al volteo, en una longitud de 45.00 ml.

Los metrados totales considerados son, conformación de dique con material de préstamo en un volumen total de 4,915 m<sup>3</sup> y protección con enrocado al volteo con un volumen de 2,851.20 m<sup>3</sup>.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES  
Dr. Ing. Jorge Luis Álvarez Deza  
JEFE ZONAL (I)  
UNIDAD DE GESTIÓN ZONAL PIURA





Descripción de las actividades y/o partidas planteadas:


- ❖ **Movilización y desmovilización de maquinarias:**  
El transporte del equipo pesado se podrá realizar en camiones de plataforma de cama baja, es importante indicar la procedencia de las maquinarias serán contratadas de la ciudad de Piura (35 km) y/o otro lugar donde se encuentre disponible las maquinarias según las especificaciones técnicas indicadas en los análisis de los costos unitarios de la actividad de emergencia, destinado recursos financieros para esta actividad.
- ❖ **Topografía Inicial - Final:**  
Acciones de control topográfico, para cumplimiento de los objetivos planteados en la Ficha Técnica la cual se realizará al inicio (Topografía Inicial), durante la ejecución y al terminar la actividad (Levantamiento topográfico post actividad).
- ❖ **Habilitación de Caminos:**  
Este trabajo consiste en la habilitación de los caminos y accesos para que la maquinaria pesada puede ingresar a las zonas de trabajo tanto en la cantera del material de préstamo y la cantera de roca.
- ❖ **Reparación de dique con material de préstamo:**  
Este trabajo consistirá en la reparación de dique con material de préstamo en una longitud total de 121ml, de acuerdo a las siguientes secciones:

TRAMO I – SECTOR SAN JUAN DE CURUMUY		
LONGITUD	SECCION DEL DIQUE	
40.00 ml	Base Mayor: 8.00ml	ALTURA REPARACIÓN DE DIQUE
	Base Menor: 6.00ml	1.00ml
TRAMO II – SECTOR SAN JUAN DE CURUMUY		
LONGITUD	SECCION DEL DIQUE	
36.00 ml	Base Mayor: 24.00ml	ALTURA REPARACIÓN DE DIQUE
	Base Menor: 6.00ml	8.00ml
TRAMO III – SECTOR SAN JUAN DE CURUMUY		
LONGITUD	SECCION DEL DIQUE	
45.00 ml	Base Mayor: 8.00ml	ALTURA REPARACIÓN DE DIQUE
	Base Menor: 6.00ml	1.00ml

Para realizar esta partida se tiene previsto utilizar excavadora de 170-250 HP o superior, de acuerdo a las características indicadas en el cuadro de insumos.

- ❖ **Protección con enrocado al volteo:**  
Este trabajo consistirá en la protección de dique con enrocado al volteo en el tramo I en una longitud de 40.00 ml, y un volumen de 115.20 m<sup>3</sup>, en el tramo II en una longitud de 36.00 ml y un volumen de 662.40 m<sup>3</sup> (ambas caras del talud del dique) y 1,944.00m<sup>3</sup> de roca en la base del dique (altura: 2,00mt) y en el tramo III –, en una longitud de 45.00 ml y un volumen de 129.60 m<sup>3</sup> de acuerdo a las dimensiones indicadas en la sección típica. Para realizar esta partida se tiene previsto la utilización de maquinaria de tipo excavadora y volquete de acuerdo a las características indicadas en el cuadro de insumos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES  
Dr. Ing. Jorge Luis Álvarez Deza  
JEFE ZONAL  
UNIDAD DE GERENCIA PIURA



**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI**



**g) Código de Registro en el SINPAD**

CODIGO SINPAD: 164701

**h) Metas físicas a ejecutar**

1. Reparación de dique con material de préstamo y protección de enrocado al volteo en la margen derecha del Dren Curumuy, sector San Juan de Curumuy, distrito de Piura, provincia y departamento de Piura".	121.00 ml
--	-----------

**i) Cantidad de la población (productores) a ser beneficiada**

Con la ejecución de la actividad se atenderá a una población beneficiaria de 70 Usuarios, cuyos predios agrícolas corresponden a 60ha.

**j) Tiempo estimado de ejecución de la intervención que se cuenta a partir de la transferencia financiera efectuada por el MIDAGRI**

Tiempo estimado de ejecución de la intervención (30 días), una vez que se cuenten con los fondos para la ejecución de la actividad.

Se estima los siguientes tiempos para su ejecución:

RUBRO	CRONOGRAMA MENSUAL DE EJECUCION FINANCIERA			
	1° MES		2° MES	
	1 - 5 DIAS	6 - 35 DIAS	36 - 45 DIAS	46 - 60 DIAS
1. PROCESO DE CONTRATACION.				
2. EJECUCION DE ACTIVIDAD.				
3. VERIFICACION Y CONFORMIDAD DE ACTIVIDAD.				
4. LIQUIDACION - CIERRE DE CONTRATO				
<b>TOTAL</b>	5 DIAS	30 DIAS	10 DIAS	15 DIAS
60 DIAS CALENDARIOS				

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES  
Dr. Ing. Jorge Luis Alvarez Deza  
Jefe General  
UNIDAD DE GESTION REGIONAL PIURA



CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI



k) Presupuesto requerido incluido el detalle por genérica y específica de gasto

Presupuesto requerido: S/ 740,650.00

Cuadro de detalle y específica de gasto.

CUADRO GENERICA DE GASTO

TAREA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	META FISICA		COD. DE GENERICA DE GASTO	COD. Y NOM. DE ESPECIFICA DE GASTO	MONTO (S/.)	Sub total
"REPARACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO Y PROTECCIÓN CON ENROCADO AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL DREN "URUMUY, SECTOR SAN JUAN DE CURUMUY, TRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".									
Control Técnico / Supervisión									
Control Técnico	PIURA	PIURA	PIURA	1.000	MES	2.3	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
Supervisión	PIURA	PIURA	PIURA	2.000	MES	2.3	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00
Visitas de Campo de verificación de ejecución, y recepción de ejecución.	PIURA	PIURA	PIURA	1	GLB	2.3	2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
Visitas de Campo de verificación de ejecución, y recepción de ejecución	PIURA	PIURA	PIURA	1	GLB	2.3	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
Visitas de Campo de verificación de ejecución, y recepción de ejecución	PIURA	PIURA	PIURA	1	GLB	2.3	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE AEREO	S/ 3,200.00	S/ 3,200.00
Visitas de Campo de verificación de ejecución, y recepción de ejecución	PIURA	PIURA	PIURA	1	GLB	2.3	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00
<b>SUB TOTAL 1.1</b>									<b>S/ 46,900.00</b>
TRABAJOS PRELIMINARES Y PROVISIONALES									
									S/ 17,700.79
MOVIUIZACIÓN Y DESMOVIUIZACIÓN DE MAQUINARIA CON CAMA BAJA.	PIURA	PIURA	PIURA	4	VJE	2.3	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	S/ 2,800.00	S/ 11,200.00
MOVIUIZACIÓN Y DESMOVIUIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA CON RODADO	PIURA	PIURA	PIURA	10	VJE	2.3	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	S/ 250.00	S/ 2,500.00
TOPOGRAFIA INICIAL - FINAL	PIURA	PIURA	PIURA	1	GBL	2.3	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	S/ 4,000.79	S/ 4,000.79
<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>									<b>S/ 279,817.95</b>
ESTACION DE CAMINOS DE ACCESO	PIURA	PIURA	PIURA	0.50	KM	2.3	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	S/ 1,980.00	S/ 990.00
DESCOIMATACION DEL CAUCE DE QUEBRADA	PIURA	PIURA	PIURA	0.00	M3	2.3	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	S/ 4.72	S/ -
CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO	PIURA	PIURA	PIURA	4,915.00	M3	2.3	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	S/ 56.73	S/ 278,827.95
PROTECCION CON ENROCADO AL VOLTEO									S/ 396,231.26
HABITACION Y SELECCION DE ROCA EN CANTERA	PIURA	PIURA	PIURA	2,851.20	M3	2.3	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	S/ 31.41	S/ 89,556.19
CARGUID Y TRANSPORTE DE ROCA	PIURA	PIURA	PIURA	2,851.20	M3	2.3	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	S/ 89.54	S/ 255,296.45
ADECUACION DE ROCA AL VOLTEO	PIURA	PIURA	PIURA	2,851.20	M3	2.3	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	S/ 18.02	S/ 51,378.62
<b>SUB TOTAL 1.2</b>								<b>S/ 46,131.21</b>	<b>S/ 693,750.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>									<b>S/ 740,650.00</b>

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES  
Dr. Ing. Jorge Luis Alvarez Deza  
JEFE ZONAL  
UNIDAD DE GESTION ZONAL PIURA



**SUSTENTO ANEXO N° 02**

En el presupuesto que se indica en el literal k) de la declaración Jurada, debe contar con los siguientes documentos de sustentos, de pendiendo del tipo de intervención.


- a) Planos o Croquis: contiendo la ubicación en planta, indicando las coordenadas UTM del punto de INCIO y punto FINAL

**CROQUIS, UBICACIÓN EN PLANTA, REPARACIÓN DIQUE SECTOR DE SAN JUAN DE CURUMUY**

**SECTOR SAN JUAN DE CURUMUY - PLANTA GENERAL**



**TRAMO I:** Reparación de dique con material de préstamo y protección con enrocado al volteo en el talud del dique

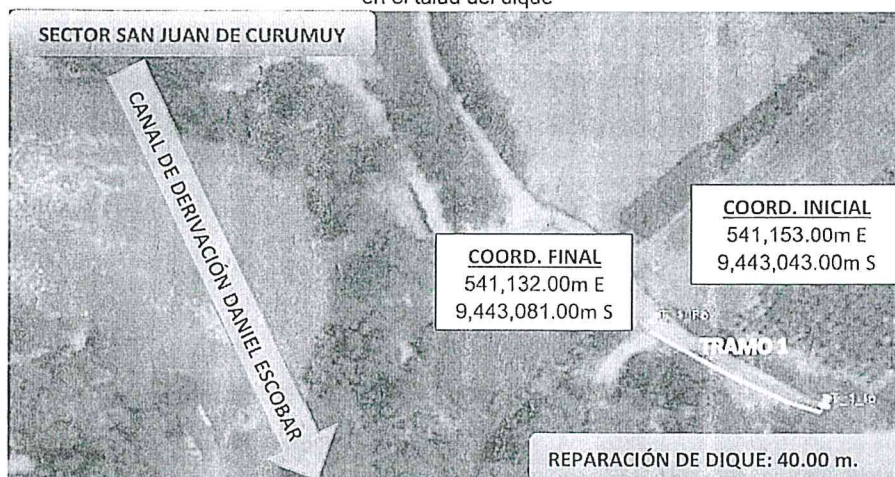


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES  
Dr. Ing. Jorge Luis Alvarado Deza  
JEFE ZONAL (I)  
UNIDAD DE GESTIÓN ZONAL PIURA






**TRAMO II:** Reparación de dique con material de préstamo y protección de ribera con enrocado al volteo en ambos lados del talud del dique

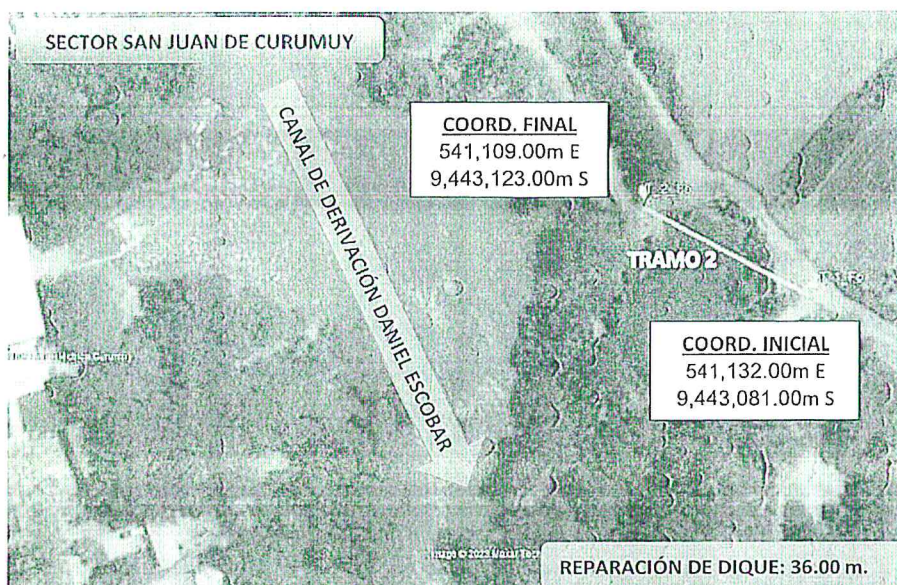


**TRAMO III:** Reparación de dique con material de préstamo y protección con enrocado al volteo en el talud del dique

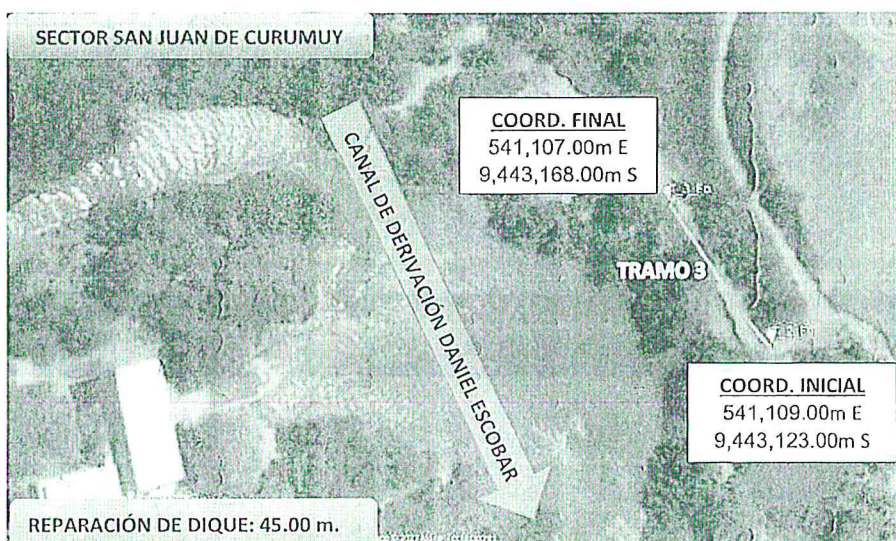

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

Dr. Ing. Jorge Luis Alvarez Deza  
JEFE ZONAL III  
UNIDAD DE GESTIÓN ZONAL PUNTA






b) Perfil longitudinal, secciones transversales o secciones típicas dimensionadas

CROQUIS PERFIL LONGITUDINAL, REPARACIÓN DIQUE DREN CURUMUY

PERFIL DEL DIQUE AFECTADO POR EL DESBORDE DEL CANAL DE DANIEL ESCOBAR

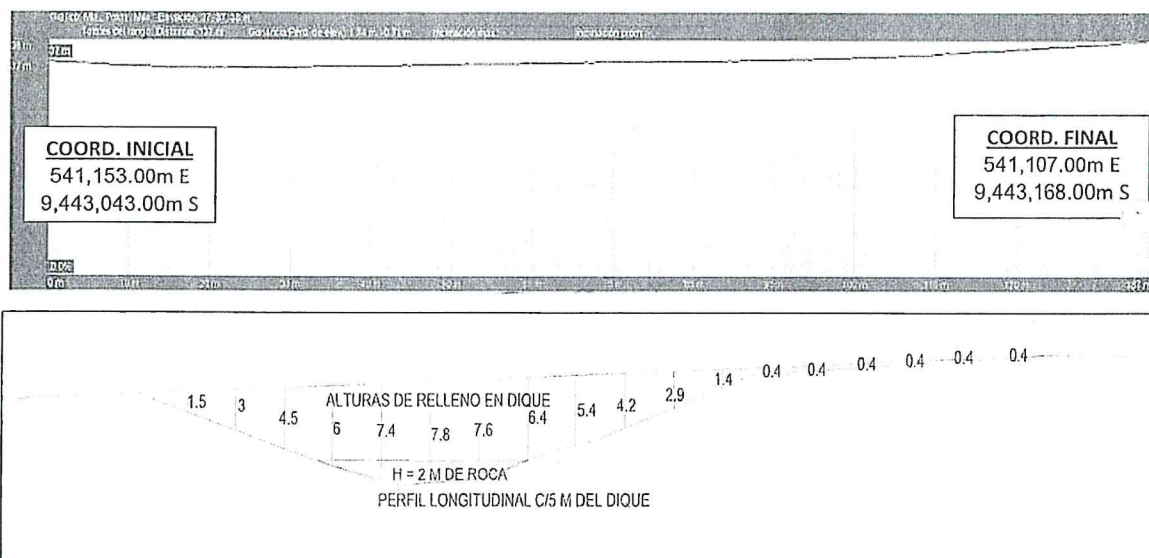


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES  
Dr. Ing. Jorge Luis Alvarez Daza  
JEFE ZONAL C/5  
UNIDAD DE GESTION ZONAL PIURA




- c) Plano de planta o croquis, señalando la sección típica de la estructura intervenir y las características hidráulicas y geométricas

SECCIÓN TÍPICA DE QUEBRADA CÓLERA

TRAMO 1 Y 3, SECCIÓN TÍPICA DE REPARACIÓN DE DIQUE Y ENROCADO

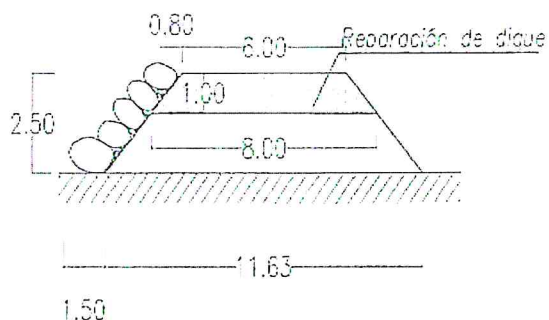


TRAMO 2, SECCIÓN TÍPICA DE REPARACIÓN DE DIQUE Y ENROCADO

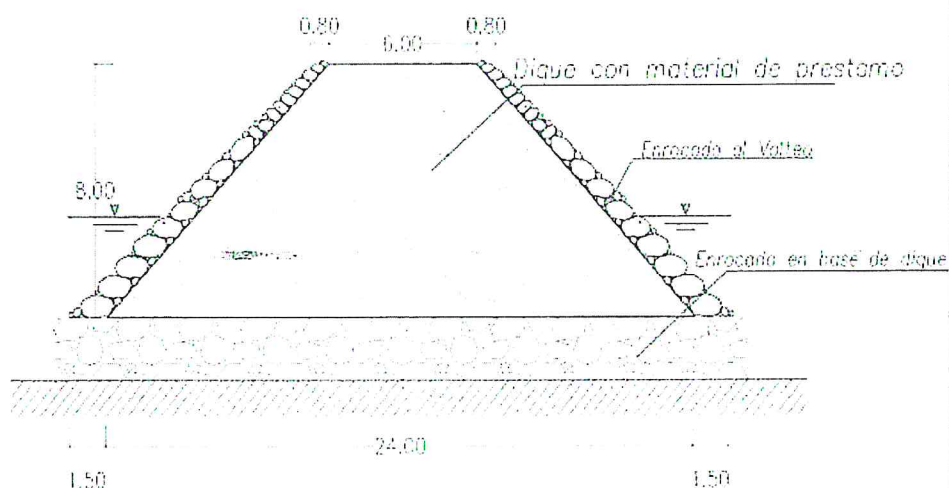

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

Dr. Ing. Jorge Luis Álvarez Deza  
Jefe General  
UNIDAD DE GESTIÓN ZONAL PIURA

CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI



d) Planilla de metrados, indicando las dimensiones de la caja hidráulica a recuperar, entre otros que sean necesarios para señalar.

SUSTENTO DE METRADOS							
NOMBRE DEL SERVICIO : "REPARACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO Y PROTECCIÓN CON ENROCADO AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL DREN CURUMUY, SECTOR SAN JUAN DE CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".							
PROGRAMA : PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI							
SECTOR : SAN JUAN DE CURUMUY							
PROVINCIA : PIURA							
Distrito : PIURA							
Departam.: PIURA							
Fecha : Abr-23							
01 ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DREN CURUMUY							
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES Y PROVISIONALES							
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA (CON CAMA BAJA)							
Descripción	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)	Alto (m)	Unidad (vje)	
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA (CON CAMA BAJA)	1.00	-	-	-	-	-	4.00
01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA (CON RODADO)							
Descripción	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)	Alto (m)	Unidad (vje)	
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA (CON RODADO)	1.00	-	-	-	-	-	10.00
01.01.03 TOPOGRAFIA INICIAL - FINAL							
Descripción	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)	Alto (m)	Unidad (Gib)	
TOPOGRAFIA INICIAL - FINAL	1.00	-	-	-	-	-	1.00
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.02.01 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO							
Descripción	Cantidad	Largo (km)	Ancho (m)	Area (m2)	Alto (m)	Unidad (km)	
HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	1.00	0.50	-	-	-	-	0.50
01.02.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO							
Descripción	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)	Alto (m)	Unidad (m3)	
TRAMO I - REPARACION DE DIQUE							4,915.00
Progresiva	1.00	40.00	-	7.00	-	280.00	
Base mayor = 8.00m							
Base menor = 6.00m							
Altura = 1.00m							
Area = ((8.00+6.00)/2)*1.00 = 7.00 m2 (seccion trapezoidal)							
TRAMO II - REPARACION DE DIQUE							4,320.00
Progresiva	1.00	35.00	-	120.00	-		
Base mayor = 24.00m							
Base menor = 6.00m							
Altura = 8.00m							
Area = ((24.00+6.00)/2)*8.00 = 120.00 m2 (seccion trapezoidal)							
TRAMO III - REPARACION DE DIQUE							315.00
Progresiva	1.00	45.00	-	7.00	-		
Base mayor = 8.00m							
Base menor = 6.00m							
Altura = 1.00m							
Area = ((8.00+6.00)/2)*1.00 = 7.00 m2 (seccion trapezoidal)							

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES  
Dr. Ing. Jorge Luis Alvarez Dera  
JEFE ZONAL III  
UNIDAD DE GESTION ZONAL PIURA



CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI



01.03 PROTECCION CON ENROCADOS AL VOLTEO						
01.03.01 HABILITACION Y SELECCION DE ROCA EN CANTERA						
Descripción	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)	Alto (m)	Unidad (m3)
						2,851.20
TRAMO I - ENROCADOS						
Progresiva	1.00	40.00		2.88		115.20
Base mayor = 1.50m						
Base menor = 0.80m						
Altura = 2.50m						
Area = ((1.50+0.80)/2)*2.50 = 2.88 m2						
TRAMO II - ENROCADOS						
Progresiva	2.00	38.00		9.20		662.40
Base mayor = 1.50m						
Base menor = 0.80m						
Altura = 8.00m						
Area = ((1.50+0.80)/2)*8.00 = 9.20 m2						
TRAMO III - ENROCADOS						
Progresiva	1.00	45.00		2.88		129.60
Base mayor = 1.50m						
Base menor = 0.80m						
Altura = 2.50m						
Area = ((1.50+0.80)/2)*2.50 = 2.88 m2						
BASE DE ENRIQUE						
Progresiva	1.00	35.00	27.00		2.00	1,944.00
01.03.02 CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA						
Descripción	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)	Alto (m)	Unidad (m3)
CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA	1.00	0.00	-	0.00	-	2,851.20
01.03.03 ADECUACION DE ROCA AL VOLTEO						
Descripción	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)	Alto (m)	Unidad (m3)
ADECUACION DE ROCA AL VOLTEO	1.00	0.00	-	0.00	-	2,851.20



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES  
Dr. Ing. Jorge Luis Alvarado Becerra  
JEFE COMACAL  
UNIDAD DE GESTION COMACAL PUNTA

## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI



e) Análisis de Costos Unitarios por partida, indicando el rendimiento de la unidad de medida por día.

### Resumen del Presupuesto.

#### Presupuesto

Presupuesto	2401001	FICHA TECNICA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS DEL DREN CURUMUY, SECTOR SAN JUAN DE CURUMUY - PIURA - PIURA - PIURA.				
Subpresupuesto	001	"REPARACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO Y PROTECCIÓN CON ENROCADO AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL DREN CURUMUY, SECTOR SAN JUAN DE CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".				
Cliente	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI				Costo al	20/04/2023
Lugar	PIURA - PIURA - PIURA					
Item	Descripción		Und.	Medrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	TRABAJOS PRELIMINARES Y PROVICIONALES					17,700.79
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					279,817.95
03	PROTECCION CON ENROCADO AL VOLTEO					396,231.26
	Costo Directo					693,750.00
	Costo Indirecto (6.77%)					46,900.00
	Costo Total del Servicio					740,650.00

SON : SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES  
Dr. Ing. Jorge Luis Álvarez Vera  
20/04/2023  
UNIDAD DE GESTION LOCAL PIURA



## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI



### Presupuesto del Servicio

#### Presupuesto

Presupuesto	2401001	FICHA TECNICA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS DEL DREN CURUMUY, SECTOR SAN JUAN DE CURUMUY - PIURA - PIURA - PIURA.
Subpresupuesto	001	"REPARACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO Y PROTECCIÓN CON ENROCADO AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL DREN CURUMUY, SECTOR SAN JUAN DE CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".

Cliente PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI Costo al 20/04/2023

Lugar PIURA - PIURA - PIURA


Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	TRABAJOS PRELIMINARES Y PROVISIONALES				17,700.79
0101	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA	vje	4.00	2,800.00	11,200.00
0102	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA	vje	10.00	250.00	2,500.00
0103	TOPOGRAFIA INICIAL - FINAL	gib	100	4,000.79	4,000.79
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				279,817.95
0201	HALITACION DE CAMINOS DE ACCESO	km	0.50	1,980.00	990.00
0203	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	4,915.00	56.73	278,827.95
03	PROTECCION CON ENROCADO AL VOLTEO				396,231.26
0301	HALITACION Y SELECCION DE ROCA EN CANTERA	m3	2,85120	3141	89,556.13
0302	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA	m3	2,85120	89.54	255,296.45
0303	ADECUACION DE ROCA AL VOLTEO	m3	2,85120	13.02	51,378.62
	Costo Directo				693,750.00
	Costo Indirecto (6.77%)				46,900.00
	Costo Total del Servicio				740,650.00

SON : SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES  
Dr. Ing. Jorge Luis Alvarez Daza  
JEFE REGIONAL  
UNIDAD DE GESTION REGIONAL PIURA



CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI




**Análisis de Costos Unitarios**

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	2101001	FINANCIACIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE PUERTOS EXISTENTES DEL DREN CUCURBATI, SECTOR SAN JUAN DE CUCURBATI - PUURA - PUURA - PUURA					
Subpresupuesto	001	PREPARACIÓN DE BOLSAS CON MATERIAL DE PRESTAMO Y PROTECCIÓN CONCRETO					
Partida	01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA (CON CAMA BAJA)					
Rendimiento	vía/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : vía		2,800.00	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
0301170003	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA CON CAMA BAJA	vía		1.0000	2,800.00	2,800.00	
							2,800.00
Partida	01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA (CON RODADO)					
Rendimiento	vía/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : vía		250.00	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
03012200040006	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	vía		1.0000	250.00	250.00	
							250.00
Partida	01.03	TOPOGRAFIA INICIAL - FINAL					
Rendimiento	alb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : alb		4,000.44	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
02901700010017	SERVICIO DE CONTROL TOPOGRAFICO	alb		1.0000	4,000.44	4,000.44	
							4,000.44
Partida	02.01	HALITACION DE CAMINOS DE ACCESO					
Rendimiento	hm/DIA	MO. 2.0000	EQ. 2.0000	Costo unitario directo por : hm		1,930.00	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP	hm	1.0000	4.0000	482.50	1,930.00	
							1,930.00
Partida	02.03	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 520.0000	EQ. 420.0000	Costo unitario directo por : m3		7.62	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP	hm	1.0000	0.0154	495.00	7.62	
							7.62
Sub Partida	11064	PREPARACIÓN Y SELECCIÓN DE MATERIAL EN CANTERA				Rend:	450.0000
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
05 00245	MATERIALES						
	MATERIAL DE PRESTAMO	m3		1.2000	3.20	3.84	
							3.84
49 01057	EQUIPO						
	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	HM	1.000	0.0178	495.00	8.81	
							8.81
						Costo Unitario por	
						M3 : 12.65	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES  
Dr. Ing. Jorge Luis Alvarez Deza  
Jefe Zonal  
UNIDAD DE GESTIÓN ZONAL PUURA

CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI



Sub Partida	11065	CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO				Rend:	177.7900 M3/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Equipo						
49 00625	CAMION VOLQUETE 15 M3.	HM	1.000	0.0450	315.00	14.16	
49 01057	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	HM	1.000	0.0450	495.00	22.28	
						36.46	
Costo Unitario por							
M3 :						36.46	



Partida	03.01	HABILITACION Y SELECCION DE ROCA EN CANTERA					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 260.0000	EQ. 260.0000	Costo unitario directo por: m3			31.41
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$I.	Parcial \$I.	
0207010012	ROCA HABILITADA	m3		0.6900	25.00	17.25	
	Equipos					17.25	
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP	hm	1.0000	0.0236	495.00	14.16	
						14.16	

Partida	03.02	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 156.0000	EQ. 156.0000	Costo unitario directo por: m3			89.54
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Equipos						
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP	hm	1,0000	0.0510	495.00	25.25	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	4,0000	0.2041	315.00	64.29	
						89.54	

Partida	03.03	ADECUACION DE ROCA AL VOLTEO					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 220.0000	EQ. 220.0000	Costo unitario directo por: m3			18.02
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$t.	Parcial \$t.	
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP	hm	1.0000	0.0364	495.00	18.02	
						18.02	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES  
Dr. Ing. Jorge Luis Alvarez Deza  
JEFE ZONAL  
UNIDAD DE GESTION ZONAL PIURA

**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI**



**Relación de Insumos**

**Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo**

Obra	2401001	FICHA TECNICA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS DEL DREN CURUMUY, SECTOR SAN JUAN DE CURUMUY - PIURA - PIURA - PIURA.				
Subpresupuesto	001	"REPARACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO Y PROTECCIÓN CON ENROCADO AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL DREN CURUMUY, SECTOR SAN JUAN DE CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".				
Fecha	20/04/2023					
Lugar	200101	PIURA - PIURA - PIURA				
Código	Recurso		Unida	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>MATERIALES</b>						
0207010011	MATERIAL DE PRESTAMO		m3	5.897.2300	3.20	18.871.14
0207010012	ROCA HABILITADA		m3	1.967.3280	25.00	49.183.20
02901700010017	SERVICIO DE CONTROL TOPOGRAFICO		alb	1.0000	4.000.44	4.000.44
						72,054.78
<b>EQUIPOS</b>						
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP		hm	825.4480	495.00	408.597.07
0301170003	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA CON CAMA BAJA		vie	4.0000	2.800.00	11.200.00
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3		hm	633.0100	315.00	199.398.15
03012200040006	CAMION VOLQUETE DE 15 m3		vie	10.0000	250.00	2.500.00
						621,695.22
Costo Directo					S/.	693,750.00
Costo Indirecto					S/.	46,900.00
Costo Total del Servicio					S/.	740,650.00

**Desagregado de Costos Indirectos**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (S/)	COSTO TOTAL (S/)
Control Técnico	Mes	1.00	15,000.00	15,000.00
Supervisión	Mes	2.00	10,000.00	20,000.00
Combustible y Carburantes	Glb	1.00	3,000.00	3,000.00
Viáticos por Comisión de Servicios	Glb	1.00	3,500.00	3,500.00
Pasajes y Gastos de Transporte Aéreo	Glb	1.00	3,200.00	3,200.00
Pasajes y Gastos de Transporte Terrestre	Glb	1.00	2,200.00	2,200.00
COSTO TOTAL INDIRECTO (S/)				46,900.00
El servicio de Control técnico será a todo costo.				

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES  
Dr. Ing. Jorge Luis Álvarez Deza  
JEFE ZONAL (I)  
UNIDAD DE GERENCIA ZONAL PIURA



## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI



- f) Ciclo de transporte relacionado a la movilización y desmovilización de maquinaria con cama baja de la excavadora sobre orugas y volquete (indicar cantidad transportada, peso de maquinaria, número de viajes, peso total, duración del viaje, entre otros, que indiquen el costo de la cama baja).

### CUADRO DE RENDIMIENTO DE TRANSPORTE DE ROCA

DISTANCIA DE RECORRIDO	35.00	KM
------------------------	-------	----

#### FORMULAS

$$E=V*T$$

#### DATOS

TIEMPO	MINUTOS
de Carga	7.00
de DESCARGA	2.00
de PARQUEO	2.00
de IDA	105.00
de RETORNO	60.00

VELOCIDAD	km/h
Ida	20
Retorno	35

CAPACIDAD DE CARGA	M3
VOLQUETE	15
F. Esponjamiento	1.15
V. Real Transportado	12.5
V. real + V. esponj.	14.375

Traslado Cargado	176.00	minutos
Tiempo recorrido total	2.93	hrs

Traslado_1_Día	8	hrs
RENDIMIENTO	39.20	M3/DÍA

### CUADRO DE RENDIMIENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO

DISTANCIA DE RECORRIDO	8.00	KM
------------------------	------	----

#### FORMULAS

$$E=V*T$$

#### DATOS

TIEMPO	MINUTOS
de Carga	5.00
de DESCARGA	2.00
de PARQUEO	2.00
de IDA	19.20
de RETORNO	13.71

VELOCIDAD	km/h
Ida	25
Retorno	35

CAPACIDAD DE CARGA	M3
VOLQUETE	15
F. Esponjamiento	1.15
V. Real Transportado	13.5
V. real + V. esponj.	15.525


Traslado Cargado	41.91	minutos
Tiempo recorrido total	0.70	hrs

Traslado_1_Día	8	hrs
RENDIMIENTO	177.79	M3/DÍA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

Dr. Ing. Jorge Luis Alvarez Deza  
JEFE FONAL III  
UNIDAD DE GESTION FONAL PUNTA

CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI



CUADRO DE RENDIMIENTO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA

FORMULAS

DISTANCIA DE RECORRIDO	35.00	KM
---------------------------	-------	----

$E=V*T$
---------

DATOS

TIEMPO	MINUTOS
de CARGA	20.00
de DESCARGA	30.00
de PARQUEO	5.00
de IDA	84.00
de RETORNO	70.00

VELOCIDAD	km/h
Ida	25
Retorno	30


Traslado Cargado	209.00	minutos
Tiempo recorrido total	3.48	hrs

Traslado_1_Día	8	hrs
RENDIMIENTO	2.30	CICLOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES  
Dr. Ing. Jorge Luis Alvarez Daza  
JEFE ZONAL (I)  
UNIDAD DE GESTION ZONAL PIURA



g) Cronograma de Ejecución

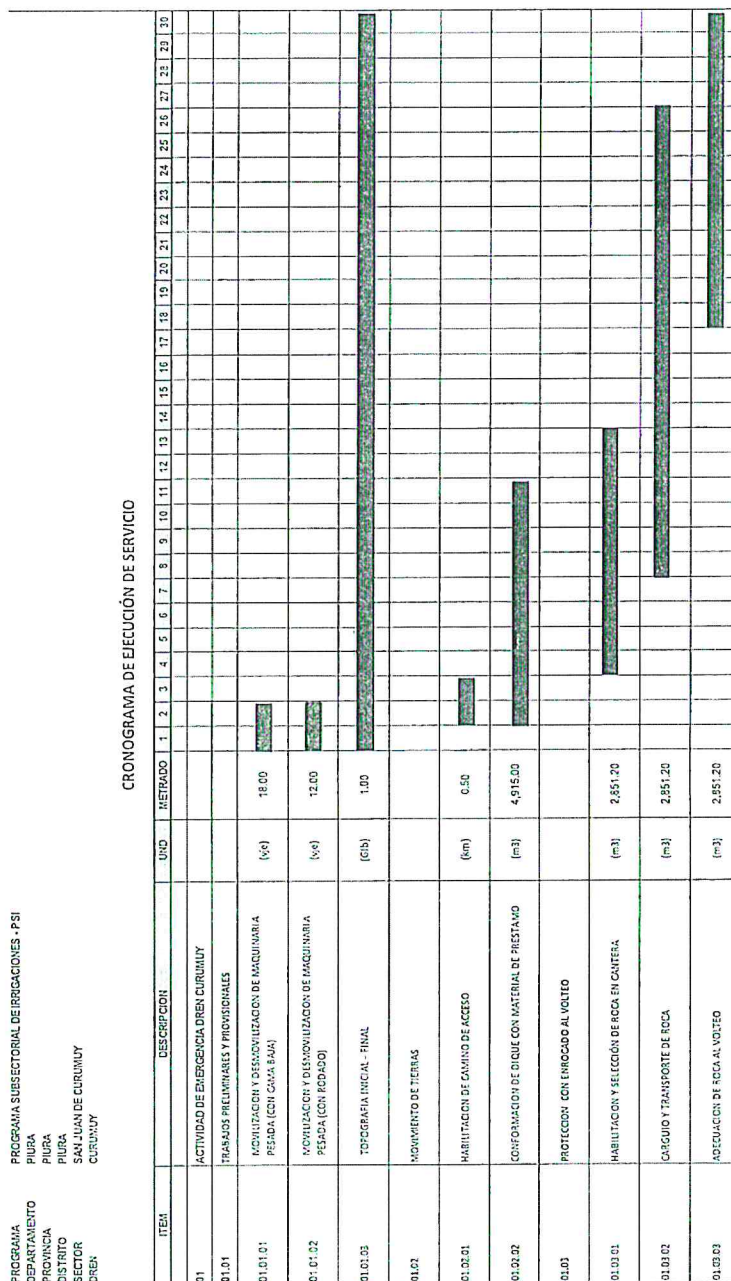

PROGRAMA  
DEPARTAMENTO  
PIURA  
PROVINCIA  
PIURA  
DISTRITO  
SAN JUAN DE CURIMUY  
SECTOR  
CURIMUY  
DREN

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES  
Dr. Ing. Jorge Luis Alvarez Deza  
21/11/2023  
UNIDAD DE GESTION LOCAL PIURA







h) Panel Fotográfico

FOTOGRAFIA N° 01



La imagen muestra la pérdida del dique y camino de vigilancia del Dren Curumuy, producto del desborde de la canal de evacuación Daniel Escobar.

FOTOGRAFIA N° 02



Perdida de Dique de encauzamiento y camino de vigilancia en el Dren Curumuy.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES  
Dr. Ing. Jorge Luis Alvarez Deza  
JEFE ZONAL (U)  
UNIDAD DE GESTION ZONAL PUNTA



FOTOGRAFIA N° 03



El desborde del Canal de Evacuación Daniel Escobar, genero la pérdida del dique de encauzamiento y camino de vigilancia del Dren Curumuy.

FOTOGRAFIA N° 04



Terrenos de cultivos afectados, producto del desborde del Canal de evacuación Daniel Escobar.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

Dr. Ing. Jorge Luis Álvarez Deza  
JEFE ZONAL  
UNIDAD DE GESTIÓN ZONAL PIURA



CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

EDAN PERÚ

INDECI

FORMULARIO EDAN PERÚ

EVALUACIÓN NRO. 1  
CÓDIGO SINPAD 164701  
TIPO DE PELIGRO LLUVIAS INTENSAS

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Fecha : 11/03/2023 1.2 Hora: 17:43  
1.3 Responsable: VERONICA CUMPA ALAYZA Dni: 02820871  
Cargo: REGISTRADOR(A)  
Institución: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PIURA

1.4 Zona Afectada:

Ubicación: PIURA / PIURA / PIURA  
Departamento / Provincia / Distrito / Localidad

1.5 Condiciones climáticas de la zona afectada para la asistencia en el momento del reporte

CIELO NUBLADO, LLUVIAS INTENSAS TEMPERATURA 28 °C APROXIMADAMENTE

1.6 Ruta de acceso sugerida para llegar a la zona afectada

Vía de transporte CARRETERA Tiempo estimado de llegada 10 MINUTOS  
Tipo de vehículo Ruta principal  
CAMIONETA CIUDAD DE PIURA  
Lugar de partida Ruta alterna  
EX BASE SECOM AV. GRAU, SANCHEZ CERRO

2.0 CARACTERÍSTICAS DEL PELIGRO DE ORIGEN NATURAL O INDUCIDO POR LA ACCIÓN HUMANA

Número	Tipo formulario	Fecha Ocurrencia	Tipo de Peligro	Ubicación
001-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / PIURA DISTRITO
003-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / PIURA DISTRITO
004-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / PIURA DISTRITO
007-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / PIURA DISTRITO
008-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / PIURA DISTRITO
009-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / AAHH SEÑOR DE LOS MILAGROS
010-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / AAHH SEÑOR DE LOS MILAGROS
012-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / AAHH TEMPLE SEMINARIO
019-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / PIURA DISTRITO
020-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / PIURA DISTRITO
023-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / PIURA DISTRITO
024-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / PIURA DISTRITO
025-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / EJIDOS DE HUAN
026-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / UPIS VILLA MIRANDA
027-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / CEREZAL
028-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / CEREZAL
029-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / CEREZAL
030-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / CEREZAL
033-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / CEREZAL



**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI**

0004

034-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / CEREZAL
036-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / EJIDOS DE HUAN
037-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / EJIDOS DE HUAN
038-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / LAGRIMAS DE CURUMUY
039-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / LAS MERCEDES
041-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / PIURA DISTRITO
042-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	22/02/2023 23:02	LLUVIAS INTENSAS	PIURA / PIURA / PIURA / AAHH LOS ALGARROBOS

**Peligros secundarios generados**

INUNDACION EN ZONAS DONDE SE ACTIVAN CUENCAS CIEGAS A NIVEL DISTRITAL, ASI MISMO SE OBSERVAN CAIDAS DE ARBOLES, CAIDA DEL FLUIDO ELECTRICO, COLAPSO DE ALCANTARILLADO, DESTRUCCION DE PISTAS, PROLIFERACION DE ENFERMEDADES EN ADULTOS, NIÑOS, MUJERES.

**Descripción del peligro de origen natural o inducido por la acción humana**

SE REGISTRAN PRECIPITACIONES DE MODERADA A FUERTE INTENSIDAD DE FORMA ESPORADICA QUE GENERAN ACUMULACION DE AGUA PLUVIAL EN ZONA DE DEPRESION DE LA CIUDAD, GENERANDO LA ACTIVACION DE CUENCAS CIEGAS

**3.0 DAÑOS A LA VIDA Y A LA SALUD DE LA PERSONA**

**3.1 Población (damnificada y afectada) con respecto al daño en las viviendas**

Localidad	Número de Familias			Número de Personas		
	Afecta.	Damnifica.	Total	Afecta.	Damnifica.	Total
PIURA / PIURA / PIURA / PIURA DISTRITO	21	0	21	68	0	68
PIURA / PIURA / PIURA / UPIS VILLA MIRANDA	3	0	3	10	0	10
PIURA / PIURA / PIURA / AAHH SEÑOR DE LOS MILAGROS	3	0	3	6	0	6
PIURA / PIURA / PIURA / LAGRIMAS DE CURUMUY	13	0	13	33	0	33
PIURA / PIURA / PIURA / LAS MERCEDES	32	0	32	92	0	92
PIURA / PIURA / PIURA / CEREZAL	27	0	27	80	0	80
PIURA / PIURA / PIURA / AAHH TEMPLE SEMINARIO	11	0	11	37	0	37
PIURA / PIURA / PIURA / AAHH LOS ALGARROBOS	54	0	54	180	0	180
PIURA / PIURA / PIURA / EJIDOS DE HUAN	132	0	132	390	0	390
Total de daños por vivienda:	296	0	296	896	0	896
Total de daños por Medios de Vida:	0	-	0	0	-	0
Total General:	296	0	296	896	0	896

**3.2 Grupos Etarios y Condición**

Condición	Menor de 1 año		1 a 4 años		5 a 9 años		10 a 14 años		15 a 17 años		18 a 49 años		50 a 59 años		Mayor de 60 años		Gestantes
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	F
AFECTA	1	0	27	27	46	31	36	40	16	28	195	223	35	60	61	70	0

**3.3 Lesionados (Heridos)**

Lugar de atención	Graves	Moderado	Leve	Con tratamiento local	Evacuación
-------------------	--------	----------	------	-----------------------	------------

**3.4 Fallecidos**


Apellidos y nombres	Edad	Sexo	Lugar de fallecimiento	Fuente
---------------------	------	------	------------------------	--------

**3.5 Desaparecidos**

Apellidos y Nombres	Edad	Sexo	Lugar / Dirección donde desapareció
---------------------	------	------	-------------------------------------

**3.6 Personal de Primera Respuesta Afectado (Salud, Bomberos, Brigadistas)**

Potencial Humano	Total personal	Daños a la salud		Desaparecido	Observaciones
		Lesionado	Fallecido		
Total	0	0	0	0	



## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI


### 4.0 DAÑOS MATERIALES

#### 4.1 A las viviendas (EN BASE AL TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES DE LA VIVIENDA)

Tipo	Destruída	Inhabitable	Afectada
ADOBE O TAPIAL	0	0	54
ESTERA	0	0	1
LADRILLO O BLOQUE DE CEMENTO	0	0	53
MADERA	0	0	17
OTRO MATERIAL	0	0	153
PIEDRA CON BARRO (PIRCA)	0	0	1
PIEDRA O SILLAR CON CAL O CEMENTO	0	0	2
QUINCHA (CAÑA CON BARRO)	0	0	15
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>

#### 4.2 A los servicios / Infraestructura de Salud de la localidad

Establecimiento de Salud (Nombre por el que se le conoce)	Condición	Funciona	¿Porque?	Observación
I-2 CASAGRANDE	AFECTADA	TOTALMENTE	EN EL AMBIENTE DE TOPICO Y UN BAÑO EXISTE FILTRACION POR HUMEDAD Y SALITRE, FILTRACION DE TECHO DE ETERENIT EN EL LUGAR DE TECHO DE AMBULANCIA, OBSTRUCCION DE CANALETAS DE EVACUACION, DETERIORO DE PINTURA, TANQUE DE AGUA SIN TAPA SE LLENA DE BASURA Y TIERRA, BOMBA DE AGUA NECESITA MANTENIMIENTO, LOS SERVICIOS HIGIENICOS NO LOGRAN EVACUAR LOS DESECHOS, MOTOR ELECTRICO NO FUNCIONA, SISTEMA ELECTRICO QUE BRINDA ENERGIA A VENTILADORES NO FUNCIONA	NINGUNA



CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

0 0003

P.S. LAGRIMAS DE CURUMUY	AFECTADA	PARCIALMENTE	<p>CAIDA DE LUNAS DE VIDRIO POR FUERTES VIENTOS( 5)</p> <p>CONTINUAN LAS FILTRACIONES CADA VEZ QUE LLUEVE, GENERANDO CHARCOS DE AGUA EN LOS CONSULTORIOS.</p> <p>POR LAS VENTANAS FILTRA AGUA EN LOS CONSULTORIOS DE ACUERDO A LA DIRECCION DE LA LLUVIA.</p> <p>CORTE DE LUZ CADA VEZ QUE LLUEVE</p> <p>LAS TUBERIAS DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS SON DE POCA PRESION PODRIAN ESTAR OBSTRUIDAS YA QUE ES AGUA DEL RIO CON LO QUE CONTAMOS.</p> <p>?FILTRACION DEL CALAMINON DE SALA DE ESPERA DEL PRIMER PISO</p> <p>?1 EQUIPO DE NEBULIZADOR QUE SE HA MALOGRADO</p> <p>?UPS (ESTABILIZADORES) MALOGRADOS</p> <p>?2 BIOMBOS</p> <p>?1 PORTA SUERO</p>	<p>SE ENVÍA FICHA A DIRECCION Y A LA OFICINA DE CEPRECED PARA MANTENIMIENTO DE SOBRETecho (CALAMINON 2DO NIVEL Y PRIMER NIVEL DE CARACTER DE URGENCIA.</p>
E/S LOS ALGARROBOS	AFECTADA	PARCIALMENTE	<p>RAJADURAS DE PAREDES</p> <p>AGRIETAMIENTO DE TECHO, COBERTURA DE TECHO DEFICIENTE, INUNDACION DE PATIOS, FALTA DE AGUA POTABLE, FALTA DE ENERGIA ELECTRICA</p>	NINGUNA
E/S RIO VIEJO	AFECTADA	PARCIALMENTE	<p>CONTINUAN LAS FILTRACIONES CADA VEZ QUE LLUEVE, GENERANDO CHARCOS DE AGUA EN LOS CONSULTORIOS.</p> <p>POR LAS VENTANAS FILTRA AGUA AL CONSULTORIO DE ENFERMERIA</p> <p>FLUIDO ELECTRICO INESTABLE, A CAUSADO QUE EL CPU DE ENFERMERIA SE MALOGRE</p> <p>BOMBA DE AGUA, TANQUE ELEVADO NO FUNCIONA POR FALTA DE MANTENIMIENTO, ADEMAS NO HAY ACTUALMENTE AGUA EN TODO EL CASERIO</p>	<p>SE ENVÍA FICHA A DIRECCION Y A LA OFICINA DE CEPRECED PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, TECHOS Y TANQUE ELEVADO DE AGUA..</p>





## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

E.S I4 SAN PEDRO	AFECTADA	TOTALMENTE	<p>FILTRACION DE AGUA EN TODOS LOS SERVICIOS DEL E.S. CADA VEZ QUE LLUEVE, PROVOCANDO QUE SE MOJEN LAS CAMILLAS, LAMPARAS. LAS PAREDES DE DRYWALL ESTA DETERORADAS, TECHOS DE CIELO RASO POR CAER, LAS ANALETAS NO ESTAN FUNCIONANDO (TIENEN FISURAS) GENERAN ACUMULACION Y DE AGUA EN EL PARTE PRINCIPAL DE ESTABLECIMIENTO, POR LAS VENTANAS FILTRAAGUA EN LOS CONSULTORIOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS. LAS TUBERIAS DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS SON DE POCA PRESION PODRIAN ESTAR OBSTRUIDAS DESAGUE COLAPSADO</p>	NINGUNA
------------------	----------	------------	--	---------

### 4.3 Daños a Instalaciones y Vehículos de Primera Respuesta

Entidad	Destru.	Inhabita.	Afectada	Vehículos	Operati.	Inopera.
---------	---------	-----------	----------	-----------	----------	----------

### 4.4 A la Infraestructura Educativa

Nombre de la Institución Educativa (II.EE.)	Total aulas	Daños (Número de Aulas)			Tipo de Nivel Educativo / Privado o Nacional
		Destru.	Inhabita.	Afectada	
1359, LA MARIPOSA	2	0	0	2	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
1356- ¿MI MUNDO DE COLORES? LOS EJIDOS DE HUAN	3	0	0	3	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
1400 ? A.H. LAS PALMERAS	2	0	0	2	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
I.E.I. N° 763, MANUEL SCORZA	3	0	0	3	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
700, URB SAN RAMON	2	0	0	2	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
487 ? LA PROVIDENCIA	2	0	0	2	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
15205, LA PALMA	4	0	2	2	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
I.E.I. N°1379-LOS ALGARROBOS V ETAPA - PIURA	3	1	1	1	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
001 MARIA CONCEPCION RAMOPS CAMPOS	6	0	0	6	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
N° 010, A.H LOS ALGARROBOS	12	0	4	8	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
084 SAN PEDRO	2	1	0	1	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
387, CONJUNTO HAB. VICUS	2	0	0	2	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
IE N°1333, VILLA PERU	2	0	0	2	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
INICIAL N° 1392, CAPULLANAS	1	0	0	1	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
1393, UPIS LOS OLIVOS	5	0	2	3	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
N°1549, A.H LOS PINOS	3	0	1	2	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
I.E 1551 LAS VEGAS	2	0	0	2	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
20147, CURUMUY LAGRIMAS	1	0	1	0	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
N°20148, SANTA SARA	3	0	0	3	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
PAUL HARRIS, URB EL CHILCAL	6	0	0	6	EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - EBE
ANN GOULDEN, AV DON BOSCO S/N	1	0	0	1	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
CEBE TRIESTE, URB BELLO HORIZONTE II ETAPA	4	0	0	4	EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - EBE
CETPRO SAN MARTIN DE PORRAS	5	0	0	5	CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - CETPRO



## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

20845, LOS ANGELES	6	0	0	6	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
I.E ROSA CARRERA DE MARTOS	33	0	33	0	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
20124, MIGUEL GRAU	2	0	0	2	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
SAN MIGUEL, AV. SAN MARTIN	35	0	0	35	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
15005, A.H 18 DE MAYO	7	0	0	7	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
14007, AV LOPEZ ALBUJAR	14	0	6	8	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
1387, DIVINO NIÑO JESUS	4	0	0	4	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
15004, BARRIO NORTE	6	0	0	6	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
1368, PROLONGACION AREQUIPA	1	0	0	1	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
NUESTA SEÑORA DE FATIMA	15	0	0	15	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
1391, A.H SUSANA HIGUSHI	1	0	0	1	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
20149, SAN JUAN DE CURUMUY	6	0	0	6	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
20197, A.H JOSE OLAYA	6	0	0	6	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
20241, LA MERCED	3	0	0	3	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
<b>Total</b>	<b>215</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>163</b>	

### 4.5 A la Infraestructura de Transporte

#### 4.5.1: Daños en carreteras, vías férreas y otros

Tipo de Vías de Comunicación	Daños (condición)		Cantidad de tramos
	Destruídos	Afectados	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.5.2: Daños en puentes, puertos y otros

Tipo de Infraestructura	Daños (cantidad)		Ubicación	Observaciones
	Destru.	Afecta.		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		


### 4.6 A la Infraestructura de Riego

#### 4.6.1 Daños en canales, defensa ribereña y otros

Tipo de Infraestructura	Daños (condición)		Cant. Tramos	Ubicación (Indicar Progresiva)
	Destru.	Afecta.		
DRENES	0	3500	1	SAN JUAN, MARGEN DERECHA RIO PIURA
DRENES	0	4000	1	LAGRIMAS DE CURUMUY
DRENES	0	3800	1	SAN FERNANDO
DRENES	0	4800	1	OLIVARES
DRENES	0	7940	1	CP6, CERO CINCO, SAN MARTIN, SAN ISIDRO
DRENES	0	2070	1	SAN MARTIN, SAN ISIDRO, SAN ISIDRO 10-4
CANALES DE RIEGO	60	60	2	SECTOR PARTIDOR KM 15 DE CANAL YUSCAY
CANALES DE RIEGO	80	60	2	KM 5.4 CARRETERA A CP4
CANALES DE RIEGO	1285	300	10	CP4, ENMANUEL, PINGOLITA Y SAN MARTIN CP3
CANALES DE RIEGO	760	980	2	C.P PINGOLITA
<b>Total</b>	<b>2.185</b>	<b>27.510</b>	<b>22</b>	

#### 4.6.2 Daños a las bocatomas, reservorios y otros

Tipo de Infraestructura	Daños (condición)		Ubicación
	Destru.	Afecta.	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

### 4.7 A los Locales Públicos

Locales Públicos	Daños (cantidad)		
	Destru.	Inhabi.	Afecta.
Total	0	0	0

### 4.8 A la Infraestructura de Servicios Básicos

Locales Públicos	Cuenta con Servicio?	Sin servicio (%)	Daños (cantidad)	
			Destruídos	Afectados
Total	0	0	-	0

### 4.9 A otros Servicios Básicos

Locales Públicos	Cuenta con Servicio?	Sin servicio (%)	Observación
Total	0	0	

## 5.0 DAÑOS A SECTORES DIVERSOS

### 5.1 A la Producción Agrícola

#### 5.1.1 Cultivos

Tipo	Daños (Has)		Lugar	Variedad de cultivo
	Perdidas	Afectadas		
Total	0	0		

#### 5.1.2 Apicultura

Tipo	Daños (unidades)		Lugar
	Perdidas	Afectadas	
Total			

#### 5.1.3 Pesca

Tipo	Perdidas	Afectadas	Lugar
Total	0	0	

### 5.2. A la Producción Pecuaria

Especie	Daños (unidades)		Lugar
	Perdidas	Afectadas	
Total	0	0	

### 5.3 Medios de Vida

Detallar comentarios a los Medios de Vida

#### 5.3.1. Total Daños por Medios de Vida

Tipo de Actividad	N° Familias Afectadas	N° Personas Afectadas
Total	0	0

## 6.0 ANÁLISIS DE NECESIDADES

### 6.1 Acciones Prioritarias:

Acción
ASISTENCIA DE TECHO TEMPORAL
ASISTENCIA ALIMENTARIA
HERRAMIENTAS
MAQUINARIA PESADA
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS
EVACUACIÓN DE DAMINIFICADOS Y AFECTADOS
EVALUADORES EDAN
EVALUACIÓN DEL RIESGO

### 6.2 Necesidades Prioritarias de Asistencia Humanitaria

#### TECHO (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------





## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

PLANCHA DE TRIPLAY (PARA PARED)	948
BOBINAS DE PLASTICO	8868
CALAMINA GALVANIZADA	1217
LISTONES DE MADERA 02? X 02? X 2.4 MTS.	18
LISTONES DE MADERA 02? X 02? X 03 MTS.	4

0 0001

### ABRIGO (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
CAMA PLEGABLE DE LONA 3/4 PLAZA	26
COLCHÓN ESPUMA DE 2 1/2 PULG. 01 PLAZA	26
MOSQUITERO 1 1/2 PLAZA	26

### ALIMENTOS (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

### UTENSILIOS (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
BIDÓN	24
BALDE	24
KID DE ASEO PERSONAL	24

### 6.3 Necesidades de Recursos Materiales y/o Equipos para Servicios Comunales

#### HERRAMIENTAS (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

#### EQUIPOS (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

#### MAQUINARIA (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

#### LETRINAS (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

#### OTROS MATERIALES (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
SACO TERRERO	17892

### 6.4 Necesidades para la Atención de Salud

#### POTENCIAL HUMANO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
-------------	----------

#### MEDICINAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
-------------	----------

#### EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
-------------	----------

### 6.5 Necesidades para la atención agropecuaria

#### INSUMOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
-------------	----------

### 7.0 COORDINACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

PERSONAL DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE PIURA CONTINUA REALIZANDO LA EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES DE LA JURISDICCION, ASI MISMO SE COORDINA CON LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL Y GRUPO DE TRABAJO PARA LAS ACCIONES PERTINENTES Y EL RESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS.

### 8.0 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES GENERALES



## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

SE REPORTA LA AFECTACION DE UN PREDIO PERTENECIENTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON SESIÓN AL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA UBICADO EN CALLE LIBERTAD 358 ESQUINA CON PLAZUELA MERINO, ZONA REGISTRAL PIURA PARTIDA 11014367, CON UN AREA DE AREA : 2 697.80 M2, REPORTADA POR LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE PIURA DEL MINISTERIO DE CULTURA.

SE BIENE REALIZANDO LAS EVALUACIONES EDAN PERU Y ENTREGANDO BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE LLUVIAS INTENSAS.

ASI MISMO SE HA SOLICITADO EL APOYO DE CISTERNAS PARA LA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES IDENTIFICADAS EN LAS CUENCAS CIEGAS DEL DISTRITO. ESTOS HAN REALIZADO INTERVENCION EN AV. JOSE AGUILAR CON AV. LAS AZUCENAS, AA.HH SEÑOR DE LOS MILAGROS, LOS OLIVOS, ASILO DE ANCIANOS, LOS ROSALES, URB. LOURDES, LOS ALGARROBOS, LOS SAUCES, EDUCADORES, LOS ALGARROBOS 4TA ETAPA, LOS ALGARROBOS (PARQUE DE PALOS), AA.HH 13 DE NOVIEMBRE.

EN PARALELO SE VIENE INTERVINIENDO CON MOTOBOMBAS EN: PLAZA TRES CULTURAS, AA.HH 6 DE SEPTIEMBRE, AA.HH SUSANA HIGUSHI, AA.HH TEMPLE SEMINARIO, LA VICTORIA, LAS PALMERAS, EJIDOS DEL NORTE, QUINTA ANA MARIA, DISTRITO EL TALLAN.

### 9.0 RECOMENDACIONES FINALES

DEBIDO A LA EMERGENCIA DE GRAN MAGNITUD POR LLUVIAS INTENSAS EN TODA LA PROVINCIA, ESTE A SOBREPASADO NUESTRA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN TODA LA PROVINCIA Y REGION, SE RECOMIENDA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NIVEL 5, A FIN DE QUE EL GOBIERNO CENTRAL Y SECTORES DISPONGA LA ATENCION OPORTUNA CON BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A LAS FAMILIAS AFECTADAS, DAMNIFICADAS, ATENCION OPORTUNA AL REESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS EN TODA LA REGION.

#### Archivos Adjuntos:

(presione ctrl + click izquierdo del mouse para abrir el archivo en otra ventana)

#### ESTADO DE EVALUACIÓN/REVISIÓN:


Instución:

Nombre, Apellidos y Firma del (la) Evaluador(a) EDAN PERÚ	Firma y Sello Jefe(a) Oficina de Defensa Civil	Firma y Sello del Gobernador(a) / Regional/Alcalde(sa)
DNI:	DNI:	DNI:



**CAPÍTULO V**  
**PROFORMA DEL CONTRATO****Importante**

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*



Conste por el presente documento, la contratación del SERVICIO DE REPARACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Y PROTECCIÓN CON ENROCADO AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL DREN CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, que celebra de una parte el PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES –PSI, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20414868216, con domicilio legal en AV. REPUBLICA DE CHILE N° 485 distrito de Jesús María, representada por el Lic. JAVIER DOROTEO ALCANTARA PASCO, identificado con DNI N° 18182401, y en su calidad de jefe de la Unidad de Administración, designado mediante Resolución Directoral N° 021-2023 MIDAGRI-DVDAFIR/PSI, de fecha 30 de Enero del 2023, en virtud de la Delegación establecida en el literal i) del artículo 3 de la presente Resolución, y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [...], el comité de selección adjudicó la buena pro del **CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023 MIDAGRI-PSI** para la contratación del CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Y PROTECCIÓN CON ENROCADO AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL DREN CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto, CONTRATAR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Y PROTECCIÓN CON ENROCADO AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL DREN CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>9</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

<sup>9</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de hasta 60 DIAS CALENDARIOS, el mismo que se computa desde el día siguiente de suscrita el Acta de inicio de actividades.

### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases del procedimiento de selección Contratación Directa N° 021-2023 MIDAGRI-PSI, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

#### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:*

*"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."*

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.





**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI****Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:*

- *"De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."*

**Importante**

*En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

*"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.*

*EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.*

*LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista."*

**CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,



## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **Importante**

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

### **OTRAS PENALIDADES:**





CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

PENALIDADES				
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Unidad	Forma de Cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	Por cada día de ausencia del personal.	0.50 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
2	En caso el responsable de la Dirección Técnica no se encuentre presente en el lugar de la prestación de la actividad, excepto en Caso Fortuito o Fuerza Mayor, debidamente acreditado.	Por ocurrencia	0.15 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
4	Cuando el Contratista no cumple en presentar el Informe Final correspondiente, dentro del plazo señalado	Por cada día de incumplimiento	0.20 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
5	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Por cada ocurrencia	0.50 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
6	Por no presentar el Plan de Trabajo con el calendario de avance al Control Técnico en el plazo establecido.	Por cada día de incumplimiento	0.10 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
7	Por no iniciar los trabajos materia de la prestación dentro del plazo establecido, luego de suscrita el Acta de Inicio del Servicio.	Por cada día de atraso	0.30 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
8	No cumple con proveer la maquinaria ofrecida o en las condiciones ofrecidas, según el cronograma de su oferta o Plan de Trabajo, que esta última no se encuentre 100% operativa.	Por ocurrencia en el incumplimiento y por cada maquinaria	0.3 UIT	Según informe del Control Técnico o Inspector o Monitor o Ingeniero de Seguimiento

## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>10</sup>**

<sup>10</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).



## CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será resuelto a través de por un Tribunal Arbitral<sup>11</sup> conformado por tres (3) árbitros, proponiéndose a los efectos las siguientes instituciones arbitrales<sup>3</sup> y respetándose el orden de prelación que se establece a continuación:

1. Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
2. Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Lima.

### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
"LA ENTIDAD"

\_\_\_\_\_  
"EL CONTRATISTA"

<sup>11</sup> Podrá establecerse también que la controversia sea resuelta por un Árbitro Único, para ello deberá tenerse en consideración el objeto del contrato (bienes o servicios), la complejidad o especialidad del bien o servicio materia de contrato, así como el monto contractual, entre otros.



CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>12</sup>.*



<sup>12</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:  
<https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

ANEXOS



CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  
CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023 MIDAGRI-PSI  
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>13</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios<sup>14</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>13</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

<sup>14</sup> Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.



**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI**

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**  
**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023 MIDAGRI-PSI**  
Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>15</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>16</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>17</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.

<sup>15</sup> En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>16</sup> Ibidem.

<sup>17</sup> Ibidem.

### CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios<sup>18</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

#### Importante

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*



<sup>18</sup> Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.


**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI**

**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores  
**ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  
CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023 MIDAGRI-PSI**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- 
- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
  - ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
  - iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
  - iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
  - v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
  - vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
  - vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*



**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI**

**ANEXO N° 3**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**

Señores  
**ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**  
**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023 MIDAGRI-PSI**  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CANAL PABUR, DISTRITO LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*

**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI**

---

**ANEXO N° 4**


**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

Señores  
**ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**  
**CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023 MIDAGRI-PSI**  
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**



CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  
CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023 MIDAGRI-PSI  
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al **CONTRATACION DIRECTA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]<sup>19</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]<sup>20</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>20</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>21</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Consortiado 1  
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....  
Consortiado 2  
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*



CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores  
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  
CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023 MIDAGRI-PSI  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TOTAL			

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

**Importante**

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI-PSI

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  
CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023 MIDAGRI-PSI  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>22</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>23</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>24</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>25</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>26</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>27</sup>
1										
2										

<sup>22</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>23</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho período.

<sup>24</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>25</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>26</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>27</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.





PROGRAMA  
SUBSECTORIAL  
DE IRRIGACIONES



CONTRATACION DIRECTA N° 021-2023-MIDAGRI PSI

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP 22	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO 23	EXPERIENCIA PROVENIENTE 24 DE:	MONEDA	IMPORTE 25	TIPO DE CAMBIO VENTA 26	MONTO FACTURADO ACUMULADO 27
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

---
