


BASES CONTRATACION DIRECTA






BASES

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI -PSI

**CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
“LIMPIEZA DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE
DIQUES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ZAÑA,
SECTOR RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE ZAÑA,
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”**



SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

**CAPÍTULO I
GENERALIDADES**

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

2.

Nombre : PROGRAMA DE SUBSECTORIAL DE IRRIGACION

RUC N° : 20414868216

Domicilio legal : Av. República de Chile N° 485 Urb. Santa Beatriz Jesús María -
Lima

Teléfono: : 01-424-4488

Correo electrónico: : Log.especialista14@psi.gob.pe

2.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del LIMPIEZA DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ZAÑA, SECTOR RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

2.2. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante el FORMATO 2 AE-35-2023 CD 14 de fecha 14 de julio 2023

2.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

2.4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

2.5. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO


NO APLICA

2.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de hasta 20 DIAS CALENDARIOS. en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.




CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

2.8. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.
- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2023.
- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado
- Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 30225.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Resolución Ministerial N° 098-2023-MIDAGRI, de fecha 09 de marzo del 2023, se aprueba los "lineamientos básicos que regula las actividades de emergencia referidas a la limpieza y descolmatación de cauces, defensa ribereñas, sistema de drenaje y canales de riego del Programa Presupuestal N° 068".

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos¹, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE² y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)
- e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (**Anexo N° 4**)³

¹ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

² Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

³ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)

- g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

- h) Deberá de presentar la experiencia del postor en la especialidad
Anexo N° 8

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o **RETENCIÓN POR EL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA** de acuerdo al artículo 9° del DECRETO LEGISLATIVO N°1553-2023.
- b) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de ser el caso. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- d) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁴ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- e) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- f) Correo electrónico para efectos de notificación durante la ejecución del servicio.
- g) Estructura de costos⁵.

Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes

⁴ Para mayor información de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁵ Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta.

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

- En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
- En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya⁶.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto de acuerdo al artículo 100⁹ y dentro del plazo de regularización, debe presentar la documentación requerida a través de mesa de partes virtual <http://tramitedigital.psi.gob.pe/mpv/>, y/o mesa de partes del programa Subsectorial de Irrigaciones (para entrega de carta fianza), en el horario de 8:30 a 16:00 horas, en Av. República de Chile N° 485 Urb. Santa Beatriz Jesús María.

2.5. ADELANTOS⁷

"La Entidad otorgará adelanto directo hasta por el 30 % del monto del contrato original.

⁶ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

⁷ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento.

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 DIAS calendarios contados a partir de la suscripción, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos⁸ mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 7 días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista".

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pago UNICO

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe final aprobado por la Entidad.
- Estructura de costos por Precios Unitarios Ofertados.
- Cronograma de ejecución y Utilización de Maquinaria según el siguiente detalle:

Marca	Modelo	Serie	Potencia	Placa (de corresponder)

- Informe descriptivo de las actividades ejecutadas firmadas por el Contratista y el ingeniero de Control Técnico o personal encargado por la UGIRD.
- Fotografía del BM monumentado.
- Panel fotográfico, georeferenciado, del periodo ejecutado, cada una con su descripción (indicando progresivas).
- Planilla de metrados finales ejecutados y planos finales de sustento (considerar cuadro de volúmenes por progresivas).
- Copia de cuaderno de control.
- Comprobante de Pago.
- Código de cuenta Interbancario.

Para efecto de los pagos, esto se efectuará previa opinión favorable de conformidad del Ingeniero de Control Técnico o personal encargado por la UGIRD.

Dicha documentación se debe presentar por mesa de partes virtual <http://tramitedigital.psi.gob.pe/mpv/>, y/o mesa de partes del programa Subsectorial de Irrigaciones, en el horario de 8:30 horas a 17:30 horas, en Av. República de Chile N° 485 Urb. Santa Beatriz Jesús María.


⁸ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

TERMINOS DE REFERENCIA






ACTIVIDADES DE EMERGENCIA MIDAGRI

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:

"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE EN LA MARGEN
DERECHA DEL RIO ZAÑA, SECTOR RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE ZAÑA,
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"



Lima, mayo del 2023

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

1. DENOMINACION DEL SERVICIO

Contratación del servicio de: "LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ZAÑA, SECTOR RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

2. FINALIDAD PÚBLICA

Ejecutar acciones inmediatas y necesarias en respuesta de las intensas precipitaciones pluviales ocurridas en el departamento de Lambayeque, en salvaguardia de la vida, salud e integridad de las personas y el patrimonio público y privado.

3. ANTECEDENTES

- a) Mediante Ley N° 28675 se crea el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, como Unidad Ejecutora 006, encargándose de desarrollar las actividades del Programa de Riego Tecnificado, así como aquellas que venía ejecutando la Unidad Ejecutora UCPSI en el marco de los compromisos asumidos con organismos internacionales concertados y en proceso, además de las actividades que se le encargue al Sector en materia de riego.
- b) El Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, es un organismo descentralizado del sector agricultura, que tiene por objetivo principal promover el desarrollo sostenible de los sistemas de riego en la costa y sierra, el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, el desarrollo de capacidades de gestión, así como la difusión del uso de tecnologías modernas de riego, para contribuir con el incremento de la producción y productividad agrícola, que permitirá mejorar la rentabilidad del agro y elevar los estándares de vida de los agricultores, el accionar del PSI está orientado a impulsar el crecimiento técnico y económico de la agricultura a nivel nacional, modernizando el uso eficiente del agua por parte de los agricultores.
- c) Dentro de los objetivos del PSI está, contribuir al incremento de la producción y la productividad de la agricultura de riego mediante acciones que permitan el desarrollo de la capacidad y gestión de las Juntas de Usuarios, el mejoramiento en aprovechamiento de los recursos hídricos y el incremento de la eficiencia en el uso del suelo cultivable.
- d) La temporada de lluvias en el territorio nacional, en muchos casos, ha venido generando daños de magnitud, habiéndose registrado en los últimos 10 años en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y la Rehabilitación (SINPAD), un número importante de emergencias generadas por dicho fenómeno, asociadas principalmente a desbordes de ríos que ocasionan inundaciones, deslizamientos de laderas, activación de quebradas (huaicos), así como aluviones, entre otros.
- e) Mediante Resolución Ministerial N° 0098-2023-MIDAGRI, de fecha 29 de marzo 2023, se aprueba los lineamientos de Alcance Sectorial LI N° 003-2023-MIDAGRI/SG-ODNGRD "Lineamientos Básicos que regulan las actividades de emergencia referidas a la limpieza y descolmatación de cauces, defensas ribereñas, sistemas de drenaje y canales de riego del Programa Presupuestal N° 0068" Derogar los "Lineamientos básicos que establecen el procedimiento de elaboración, ejecución, monitoreo y seguimiento del desarrollo de Actividades de Emergencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, referido a acciones comunes - Producto N° 8: Actividad 4 - 5006144 "Atención de actividades de emergencia" del Programa Presupuestal N° 0068" aprobados mediante Resolución Ministerial N° 0261-2021-MIDAGRI.



CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

- f) Según consta en el **Decreto Supremo N.° 029-2023-PCM**, Oficio N.° D000145-2023-INDECI-JEF INDECI, de fecha 1 de marzo de 2023, el Jefe del INDECI remite y hace suyo el Informe Situacional N.° D000004-2023-INDECI-DIRES, de fecha 1 de marzo de 2023, emitido por el Director de Respuesta de dicha entidad, en el cual se señala que, en base al sustento emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI y por la Sub Dirección de Sistematización de Información sobre Escenarios de Riesgo de Desastres - SD SIERD de la Dirección de Preparación del INDECI, se ha determinado que varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, son los más expuestos al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.
- g) Según consta en el **Decreto Supremo N.° 043-2023-PCM**, Oficio N.° D000218-2023-INDECI-JEF INDECI, de fecha 1 de marzo de 2023, el Jefe del INDECI remite y hace suyo el Informe Situacional N.° D000004-2023-INDECI-DIRES, de fecha 1 de marzo de 2023, emitido por el Director de Respuesta de dicha entidad, en el cual se señala que, en base al sustento emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI y por la Sub Dirección de Sistematización de Información sobre Escenarios de Riesgo de Desastres - SD SIERD de la Dirección de Preparación del INDECI, se ha determinado que varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, son los más expuestos al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales; asimismo, autorizar la continuación de las acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación iniciadas en el marco del Decreto Supremo N° 029-2023-PCM y el Decreto Supremo N° 034-2023-PCM.
- h) Mediante OFICIO Nro. 00316-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI, de fecha 13 de abril del 2023, se solicita la atención por desastre y ejecución de 19 actividades de emergencias.
- i) Mediante Memorando N° 324-2023-MIDAGRI-SG/ODNGRD, de fecha 19 de abril del 2023, se emite la opinión favorable para que el Programa Subsectorial de Irrigaciones continúe con la gestión de financiamiento.
- j) Mediante Oficio N°00092-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UPPPS, fecha 21 de abril 2023, se solicita la aprobación de la Nota de Modificación N°082-2023 del SIAF en línea, con la propuesta de Nota de Modificación Presupuestal N°062-2023, que corresponde a actividades que serán ejecutadas.
- k) Decreto Supremo N° 059-2023-PCM, con fecha 10 de mayo, que declara el Estado de Emergencia en varios Distritos de algunas Provincias de los Departamentos de Ancash, Cajamarca, La Libertad y Lima, por impactos de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales.


4. MARCO LEGAL

La ejecución del servicio deberá realizarse de acuerdo a los dispositivos legales y Normas Técnicas Vigentes que se indican a continuación, las cuales no son limitativas, siendo que es aplicable toda norma pertinente adicional:

- Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Política de Estado 32 Gestión del Riesgo de Desastres, Aprobado con acuerdo Nacional.
- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre-SINAGERD y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N°048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el reglamento de la Ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (SINAGERD).

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

- Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que dispone la aprobación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como Política de Obligatorio cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional.
- Resolución Ministerial N°046-2013-PCM, que aprueba la Directiva N°001-2013-PCM-SINAGERD "Lineamientos que definen el Marco de Responsabilidades en Gestión de Riesgo de Desastres, de las Entidades del Estado en los Tres niveles de Gobierno" y su anexo en el marco de la Ley N° 29564 y su Reglamento.
- Decreto Supremo N°034-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres- (PLANAGERD)
- Resolución Ministerial N°0602-2016-MIDAGRI, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual Actualizado-PESEM 2015-2021 (diciembre 2016).
- Ley N° 31075, Ley que aprueba la Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
- Ley de Procedimiento N°27444, Ley que aprueba el Procedimiento Administrativo en General.
- Ley de Presupuesto del Sector Público del Año 2023.
- Decreto de Urgencia N°024-2010, Decreto de Urgencia que dicta Medidas Económicas y Financieras para la creación del Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención a Emergencias por Desastres en el Marco del Presupuestos por Resultados.
- Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público.
- Decreto Supremo N°132-2017-EF, Decreto Supremo que aprueba la conformación y funciones de la Comisión Multisectorial del "Fondo para Intervención ante Ocurrencias de Desastres Naturales", dicta Normas Reglamentarias.
- Resolución Ministerial N°0054-2019-MINAGRI, que aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022 del Ministerio de Agricultura y Riego.
- Resolución Ministerial N°0440-2019-MINAGRI, que aprueba el "Plan de Contingencias del Sector de Agricultura y Riego Ante Lluvias Intensas".
- Resolución Ministerial N°003-2020-MINAGRI, que actualiza la constitución del grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres del Ministerio de Agricultura y Riego-GTGRD-MINAGRI.
- Resolución Ministerial N° 194-2020-MINAGRI, que aprueba el "Plan de Contingencias del Sector de Agricultura y Riego, ante el sismo de gran magnitud y seguido de Tsunami frente a la Costa Central del Perú".
- Mediante Resolución Ministerial N° 0096-2023-MIDAGRI, de fecha 29 de marzo 2023, se aprueba los lineamientos de Alcance Sectorial LI N° 003-2023-MIDAGRI/SG-ODNGRD "Lineamientos Básicos que regulan las actividades de emergencia referidas a la limpieza y descolmatación de cauces, defensas ribereñas, sistemas de drenaje y canales de riego del Programa Presupuestal N° 0068"
- Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Decreto Supremo N° 029-2023- PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.
- Decreto Supremo N° 043-2023- PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional, por desastre de gran magnitud, a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, asimismo, autorizar la continuación de las acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación iniciadas en el marco del Decreto Supremo N° 029-2023-PCM y el Decreto Supremo N° 034-2023-PCM.



[Handwritten signature]

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

5. OBJETIVO DEL SERVICIO

El objetivo es la contratación del Servicio denominado "LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO ZAÑA, SECTOR RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

6. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Considerando que el Anexo No. 2, de Contenidos Mínimos del Informe para actividades de Emergencia de Atención Inmediata – MIDAGRI, establece las metas del servicio (Puntos Críticos), habiéndose determinado la cantidad de horas máquina, la cantidad de material descolmado, la cantidad de material necesario para la conformación de dique, la cantidad de metros cúbicos de roca requeridos.

Las actividades que se han contemplado en el presente servicio son las siguientes:

1. Limpieza y descolmación de cauce	430.00 m – 12,900.00 m ³
2. Conformación de dique con material propio	430.00 m – 10,535.00 m ³

6.1 EJECUCION DELSERVICIO

6.1.1 Plazo de ejecución del servicio

El inicio del cómputo del plazo de ejecución del servicio se rige desde el día siguiente de la firma del "Acta de Inicio del Servicio" hasta los 30 días calendarios (El Acta de Inicio del Servicio lo firma el contratista y Encargado de la UGIRD como parte de la Entidad).

La firma del "Acta de Inicio de Servicio" se realizará el día de la notificación de la adjudicación.

6.1.2 Plan de Trabajo con Cronograma de Ejecución del servicio

El contratista dentro de los tres (03) días posteriores a la suscripción del Acta de Inicio del Servicio remitirá el "Plan de Trabajo", al Control Técnico, el cual, previa revisión y aprobación remitirá, en un plazo de dos (02) días calendarios, a la Entidad el mencionado "Plan de Trabajo y cronograma de utilización de maquinaria" mediante, Mesa de Partes Virtual o físico el cual debe de contener como mínimo lo siguiente.

- Cronograma de Ejecución de maquinaria.
- Cronograma de Utilización de maquinaria, según el siguiente detalle:

Marca	Modelo	Serie	Potencia	Placa (de corresponder)

- Informe Topográfico (con planos Iniciales), según el siguiente detalle:
 - Memoria descriptiva
 - Video de reconocimiento de campo (10 minutos mínimos)
 - Planos de ubicación general
 - Planos de Planta.
 - Planos de Perfil longitudinal (incluir el cuadro de volúmenes de movimiento de tierras y enrocado).
 - Planos de secciones transversales
 - Plano de Ubicación de canteras de roca

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

- Plano de Ubicación de botaderos (de corresponder)

Versión digital y editable de la nube de puntos obtenido del levantamiento topográfico inicial

Los planos Iniciales proporcionados por el contratista deberán de ser presentados con el mayor detalle posible, debido a que estos serán de utilidad para el control de los trabajos ejecutados en campo; en el Cronograma de Ejecución se debe de visualizar la secuencia de las actividades a ejecutar, en el Cronograma de Ejecución debe de contemplar estrictamente el plazo de ejecución fijado en la propuesta y el contrato.

La Contratista deberá efectuar un levantamiento topográfico inicial que abarque como mínimo toda el área a intervenir establecida en la (Anexo No. 2 Actividades de Emergencia de Atención Inmediata en el marco de la Resolución Ministerial N°0261-2021-MIDAGRI), que permitan identificar el estado antes de la intervención, lo cual está contemplado dentro de su plazo contractual. Una vez culminada la actividad, el contratista deberá realizar el levantamiento Topográfico Final, en el cual, deberá de indicar a detalle todos los trabajos ejecutados, debido a que estos serán los que determinen los metros finales ejecutados.

El Levantamiento Topográfico antes indicado deberá efectuarse bajo la estricta supervisión del ingeniero de Control Técnico o en coordinación con el Personal encargado por la UGIRD, el cual bajo responsabilidad deberá garantizar la calidad e idoneidad del referido levantamiento topográfico.

La contratista deberá garantizar en campo la existencia permanente (hasta la culminación de la relación contractual) de **por lo menos 1 BMs monumentado** a lo largo de toda la longitud a intervenir, los BMs antes indicados deberán ser fijos, evitando la probabilidad de que por motivos de la ejecución de la prestación sean alterados, modificados o eliminados, pudiendo monumentar alternativamente en la roca fija o en infraestructura existente permanente, la ubicación de los BMs será determinada por el Control Técnico.


6.1.3 De la Ejecución del Servicio.

La contratista deberá **iniciar los trabajos al día siguiente de suscrita el Acta de Inicio del Servicio**.

El servicio se ejecutará a través de actividades que se encuentran en la (Anexo No. 2 de las Actividades de Emergencia de Atención Inmediata en el marco de la Resolución Ministerial N° 098-2023-MIDAGRI), estas serán realizadas en base al "Plan de Trabajo, cronogramas de ejecución y utilización de maquinaria" aprobados por el control técnico o personal encargado por la UGIRD, con los montos establecidos para su ejecución y utilización de maquinaria.

El contratista se encuentra obliga a:

- Ejecutar los trabajos en concordancia la Anexo No. 2 de las Actividades de Emergencia de Atención Inmediata en el marco de la Resolución Ministerial N° 098-2023-MIDAGRI, y Plan de Trabajo aprobado por el Control Técnico o personal encargado por la UGIRD, en estricta sujeción al cronograma de ejecución y utilización de maquinaria.
- Todas las actividades deberán ser ejecutadas de acuerdo a la Normatividad Nacional Aplicable.
- Es responsabilidad del contratista disponer (según el cronograma de utilización de maquinaria) de los equipos mínimos necesarios



CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

permanentemente para ejecutar las actividades que correspondan con la finalidad de cumplir lo establecido en los TDR y "Plan de Trabajo" aprobado por el control técnico o Control Técnico Encargado por la UGIRD.

Los trabajos deberán de ejecutarse empleándose maquinaria de acuerdo a las características indicadas en el presente TDR (numeral A.3. *equipamiento*), o con maquinaria distinta (sustentada en el plan de trabajo aprobado por el control técnico o personal encargado por la UGIRD), bajo cuenta y riesgo del contratista en relación a los rendimientos y plazos de ejecución; del mismo modo el contratista deberá garantizar la cantidad mínima de maquinaria requerida según el presente TDR, para la ejecución y culminación de los trabajos en el plazo de ejecución previsto.

El material de corte producto de la actividad de Descolmatación y/o perfilado será empleado en la conformación y o rehabilitación de diques de protección, conforme al detalle de la sección típica de la conformación de dique.

El desarrollo de las actividades materia de la presente contratación podrá realizarse en doble turno, a fin de culminar las actividades contratadas dentro de los plazos establecidos, para lo cual el contratista deberá considerar la logística y los equipos necesaria para tal fin.

6.1.4 Metrado a Ejecutar.

HOJA DE METRADOS

ITEM	DESCRIPCION	UNID	TOTAL
01.03.00	TRABAJO PRELIMINARES Y PROVISIONALES		
01.01.00	Movilización y desmovilización de maquinaria con cama baja	VIE	3.00
01.02.00	Movilización y desmovilización de maquinaria con rodados	VIE	6.00
01.03.00	Servicio de control topográfico	GAL	1.00
02.03.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.00	Habilitación de vías de acceso	KM	1.50
02.02.00	Limpieza y descolmatación de cauce	M3	12,900.00
02.03.00	Conformación de dique con material propio	M3	10,535.00
03.03.00	TRABAJO DE REFORZAMIENTO DE DIQUE		
03.01.00	Preparación y selección de roca en canchales	M3	1,730.75
03.02.00	Carga y transporte de roca a la zona de trabajo	M3	1,730.75
03.03.00	Acomodo de roca para protección de dique	M3	1,730.75

Fuente: "Anexo No. 2", de contenido Mínimo de la Actividad de Emergencia.

6.1.5 Formas de Pago

La forma de pago por la ejecución del servicio realizado por la Contratista será en pago único, para lo cual, la Entidad requerirá de la siguiente documentación:

- Informe final aprobado por la Entidad.
- Estructura de costos por Precios Unitarios Ofertados.
- Cronograma de ejecución y Utilización de Maquinaria según el siguiente detalle:

Marca	Modelo	Serie	Potencia	Placa (de corresponder)

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

- Informe descriptivo de las actividades ejecutadas firmadas por el Contratista y el ingeniero de Control Técnico o personal encargado por la UGIRD.
- Fotografía del BM monumentado.
- Panel fotográfico, georeferenciado, del periodo ejecutado, cada una con su descripción (indicando progresivas).
- Planilla de metrados finales ejecutados y planos finales de sustento (considerar cuadro de volúmenes por progresivas).
- Copia de cuaderno de control.
- Comprobante de Pago.
- Código de cuenta Interbancario.

Para efecto de los pagos, esto se efectuará previa opinión favorable de conformidad del Ingeniero de Control Técnico o personal encargado por la UGIRD.

La Entidad debe de pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el Contrato.

No se reconocerán bajo ninguna circunstancia mayores prestaciones ejecutadas sin tener en cuenta el párrafo anterior.

6.1.6 Adelantos

Se establece un adelanto directo de 30% del monto del contrato original para lo cual el contratista tiene un plazo de 8 días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato, para solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía (entiéndase carta fianza emitida por la empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la SBS, y deben estar autorizadas para la emisión de dicha garantía) y el comprobante de pago correspondiente.

Vencido dicho plazo no procede la solicitud del adelanto. La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los 7 días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.


6.1.7 Cuaderno de Control

Tanto la contratista a través del Director Técnico, como el ingeniero de Control Técnico o personal encargado por la UGIRD, están obligados a llenar todos los días un Cuaderno de Control, en el que se anotara todas las ocurrencias relevantes del día, indicando además el personal técnico clave presente, así como la relación de la maquinaria utilizada, debiendo indicar marca, modelo y estado del mismo, avance diario ejecutado de las partidas y su respectivo acumulado.

En cuanto al personal, el contratista deberá mantener el personal ofertado y acreditado cumpliendo todas las normas de seguridad. Solo después de iniciada la actividad, podrá solicitar el cambio de personal clave, el cual deberá de ser evaluado de acuerdo al perfil indicado, pudiendo este ser igual o mayor al perfil solicitado.

La omisión de la anotación diaria por parte de la contratista será considerada como falta ausencia del personal técnico lo que será considerado para la aplicación de penalidades que corresponda.

6.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS A CONSIDERAR:



CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

Los trabajos a ejecutarse serán de conformidad con lo establecido en el "Anexo N° 02" Formato con carácter de Declaración jurada que sustenta la actividad de Emergencia en el marco de la Resolución Ministerial N° 0098-2023-MIDAGRI, debiendo considerar las siguientes especificaciones cuando correspondan.

6.2.1 ALCANCES DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Los presentes Términos de Referencia, conjuntamente con el Contrato, el Anexo No. 2 de Contenido Mínimo del Actividades de Emergencia de Atención Inmediata y la oferta de la contratista, tienen como objeto normar las condiciones generales de intervención a ser aplicadas por el CONTRATISTA en la ejecución del servicio.

El CONTRATISTA suministrará todos los elementos necesarios para la ejecución del servicio tales como; herramientas, maquinarias, equipos, mano de obra, seguros, dirección técnica y todo lo necesario para la realización del servicio, así como el mantenimiento durante el desarrollo de las actividades, desmontaje y remoción de las construcciones provisionales. Detalles de la actividad y materiales no mostrados en la el Anexo No. 2 de Contenido Mínimo del Actividades de Emergencia de Atención Inmediata y en los presentes Términos de Referencia, pero necesarios para la ejecución o instalaciones deberán ser incluidos en los trabajos del CONTRATISTA.

Más allá de lo establecido en estos TDR, el Control Técnico, tiene autoridad suficiente para ampliar las especificaciones técnicas, en cumplimiento de la Normativa Vigente, en lo que respecta a la ingeniería y la correcta metodología constructiva a seguir en la ejecución de la actividad.

Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá presentar al Control Técnico, el Calendario que visualice la secuencia de las actividades a ejecutar.

6.2.2 NORMAS TECNICAS

La ejecución de las actividades del servicio, se efectuará cumpliendo con los presentes Términos de Referencia que resultan obligatorios a la materialización del servicio. Si en determinadas cuestiones surgieran dudas respecto a la aplicación de Normas, la decisión del Control Técnico es la única determinante y válida.

6.2.3 RECTIFICACION Y COMPLEMENTO DE ESPECIFICACIONES

El Control Técnico, previa autorización y pleno conocimiento de la Entidad contratante y en acuerdo con el CONTRATISTA, tendrá la facultad durante el curso de la ejecución de las actividades de modificar, complementar o adaptar a situaciones reales las presentes especificaciones técnicas para la ejecución de las partidas, a fin de asegurar una adecuada ejecución de los trabajos de acuerdo a lo previsto en el Anexo No. 2, sin desnaturalizar el objetivo y metas del mencionado Anexo.

6.2.4 ESTRUCTURAS Y SERVICIOS EXISTENTES

El CONTRATISTA previamente al inicio de los trabajos, determinará con exactitud las estructuras y servicios existentes en la zona de trabajo, en coordinación con las entidades correspondientes, responsabilizándose por los daños que ocasione a éstas.



CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

También será responsable de la conservación del buen estado de las estructuras y servicios existentes, no indicados en los planos y/o croquis.

6.2.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS.

6.2.5.1 Movilización y desmovilización de maquinaria con cama baja

Esta partida consiste en el traslado del equipo mecánico al lugar en la cual se desarrollará la actividad de emergencia, la movilización de maquinaria pesada con Cama baja incluye la obtención y pago de permisos y seguros.

La movilización y desmovilización de la maquinaria pesada, y desplazamientos largos se deberá realizar con el uso de cama baja o plataforma.

El contratista se encuentra en la obligación de someter a una inspección técnica a toda la maquinaria que será transportada a la zona en la cual se ejecutará el servicio, garantizando de esta manera su operatividad para el desarrollo de sus actividades.

La movilización se efectuará considerando en el caso de equipo pesado, el peso de la unidad a transportarse y la medición se realizará por viaje de maquinaria efectuada.

6.2.5.2 Movilización y desmovilización de maquinaria con rodado

Esta partida consiste en el traslado del equipo mecánico autopropulsado por sus propios medios al lugar en la cual se desarrollará la actividad de emergencia, la movilización de este tipo de maquinaria incluye la obtención y pago de permisos y seguros.

El contratista se encuentra en la obligación de someter a una inspección técnica a toda la maquinaria que será transportada por sus propios medios a la zona en la cual se ejecutará el servicio.


La medición de esta partida se realizará por viaje de maquinaria efectuada.

6.2.5.3 Servicio de Control Topográfico

Comprende el suministro de mano de obra y equipos (según el numeral A.3 Equipamiento de los TDR), para realizar los trabajos de control de la actividad a ejecutar: rasante, progresivas, BM's, alineaciones, cota de los trabajos de perfilado, en la longitud de los trabajos de roca acomodada en la margen correspondiente donde se ejecutará la actividad.

El control topográfico será realizado de forma permanente durante toda la ejecución de la prestación, y en coordinación con el personal encargado del equipo de maquinaria pesada a fin de evitar interferir en la operación y producción de la maquinaria. Es decir, de ser necesario, el equipo encargado del control topográfico deberá adecuarse al cronograma de ejecución y utilización de maquinaria.

El equipo topográfico mínimo para utilizar deberá ser: 01 estación total, GPS diferencial, 01 Nivel, 01 Mira Plegable de 4 m, Winchas de 5.00, 25.00, 50.00 y 100 m, jalones y libreta de campo, pudiéndose usar alternativamente Dron, debiendo garantizar la precisión deseada.



CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

Luego de culminado la ejecución del servicio el personal encargado de esta actividad entregará al encargado de la Dirección Técnica del servicio, la planilla de movimiento de tierras real ejecutado con su respectivo plano de secciones transversales conforme a la actividad (contemplando en formato digital y editable la nube de puntos editable), el mismo que deberá ser contrastado con los metrados proporcionados en el "Anexo No. 2" de Actividades de Emergencia de Atención Inmediata. Cualquier modificación, deberá comunicarse previamente al Ingeniero de Control Técnico, con la finalidad de coordinar el criterio técnico y obtener la autorización respectiva por la UGIRD..

- Extensión del Trabajo. - Comprende los trabajos topográficos de trazo, nivelación y replanteo de obras tanto para dar inicio a los trabajos, así como durante los trabajos que se desarrollen y dar sustento a la Planilla de Metrados.
- Medición. - Se medirá en forma Global.

6.2.5.4 Habilitación de vías de Accesos.

- Alcance del Trabajo. - Este trabajo comprenderá el suministro de materiales, equipos, y operaciones necesarias para la habilitación de caminos y/o carretera, para facilitar el acceso de la maquinaria a la zona de trabajo y/o cantera.

La habilitación y mantenimiento de caminos de acceso permitirá reducir los tiempos de recorrido de la maquinaria de transporte y la conservación de los mismos, evitando mayores costos de reparación y reduciendo el tiempo de ejecución de las actividades.

- La maquinaria a emplearse en esta partida será con tractor y/o conforme a la evaluación realizada por el Contratista y el Control Técnico en Campo; con el cual se conseguirá realizar de manera adecuada los trabajos programados en esta partida.
- Medición. - La habilitación de accesos será cuantificado por kilómetro de acceso y/o carretera habilitada.

6.2.5.5 Limpieza y descolmatación de cauce.

- Alcance del Trabajo.- Esta partida se refiere a la excavación de la zona del cauce contenida dentro de los límites del trazo proyectado para limpieza de la sección del río en los tramos identificados 1 y 2, y el arrimado lateral del material excavado hacia el área donde se conformara el dique con material propio, o según corresponda de acuerdo al Anexo No. 2, a fin de orientar la aproximación del caudal hacia el cauce principal o central, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicadas por el ingeniero de Control Técnico y el Anexo No. 2 de Contenido Mínimo del Actividades de Emergencia de Atención Inmediata.

Las excavaciones serán efectuadas según los ejes, rasantes y niveles indicados por la topografía efectuada por el contratista, y se llevarán a cabo aplicando medios apropiados elegidos, previa aprobación del ingeniero de Control Técnico.

Respecto a todas las obras de protección existentes (diques de enrocado, espigones con gaviones, etc.) ubicadas dentro del límite de excavación proyectado para la limpieza del río, estas no deberán ser eliminadas y por el contrario deberán ser reforzadas utilizando el material proveniente de las excavaciones, colocando el material en el sitio adecuado previa autorización del ingeniero de Control Técnico.




CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

El CONTRATISTA deberá proceder a las excavaciones, después que haya procedido al levantamiento topográfico del terreno natural aprobado por el ingeniero de Control Técnico.

- **Alcance del Trabajo.** - La limpieza y descolmatación del cauce comprende el suministro de materiales, equipos y operaciones necesarias para efectuar los cortes de terreno para efectuar la limpieza del cauce del río, en los tramos con lo cual se conformará el dique que permitirá encasar las aguas/o encauzar las aguas a un punto determinado.
- **La maquinaria a emplearse** en los trabajos de descolmatación de cauce será de 01 excavadora sobre oruga según características indicadas en el Anexo No. 2 de Contenido Mínimo del Actividades de Emergencia de Atención Inmediata. El contratista podrá utilizar maquinaria adicional y del tipo que considere necesario para mejorar los tiempos de ejecución de la actividad, esto último, no significa pagos adicionales por cualquier rubro que el contratista suponga o crea le corresponda (la maquinaria indicada en el Anexo No. 2, no puede ser reemplazada por la maquinaria de potencia inferior a la considerada).
- **Medición.** - La descolmatación de cauce se medirá en metros cúbicos (m³), para el efecto se determinará el promedio del área de acuerdo a las secciones consideradas multiplicada por su distanciamiento.

El material excedente, producto de la descolmatación (no utilizado en la conformación de dique con material propio), y material producto de las excavaciones, previa autorización de la supervisión, podrá ser arrimado en la ribera del cauce materia de la intervención, o según lo indicado por este, no constituyendo mayor costo a la Entidad.

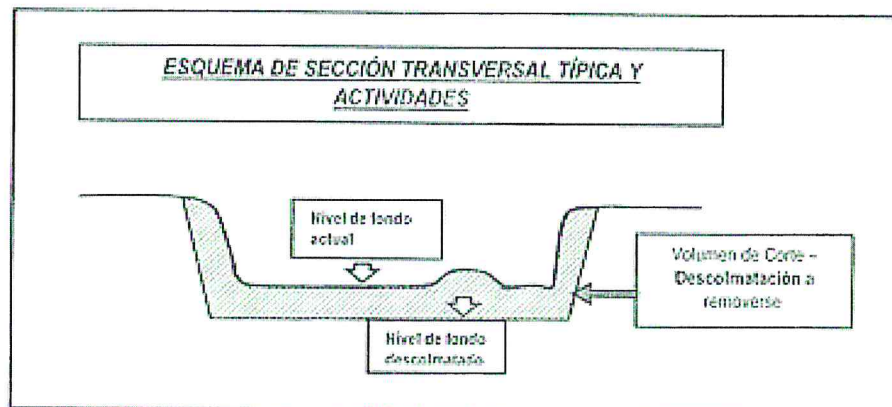

Fuente: Anexo N° 02

6.2.5.6 Conformación de dique con material propio.

- **Alcance del Trabajo.** - Una parte del material de corte de río, producto de las actividades de descolmatación, será empleado en la conformación del dique de protección y encauzamiento en una longitud total de 430.00 ml y a las dimensiones indicadas según el Anexo No. 2.

Para la ejecución de esta partida se emplearán excavadoras sobre orugas, los cuales además de conformar el dique con material propio realizarán el proceso de acomodo y compactado, de la misma manera con la ayuda de la maquinaria se procederá a realizar el proceso de perfilado de la corona del dique, ello con el propósito de proporcionar uniformidad a la altura del dique.

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

- Medición. - La conformación de dique con material propio se medirá en metros cúbicos, considerando las dimensiones de la sección típica indica en el Anexo No. 2.

6.2.5.7 Preparación y selección de roca en cantera

- Alcance del Trabajo. - Comprende el suministro de materiales, equipos y operaciones necesarias para la habilitación y selección de roca en cantera.

Se considerará servicio de voladura de roca si el contratista lo considera necesario.

- El material estará formado por rocas cuyo tamaño sea de 80cm a 150cm, de diámetro nominal cuyos fragmentos individuales deberán ser densos y resistentes a la abrasión y deberán estar libres de grietas, hendiduras y otros defectos que pudieran aumentar injustificadamente la destrucción del enrocado por el agua u otros factores meteorológicos.

- Los materiales de desecho deberán ser colocados en áreas agotadas o en áreas aprobadas por el Ing. Director Técnico.

- La maquinaria a emplearse debe contar con 01 Excavadora según características indicadas en el Anexo No. 2. El contratista podrá utilizar maquinaria adicional y del tipo que considere necesario para cumplir con la actividad, esto último, no significa pagos adicionales por cualquier rubro que el contratista suponga o crea le corresponda (la maquinaria indicada en el Anexo No. 2, puede ser reemplazada por la maquinaria adicional, bajo cuenta y riesgo del contratista para el cumplimiento del plazo).

- Medición. - La habilitación de roca en cantera se medirá en metros cúbicos, para el efecto se estimará en la cantera el volumen de las rocas habilitadas y colocadas en su lugar adecuado para realizar posteriormente el carguío.

6.2.5.8 Carguío y transporte de roca frente al área de trabajo

- Alcance del Trabajo. - Comprende el suministro de materiales, equipos y operaciones necesarias para el carguío de las rocas a los volquetes su transporte hasta la zona de trabajo.

- La maquinaria a emplearse en el carguío de roca será básicamente con volquetes, y excavadora, según características indicadas en el Anexo No. 2. El contratista podrá utilizar maquinaria adicional y del tipo que considere necesario para cumplir con la actividad, esto último, no significa pagos adicionales por cualquier rubro que el contratista suponga o crea le corresponda (la maquinaria indicada el Anexo No. 2, puede ser reemplazada por la maquinaria adicional, bajo cuenta y riesgo del contratista para el cumplimiento del plazo).

- El transporte de roca entre la cantera y el lugar de colocación final será realizado a través de la ruta más corta posible o aquella que señale el ingeniero de Control Técnico, quedando obligado al Ing. Director Técnico a construir los caminos de acceso o empalme necesarios para estos fines.

- Medición. - El carguío de roca se medirá en metros cúbicos, para el efecto se medirá el volumen de transporte de los volquetes que se utilizaran para el transporte multiplicado por número de viajes efectuados (30% de vacíos, es decir



CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

el volumen de roca por viaje es igual al 0.70 x volumen geométrico).

6.2.5.9 Acomodo de roca para protección de dique

Consiste en la actividad de colocación de roca, en los lugares establecidos en el Anexo No. 2 y lo indicado por el Control Técnico. Se considera un 10% de vacío en la adecuación de la roca.

El tamaño y peso de la roca a utilizarse será verificada por el Control técnico en función de la cantera elegida, debiéndose asegurar que tanto el tamaño y peso de la roca cumpla los objetivos para los cuales se instala por el Control Técnico y especificada en la Anexo No. 2.

- Alcance del Trabajo. - Comprende el suministro de materiales, equipos y operaciones necesarias para la adecuación de las rocas dejadas al volteo por los volquetes con la finalidad de optimizar su funcionalidad.
- Las rocas deberán ser colocadas y acomodadas de manera que queden regularmente distribuidos, con las más pequeñas en la parte superior y las más grandes en la parte inferior del talud y que sus caras más planas queden expuestas.

No se colocará roca en uña

- La maquinaria a emplearse en la adecuación deberá ser compuesto básicamente de excavadora, según características indicadas el Anexo No. 2. El contratista podrá utilizar maquinaria adicional y del tipo que considere necesario para cumplir con la actividad esto último, no significa pagos adicionales por cualquier rubro que el contratista suponga o crea le corresponda (la maquinaria indicada en el Anexo No. 2, puede ser reemplazada por la maquinaria adicional, bajo cuenta y riesgo del contratista para el cumplimiento del plazo).
- Medición. - La adecuación de roca al volteo se medirá en metros cúbicos, para el efecto se medirá el volumen de acuerdo a la geometría del talud del dique se estimará teniendo en cuenta el área cubierta y el espesor promedio de la roca. El acabado final de la roca a volteo será determinado por el ingeniero de Control Técnico.

7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO ZAÑA, SECTOR RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

Ubicación de la intervención (distrito/provincia/departamento/sector)

Departamento	:	Lambayeque
Provincia	:	Chiclayo
Distrito	:	Lagunas
Sector	:	Rafan Lagunas
Rio	:	Zaña

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

el volumen de roca por viaje es igual al 0.70 x volumen geométrico).

6.2.5.9 Acomodo de roca para protección de dique

Consiste en la actividad de colocación de roca, en los lugares establecidos en el Anexo No. 2 y lo indicado por el Control Técnico. Se considera un 10% de vacío en la adecuación de la roca.

El tamaño y peso de la roca a utilizarse será verificada por el Control técnico en función de la cantera elegida, debiéndose asegurar que tanto el tamaño y peso de la roca cumpla los objetivos para los cuales se instala por el Control Técnico y especificada en la Anexo No. 2.

- Alcance del Trabajo. - Comprende el suministro de materiales, equipos y operaciones necesarias para la adecuación de las rocas dejadas al volteo por los volquetes con la finalidad de optimizar su funcionalidad.
- Las rocas deberán ser colocadas y acomodadas de manera que queden regularmente distribuidos, con las más pequeñas en la parte superior y las más grandes en la parte inferior del talud y que sus caras más planas queden expuestas.

No se colocará roca en uña

- La maquinaria a emplearse en la adecuación deberá ser compuesto básicamente de excavadora, según características indicadas el Anexo No. 2. El contratista podrá utilizar maquinaria adicional y del tipo que considere necesario para cumplir con la actividad esto último, no significa pagos adicionales por cualquier rubro que el contratista suponga o crea le corresponda (la maquinaria indicada en el Anexo No. 2, puede ser reemplazada por la maquinaria adicional, bajo cuenta y riesgo del contratista para el cumplimiento del plazo).
- Medición. - La adecuación de roca al volteo se medirá en metros cúbicos, para el efecto se medirá el volumen de acuerdo a la geometría del talud del dique se estimará teniendo en cuenta el área cubierta y el espesor promedio de la roca. El acabado final de la roca a volteo será determinado por el ingeniero de Control Técnico.

7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO ZAÑA, SECTOR RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

Ubicación de la intervención (distrito/provincia/departamento/sector)

Departamento	:	Lambayeque
Provincia	:	Chiclayo
Distrito	:	Lagunas
Sector	:	Rafan Lagunas
Río	:	Zaña

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI


Planos o Croquis: contiendo la ubicación en planta, indicando las coordenadas UTM del punto de INCIO y punto FINAL

CROQUIS, UBICACIÓN EN PLANTA, TRAMO RÍO ZAÑA SECTOR RAFAN LAGUNA TRAMO I




TRAMO I

TRAMO RÍO ZAÑA		
INICIAL:	FINAL:	
ESTE : 651771.00	ESTE : 651619.23	Zona 17 L
NORTE : 9229784.00	NORTE : 9229600.77	

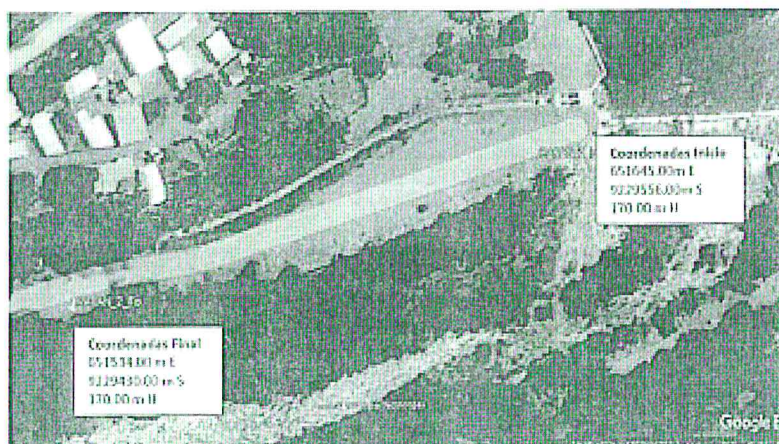

TRAMO II RÍO ZAÑA		
INICIAL:	FINAL:	
ESTE : 651645.16	ESTE : 651534.00	Zona 17 L
NORTE : 9229556.22	NORTE : 9229430.00	




CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

CRÓQUIS PERFIL LONGITUDINAL, TRAMO RÍO ZAÑA SECTOR RAFAN LAGUNA

PERFIL TRAMO I



PERFIL TRAMO II



8. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR:

Del Postor:

Será una persona Jurídica que cuente con RUC y RNP en el capítulo de servicios y que no se encuentre impedido, suspendido, ni inhabilitado para contratar con el estado. Con experiencia en servicios similares.

Se considera servicios similares a los siguientes:

Servicios o ejecución de obras Descolmatación de ríos o canales o drenes o cauces o quebradas o servicios o ejecución de obras de encauzamiento de ríos o canales o drenes o cauces o quebradas o servicios o ejecución de obras de defensa ribereñas de ríos o cauces o quebradas o servicios o ejecución de obras de conformación de bordos en ríos o cauces o quebradas.

Servicio de Limpieza de ríos o quebradas o canales o drenes.

9. PERSONAL CLAVE

Personal requerido para la ejecución de la actividad:

- Director Técnico: Ingeniero Agrícola y/o Civil a tiempo completo, encargado de la coordinación y ejecución física del servicio en campo.
- Especialista en Topografía: Técnico en topografía, encargado del desarrollo del levantamiento, procesamiento y control topográfico en campo.

10. SISTEMA DE CONTRATACION

A PRECIOS UNITARIOS.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

Se le otorga a la empresa contratada para la ejecución del servicio un plazo de hasta 30 días calendario, contabilizados desde el siguiente día de suscrita el Acta de Inicio de Actividades, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.1.1.

ACTIVIDAD	EJECUCION DEL SERVICIO (días calendario)
"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ZAÑA, SECTOR RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	30

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

12. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS.

La conformidad de ejecución del servicio por parte de la Entidad, no enerva su derecho a reclamar posterior por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto en el inciso 40.2 del artículo 40° de la Ley de Contratación del Estado Congruentes con el Artículo 173 de su Reglamento.

El Plazo de responsabilidad del contratista es de 01 (un) año.

13. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantías que deben otorgar el postor y/o contratista, serán mediante Fianza otorgada por la Entidad que se encuentre bajo la supervisión de la SBS. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe de entregar a la Entidad la Garantía de Fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al 10% (diez por ciento) del Monto del Contrato Original, de conformidad con lo señalado en el artículo 148 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado

Esta debe de mantenerse vigente hasta la aprobación del Informe final.

14. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25.

Estas penalidades se deducen de los pagos que la entidad debe efectuar al contratista.

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

14.1 OTRAS PENALIDADES

Con el objeto de asegurar una mejor calidad de la ejecución de los trabajos; se establecen estas otras penalidades:

PENALIDADES				
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Unidad	Forma de Cálculo	Procedimiento

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado	Por cada día de ausencia del personal.	0.50 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
2	En caso el responsable de la Dirección Técnica no se encuentre presente en el lugar de la prestación de la actividad, excepto en Caso Fortuito o Fuerza Mayor, debidamente acreditado.	Por ocurrencia	0.15 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
3	Cuando el Contratista no cumple en presentar el Informe Final correspondiente, dentro del plazo señalado	Por cada día de incumplimiento	0.20 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
4	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Por cada ocurrencia	0.50 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
5	Por no presentar el Plan de Trabajo y cronograma de utilización de maquinaria al Control Técnico en el plazo establecido.	Por cada día de incumplimiento	0.10 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
6	Por no iniciar los trabajos materia de la prestación dentro del plazo establecido, luego de suscrita el Acta de Inicio del Servicio.	Por cada día de atraso	0.30 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
7	No cumple con proveer la maquinaria indicada según el cronograma de utilización y ejecución de maquinarias, aprobado según el Plan de Trabajo y que esta última no se encuentre 100% operativa.	Por ocurrencia en el incumplimiento y por cada maquinaria	0.3 UIT	Según informe del Control Técnico o Inspector o Monitor o Ingeniero de Seguimiento

- El PSI durante la etapa de ejecución contractual, tomara las medidas preventivas necesarias, a fin de verificar el cumplimiento en lo concerniente a la maquinaria, el



[Handwritten signature]

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

equipo y personal propuesto. A fin del cumplimiento de la actividad en las mejores condiciones.

15. RECEPCIÓN DEL SERVICIO

Culminada la prestación del servicio, el Contratista en un plazo máximo de dos (02) días siguientes a la culminación, deberá solicitar al Control Técnico, la recepción del mismo, en un plazo máximo de dos (02) días siguientes, el Control Técnico emite y entrega a la Entidad un Informe Técnico pronunciándose sobre la culminación o no del servicio, debiendo actuar de acuerdo al siguiente detalle:

- En caso el Informe Técnico del Control Técnico concluya con la culminación de la ejecución del servicio por parte del contratista, deberá detallar los trabajos culminados (de presentarse una modificación al Contrato, será de responsabilidad del Contratista realizar el trámite de la solicitud de modificación contractual de forma oportuna, para su aprobación respectiva por la Entidad).
- En caso el Informe del Control Técnico corrobore la no culminación de los servicios por parte del Contratista, deberá evaluar la posibilidad, pertinencia, y de ser el caso solicitar el inicio del procedimiento de resolución de contrato con el objeto de requerir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones referidas a la culminación del servicio dentro del plazo contractual.

En dichos casos el "Informe Técnico" del Ingeniero de Control Técnico deberá adjuntar en original y unas copias, en formato físico y digital lo siguiente:

1. Memoria Descriptiva
2. Planilla de metrados.
3. Comparativo de metrados del el Anexo No. 2 y lo realmente ejecutado.
4. Planos definitivos.
5. Fotografías (05 unidades) y videos (01 filmación de 10 minutos como mínimo).

En un plazo máximo de 03 días hábiles de recibido el Informe Técnico del Ingeniero de Control Técnico y demás actuados, la UGIRD designará a un equipo de tres (03) Ingenieros con conocimiento técnico, con el objetivo de verificar los trabajos realizados y de corresponder se suscriban un Acta de Recepción del Servicio u observación.

En un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de habérsele notificado a los ingenieros integrantes, el especialista encargado comunicará a la UGIRD, para que mediante esta unidad se notifique al Contratista y al Control Técnico, la fecha y hora en que se llevará a cabo la recepción del servicio, la cual no podrá exceder de los diez (10) días calendario siguientes.

- En caso no encuentre conforme los trabajos, se levantará un Acta de Observaciones detallando cada una de estas, y otorgará al Contratista un plazo máximo de diez (10) días calendario para su subsanación. Para la verificación de la subsanación, y de corresponder la recepción, el equipo de ingenieros encargados de la recepción, se apersonarán al lugar de actividades sin necesidad de aviso previo.
- En caso persista la observación, el especialista encargado levantará un Acta de No Recepción del Servicio, e informará a la UGIRD para que evalúe si corresponde resolver el contrato, de ser el caso que se considere otorgar un plazo adicional al contratista para que subsane las observaciones persistentes, estas se encontrarán sujetas a la aplicación de penalidades.

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

- En caso que los encargados de la recepción, adviertan que el servicio manifiestamente no cumple las características y condiciones ofrecidas, levantará un Acta de No Recepción del Servicio, e informará a la UGIRD.

En el mismo día, luego de efectuada la recepción del servicio, el equipo de ingenieros encargados de la recepción, remitirá a la UGIRD el original del Acta de Recepción.

16. INFORME FINAL DEL SERVICIO


Una vez culminada al 100% la ejecución del servicio, con el Acta de Recepción del servicio, el Contratista entregará al Control Técnico en un plazo máximo de cinco (05) días calendario el Informe Final para su evaluación, teniendo el Control Técnico un periodo de dos (02) días para emitir su Informe Técnico pronunciándose sobre el Informe Final.

El Informe Final del servicio tendrá la siguiente estructura:

- Resumen General.
- Descripción de la actividad.
- Avance físico de la actividad por partida.
- Planilla de metrados y valorización única del servicio.
- Relación de personal, maquinaria pesada y equipos del contratista (respecto al cronograma de utilización y ejecución de maquinaria y equipos aprobados en el plan de trabajo).
- Informe de estado de operatividad de las maquinarias.
- Adjuntar SCTR del personal durante la ejecución del servicio.
- Resumen de documentación y reuniones técnicas.
- Conclusiones y recomendaciones.
- Anexos.
 - Acta de Inicio del Servicio.
 - Acta de Recepción del Servicio.
- Panel fotográfico.
- Cuaderno de Control.
- Planos: Iniciales de replanteo y finales.
 - Nube de puntos obtenido del levantamiento inicial y final topográfico digital
 - Planos de ubicación general
 - Planos de Planta final
 - Planos de Perfil longitudinal (incluir el cuadro de volúmenes de movimiento de tierras y enrocados finales).
 - Planos de secciones transversales finales
 - Plano de Ubicación de canteras de roca
 - Plano de Ubicación de botaderos, en el cual se indique las coordenadas de los botaderos y los volúmenes de materiales que fueron depositados en esa zona (cuadro de metrados de material eliminado).
- Informe de aprobación por parte del Control Técnico.

Se debe de realizar una descripción de las ocurrencias del trabajo, en las que se indicaran detalladamente entre otros, los métodos utilizados, personal en la actividad, metrados, fotografías (panel fotográfico digital que registre día a día el desarrollo de la actividad); incidencias en la labor de la dirección Técnica.

En caso de existir observaciones, el Control Técnico comunicará inmediatamente al contratista para que sean absueltas en un plazo no mayor de tres (03) días calendario de notifica dichas observaciones, y una vez encontrada conforme, el Control Técnico remitirá a la Entidad el Informe Final.



[Handwritten signature]

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

17. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio estará a cargo de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, previo informe de conformidad del Ingeniero de control técnico o personal encargado por la UGIRD o informe Técnico del Ingeniero de Seguimiento de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje.

18. CONSTANCIA DE PRESTACION

La constancia de prestación por el servicio prestado estará a cargo y será otorgado por la Unidad de Administración de conformidad con el Artículo 169º del Reglamento de la Ley de contrataciones con el estado.

19. OTRAS CONSIDERACIONES

- El contratista será responsable por los daños y/o perjuicios causados a terceros y responderá directamente, excluyendo al PSI de cualquier responsabilidad por su acción u omisión.
- Prestaciones Adicionales: No se reconocerán adicionales por mayores prestaciones del servicio.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

01 Director Técnico: Ingeniero Agrícola y/o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

01 Especialista en Topografía: Ingeniero Agrícola o Ingeniero Civil o Ingeniero Topógrafo o Técnico Topógrafo.

Acreditación:

Se verificará el Grado académico o Título Profesional en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> // o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <http://www.titulosinstitutos.pe/>, según corresponda, o declaración jurada de cumplimiento de requisitos, en cuyo caso tendrá dos (02) días calendarios de plazo, a partir del día siguiente de la adjudicación, para presentar los documentos que acrediten.

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

01 Director Técnico: Experiencia mínima de 02 años como Director Técnico y/o Responsable y/o Residente y/o Control Técnico, en obras y/o servicios en general.

01 Especialista en Topografía: Experiencia mínima de 2 años como topógrafo y/o Jefe de Topografía y/o residente y/o Control Técnico, en obras y/o servicios en general.

Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, o declaración jurada de cumplimiento de requisitos, en cuyo caso tendrá dos (02) días calendarios de plazo, a partir del día siguiente de la adjudicación, para presentar los documentos que acrediten.

A.3 EQUIPAMIENTO

Requisitos mínimos:

TIPO DE MAQUINARIA	POTENCIA	CANTIDAD	ANTIGÜEDAD	CALIBRACIÓN
--------------------	----------	----------	------------	-------------

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

Excavadora sobre Orugas	170-250 hp	02	Max. 10 Años	Operativo
Tractor sobre Orugas	270-295hp	01	Max. 10 Años	Operativo
Camión volquete de 15m3		04	Max. 10 Años	Operativo
Estación Total (Incluye Prismas)	-	01		Menor a 6 Meses
Nivel de Ingeniero (Incluye Miras)	-	01		Menor a 6 Meses

Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido, carta de compromiso de presentación y acreditación de equipamiento requerido, o declaración jurada de cumplimiento de requisitos, en cuyo caso tendrá dos (02) días calendario de plazo, a partir del día siguiente de la adjudicación, para presentar los documentos que acrediten.

REQUISITOS DE EVALUACIÓN

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Requisitos:

Se evaluará considerando un monto facturado acumulado hasta S/ 350,935 (Trescientos cincuenta mil novecientos treinta y cinco con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considera servicios similares a los siguientes:

- Servicios o ejecución de obras Descolmatación de ríos o canales o drenes o cauces o quebradas o servicios.
- Servicios o Ejecución de obras de encauzamiento de ríos o canales o drenes o cauces o quebradas o servicios.
- Servicios o Ejecución de obras de defensa ribereñas de ríos o cauces o quebradas o servicios.
- Servicios o Ejecución de obras de conformación de bordas en ríos o cauces o quebradas.
- Servicio de Limpieza de ríos o quebradas o canales o drenes

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación; o (iv) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación o (vi) o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones, o declaración jurada de cumplimiento de requisitos, en cuyo caso tendrá dos (02) días calendario de plazo, a partir del día siguiente de la adjudicación, para presentar los documentos que acrediten.

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.


Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

² Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fe de ciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir esto equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término "cancelado" o "pagado") supuesto en el cual si se contara con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".



CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

ANEXO N° 02

**FORMATO CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA QUE SUSTENTA LA
ACTIVIDAD DE EMERGENCIA**

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO ZAÑA, SECTOR RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"



Formado digitalmente por SUAREZ
2545-Alejandro Ivan Fajó
C414565216.html
Folios: 205-2071 20/04/23 09:00

a) Código y nombre de la Unidad Ejecutora

006-956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI

b) Ubicación de la intervención (departamento/provincia/distrito/coordenadas UTM)

Departamento : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Distrito : Lagunas
Sector : Rafan Lagunas
Río : Zaña

c) Norma de Declaratoria de Emergencia

DECRETO SUPREMO N° 029-2023-PCM

d) Coordenadas UTM (Datum WGS 84); Se tiene II tramo priorizado,

TRAMO I

TRAMO RÍO ZAÑA		
INICIAL:	FINAL:	
ESTE : 651771.00	ESTE : 651619.23	Zona 17 L
NORTE : 9229784.00	NORTE : 9229600.77	

TRAMO II

TRAMO II RÍO ZAÑA		
INICIAL:	FINAL:	
ESTE : 651645.16	ESTE : 651534.00	Zona 17 L
NORTE : 9229556.22	NORTE : 9229430.00	

e) Breve descripción de los daños

Ante las constantes precipitaciones pluviales, se ha presentado el incremento de caudal, el cual está ocasionando la colmatación del cauce la erosión en la margen



Formado digitalmente por ALVARO
2545-Jorge Luis FAU 254565216
Folios: 205-2071 20/04/23 09:00

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI



PERU

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

ANEXO N° 02

FORMATO CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA QUE SUSTENTA LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE EN LA
MARGEN DERECHA DEL RÍO ZAÑA, SECTOR RAFAN LAGUNAS,
DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE"



Trazo digitalizado por SUAREZ
LUIS RAFAEL FLORES
01/05/2023 14:00
01/05/2023 14:00
01/05/2023 14:00

a) Código y nombre de la Unidad Ejecutora

006-956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

b) Ubicación de la intervención (departamento/provincia/distrito/coordenadas UTM)

Departamento : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Distrito : Lagunas
Sector : Rafan Lagunas
Río : Zaña

c) Norma de Declaratoria de Emergencia

DECRETO SUPREMO N° 029-2023-PCM

d) Coordenadas UTM (Datum WGS 84): Se tiene II tramo priorizado,

TRAMO I

TRAMO RÍO ZAÑA		
INICIAL:	FINAL:	
ESTE : 651771.00	ESTE : 651619.23	Zona 17 L
NORTE : 9229784.00	NORTE : 9229600.77	

TRAMO II

TRAMO II RÍO ZAÑA		
INICIAL:	FINAL:	
ESTE : 651645.16	ESTE : 651534.00	Zona 17 L
NORTE : 9229556.22	NORTE : 9229430.00	

e) Breve descripción de los daños

Ante las constantes precipitaciones pluviales, se ha presentado el incremento de
caudal, el cual está ocasionando la colmatación del cauce la erosión en la margen



Trazo digitalizado por SUAREZ
LUIS RAFAEL FLORES
01/05/2023 14:00
01/05/2023 14:00
01/05/2023 14:00

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

derecha y del talud del Río Zaña, en el Sector Rafan Lagunas, lo que representa un alto riesgo de afectación de 7,747.79 hectáreas de terrenos de cultivos, correspondiente a 6,500 usuarios y 1,300 familias.

f) Breve descripción de la actividad de emergencia

Con la finalidad de atender la ocurrencia y disminuir la vulnerabilidad existente, es necesario efectuar la protección de ribera, mediante limpieza, descolmatación de cauce en una longitud de 430.00 ml y conformación de dique con material propio en la margen derecha del Río Zaña en los tramos antes mencionados.

Tramo I

- Margen Derecha, desde las coordenadas UTM WGS 84 Zona 17L; 651,771.00 m E - 9229556.00 m S, hasta las coordenadas UTMS WGS 84 Zona 17; 651,534.00 m E - 9229430.00 m S. (descolmatación de cauce y conformación de dique con material propio).

Tramo II

- Margen Derecha, desde las coordenadas UTM WGS 84 Zona 17L; 651645.00 m E - 9,229,784.00 m S, hasta las coordenadas UTMS WGS 84 Zona 17; 651,534.00 m E - 9229430.00 m S. (descolmatación de cauce y conformación de dique con material propio).

Las maquinarias para realizar los trabajos correspondientes a la descolmatación del cauce del Río Zaña sector Rafan Laguna, en dos tramos para la ejecución se requiere la siguiente maquinaria:

Tractores sobre Orugas de 270-295 HP, Excavadoras sobre Orugas de 170 HP o superior y maquinaria liviana como volquetes roqueros, capacidad mínima de 15 m3, se efectuarán las siguientes actividades:

Tramo I

- ❖ Limpieza y descolmatación de cauce de río, en un volumen total 7,800.00 m3 y una longitud de 260.00 ml.
- ❖ Conformación de dique con material propio, en un volumen total de 6,370.00 m3 y una longitud total de 260.00ml.

Tramo II

- ❖ Limpieza y descolmatación de cauce de río, en un volumen total 5,100.00 m3 y una longitud de 170.00 ml.
- ❖ Conformación de dique con material propio, en un volumen total de 4,165.00 m3 y una longitud total de 170.00ml.


Los metrados totales considerados son, descolmatación en el cauce del Río Zaña sector Rafan Lagunas, en un volumen total de 12,900.00 m3 y la conformación de dique con material propio, asciende al volumen de 10,535.00m3.

Descripción de las actividades y/o partidas planteadas:

- ❖ Movilización y desmovilización de maquinarias:



Formado digitalmente por SEMPREZ
JORG ALFREDO LUNA FANZ
011480817616
Módulo: Dap Vista Remota
Fecha: 09-05-2023 20:54:25 -05:00



Formado digitalmente por SEMPREZ
JORG ALFREDO LUNA FANZ 011480817616
Módulo: Dap Vista Remota
Fecha: 09-05-2023 19:41:19 -05:00

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI



PERU

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES



Empleado digitalmente por SUAREZ
JUAN ANTONIO FAN
D-14865215-14865215
Firma: 09-05-2023 10:54:35 -05:00

El transporte del equipo pesado se podrá realizar en camiones de plataforma de cama baja, es importante indicar la procedencia de las maquinarias serán contratadas de la ciudad de Chiclayo a una distancia aproximada de 40 km y/o otro lugar donde se encuentre disponible las maquinarias según las especificaciones técnicas indicadas en los análisis de los costos unitarios de la actividad de emergencia, destinado recursos financieros para esta actividad.

- ❖ El control topográfico será realizado de forma permanente durante toda la ejecución de la prestación, para cumplimiento de las metas planteadas en el anexo 02, la cual se realizará al Inicio (Topografía Inicial), durante la ejecución y al terminar la actividad (Levantamiento topográfico post ejecución de la prestación).
- ❖ Limpieza y descolmatación de cauce

Este trabajo consistirá en la descolmatación del cauce de Río Zaña sector Rafan Lagunas, en una longitud total de 430.00 ml, de acuerdo a las siguientes secciones:

TRAMO – RIO ZAÑA		
LONGITUD	SECCION DEL RIO	
	ANCHO	ALTURA DE DESCOLMATACION PROMEDIO
430.00 ml	60.00ml	0.50ml

Para realizar esta partida se tiene previsto la utilización tractor sobre orugas de 270 HP o superior, de acuerdo a las características indicadas en el cuadro de insumos.

Esta partida considera trabajos de desvío de cauce de río siempre y cuando sea necesario para la ejecución de la partida.

- ❖ Conformación de dique con material propio:

Este trabajo consistirá en la conformación de dique con material propio en el Río Zaña sector Rafan Lagunas margen derecha, en una longitud de 430.00 ml, y un volumen de 10,535.00 m³, de acuerdo a las dimensiones indicadas en la sección típica. Para realizar esta partida se tiene previsto la utilización de maquinaria de tipo excavadora y tractores sobre orugas de acuerdo a las características indicadas en el cuadro de insumos.

g) Código de Registro en el SINPAD (Nota 1)

CODIGO SINPAD: 166297

h) Metas físicas a ejecutar

1. Limpieza y descolmatación de cauce	430,00 m – 12,900,00 m ³
---------------------------------------	-------------------------------------



Empleado digitalmente por ALVAREZ
D-14865215-14865215
Firma: 09-05-2023 13:47:37 -05:00

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI



PERÚ Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

2. Conformación de dique con material propio	430.00 m – 10,535.00 m ³
--	-------------------------------------

i) Cantidad de la población (productores) a ser beneficiada

Con la ejecución de la actividad se atenderá a una población beneficiaria de 1,300 familias de agricultores.



Formado digitalmente por SUAREZ
JEAS Alfredo Ivan FRIJ
0414808210 han
Firma: Dey Vito Eujana
Fecha: 04-05-2023 09:54:25 -05:00

j) Tiempo estimado de ejecución de la intervención que se cuenta a partir de la transferencia financiera efectuada por el MIDAGRI

Tiempo estimado de ejecución de la intervención (25 días) Una vez que se cuenten con los fondos para la ejecución de la actividad, se estima los siguientes tiempos para su ejecución

DESCRIPCIÓN	DÍAS CALENDARIO	MES 1			MES 2
		10	20	30	40
1. PROCESO DE CONTRATACIÓN	5				
2. EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	25				
3. VERIF. Y CONFORM. ACTIVIDAD	3				
4. LIQUIDACIÓN – CIERRE DE CONTRATO	2				
TOTAL	35				

k) Presupuesto requerido incluido el detalle por genérica y específica de gasto

Presupuesto requerido: S/ 379,535.00

Cuadro de detalle y específica de gasto.



Formado digitalmente por SUAREZ
JEAS Jorge Luis FRIJ 2014808210
han
Firma: Dey Vito Eujana
Fecha: 04-05-2023 10:41:42 -05:00

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI



PERÚ Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

SUSTENTO ANEXO N° 02

En el presupuesto que se indica en el literal k) de la declaración Jurada, debe contar con los siguientes documentos de sustentos, de dependiendo del tipo de intervención.


- a) Planos o Croquis: contiendo la ubicación en planta, indicando las coordenadas UTM del punto de **INICIO** y punto **FINAL**

RIO ZAÑA SECTOR RAFAN LAGUNA PLANTA GENERAL

PSI
Firmado digitalmente por DAMAZO,
JULIO Alfredo Ivan FAL
DNI: 8857161
Fecha: 09.09.2023 20:54:28 -05:00



CROQUIS, UBICACIÓN EN PLANTA, TRAMO RÍO ZAÑA SECTOR RAFAN LAGUNA TRAMO I

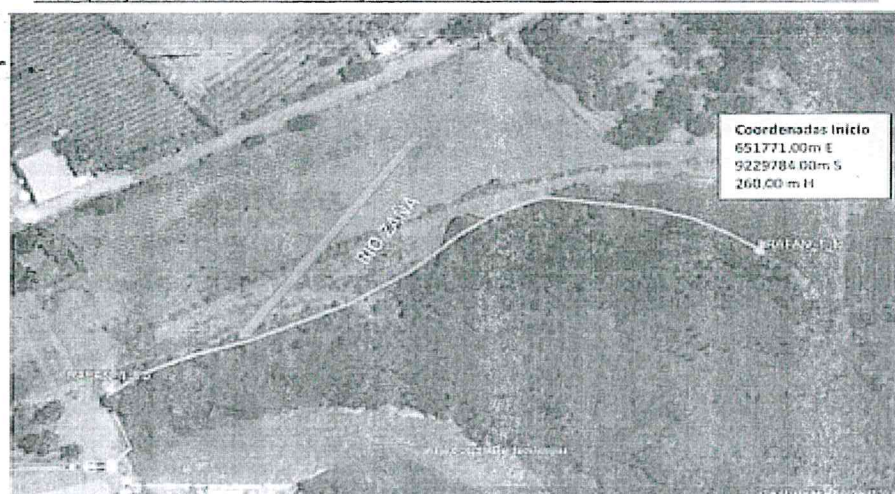

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI



PERÚ Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

CROQUIS, UBICACIÓN EN PLANTA, TRAMO RÍO ZAÑA SECTOR RAFAN LAGUNA TRAMO II



Imageto digitalizada por SUAREZ
JMS Alrededor 14/01/2023
04:45:14 h:m:s
Módulo: DGT-001-001
Fecha: 2023-01-14 04:45:14



b) Perfil longitudinal, secciones transversales o secciones típicas dimensionadas

CROQUIS PERFIL LONGITUDINAL, TRAMO RÍO ZAÑA SECTOR RAFAN LAGUNA

PERFIL TRAMO I



PERFIL TRAMO II



Imageto digitalizada por SUAREZ
JMS Alrededor 14/01/2023
04:45:14 h:m:s
Módulo: DGT-001-001
Fecha: 2023-01-14 04:45:14

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI



PERU


Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego




PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

- c) Plano de planta o croquis, señalando la sección típica de la estructura intervenir y las características hidráulicas y geométricas

SECCIÓN TÍPICA DE CONFORMACIÓN DE DIQUE-MARGEN DERECHA RÍO ZAÑA

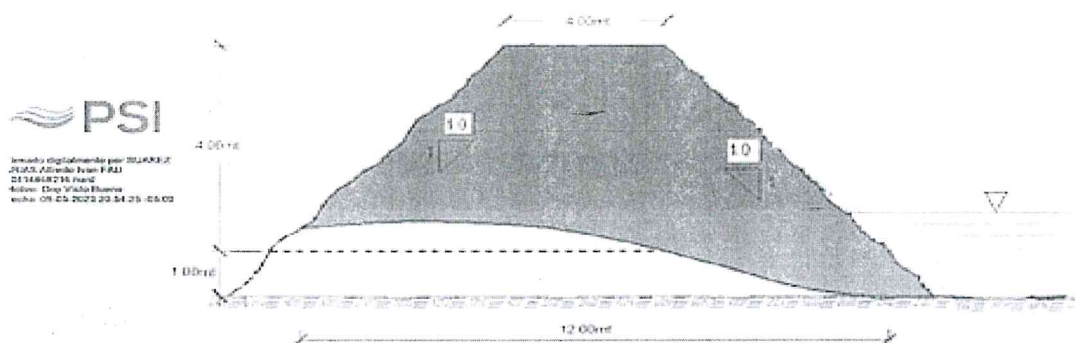

CROQUIS DEL RIO ZAÑA – SECTOR RAFAN LAGUNAS

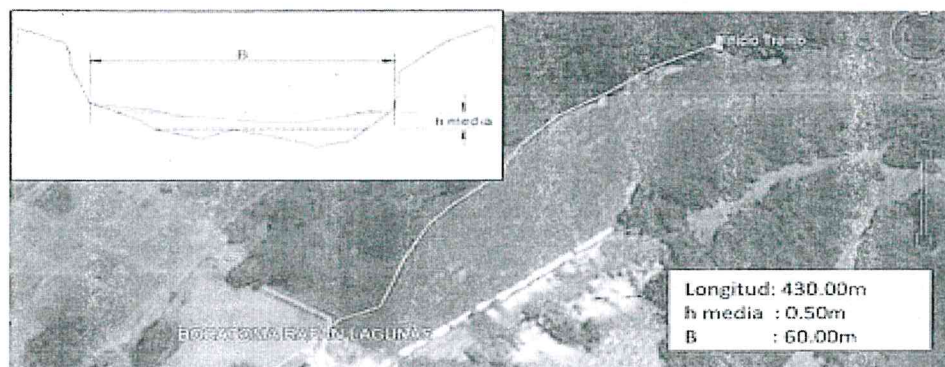

- d) Planilla de metrados, indicando las dimensiones de la caja hidráulica a recuperar, o las dimensiones de los diques a conformar, o las dimensiones del enrocado, que justifiquen los factores de esponjamiento, compactación o volumen de vacíos, entre otros que sean necesarios para señalar.



Finalizado digitalizado por: ALVAREZ
DE LA Torre Juan P. P. 20414680716
Perú. Fecha: 09-05-2023 19:47:51 -05:00

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI



Presupuesto del Servicio

Presupuesto

Proyecto FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN EL RÍO ZAÑA, LAMBAYEQUE
Sub Proyeto 01 - LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO ZAÑA, SECTO RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Cliente PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI

Dirección LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Costo a: Marzo - 2023



Descripción		Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Subtotal	Total
TRABAJOS PRELIMINARES Y PROVISIONALES							16,191.90
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA CON CAMA BAJA	VJE	2.00	3,500.00	7,000.00		
01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA CON RODADO	VJE	8.00	523.92	4,191.36		
01.03	SERVICIO DE CONTROL TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	5,000.54	5,000.54		
MOVIMIENTO DE TIERRAS							162,377.70
02.01	HABILITACIÓN DE VÍAS DE ACCESO	KM	1.50	2,360.00	3,540.00		
02.02	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE	M3	12,900.00	6.09	78,561.00		
02.03	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	M3	10,535.00	7.62	80,276.70		
TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DE DIQUE							172,365.40
03.01	PREPARACIÓN Y SELECCIÓN DE ROCA EN CANTERA	M3	1,730.75	31.41	54,362.86		
03.02	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA FRENTA AL ÁREA DE -TRABAJO	M3	1,730.75	50.16	86,814.42		
03.03	ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE DIQUE	M3	1,730.75	18.02	31,186.12		
COSTO DIRECTO							350,935.00
COSTO INDIRECTO						8.1 %	28,600.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO							379,535.00

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI



PERU Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

Análisis de Costos Unitarios

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto: FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN EL RÍO
Sub-Proyecto: ZANA LAMBAYEQUE
Presupuesto: 01 - LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL
PROPIO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO ZAÑA, SECTO RAFAN LAGUNAS,
DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE.
Cliente: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -
PSI



LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Costo n°

Marzo -
2023

Unidad digitalizada por DAVIC
PSI-ADIC-100-100
Código: 01-01-00
Módulo: 01-01-00
Fecha: 01/03/2023

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA CON CAMA
BAJA

Rend: 2.0000 VJE/DIA

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
29 01025	Equipo MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA CON CAMA BAJA	VJE		1.0000	3.500.00	3.500.00
						3.500.00
Costo Unitario por VJE :						3.500.00

Partida	01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA CON RODADO				Rend:	1.0000 VJED/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	49	Equipo					
	01105	CAMION VOLQUETE 15 M3.	VJE		1.0000	523.92	523.92
							523.92
						Costo Unitario por VJE :	523.92

Partida	01.03	SERVICIO DE CONTROL TOPOGRÁFICO				Rend:	1.0000 GLB/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	39	Materiales					
	01104	SERVICIO DE CONTROL TOPOGRÁFICO	GLB		1.0000	5,000.54	5,000.54
							5,000.54
						Costo Unitario por	
						GLB :	5,000.54

Partida	02.01	HABILITACIÓN DE VÍAS DE ACCESO					Rend:	2.0000 KM/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	49	Equipo						
	01106	TRACTOR DE ORUGAS DE 270-205 HP	HM	1.000	4.0000	590.00	2.360.00	
							2.360.00	
						Costo Unitario por		
						KM :	2.360.00	



Unidad digitalizada por DAVIC
PSI-ADIC-100-100
Código: 01-01-00
Módulo: 01-01-00
Fecha: 01/03/2023 14:45:42 -05:00

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI



PERU

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



PSI

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

Partida	02.02	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE					Rend:	650.0000 M3/DIA		
Código	Descripción Insumo					Unidad	Cantidada	Cantidad	Precio	Parcial
	Equipo									
49 01057	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP					HM	1.000	0.0123	495.00	5.09
										5.09
									Costo Unitario por M3 :	6.09



CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Rend: 520.0000
M3/DIA

Verificado digitalmente por SUAREZ
JOSÉ ALBERTO VILLAN
0414766216 para
Módulo: Day Visto: 2023/05/07
hora: 09:05:2023 20:50:00

Código	Descripción Insumo						Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Equipo										
49 01057	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP				HM	1,000	0.0154	495.00			7.62
											7.62
							Costo Unitario por M3 :				7.62

Partida	03.01	PREPARACIÓN Y SELECCIÓN DE ROCA EN CANTERA					Rend:	260.0000 M3/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
		Materiales						
	05 01105	ROCA HABILITADA	M3		0.0900	25.00	17.25	
							17.25	
		Equipo						
	49 01057	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	HM	1.000	0.0286	495.00	14.16	
							14.16	
						Costo Unitario por M3 :	31.41	

Partida	03.02	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA FRENTE AL ÁREA DE TRABAJO					Rend:	260.0000 M3/
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
		Equipo						
	49 00025	CAMION VOLQUETE 15 M3.	HM	4,000	0.1143	315.00	35.00	
	49 01057	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	HM	1,000	0.0286	495.00	14.16	
							50.16	
						Costo Unitario por M3 :	50.16	

Partida	03.03	ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE DIQUE					Rend:	220.0000 M3/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
		Equipo						
	49 01057	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	HM	1,000	0.0364	495.00	18.02	
							18.02	



Verificado digitalmente por: AL VAREZ
DIEGO JUAN FARI 2041666216
Email: Diego.alvarez@midagri.gob.pe
Fecha: 05.05.2023 10:44:00 -05:00

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI



Costo Unitario por
M3 : 18.02

Relación de Insumos

Listado de Insumos

Proyecto: FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN EL RÍO ZAÑA, LAMBAYEQUE
Sub Proyeto: 01 - LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO ZAÑA, SECTO RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI
LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Costo a : **Marzo - 2023**

IC/ Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES					
05 01105	ROCA HABILITADA	M3	1,194.32	25.00	29,858.00
39 01104	SERVICIO DE CONTROL TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	5,000.54	5,000.54
					34,858.54
EQUIPO					
29 01009	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA CON CAMA BAJA	V/E	2.00	3,500.00	7,000.00
49 00625	CAMION VOLQUETE 15 M3.	HM	197.32	315.00	62,313.30
49 01100	CAMION VOLQUETE 15 M3.	V/E	8.00	523.92	4,191.36
49 01057	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	HM	462.89	485.00	230,031.60
49 01108	TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP	HM	6.00	590.00	3,540.00
					315,076.46
COSTO DIRECTO					350,935.00
COSTO INDIRECTO				8.1 %	28,600.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO					379,535.00

SON : TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES

Desagregado de Costos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (S/)	COSTO TOTAL (S/)
Control Técnico	Mes	1.00	15,000.00	15,000.00
Supervisión	Mes	0.00	10,000.00	0.00
Combustible y Carburantes	Glb	1.00	5,500.00	5,500.00
Viáticos por Comisión de Servicios	Glb	1.00	3,200.00	3,200.00
Pasajes y Gastos de Transporte Aéreo	Glb	1.00	4,000.00	4,000.00
Pasajes y Gastos de Transporte Terrestre	Glb	1.00	900.00	900.00
COSTO TOTAL INDIRECTO (S/)				28,600.00
El servicio de Control técnico será a todo costo (estadia, pasajes, movilidad, alimentación y control topográfico en campo)				

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI



PERU Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

f) Ciclo de transporte relacionado a la movilización y desmovilización de maquinaria con cama baja de la excavadora sobre orugas (indicar cantidad transportada, peso de maquinaria, número de viajes, peso total, duración del viaje, entre otros, que indiquen el costo de la cama baja), también relacionada al carguio y transporte de carga (indicando distancia de la cantera hacia la zona a trabajar, capacidad del volquete a utilizar, describiendo tiempo de carga, tiempo de descarga, viaje de ida-llevo, viaje de vuelta-vacio, tiempo del ciclo en minutos, tiempo de trabajo diario, eficiencia, tiempo de trabajo efectivo, número de viajes/día, volumen transportado por volquete, número de volquetes, total de material transportado en un día), que permita obtener el rendimiento del transporte de roca de la cantera hacia la zona a intervenir (m³/día).



CUADRO DE RENDIMIENTO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA

firmado digitalmente por GUARDO
GUARDO, Adolfo Ivan FALU
E414882215 hard
Rolero: Don Vito Riano
Fecha: 04-05-2023 20:54:25-05:00

DISTANCIA DE
RECORRIDO

40.00

KM

FORMULAS

$E=V*T$

DATOS

TIEMPO	MINUTOS
de CARGA	20.00
de DESCARGA	30.00
de PARQUEO	5.00
de IDA	160.00
de RETORNO	80.00


VELOCIDAD	km/h
Ida	15
Retorno	30

Traslado Cargado	295.00	minutos
Tiempo recorrido total	4.92	hrs

Traslado_1_Día	8	hrs
RENDIMIENTO	1.63	CICLOS



firmado digitalmente por ALVARO
DE ZA, Jorge Luis FALU 20411800216
hard
Rolero: Don Vito Riano
Fecha: 04-05-2023 15:44:45-05:00



CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI



PERU Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego




PSI PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

g) Cronograma de Ejecución

 **PSI**

Empleado digitalmente por: SUMARZ
ANA Katerine van PAM
01/08/2023 14:04
Firma: Dey Vitoriano
Fecha: 09/05/2023 15:41:39 -05:00

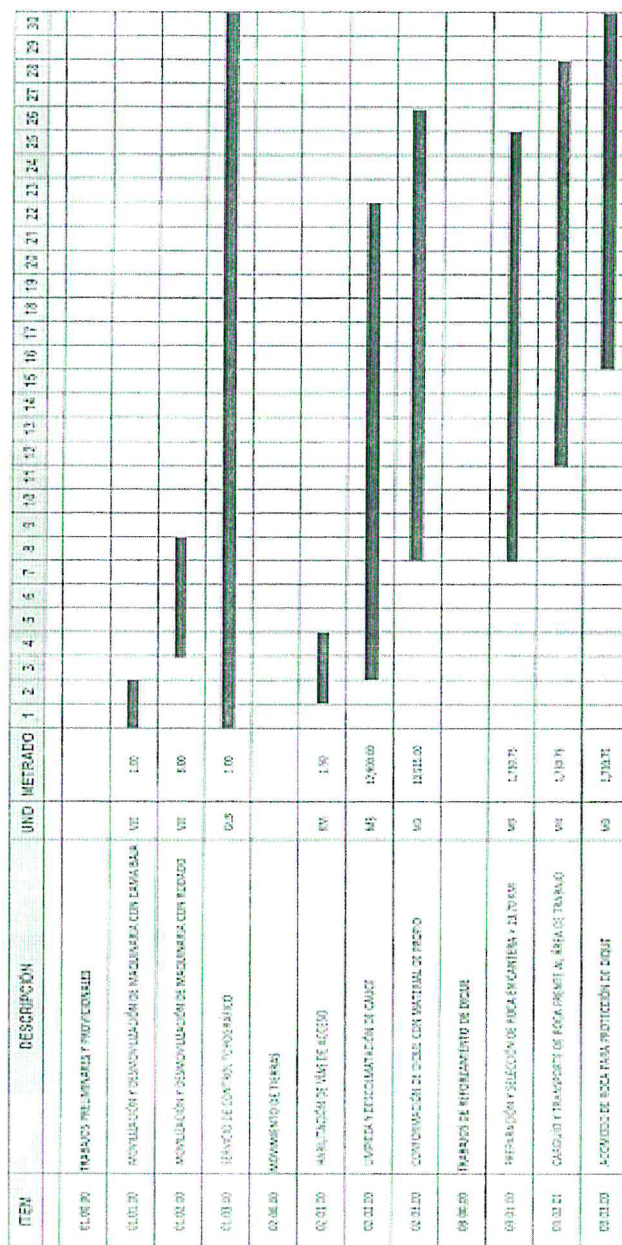

 **PSI**

Empleado digitalmente por: SUMARZ
ANA Katerine van PAM
01/08/2023 14:04
Firma: Dey Vitoriano
Fecha: 09/05/2023 15:41:39 -05:00

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI



PERÚ Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



h) Panel Fotográfico

FOTOGRAFIA N° 01




Introducido digitalmente por S214962
JUANES, Alfredo Ivan F. 014
04 14588215 1458
Módulo: Day Vista Buena
Fecha: 09/05/2023 10:54:23-25:00



La imagen muestra la colmatación del Río Zaña

FOTOGRAFIA N° 02

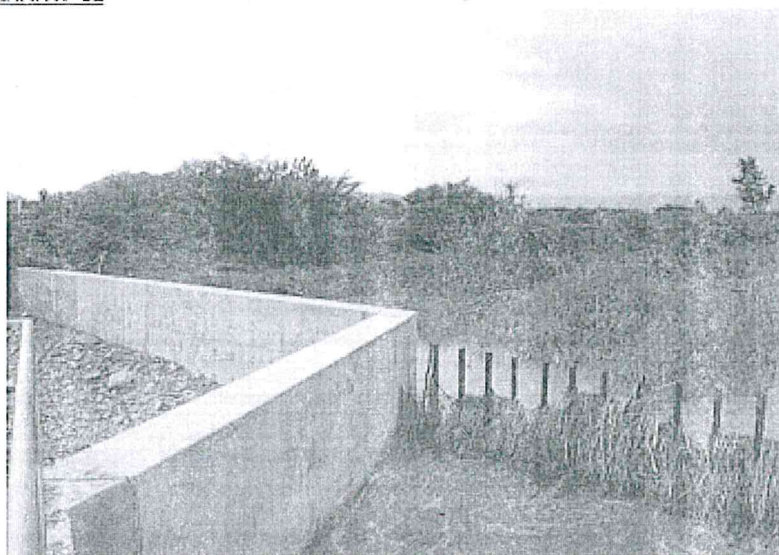

Presencia de material sólido al ingreso de la Bocatoma Rafan Lagunas Río Zaña.



Introducido digitalmente por S214962
JUANES, Alfredo Ivan F. 014
04 14588215 1458
Módulo: Day Vista Buena
Fecha: 09/05/2023 10:45:24-45:00

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI



PERU Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

 **PSI** PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES


FOTOGRAFIA N° 03



Colmatación en sector Ucupe Río Zaña

 **PSI**

Imágenes digitalizadas por SURPES
SEAD, Anexo San Juan (FAU)
0414896218-1510
Rector: Day Aníbal Quispe
Fecha: 09-09-2023 09:54:35 -05:00



FOTOGRAFIA N° 04



Río Zaña en el sector Ucupe

 **PSI**

Imágenes digitalizadas por SURPES
SEAD, Anexo San Juan (FAU)
0414896218-1510
Rector: Day Aníbal Quispe
Fecha: 09-09-2023 09:45:09 -05:00

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI




PERÚ Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Sección típica de cauce del Río Zaña

Imada digitalmente por EDUARDO
PEREZ ALVARADO para PSI
01/10/2023 15:45:00
Firma: Day Vito Huamán
eS/A: 01-05-2023 15:45:00


SECCION TIPICA DE CAUCE DE RIO, CONFORMACION DE DIQUE MARGEN IZQUIERDA CON MATERIAL PROPIO
SECCION TIPICA DE CAUCE RIO ZANJA

longitud = 502.00 m
h media = 0.50 m
B = 90.00 m



C = 4.00 m
P = 4.00 m
E = 12.00 m
D = 1.00 m
Z1 = 1.00 m
Z2 = 1.00 m

ESQUEMA DE LA MEDIDA ESTRUCTURAL

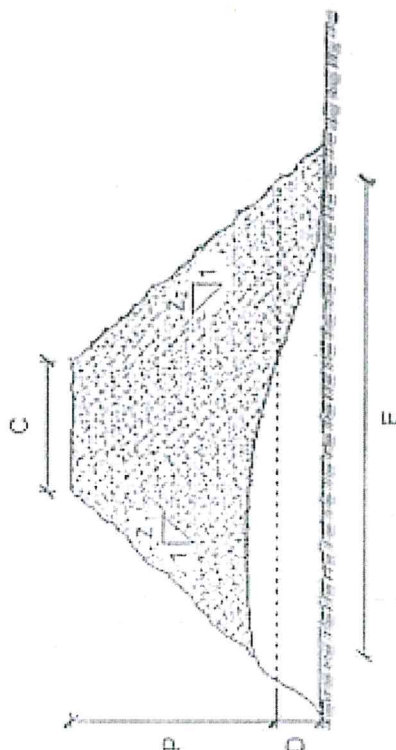

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

EDAN PERÚ

FORMULARIO EDAN PERÚ

EVALUACION NRO. 1
CODIGO SINPAD 166297
TIPO DE PELIGRO LLUVIAS INTENSAS

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Fecha 16/03/2023 1.2 Hora: 11:28
1.3 Responsable: CABANILLAS PEJERREY ALEX RAUL Dni: 16754329
Cargo: REGISTRADOR(A)
Institución: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS

1.4 Zona Afectada:

Ubicación: LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS
Departamento / Provincia / Distrito / Localidad

1.5 Condiciones climáticas de la zona afectada para la asistencia en el momento del reporte

DIA SOLEADO 24 C

1.6 Ruta de acceso sugerida para llegar a la zona afectada

Via de transporte: CARRETERA Tiempo estimado de llegada: 45 MINUTOS
Tipo de vehículo: Ruta principal
CAMIONETA CHICLAYO - MOCUPE
Lugar de partida: Ruta alterna
CHICLAYO CHICLAYO - SALTUR - MOCUPE

2.0 CARACTERÍSTICAS DEL PELIGRO DE ORIGEN NATURAL O INDUCIDO POR LA ACCIÓN HUMANA

Número	Tipo formulario	Fecha Ocurrencia	Tipo de Peligro	Ubicación
004-2023-MDL	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / LAGUNAS (CANASLOCHE)
034-2023-MDL	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / PERLES IV
01-2023-MDL	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / EL PROGRESO
04	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / MOCUPE
04-2023-MDL	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / MOCUPE
04-2023	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / MOCUPE
04-2023-MDL	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / MOCUPE
04-2023-MDL	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / MOCUPE
04-L-2023-MDL	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / RAFAN
04-L-2023-MDL	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / TUPAC AMARU - RAFAN
004-2023-MDL	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / MOCUPE
004-2023-MDL	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / MOCUPE
04C-2023-MDL	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / MOCUPE
04D-2023-MDL	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / MOCUPE
04E-2023-MDL	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / MOCUPE
04F-2023-MDL	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / EL AGROPECUARIO
04G-2023-MDL	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / NUEVO MOCUPE
04H-2023-MDL	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / MOCUPE
04H-2023-MDL	EMPADRONAMIENTO FAMILIAR (2A y 2B)	09/03/2023 19:03	LLUVIAS INTENSAS	LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / LAS VEGAS

Peligros secundarios

generados

INFESTACION DE INSECTOS (PLAGAS)

MODELO	
Descripción del peligro de origen natural e inducido por la acción humana	

LAS LLUVIAS INTENSAS OCASIONARON INUNDACION DE
VIVIENDAS, CERRADO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE
MOQUEPE, ASIENTAMIENTO HUMANO Y VIRGEN DEL
CARMEN, NUEVO MOQUEPE, PUEBLO LIBRE, TUPAC AMARU Y
LAGUNAS. AFECTACION DE LAS FUENTES DE AGUA NOTABLE
EN MOQUEPE, NUEVO MOQUEPE, PUEBLO LIBRE, TUPAC AMARU.
TAMBIEN FUERON AFECTADOS LOS CAMINOS VECINALES DE
LAS VEGAS A PERALES, DE LAS VEGAS A SAN LUIS, DE TUPAC
AMARU A MONTECRUZ, DE UCIPE A SANTA ROSA, DE MOQUEPE
A PARTIDOR SAN JUAN.
AFECTACION DE PUENTES EN MOQUEPE (PUENTE
CEMENTERIO), AFECTACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y
POSTOS MEDICAS, POR OTRO LADO EL INCREMENTO DEL
CAUDAL DEL CANAL RAFAH AFECTADO LA BOCADOMA RAFAH Y
SAN LUIS DESORDENADO EL CANAL RAFAH EN EL PROGRESO
AFECTANDO VIVIENDAS, HUBO DESBOCHE EN
PERALES, RAFAH Y TUPAC AMARU, INCREMENTO SE HA
PRODUCIDO LA ACTIVACION DE LA QUEBRADA CERRO LA
GUITARRA GENERANDO HUACOS EN NUEVO MOQUEPE, SAN
JUAN DE MIRAFLORES Y PUEBLO LIBRE. TAMBIEN HUACIDO
AFECTACION DE CANALES DE RIEGO Y DETERIORO

3.0 DAÑOS A LA VIDA Y A LA SALUD DE LA PERSONA

3.1 Población (damnificada y afectada) con respecto al daño en las viviendas

Número de Familias				Número de Personas		
Localidad	Afecta.	Dañifica.	Total	Afecta.	Dañifica.	Total
LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / NUEVO MOQUE	225	22	247	505	82	587
LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / SAN LUIS	18	2	20	29	10	39
LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / EL AGROPECUARIO	36	8	44	90	22	112
LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / PUEBLO LIBRE	111	6	117	165	17	183
LAMBAYEQUE / CHICLAYO / LAGUNAS / MOQUE	311	69	380	751	180	931
Total de daños por vivienda:	701	107	808	1,541	311	1,852
Total de daños por Medios de Vida:	0	-	0	0	-	0
Total General:	701	107	808	1,541	311	1,852

3.2 Grupos Etarios y Condición

Condición	Menor de 1 año		1 a 4 años		5 a 9 años		10 a 14 años		15 a 17 años		18 a 29 años		30 a 39 años		Mayor de 40 años		Gratificación
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
DAÑINI	2	0	12	12	14	15	11	18	9	6	65	82	13	14	21	17	0
AFFECTA	0	3	38	26	68	42	62	68	39	36	336	418	68	115	113	111	2

3.3 Lesionados (Heridos)

Lugar de atención	Graves	Moderada	Léve	Con tratamiento fornal	Evacuación
-------------------	--------	----------	------	---------------------------	------------

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

3.4. *Phallidae*

Apellidos y nombres	Edad	Sexo	Lugar de fallecimiento	Fuente
---------------------	------	------	------------------------	--------

3.5 Desaparecidos

Apellidos y Nombres	Edad	Sexo	Lugar / Dirección donde desapareció
---------------------	------	------	-------------------------------------

3.6 Personal de Primera Respuesta Afectado (Salud, Bomberos, Brigadistas)

Potencial Humano	Total personal	Datos a la salud		Desaparecida	Observaciones
		Lesionado	Fallecido		
Total	0	0	0	0	

4.0 DAÑOS MATERIALES

4.1 A las viviendas (EN BASE AL TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES DE LA VIVIENDA)

Tipo	Destruída	Inhabitable	Afectada
ADOBE O TAPIAL	15	86	500
LADRILLO O BLOQUE DE CEMENTO	2	0	189
PIEDRA CON BARRO (PIRCA)	0	1	0
PILORA O SILLAR CON CAL O CEMENTO	1	0	1
QUINCHA (CAÑA CON BARRO)	0	2	0
Total	18	89	700

4.2 A los servicios / Infraestructura de Salud de la localidad

Establecimiento de Salud (Nombre por el que se le conoce)	Condición	Funciona	¿Porque?	Observación
PUESTO DE SALUD NUEVO MOCUPE	AFECTADA	TOTALMENTE	FILTRACIONES EN EL TECHO - (AREAS AFECTADAS OBSTETRICIA, TOPICO, BAÑO, CORTE DE ENERGIA ELECTRICA Y DAÑO EN PAREDES)	SE REQUIERE APLICAR ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y COLOCACION DE CALAMINAS PARA PROTEGER EL TECHO Y ASÍ EVITAR POSIBLES FILTRACIONES DE AGUA
PUESTO DE SALUD LAGUNAS	SIN AFECTACION	PARCIALMENTE	NO PRESENTA DAÑOS	LEVE FILTRACION DE AGUA EN EL TECHO
PUESTO DE SALUD TUPAC AMARU - BAFAN	AFECTADA	TOTALMENTE	FILTRACIONES EN LAS AREAS DE ENFERMERIA, MEDICINA, ALMACEN, TOPICO DAÑOS A EQUIPOS Y OTROS: ARCHIVADORES Y BALANZA MOJADOS POR LA FILTRACION DE AGUA	ENFERMERIA CON CERAMICO LEVANTADO Y PAREDES CON APARICION DE HONGOS POR LA HUMEDAD

4.3 Daños a Instalaciones y Vehículos de Primera Respuesta

Entidad	Destru.	Inhabita.	Afectado	Vehiculos	Operati.	Inopera.
---------	---------	-----------	----------	-----------	----------	----------

4.4 A la Infraestructura Educativa

Nombre de la Institución Educativa (I.E.E.)	Total aulas	Daños (Número de Aulas)			Tipo de Nivel Educativo / Privado o Nacional
		Destru.	Inhabita.	Afectada	
I.E.E.I. VIRGEN DE GUADALUPE N°006 - MOQUEPE	4	0	0	0	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
I.E.E.I. ANGEL DIVINO N°173 - PUEBLO LIBRE	2	0	0	0	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
I.E.E.5. TUPAC AMARU	9	0	0	2	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
I.E.E.P. DIVINO MAESTRO N° 11099 - MONTECRUZ	6	0	0	3	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
I.E.E.I. CORAZON DE JESUS N°122 - LAGUNAS	3	0	0	0	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
I.E.E.P. JUAN PABLO SEGUNDO N°10031 - PUEBLO LIBRE	6	0	0	3	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
I.E.E.P.S. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI N° 10832 - NUEVO MOQUEPE	20	0	0	0	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
I.E.E.P. N° 10020 - MOQUEPE	12	0	0	1	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
I.E.E.I. N° 463 - PERDLES	1	0	0	1	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
I.E.E.I. N° 322 - UCUPE	6	2	0	0	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

U.E.E. SAN PEDRO DE LOS RIOS - MOQUE	0	0	0	0	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
U.E.E. JULIO ARMAS LOYOLA - LAGUNAS	9	0	0	0	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
U.E.E.P. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ N° 10777	0	0	0	0	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
U.E.E. ESTRELLITAS DEL CARMEN N°467 - VIRGEN DEL CARMEN	2	0	0	2	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
U.E.E. CECECOM - EL PROGRESO	4	1	0	2	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
U.E.E.P. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ N° 296431 - TUPAC AMARU	6	0	0	0	EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EBR
Total	21	1	0	2	

4.5 A la Infraestructura de Transporte

4.5.1: Daños en carreteras, vías férreas y otros

Tipo de Vías de Comunicación	Daños (condición)		Cantidad de tramos
	Destruidos	Afectados	
TROCHA CARROZABLE	700	0	1
UBICACIÓN: E643012.00, N9219784.00 - PERALES			
OBSERVACIÓN: CAMINO CARROZABLE DESTRUIDO POR LAS INTENSAS LLUVIAS			
TROCHA CARROZABLE	350	0	1
UBICACIÓN: E643524.00, N9219639.00 - CARRETERA A LAS VEGAS			
OBSERVACIÓN: TROCHA CARROZABLE DESTRUIDA A CAUSA DE LAS INTENSAS LLUVIAS			
TROCHA CARROZABLE	1000	0	1
UBICACIÓN: E643142.00, N9221354.00 - CAMINO A MONTECRUZ			
OBSERVACIÓN: TROCHA CARROZABLE DESTRUIDA POR LAS INTENSAS LLUVIAS			
TROCHA CARROZABLE	980	0	1
UBICACIÓN: E643532.04, N9218950.71 - SAN LUIS			
OBSERVACIÓN: TROCHA CARROZABLE DESTRUIDA POR LAS FUERTES LLUVIAS			
TROCHA CARROZABLE	1200	0	1
UBICACIÓN: E645966.00, S9221208.00			
OBSERVACIÓN: TROCHA CARROZABLE DESTRUIDA POR LAS INTENSAS LLUVIAS			
TROCHA CARROZABLE	1800	0	1
UBICACIÓN: E651497.63, N9229485.00			
OBSERVACIÓN: TROCHA CARROZABLE DESTRUIDA POR FUERTES LLUVIAS			
VÍAS URBANAS	0	7000	1
UBICACIÓN: E644580.20, S9221901.39 - TUPAC AMARU RAFAEL			
OBSERVACIÓN: CARRETERA TRAMO DE TUPAC AMARU RAFAEL A LAGUNAS			
VÍAS DEPARTAMENTALES	0	6200	1
UBICACIÓN: E652239.58, N9226965.06			
OBSERVACIÓN: CARRETERA AFECTADA (HUECOS) - EL AGROPECUARIO HASTA NUEVO MOQUE			
TROCHA CARROZABLE	1300	0	1
UBICACIÓN: E650844.46, N9228398.74			
OBSERVACIÓN: TROCHA CARROZABLE - CAMINO HACIA EL PROGRESO			

Estado: Liquidación por Autocancelación
 Fecha: 08/05/2023
 Hora: 10:00:00
 Usuario: Jhon Jairo Buitrago
 Hora: 08/05/2023 10:00:00

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

TROCHA CARROZABLE	0	6.700	1
UBICACION: E654535.00, N9232438.00			
OBSERVACION: TROCHA CARROZABLE QUE CONECTA UCUPE CON CASERIO EL COLOCHE			
TROCHA CARROZABLE	0	2800	1
UBICACION: E 652281.04, N 9226417.65			
OBSERVACION: TROCHA CARROZABLE QUE CONECTA A VIRGEN DEL CARMEN CON LA HUACA TEODORA			
Total	7.330	24.200	11

4.5.2: Daños en puentes, puertos y otros

Tipo de Infraestructura	Daños (cantidad)		Ubicación	Observaciones
	Destru.	Afecta.		
Total	0	0		

4.6 A la Infraestructura de Riego

4.6.1 Daños en canales, defensa ribereña y otros

Tipo de Infraestructura	Daños (condición)		Cant. Tramos	Ubicación (Indicar Progresiva)
	Destru.	Afecta.		
CANALES DE RIEGO	0	2000	14	WG 04- UTM 651513 - 9729580 CANAL DE RIEGO RAFAN - LAGUNAS, 1 SECTOR PROGRESO, PUEBLO LIBRE, POZO 1.)
CANALES DE RIEGO	0	40	1	CANAL DE RIEGO DERIVACION UCUPE - MOCUPE, SECTOR PALOMINO
CANALES DE RIEGO	0	3000	1	CANAL MOCUPE SECTOR SAN JUAN Y PUENTE CEMENTERIO
ORENES	0	5800	1	SECTOR MOCUPE
ORENES	0	3500	1	SECTOR MONTECRUZ - LAGUNAS
DIQUEES	0	1490	1	SECTOR POZO 1, RIO ZAÑA (LIMPEZA, DECOL Y CONFOR DIQUE MI RIO ZAÑA)
Total	0	15.930	19	

4.6.2 Daños a las bocatomas, reservorios y otros

Tipo de Infraestructura	Daños (condición)		Ubicación
	Destru.	Afecta.	
BOCATOMAS	1	0	LA BOCATOMA RAFAN LAGUNAS SE COLMATO CON ARENA Y PIEDRA - Y AFECTACION DE DIQUE
Total	1	0	

4.7 A los Locales Públicos

Locales Públicos	Daños (cantidad)		
	Destru.	Inhabi.	Afecta.
Total	0	0	0

4.8 A la Infraestructura de Servicios Básicos

Locales Públicos	Cuenta con Servicio?	Sin servicio (%)	Daños (cantidad)	
			Destruídos	Afectados
Total	0	0	0	0

4.9 A otros Servicios Básicos

Locales Públicos	Cuenta con Servicio?	Sin servicio (%)	Observación
Total	0	0	

5.0 DAÑOS A SECTORES DIVERSOS

5.1 A la Producción Agrícola

5.1.1 Cultivos

Tipo	Daños (Has)		Lugar	Variedad de cultivo
	Perdidas	Afectadas		
Total	0	0		

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

5.1.2 Agricultura

Tipo	Daños (unidades)		Lugar
	Perdidas	Afectadas	
Total			

5.1.3 Pesca

Tipo	Perdidas	Afectadas	Lugar
Total	0	0	

5.2. A la Producción Pecuaria

Especie	Daños (unidades)		Lugar
	Perdidas	Afectadas	
Total	0	0	

5.3 Medios de Vida

Detallar comentarios a los Medios de Vida

CULTIVOS AFECTADOS 200, N° PRODUCTORES 85, CULTIVOS PERDIDOS 100, N° PRODUCTORES 35, MONTO APROX DE PERDIDAS 200000

5.3.1. Total Daños por Medios de Vida

Tipo de Actividad	N° Familias Afectadas	N° Personas Afectadas
Total	0	0

6.0 ANÁLISIS DE NECESIDADES

6.1 Acciones Prioritarias:

Acción

6.2 Necesidades Prioritarias de Asistencia Humanitaria

TECHO (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

SABRIGO (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

ALIMENTOS (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

UTENSILIOS (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

6.3 Necesidades de Recursos Materiales y/o Equipos para Servicios Comunales

HERRAMIENTAS (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

EQUIPOS (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

MAQUINARIA (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

LETRINAS (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

OTROS MATERIALES (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

6.4 Necesidades para la Atención de Salud

POTENCIAL HUMANO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
-------------	----------

MEDICINAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
-------------	----------

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
-------------	----------

6.5 Necesidades para la atención agropecuaria

INSUMOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SEMILLAS	100

7.0 COORDINACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

8.0 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES GENERALES

EL PUNTO CRÍTICO EN EL RÍO ZANA UBICADA EN SECTOR POZO 1, SE DESBORDÓ EL RÍO ZANA POR COIMATACIÓN Y EROSIÓN DEL TALUD, EL CUAL REPRESENTA UN ALTO RIESGO DE AFECTACIÓN DE 2037 HAS DE TERRENO DE CULTIVOS CORRESPONDIENTE 1945 FAMILIAS

9.0 RECOMENDACIONES FINALES

Archivos Adjuntos:

(presione ctrl + click izquierdo del mouse para abrir el archivo en otra ventana)

ESTADO DE EVALUACIÓN/REVISIÓN:

Institución:

Nombre, Apellidos y Firma del (la)
Evaluador(a) EDAN PERÚ

DNI:

Firma y Sello Jefe(a) Oficina de
Defensa Civil

DNI:

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTAÑEDA**
Segundo Atiles Castillo Espinoza
ALCALDE

Firma y Sello del Gobernador(a) /
Regional/Alcalde(sa)

DNI:

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de, que celebra de una parte el PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES –PSI, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20414868216, con domicilio legal en AV. REPUBLICA DE CHILE N° 485 distrito de Jesús María, representada por el Lic. JAVIER DOROTEO ALCANTARA PASCO, identificado con DNI N° 18182401, y en su calidad de jefe de la Unidad de Administración, designado mediante Resolución Directoral N°14-2023 MIDAGRI-DVDAFIR/PSI, de fecha 30 de Enero del 2023, en virtud de la Delegación establecida en el literal i) del artículo 3 de la presente Resolución, y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro del **CONTRATACION DIRECTA N°15-2023 MIDAGRI-PSI** para la contratación de servicio de "LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO SANTA, SECTOR UREÑA BAJA SAN IGNACIO, DISTRITO DE GUADALUPITO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto, "LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO SANTA, SECTOR UREÑA BAJA SAN IGNACIO, DISTRITO DE GUADALUPITO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO⁹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

⁹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de hasta 20 DIAS CALENDARIOS, el mismo que se computa desde el día siguiente de suscrita el Acta de inicio de actividades.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases del procedimiento de selección Contratación Directa N°15--2023 MIDAGRI-PSI, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

- *“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

Importante

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES:

PENALIDADES				
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Unidad	Forma de Cálculo	Procedimiento

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	Por cada día de ausencia del personal.	0.50 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
2	En caso el responsable de la Dirección Técnica no se encuentre presente en el lugar de la prestación de la actividad, excepto en Caso Fortuito o Fuerza Mayor, debidamente acreditado.	Por ocurrencia	0.15 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
3	Cuando el Contratista no cumple en presentar el Informe Final correspondiente, dentro del plazo señalado	Por cada día de incumplimiento	0.20 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
4	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Por cada ocurrencia	0.50 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
5	Por no presentar el Plan de Trabajo y cronograma de utilización de maquinaria al Control Técnico en el plazo establecido.	Por cada día de incumplimiento	0.10 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
6	Por no iniciar los trabajos materia de la prestación dentro del plazo establecido, luego de suscrita el Acta de Inicio del Servicio.	Por cada día de atraso	0.30 UIT	Según informe del Control Técnico o Monitor o Ingeniero de Seguimiento
7	No cumple con proveer la maquinaria indicada según el cronograma de utilización y ejecución de maquinarias, aprobado según el Plan de Trabajo y que esta última no se encuentre 100% operativa.	Por ocurrencia en el incumplimiento y por cada maquinaria	0.3 UIT	Según informe del Control Técnico o Inspector o Monitor o Ingeniero de Seguimiento

- El PSI durante la etapa de ejecución contractual, tomara las medidas preventivas necesarias, a fin de verificar el cumplimiento en lo concerniente a la maquinaria, el

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹⁰

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del

¹⁰ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será resuelto a través de por un Tribunal Arbitral¹¹ conformado por tres (3) árbitros, proponiéndose a los efectos las siguientes instituciones arbitrales³ y respetándose el orden de prelación que se establece a continuación:

1. Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
2. Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Lima.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"


"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹².

¹¹ Podrá establecerse también que la controversia sea resuelta por un Árbitro Único, para ello deberá tenerse en consideración el objeto del contrato (bienes o servicios), la complejidad o especialidad del bien o servicio materia de contrato, así como el monto contractual, entre otros.

¹² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



ANEXOS

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

CONTRATACION DIRECTA N° 14-2023 MIDAGRI-PSI

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹³	Sí	No	
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios¹⁴

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹³ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

¹⁴ Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 14-2023 MIDAGRI-PSI
Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁵	Sí	No	
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁶	Sí	No	
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁷	Sí	No	
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.

¹⁵ En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

¹⁶ Ibídem.

¹⁷ Ibídem.

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios¹⁸

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁸ Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.


CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

ANEXO N° 2

**DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 14-2023 MIDAGRI-PSI
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- 
- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
 - ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
 - iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
 - iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
 - v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
 - vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
 - vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°14-2023 MIDAGRI-PSI
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CANAL PABUR, DISTRITO LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.


CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°14-2023 MIDAGRI-PSI
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°14-2023 MIDAGRI-PSI

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **CONTRATACION DIRECTA N°14-2023 MIDAGRI-PSI**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]¹⁹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²⁰

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%²¹

¹⁹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁰ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²¹ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1

Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2

Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad



CONTRATACION DIRECTA N°14-2023-MIDAGRI PSI

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°14-2023 MIDAGRI-PSI
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TOTAL			

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".



ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°14-2023 MIDAGRI-PSI
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²²	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²³	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁴ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁵	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁶	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁷
1										
2										
3										
4										

²² Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.


²³ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho período.

²⁴ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

²⁵ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

²⁶ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁷ Consignar en la moneda establecida en las bases.



N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²²	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²³	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁴ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁵	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁶	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁷
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
 Firma, Nombres y Apellidos del postor o
 Representante legal o común, según corresponda

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
