

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <div>• Abc</div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <div>• Abc</div>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <div>• Xyz</div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022



BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-HOMOLOGACION N°44- 2023-GRA-SEDECENTRAL/OEC

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACIÓN DE BIENES

**ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS PARA AULAS
FUNCIONALES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TALLER
DE COMPUTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N 12 CRISTO REY DE LA
LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA,
PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO"**

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Advertencia

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo

que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Gobierno Regional de Ayacucho – Sede Central.
RUC N° : 20452393493
Domicilio legal : Jr. Callao N°122-Ayacucho-Huamanga-Ayacucho.
Teléfono: : 066 – 289505
Correo electrónico: : Abastecimiento@regionayacucho.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS PARA AULAS FUNCIONALES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TALLER DE COMPUTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

ITEM PAQ.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	SILLA DE SECUNDARIA 1°, 2° GRADO	UND	180
2	SILLA DE SECUNDARIA 3°, 4° GRADO	UND	180
3	SILLA DE SECUNDARIA 5° GRADO	UND	152
4	MESA DE SECUNDARIA 1°, 2° GRADO	UND	180
5	MESA DE SECUNDARIA 3°, 4° GRADO	UND	180
6	MESA DE SECUNDARIA 5° GRADO	UND	90

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N°02 de fecha 30 de marzo del 2023

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO APLICA

1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO APLICA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 0.10 (10/100 Soles) por cada copia simple tamaño A4 de acuerdo al TUPA de la institución en la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal (Jr. Callao 122 3er. Piso - Ayacucho).

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.11. BASE LEGAL

- ✓ Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.
- ✓ Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector público para el año fiscal 2023.
- ✓ Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector público para el año fiscal 2023.
- ✓ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias
- ✓ Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225.
- ✓ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y modificatorias.
- ✓ Decreto Supremo N° 162-2021-EF Directivas del OSCE.
- ✓ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- ✓ Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- ✓ Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- ✓ Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- ✓ Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- ✓ Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos², la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. **(Anexo N° 1)**
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE³ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. **(Anexo N° 2)**
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo N° 3)**

² La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

³ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**⁴
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en **SOLES**. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los **“Requisitos de Calificación”** que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁵.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N° 10)**.

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

⁴ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁵ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁶ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación ⁷ (**Anexo N° 11**).
i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁸.
j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete⁹.

Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*
- En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁰.*
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el*

⁶ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁷ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁸ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

⁹ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

¹⁰ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la Entidad, ubicado en Jr. Callao N°122 – Ayacucho-Huamanga-Ayacucho.

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un único pago.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del ALMACEN DE LA OBRA.
- Informe del funcionario responsable del RESIDENTE DE OBRA CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DE OBRA emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en la oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS PARA AULAS FUNCIONALES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TALLER DE COMPUTO

PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA II.EE MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY, LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Órgano o Unidad Orgánica:	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – SUB GERENCIA DE OBRAS
Meta Presupuestaria:	0016
Nombre del Proyecto:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA II.EE MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY, LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".
Fuente de financiamiento:	RECURSOS ORDINARIOS
Denominación de la Adquisición :	ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS PARA AULAS FUNCIONALES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TALLER DE COMPUTO

1. FINALIDAD PÚBLICA:

El Gobierno Regional de Ayacucho a través del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA II.EE MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY, LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", busca brindar la adecuada prestación del servicio educativo, tenido como objetivo principal dotar de mobiliarios y equipamiento integral a la institución educativa.

2. ANTECEDENTES:

El Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la sede central, viene ejecutando la META N° 0016 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA II.EE MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY, LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en el ejercicio fiscal 2023.

Así mismo como ente Rector del Desarrollo de la Región Ayacucho, tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada garantizando la creación de fuentes de empleo y el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo nacionales, regionales y locales.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Seleccionar una persona natural o jurídica para la ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS PARA AULAS FUNCIONALES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TALLER DE COMPUTO, que son muebles que sirven para desarrollar actividades en ambientes básicos y complementarios.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211641

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



Estos muebles en cuanto a sus dimensiones, materiales y geometría estarán conforme la Norma Técnica denominada "Criterios de Diseño para Mobiliario Educativo de la Educación Básica Regular" aprobado mediante la resolución viceministerial N° 331-2021-MINEDU, estos muebles son esenciales para el cumplimiento integral del mobiliario de la obra **META N° 0016 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA II.EE MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY, LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**.

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS:

4.1. NOMBRE DEL PROYECTO.

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA II.EE MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY, LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

4.2. DESCRIPCION DEL BIEN A CONTRATAR:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	SILLAS DE SECUNDARIA 1°, 2° GRADO	und	180.00
2	SILLAS DE SECUNDARIA 3°, 4° GRADO	und	180.00
3	SILLAS DE SECUNDARIA 5° GRADO	und	152.00
4	MESAS DE SECUNDARIA 1°, 2° GRADO	und	180.00
5	MESAS DE SECUNDARIA 3°, 4° GRADO	und	180.00
6	MESAS DE SECUNDARIA 5° GRADO	und	90.00

4.3. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

Comprende la **ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS PARA AULAS FUNCIONALES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TALLER DE COMPUTO**, que son muebles que sirven para desarrollar actividades en ambientes básicos y complementarios. Estos muebles en cuanto a sus dimensiones, materiales y geometría estarán conforme la Norma Técnica denominada "Criterios de Diseño para Mobiliario Educativo de la Educación Básica Regular" aprobado mediante la resolución viceministerial N° 331-2021-MINEDU.

4.4. COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

La **ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS PARA AULAS FUNCIONALES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TALLER DE COMPUTO**, deben cumplir con Norma Técnica denominada "Criterios de Diseño para Mobiliario Educativo de la Educación Básica Regular" en cuanto a las dimensiones, materiales y geometrías, en adelante se detalla las especificaciones técnicas por cada ítem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

- El tipo de madera a requerir será de madera tornillo o cachimbo rojo.
- Las demás características serán de acuerdo a la ficha de homologación adjunto al presente.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

Ing. Ricardo Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98719



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



4.5 REGLAMENTOS TÉCNICOS,

Estos muebles deben cumplir la Norma Técnica denominada "Criterios de Diseño para Mobiliario Educativo de la Educación Básica Regular" aprobado mediante la resolución viceministerial N° 331-2021-MINEDU.

5. GARANTÍA COMERCIAL:

En el caso de adquisición de implementos (muebles) se requiere una garantía comercial por defectos de diseño y/o fabricación, el cual será de 1 año contados a partir de la fecha en que se otorga la conformidad de recepción de los muebles. Dicha garantía cubre el reemplazo y/o reparación del bien adquirido en un plazo máximo de 2 días de haberse notificado al proveedor. El proveedor deberá otorgar una garantía del bien, el cual deberá estar plasmado en su propuesta o cotización.

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

El proveedor, deberá cumplir con los siguientes requisitos, de acuerdo a los compromisos establecidos y normatividad vigente:

- ✓ Ser Persona Natural o Persona Jurídica.
- ✓ Tener Registro Único de Contribuyente habilitado.
- ✓ Poseer Código de Cuenta Interbancario registrado.
- ✓ Tener Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente

7. OTRAS CONDICIONES:

El postor será responsable ante el Gobierno Regional, por los daños o perjuicios que pudiera ocasionar a la obra, por entregar el bien con desperfectos o adulterados. El proveedor se hará cargo en su totalidad del gasto que ocasione a la obra.

La calidad y características de los materiales serán verificadas por el responsable de Almacén de Obra, y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor de Obra.

8. LUGAR, PLAZO Y FORMA DE ENTREGA:

LUGAR:

Los Muebles deberán ser entregados en los ambientes nuevos construidos de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.I.E.E MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY, LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", ubicado en la Jr. Redentor del distrito de CoraCora, Provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, previa coordinación con el Ingeniero Residente y Supervisor de Obra.

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo total de entrega de los bienes es hasta treinta (30) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

NOTA:

- En caso de no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, el bien no será recepcionado, bajo responsabilidad del proveedor de dichos muebles.

FORMA DE ENTREGA:

- La entrega de los muebles se realizar en cada aula correspondiente a las aulas funcionales, innovación tecnológica y taller de cómputo en los niveles 1, 2 y 3 de la

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98715



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



institución educativa, los cuales el proveedor del servicio debe prever su movilización y presentación en estos ambientes.

- El proveedor deberá presentar certificados de calidad en original del mueble ofertado del cumplimiento de las propiedades mecánicas
- El costo de entrega del mueble incluye (carga y descarga) y movilización hasta el la Obra en el distrito de CoraCora, Provincia de Paríacochas, departamento de Ayacucho, además de todos los impuestos de ley que incurra su traslado.
- Para la entrega de los muebles, estos deben estar todos embalados unitariamente por plásticos film para conservar hasta la entrega del proyecto.
- La calidad, características, cantidad y otras condiciones serán verificadas por el área usuaria, el cual incurrirá en la forma de pago. El proveedor deberá tener en stock y estar en la capacidad de atender el requerimiento según las necesidades del requerimiento.

9. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE ENTREGA:

- ✓ La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 168 del Reglamento de la Ley N°30225.
- ✓ En este caso, la recepción será por el responsable del Almacén de Obra y quien deberá remitir los documentos sustentatorios para su trámite de pago.
- ✓ La conformidad de otorgada por el Residente de obra y supervisor de obra, los mismos que se tramitarán de acuerdo al sistema del Gobierno Regional de Ayacucho.

10. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

La forma de pago será PAGO UNICO a la entrega total de los muebles solicitados.

11. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS:

La recepción conforme de la entidad, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. De acuerdo al Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de responsabilidad del proveedor para esta adquisición será de un (01) año, contados a partir de otorgada la conformidad de los muebles.

12. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACION:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Dónde: F tiene los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes,
Servicios en general, consultorías y ejecución de obras: $F = 0.40$.

Para plazos mayores a sesenta (60) días:

Para bienes, servicios en general y consultorías: $F = 0.25$.

Para obras: $F = 0.15$.

13. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor de los bienes debe guardar reserva absoluta y confidencialidad en el manejo de la información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Richard Wilver Bancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



14. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La presente contratación se rige por el sistema A SUMA ALZADA.

15. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

El gasto que origine la adquisición del bien será afecto a la siguiente cadena funcional:

Presupuesto : 2023
Sector : 99 GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Und. Eject. : 000770 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL
Función : 22 EDUCACIÓN
Div Funcional : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Gru.Funcional : 105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Meta : META N° 0016 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA II.EE MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY, LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".
Fte Fto : RECURSOS ORDINARIOS

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SUB GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SUB GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Richard Wilber Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

LAS CARACTERISTICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS SERAN DE ACUERDO A LAS FICHAS DE HOMOLOGACION APROBADO MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL N°161-2023-MINEDU DE FECHA 17/03/2023, ADJUNTO AL PRESENTE.



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 500,000.00 (QUINIENTOS MIL CON 00/100), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><i>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 101,980.00 CIENTO UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</i></p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes VENTA DE MESAS Y SILLAS EN GENERAL.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores</p>

¹ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FIERA, MEJORAMIENTO DEL NIVEL EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLONIA SANTA MARÍA N° 12 COMITÉ REG. DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACUTSI, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO


Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FIERA, MEJORAMIENTO DEL NIVEL EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLONIA SANTA MARÍA N° 12 COMITÉ REG. DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACUTSI, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO


Ing. Richard Wilver Gancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentadora correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO N°100 "MARTÍN CRUZ" Y DE LA MATRILLA DEL COLEGIO N°100, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Luis Escobar Bellido
Representante de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO N°100 "MARTÍN CRUZ" Y DE LA MATRILLA DEL COLEGIO N°100, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p> <i>i</i> = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio <i>i</i> O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio </p> <p style="text-align: right;">[100] puntos</p>

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de , que celebra de una parte GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°20452393493, con domicilio legal en JR. CALLAO N° 122, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°44-2023-GRA-SEDECENTRAL/OEC-1** para la contratación de ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS PARA AULAS FUNCIONALES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TALLER DE COMPUTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS PARA AULAS FUNCIONALES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TALLER DE COMPUTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹¹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en UN UNICO PAGO, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la

¹¹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [30] DIAS CALENDARIOS, el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por ALMACEN DE OBRA y la conformidad será otorgada por RESIDENTE DE OBRA CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DE OBRA en el plazo máximo de [SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de **UN (1)** año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere

lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹²

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

¹² De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹³.

¹³ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁴		Sí	No
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹⁵

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁴ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹⁵ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁶		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁷		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁸		Sí	No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

¹⁶ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

¹⁷ Ibídem.

¹⁸ Ibídem.

2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹⁹

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁹ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]**, de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].**
2. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].**

b) Designamos a **[CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con **[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]**.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. **OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]** [%]²⁰

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. **OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]** [%]²¹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%²²

²⁰ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²¹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²² Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²³	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁴	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁵ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁶	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁷	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁸
1										
2										
3										
4										

²³ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁴ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²⁵ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

²⁶ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

²⁷ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁸ Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²³	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁴	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁵ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁶	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁷	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁸
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

ANEXO N° 11

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

FICHA DE HOMOLOGACIÓN

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

Código del CUBSO	: 56121505-00390356
Denominación del requerimiento	: Mesa de metal y madera para estudiante de 5° de secundaria.
Denominación técnica	: Mesa de estudiante de secundaria de metal y madera de 50 cm x 60 cm x 75 cm.
Unidad de medida	: Unidad.
Resumen	: Mesa de estructura de metal tablero de madera y accesorios de fijación para 01 estudiante, con 750 mm de altura total, 500 mm de profundidad y 600 mm de ancho. Destinada a la población estudiantil de 5° del nivel secundaria de la Educación Básica Regular.

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

La mesa de metal y madera para estudiante de 5° del nivel secundaria, está conformado por los siguientes componentes:

- Estructura de Mesa
- Tablero de mesa
- Ensamblaje y accesorios

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
"60 A MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA E.
COLEGIO VIOLENTINO S. N.º 12 CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANCHIS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

2.1.1. Características y especificaciones del bien.

Nº	Características	Especificación	Documento Técnico de Referencia
1. Estructura de mesa			
1.1	Material	Tubo mecánico electro soldado de acero laminado al frío	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.3.1.1
1.2	Resistencia a la tracción	≥ 45 ksi [310 MPa]	ASTM A513 Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing Tabla S5.1
1.3	Límite de fluencia	≥ 32 ksi [221 MPa]	
1.4	Composición química	C máx. 0.15% Mn máx. 0.60% P máx. 0.035% S máx. 0.035%	ASTM A513 Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing Tabla 1 y Tabla 2

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA E. COLEGIO VIOLENTINO S. N.º 12 CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANCHIS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: RCBEL
CANO Tiberto Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 19:11:12 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

1.5.	Sección de tubo: arriostre horizontal inferior	1" x 1"	Establecido por el Ministerio
1.6.	Sección de tubo: arriostre horizontal superior	1" x 2"	
1.7.	Espesor nominal de la pared del tubo estructura principal	1,5 mm calibre 16	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos: Numeral 5.3.1.1. Tabla 11
1.8.	Dimensiones estructurales	Véase Anexo N° 03 Lámina L-13	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Cuadro N°15
1.9.	Soldadura	Metal Inner Gas (MIG) de micro alambre que no dejará escoria, previamente decapada.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos: Numeral 5.3.1.1 apartado c)
		Todas las uniones soldadas entre elementos metálicos deberán tener un cordón de soldadura continuo en todo el perímetro de la unión. Las uniones deberán tener un acabado uniforme.	Establecido por el Ministerio
1.10.	Acabado	Preparación de la superficie: Los tubos deben recibir un baño de desengrase, de desoxidación (decapado), de reactivado, de fosfatizado y un baño para pasivado con el objeto de eliminar óxidos, escamas de óxido y grasas. Luego debe ser sometido a un proceso de secado para eliminar toda humedad interior y exterior.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos: Numeral 5.3.2
		Recubrimiento en polvo; recubrimiento en polvo termo convertible, de tipo epoxi o epoxi-poliéster. La película depositada será de 80 micrones mínimo, brillo semimate. Curado mediante homeado para que adquiera la apariencia adecuada, las propiedades mecánicas y químicas finales.	

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO WATO WATA, CANTON DE CORA CORA, PROVINCIA DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellaco
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI YANCO Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:11:40 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTRO PARRAFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 06:33:41 -05



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

1.11.	Color	RAL 7032	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Anexo N° 02
1.12.	Defectos no tolerables	Deformaciones, grietas, puntas o filos, salpicaduras y espacios vacíos entre o los elementos metálicos	Establecido por el Ministerio
2. Tablero Mesa			
2.1	Especies de madera (Véase Nota 01, Nota 02 y Nota 03)	AGUANOMASHA (<i>Machaerium inundatum</i>)	Establecido por el Ministerio
		CACHIMBO ROJO (<i>Cariniana domesticata</i>)	
		COPAIBA (<i>Copaifera officinalis</i>)	
		HUAYRURO (<i>Ormosia coccinea</i>)	
		MASHONASTE (<i>Clarisia racemosa</i>)	
		REQUIA (<i>Gyneria kunthiana</i>)	
		ULCUMANO (<i>Podocarpus oleifolius</i>)	
		TORNILLO (<i>Cedrelinga cateniformis</i>)	
2.2	Densidad básica	0,45 g/cm ³ a 0,70 g/cm ³	<p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OPERA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACUTIAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO</p> <p> Ing. Richard Wilver Cancho Vargas SUPERVISOR DE OBRA CIP: 98718</p> <p>NTP 260.015:20121 MUEBLES: Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.1</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OPERA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACUTIAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO</p> <p> Ing. Luis Escobar Benito Residente de Obra CIP: 211541</p> <p>PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL</p> <p>Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Ceyo FAU: 20514347221 soft Motivo: Day V° B° Fecha: 15.03.2023 10:11:54 -05:00</p>
2.3	Flexión estática	MOR ≥ 501 kg/cm ² MOE ≥ 90 t/cm ²	
2.4	Compresión perpendicular	ELP ≥ 41 kg/cm ²	
2.5	Cizallamiento	≥ 61 kg/cm ²	
2.6	Dureza en lados	≥ 301 kg/cm ²	
2.7	Tenacidad	≥ 1,8 kg-m	

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU:
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:33:30 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUIJANA Florencia Antonia FAU:
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 17:49:52 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU:
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:33:47 -05:00

2.8	Contenido de humedad de la madera (Véase Nota 04)	Para establecer el CHE de la madera a ser utilizado en los diferentes usos, en función del lugar donde prestará servicio, se deberá tomar como referencia la información brindada en el aplicativo "Calculadora CHE Perú" disponible en el Play Store indicado en el siguiente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.itp.calculadorache&hl=es_PE&gl=US&fbclid=IwAR0pqkKVL TGOGJqP33eo6J9N6g1x_UeIL0VjBI4OPDj4BLZV-IJmMCS7S7o	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.5.1
2.9	Preservación	La madera a emplearse debería resistir el ataque de insectos y hongos xilofagos, para lo cual, en previsión de posibles ataques de agentes biológicos que contribuyan a la degradación, es recomendable utilizar preservantes que garanticen la inocuidad para el uso del mobiliario.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.5.2
2.10	Juntas de tablero	Machihembrada o endentadas (Finger Joint) con listones de 50 mm de ancho como mínimo. Tener en cuenta el balance de los anillos de crecimiento de la madera para prevenir alabeos no tolerados.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.7.2
2.11	Dimensiones tablero (Véase Anexo N°03, Lámina L-11)		
2.11.1	Profundidad	500 mm	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Cuadro N°15
2.11.2	Ancho	600 mm	
2.12	Espesor	22-25 mm	Establecido por el Ministerio

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLE YANOC T. Serie Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 18:12:01 -05.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDIANIZADO "CRISTO REY" DE CAYO CAYO, DISTRITO DE CAYO CAYO, PROVINCIA DE PUNTA CANE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRAS
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 13.03.2023 11:33:58 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZOPRILLA QUINTANA Florencia Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 13.03.2023 17:51:41 -05:00



PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 08:32:55 -05:00



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDIANIZADO "CRISTO REY" DE CAYO CAYO, DISTRITO DE CAYO CAYO, PROVINCIA DE PUNTA CANE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO


Ing. Luis Escobar Bellido
Papeleta de Obra
CIP: 211541

2.13	Encolado	Colas PVA con 48% de sólidos como mínimo, no tener una antigüedad de fabricación mayor a 6 meses y de fraguado al ambiente. El adhesivo debe colocarse en la superficie de las dos piezas a encolar	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Requisitos Numeral 5.1.8
2.14	Lijado	Lijado manual o mecánico. Grano mínimo de 150 grit.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Requisitos Numeral 5.1.9
		La superficie debe quedar totalmente lisa y suave al tacto, libre de astillas, irregularidades, cantos vivos y poros levantados; las aristas serán redondeadas.	
2.15	Acabado	Laca selladora mate o semi-mate translúcida o lacas catalizadas o un material de recubrimiento con dureza y durabilidad equivalente o superior a las consideraciones técnicas siguientes: - Base de nitrocelulosa, aditivos plásticos y metálicos - Sólidos en Volumen 27 ± 2 % - Espesor de Película Seca 2.0 – 3.0 mils por capa	NTP 260.006 2019 MOBILIARIO ESCOLAR. Mesa para nivel de educación secundaria. Requisitos. 4ª Edición Numeral 7.2.4
		Mínimo 3 capas, aplicado en la totalidad de las superficies.	Establecido por el Ministerio
2.16	Defectos no tolerables en madera		
2.16.1	Perforaciones grandes	Mayor de 3 Agujeros con diámetro mayores a 6mm, por metro lineal y no alineados	<p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO "B.P.A. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"</p>  <p>Ing. Richard Wilver Cancho Vargas SUPERVISOR DE OBRA CIP: 98718</p> <p>NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Requisitos Numeral 5.1.4</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO "B.P.A. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"</p>  <p>Ing. Luis Escobar Bellido Residente de Obra CIP: 211541</p> <p>PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL</p> <p>Firmado digitalmente por ROBLI VANOC Tiberio Cayo FAU 20514347221 soft Motivo: Day V° B° Fecha: 18.03.2023 19:12:14 -05</p>
2.16.2	Rajaduras y Grietas	Mayor a 20 mm de largo, 0,5 mm de ancho, y mayor a la tercera parte del espesor de la pieza.	
2.16.3	Inclinación del grano	Mayor a 10°	
2.16.4	Falla de compresión paralela	Máximo en dos lados consecutivos y no perjudiquen la solidez.	
2.16.5	Defectos de forma	Mayor al 0.3% de la longitud de la pieza	

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

2.16.6	Presencia de hongos de pudrición	No se admiten	
2.16.7	Presencia de insectos activos	No se admiten	
2.16.8	Defectos por nudos	Mayor de 20 mm de diámetro y mayor a la cuarta parte del ancho del material	
2.16.9	Nudos muertos	No se admiten	
2.16.10	Mezcla de especies	No se admiten	
2.16.11	Presencia de médula y/o corteza	No se admiten	
2.16.12	Inestabilidad en un plano	No se admiten	NTP 260.014:2021 MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Muestreo. 4ª Edición Anexo A
2.16.13	Ensamblajes defectuosos	No se admiten	Establecido por el Ministerio
2.16.14	Acabado defectuoso	No se admiten	
2.17	Defectos tolerables		
2.17.1	Perforaciones pequeñas	Agujeros de 1 mm a 3 mm de diámetro, que sumados sus diámetros den un máximo de 6 mm en un área de 100 cm ² , no alineados ni pasantes	<div>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO COLEGIO N° 1002, STRAL N° 12 CRISTÓBAL COLÓN, CALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANCHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO</div> <div> Ing. Richard Wilver Cancho SUPERVISOR DE OBRA CIP: 98718</div>
2.17.2	Mancha azul		
3. Accesorios y piezas de ensamble			
3.1	Regatones		
3.1.1	Material	Polipropileno (PP)	Establecido por el Ministerio
3.1.2	Dimensiones	12 mm (mínimo) de embone exterior o interior. Distancia no menor de 5 mm del piso a la estructura metálica. (Véase Lámina L-13A)	Establecido por el Ministerio
3.1.3	Color	RAL 9005 (negro)	Establecido por el Ministerio

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEGIO N° 1002, STRAL N° 12 CRISTÓBAL COLÓN, CALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANCHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellico
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI YANOC Tiberno Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 19:12:24 -05

3.2	Platina de acero electrosoldado		
3.2.1	Material	Acero laminado	Establecido por el Ministerio
3.2.2	Dimensiones mínimas	25mm x 30mm (Véase Lámina L-13A)	Establecido por el Ministerio
3.2.3	Tipo de perforación	"ojo chino"	Establecido por el Ministerio
3.2.4	Espesor	1.5 mm calibre 16	Establecido por el Ministerio
3.2.5	Soldadura	Metal Inner Gas (MIG) de micro alambre que no dejará escoria, previamente decapada.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.3.1.1 apartado c)
3.3	Tornillos		
3.3.1	Acabado	Tornillos de cabeza plana autorroscantes	Establecido por el Ministerio
3.3.2	Dimensiones	4 mm x 20 mm	Establecido por el Ministerio

Nota 01: Los postores deberán presentar relación de especies de madera a utilizar en el proceso de fabricación, según lo estipulado en el numeral 3.1 De la Selección del capítulo III Información Complementaria.

Nota 02: El contratista podrá proponer una especie de madera similar o superior a las indicadas en el numeral 2.1, siempre y cuando esta cumpla con las características de la madera indicadas entre los numerales 2.2 al 2.9, para lo cual debe presentar la(s) ficha(s) técnica(s) de la especie(s) de madera, suscrita por el Contratista, especialista en el control de calidad de productos de madera o un laboratorio especializado en la investigación de la madera.

La propuesta deberá ser aprobada por la Entidad contratante, para esto, el contratista deberá presentar una solicitud a la Entidad contratante dentro de los 10 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, sin que se genere sobrecostos y modificaciones a los plazos contractuales establecidos por la Entidad.

Nota 03: Los listones de madera que componen cada uno de los elementos, asiento y respaldar de madera deberán ser de una misma especie maderable.

Nota 04: Se utilizará el Programa para determinar el Contenido de Humedad de Equilibrio (CHE) de la madera a nivel nacional. El aplicativo web "CHE Perú", se encuentra disponible en el siguiente enlace: <http://citemadera.itp.gob.pe/proyectos/che/>.

2.1.2. Marcado y/o rotulado

2.1.2.1. Logotipo institucional

Para identificar la procedencia institucional de la mesa de metal y madera para estudiante de 5° de secundaria, se colocará mediante técnica de pirograbado el logotipo institucional de la entidad contratante, en cada uno de los bienes a adquirir de acuerdo a lo señalado en la Lámina L-13.

El logo institucional tendrá las siguientes características:

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA LÍNEA DE CORA CORA
DIRECCIÓN DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO



Inq. Richard Wilver Cancho Vargas

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft Motivo: Day V° B° Fecha: 13.03.2023 11:24:48 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA LÍNEA DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellio
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI YANOC Tiborio Dayo FAU 20514347221 soft Motivo: Day V° B° Fecha: 15.03.2023 16:12:31 -05


PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI FARRAN Alana Lupe FAU 20514347221 soft Motivo: Day V° B° Fecha: 15.03.2023 09:24:12 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencia FAU 20514347221 soft Motivo: Day V° B° Fecha: 13.03.2023 17:52:17 -05

Características	Especificación
Dimensiones	9 cm (ancho) x 3 cm (alto)
Grabado	Pirograbado
Fuente	Arial
Tamaño de letra	7 puntos mín.



2.1.2.2. Identificación de fabricante

Para la identificación del fabricante de la mesa de metal y madera para estudiante de 5° de secundaria, se colocará una lámina autoadhesiva en cada uno de los bienes a adquirir. Este rotulado tendrá las siguientes características:

Características	Especificación
Dimensiones	8-12 cm (ancho) x 4-8 cm (alto)
Material	Autoadhesivo
Color	Marrón
Fuente	Arial
Tamaño de letra	7 puntos mín.
Información a consignar	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de la entidad usuaria en el encabezado - Nombre del procedimiento de selección - Descripción de los bienes (código del bien y Nombre del bien) - Nombre del contratista, dirección y teléfono
Ubicación	Parte inferior del bien.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YALDO Tiberio Cayo FAU
20514347221.soft
Motivo: Dev V° B°
Fecha: 15.03.2023 19:12:42 -05'03

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN N°

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Código del bien, Nombre del Bien)

NOMBRE DEL CONTRATISTA (indicar el nombre de todas las empresas que conforman el consorcio de corresponder)

DIRECCIÓN:

TELÉFONO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI
FAPFAN Maria Lupe FAU
20514347221.soft
Motivo: Dev V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:34:19 -05

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
"COLEJO MIO" D.N.O. S°RAL N° 12 CRISTÓBAL COLÓN, LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

2.1.3. Embalaje

Los bienes deben de estar embalados en su totalidad, de forma que no se dañen o deterioren durante el transporte hasta el destino final, tomando en cuenta para la envoltura

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Versión 02

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221.soft
Motivo: Dev V° B°

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221.soft
Motivo: Dev V° B°

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
"COLEJO MIO" D.N.O. S°RAL N° 12 CRISTÓBAL COLÓN, LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas

Página 8 de 53

y embalaje, según lo indicado en la NTP 260.012:2017 MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Embalaje. 3ª Edición.

2.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

2.2.1. Procedencia de la madera

El contratista debe garantizar el origen legal de la madera que utiliza como materia prima para la fabricación de mobiliarios de madera. Para ello, la madera que se adquiere debe estar sustentada con la Guía de Transporte Forestal (GTF), conforme a lo establecido en el Artículo 168 del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, en el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, según corresponda:

- Para los casos de madera de especies forestales nativas, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Transporte Forestal (GTF) que ampara la procedencia de la madera. En los casos de títulos habilitantes, en la GTF debe estar consignada la resolución de aprobación del plan de manejo forestal o resolución que aprueba el aprovechamiento forestal (reingresos, movilización de saldos, etc.).
- Para los casos de madera de especies forestales introducidas, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Remisión (GR) con la descripción de la especie que la identifique como introducida y el número de registro de la plantación.
- Para los casos de madera importada, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Remisión (GR) y los documentos de importación.

En el caso el contratista no pueda garantizar el origen legal de la madera, la Entidad contratante podrá notificar a las entidades sancionadoras, en el marco del Art. 215 del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.

2.2.2. Lugar de entrega

El lugar de entrega de los bienes será determinado por cada Entidad contratante, para lo cual brindará el detalle de la(s) dirección(es) respectiva(s). Para ello, podrá tomar en consideración el formato "Dirección(es) de Institución(es) de destino", adjunto en el Anexo N° 01.

Cualquier cambio respecto al lugar de entrega de los bienes dentro de la misma provincia, será comunicado al Contratista por la Entidad contratante, mediante correo electrónico hasta el inicio de la etapa de transporte y entrega de los bienes, sin que dicho cambio suponga una variación en plazos ni costos contractuales de ninguna índole.

En caso la Entidad contratante determine que la entrega de los bienes será en recintos de Instituciones Educativas Públicas, se podrá tomar en consideración el formato "Direcciones de Instituciones Educativas" adjunto en el Anexo N° 01. Asimismo, la Entidad contratante deberá realizar mediante correo electrónico, la notificación al Contratista, respecto de cualquier cambio sobre la asignación de los códigos modulares para la Institución Educativa, sin que dicho cambio suponga el incremento de costos o de tiempo de entrega, todo ello, antes de la elaboración de los Documentos que Acrediten la Entrega de los Bienes.

2.2.3. Etapas de la ejecución contractual

La ejecución se dará en 03 etapas:

1. Etapa de fabricación y embalaje de bienes
2. Etapa de control de calidad
3. Etapa de transporte y entrega de bienes

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA CALA DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA CALA DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:12:40 -05:00

ETAPAS DE EJECUCIÓN		
N°	ETAPA	DESCRIPCIÓN
1)	Fabricación y embalaje de los bienes	El Contratista deberá llevar a cabo la fabricación de los bienes según lo establecido en la Sección Técnica de la presente ficha y sus respectivos anexos; y los numerales 2.2.6.1. Fabricación y 2.2.6.2. Embalaje.
2)	Control de Calidad	El contratista deberá llevar a cabo el control de calidad de los bienes, según lo establecido en el numeral 2.2.7.
3)	Transporte y entrega de los bienes	El Contratista deberá transportar y entregar la totalidad de los bienes, según lo establecido en los numerales 2.2.8.1. Transporte y 2.2.8.2. Entrega.

Consideraciones:

A partir de la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de los bienes, se ingresa a la etapa de control de calidad, dentro de dicho periodo se realizarán las siguientes actividades:

- Verificación Cuantitativa, a partir del día siguiente hábil del ingreso de la "Solicitud de verificación de cantidad por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes" (véase numeral 2.2.7.2)
- Verificación Técnica (véase numeral 2.2.7.3.), a partir del día hábil siguiente de emitido el Informe de Verificación Cuantitativa, contará con las siguientes subetapas:
 - Toma de muestras por parte del Organismo de Evaluación de la Conformidad (véase numeral 2.2.7.1.), a partir del día siguiente hábil de emitido el Informe de Verificación Cuantitativa.
 - Aplicación de métodos de ensayos de los bienes a cargo del Organismo de Evaluación de la Conformidad, a partir del día siguiente hábil de la suscripción del Acta de Toma de Muestras.
 - El Área Usuaría realizará las Inspecciones Técnicas a los bienes, las cuales físicamente se ejecutarán dentro del plazo máximo programado para la aplicación de métodos de ensayos antes mencionados.
- Verificación de la documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes, a partir del día siguiente hábil del ingreso de dicha documentación al Área Usuaría (véase numeral 2.2.7.4).
- Elaboración y notificación de los documentos que acredite entrega de los bienes, a partir del día siguiente hábil de realizada la notificación indicando la aprobación al sustento de las condiciones mínimas para el transporte de los bienes. Finaliza con la entrega de los documentos que acredite entrega de los bienes y la suscripción del Acta de Recepción Documentaria, entre la Entidad Contratante y el Contratista (véase numeral 2.2.8).

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE INVERSIÓN Y DESARROLLO
 DE OBRA CIVIL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellico
 Residente de Obra
 CIP: 211541

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INVERSIÓN Y DESARROLLO
 DE OBRA CIVIL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
 YANOC Tiberio Cayo FAU
 20514347221 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 15.03.2023 10:12:58 -05:00

2.2.4. Plazos de ejecución

El plazo de ejecución por cada etapa será determinado por la Entidad contratante de acuerdo con la cantidad de bienes a adquirir, la ubicación y accesibilidad al (a los) lugar(es) de destino, y cualquier otra consideración propia del requerimiento específico de la Entidad.

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INVERSIÓN Y DESARROLLO
 DE OBRA CIVIL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
 GUERRERO Gonzalo Elias FAU
 20514347221 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 15.03.2023 11:08:02 -05:00

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INVERSIÓN Y DESARROLLO
 DE OBRA CIVIL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
 ZORRILLA QUINTANA Florencia
 Anio: FAU 20514347221 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 15.03.2023 11:08:02 -05:00

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INVERSIÓN Y DESARROLLO
 DE OBRA CIVIL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
 FAREAN Maria Lupe FAU
 20514347221 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 15.03.2023 11:08:02 -05:00



Ing. Richard Wiver Cancho
 SUPERVISOR DE OBRA
 Página 10 de 18

Considerar la información contenida en el siguiente cuadro, de forma referencial, para los plazos de la ejecución contractual.

PLAZO DE EJECUCIÓN (días calendario)				
Cantidad de bienes a adquirir (Und.)	Etapas de fabricación y embalaje (días)	Etapas de control de calidad (días)	Etapas de transporte y entrega (días)	Plazo total de ejecución (días)
1-1,000	10-80	70-75	5-10	85-165
1,000-5,000	40-100	75-80	10-30	125-210
5,000 – 10,000	60-130	75-80	30-50	165-260
10,000 – más	Más de 130	Más de 80	Más de 50	Más de 260

En el siguiente cuadro se detalla el inicio y fin de los plazos respectivos por cada etapa:

PLAZO DE EJECUCIÓN			
Nº	ETAPA	PLAZO	
1)	Fabricación y embalaje de los bienes	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día siguiente de suscrito el contrato. (véase numeral 2.2.5.1 Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de fabricación y embalaje, por parte del contratista, se tomará en cuenta el día del ingreso de la Solicitud de verificación de cantidad. (véase numeral 2.2.6.1 Fabricación)
2)	Control de Calidad	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día siguiente del ingreso de la "Solicitud de verificación de cantidad por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes" (véase numeral 2.2.7.2)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de control de calidad, por parte del contratista, se tomará en cuenta la entrega de los Documentos que acrediten la entrega de bienes y la suscripción del ACTA DE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA, entre el Área Usuaria y el CONTRATISTA. (véase numeral 2.2.8.2)
3)	Transporte y entrega de los bienes	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día calendario siguiente de suscrita el Acta de Recepción Documentaria, referida a las "Actas de Entrega de Bienes" entregadas por la Entidad al Contratista. (véase numeral 2.2.8.1 Transporte)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de transporte y entrega, por parte del contratista, deberá ingresar una carta en la cual deberá comunicar el término del Transporte y Entrega de los bienes, y se tomará en cuenta la fecha máxima de recepción consignada en los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes. (véase numeral 2.2.8.2 Entrega)
Nota 04: La propuesta del Contratista deberá considerar las provisiones necesarias para realizar la entrega en las instituciones beneficiadas, según las condiciones climáticas imperantes en la zona.			

2.2.5. Consideraciones generales

2.2.5.1. Requisitos a presentar para la suscripción del contrato

Para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar los siguientes documentos:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ZORRILLA QUIRITA Y A Florencio
Anónimo EPU 20514347221 soft
Móvil: Day Vº Bº
Fecha: 13.02.2023 17:53:35 -05

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C/OBRA, MEDIANTE DEL SERVIDOR DE CORREO WEB DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellico
Residente de Obra
CIP: 211541

Documentación a presentar:

- Cronograma de ejecución del contrato.
- Detalle de los precios unitarios del precio ofertado.
- Presentación de talleres de producción y almacenes.
- Presentación de responsable general de operaciones.
- Declaración Jurada de Almacenaje de los Bienes.
- Plan Covid-19

En el siguiente cuadro se detallan los documentos antes mencionados:

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		
#	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
a)	Cronograma de ejecución del contrato	Deberá incluir fechas y plazos programados para todas las etapas del contrato establecidos en el numeral 2.2.4. PLAZOS DE EJECUCIÓN. El Contratista deberá presentar un Cronograma Gantt en archivo nativo (formato editable) en programa MS Project, MS Excel o similar. Para ello, deberá ceñirse a los FORMATO N° 01 y FORMATO N° 02, adjuntos en el Anexo N° 05.
b)	Detalle de los precios unitarios del precio ofertado	El cuadro de "Detalle de los precios unitarios del precio ofertado" deberá ser desagregado por Institución de destino, y deberá detallar los costos de adquisición y entrega según la región donde se ubiquen las Instituciones de destino. Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N°03, adjunto en el Anexo N° 05.
c)	Presentación de las ubicaciones de los talleres de producción y almacenes	Se deberá presentar la(s) dirección(es) de su(s) instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes (máximo 04 instalaciones de almacenamiento y/o talleres de fabricación) y los datos del personal técnico de contacto. Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N° 04, adjunto en el Anexo N°05.
d)	Presentación de responsable general de operaciones	Se deberá presentar un formato donde se deberá designar un responsable, el que deberá contar con capacidad de decisión frente a cualquier contingencia que se presente y quien será la persona autorizada para coordinar directamente con la Entidad contratante aspectos relacionados con las prestaciones. Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N° 05, adjunto en el Anexo N° 05.
e)	Declaración Jurada de Almacenaje de los Bienes	El postor ganador deberá remitir una Declaración Jurada donde se compromete a realizar el almacenaje de los bienes en ambientes techados, sin goteras, sin filtraciones, a fin de garantizar la calidad e integridad de los bienes fabricados y/o almacenados. En caso de incumplimiento se aplicarán las penalidades estipuladas en el numeral 2.2.11.2. OTRAS PENALIDADES.



- Todos los documentos indicados en el presente numeral deberán ser presentados de forma digital e impresa, con la firma del representante legal, en idioma castellano.
- Toda la documentación a ser entregada por el Contratista se remitirá por Mesa de Partes de la Entidad contratante y/o el canal determinado por dicha Entidad.
- La Entidad contratante se encargará de revisar el "Cronograma de ejecución del contrato" y el "Detalle de los precios unitarios del precio ofertado" de la propuesta económica, para garantizar que se cumpla con el plazo de ejecución establecido. Luego de la revisión se emitirá la conformidad respectiva o se plantearán las observaciones que deben ser subsanadas por el postor dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- La presentación del cronograma no significa que existirá una variación del plazo de ejecución contractual con el que cuenta el Contratista para la ejecución de sus prestaciones, los cuales se indicarán según lo estipulado en el numeral 2.2.3. **PLAZOS DE EJECUCIÓN**.

La Entidad contratante determina si se otorga adelanto de pago al contratista. De ser el caso, el contratista podrá solicitar dentro del plazo establecido por la Entidad contratante la entrega del adelanto del 30% del monto del contrato, a partir del día siguiente de suscrito el Contrato, según lo dispuesto en el Artículo N° 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El pago del adelanto se hará en la moneda establecida por la Entidad contratante.

El Área Usuaria de cada Entidad contratante determinará el correo electrónico a través del cual se realizarán todas las comunicaciones que emita durante la ejecución del contrato, lo cual será comunicado después de su suscripción.

En el caso que el Área Usuaría realice alguna modificación (ya sea un cambio y/o la adición de una nueva dirección electrónica para la comunicación) a la presente dirección, esta será notificada al Contratista vía correo electrónico durante la ejecución contractual.

La Entidad comunicará a la(s) Institución(es) de destino el contenido de las bases del presente procedimiento de selección con la finalidad que se tome conocimiento de la documentación y procedimientos que se seguirán en la entrega de los bienes.

El Contratista deberá llevar a cabo la fabricación y embalaje de los bienes según lo establecido en las presentes especificaciones técnicas y sus respectivos anexos.

El Contratista deberá presentar a través de una comunicación por Mesa de Partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, su Solicitud de Calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad adjuntando la información sustentatoria respecto a los Requisitos Mínimos para la selección de los Organismos de Evaluación de la Conformidad, dentro de los 10 días calendario contabilizados a partir del día calendario siguiente de suscrito el contrato, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.3.

Las muestras fabricadas por el Contratista no están incluidas en las cantidades propuestas a ser entregadas en las Instituciones beneficiadas; sin embargo, las muestras sí se contabilizan para la Verificación Cuantitativa.

A partir de la fecha de ingreso de la carta del Contratista donde comunica la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de los bienes, se llevará a cabo el proceso de control de calidad.

El Contratista deberá ingresar, a través de Mesa de Partes, una carta dirigida a la Entidad, con copia al Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o

GOBIERNO REGIONAL DE AYACÚCHO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
ZONA URBANA DE AYACÚCHO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
ZONA URBANA DE AYACÚCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 08748

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

ng. U.S. Escobar Bellido
Residente de obra

La carta deberá contener la siguiente documentación:

- Solicitud de verificación de cantidades por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes.
- Documentación sobre la Procedencia de la Madera indicado en el numeral 2.2.1. PROCEDENCIA DE LA MADERA.

2.2.6.2. Proceso de embalaje

2.2.6.3. Inspecciones inopinadas

En las Inspecciones Inopinadas realizadas durante el proceso de fabricación de los bienes, la Entidad podrá tomar muestras de los bienes que se encuentren terminados hasta ese momento para analizarlos con equipos de medición para determinar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Asimismo, la Entidad verificará los procesos de fabricación y el apilado, tanto de la materia prima como de los bienes conforme al avance hasta el momento de realizada la inspección inopinada.

Las inspecciones inopinadas serán programadas dentro del horario establecido por la Entidad.

El formato referencial del Acta de Visita Inopinada se encuentra en el Anexo N° 06.

2.2.7. Control de calidad

Durante el periodo del proceso de control de calidad se realizará actividades para la emisión de la conformidad de la etapa de fabricación, y posteriormente, el informe de cumplimiento de especificaciones técnicas a verificación de la documentación referida al sustento de las condiciones mínimas previo al inicio de la etapa de transporte.

El control de calidad inicia con la Verificación Cuantitativa y culmina con la emisión del Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

El control de calidad involucra la participación del Contratista, la Entidad, el Área Usuaria, el Área designada para el conteo de bienes y el Organismo de Evaluación de la Conformidad en las siguientes actividades:

- Verificación Cuantitativa por parte del Área designada por la Entidad.
- Verificación Técnica: Elección del organismo de evaluación de la conformidad, Toma de Muestras y aplicación de los métodos de ensayos por el Organismo de Evaluación de la Conformidad, y las Inspecciones Técnicas por la Entidad.

Los empaques de los bienes y los costos que se generen producto de la Verificación Cuantitativa y de la Verificación Técnica serán realizados y asumidos por el Contratista.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACÚCHO
REGISTRADO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL N.º 1 DEL SECUNDARIO EN LA
CALLE 30 NO. 700 B. S. T. N. Y C. CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTR.
DE CORA CORA, PROVINCIA DE HUANCAYOCOS, DEPARTAMENTO DE AYACÚCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CAP: 98716

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 MEDIDAMENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL DISTRITO DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO
 Ing. Luis Escobar Belluog
 Residente de Cora Cora
 CIP: 21154

PRONIEC
PROGRAMA NACIONAL
DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
 YANOS Tibério Cayo FAU
 20514347221 soft
 Motivo: Dey V' B'
 Fecha: 15.03.2023 18:13:41 -05:0

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INICIACIÓN A LA EDUCACIÓN
FORMAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NAȚIONAL
DE ÎNȚĂLESȚI UNCTIVĂ EDUCATIVĂ
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por POBLE:
YANOC Tiberio Cayo FAU
25514347221 soft
Motivo: Doy v° B°
Fecha: 15.03.2023 19:13:55 -35:0

El número de muestras para los ensayos y/o pruebas para la certificación serán fabricadas por el Contratista, de acuerdo con la NTP 260.014.2021. Las muestras fabricadas por el contratista no están incluidas en las cantidades propuestas a ser entregadas en las Instituciones de destino; sin embargo, las muestras sí se contabilizan para la Verificación Cuantitativa según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2.

2.2.7.3.2. Toma de muestras

A partir del día siguiente hábil de recibido el Informe de Verificación Cuantitativa en el Área Usuaría, indicando la conformidad de la misma, el Área Usuaría y el Contratista coordinarán la fecha para la Toma de Muestras.

La toma de muestras para la aplicación de métodos de ensayos se deberá realizar en uno de los almacenes del Contratista en presencia de un representante de la Entidad. La(s) dirección(es) del (de los) almacén(es) debe coincidir con la información presentada para la suscripción del contrato o, de corresponder, con la información modificada mediante el procedimiento establecido en el numeral 2.2.5.1. Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato.

Se precisa que las muestras se toman bajo el nivel de inspección S1 de la NTP 260.014.2021 vigente.

El Organismo de Evaluación de la Conformidad tomará la cantidad de muestras del tipo de mobiliario, realizando una selección de manera aleatoria, en presencia de un representante del Contratista y del Área Usuaría, procediendo a llevarlos a sus instalaciones para la evaluación y/o procedimientos correspondientes, según lo estipulado en la NTP 260.014.2021. En este momento se suscribirá el Acta de Toma de Muestras entre la Entidad, el Contratista y el Organismo de Evaluación de la Conformidad.

Es de responsabilidad del Contratista programar la fecha de toma de muestras para la aplicación de métodos de ensayos y cumplir con entregar la documentación requerida en los plazos establecidos.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procederá a aplicar la(s) penalidad(es) correspondiente, según lo establecido en el numeral 2.2.11. Incumplimiento de Contrato y Penalidades.

El formato referencial del Acta de Toma de Muestras se encuentra en el Anexo N° 06.

2.2.7.3.3. Métodos de ensayo

El Contratista deberá entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, el "Informe de ensayos" en el plazo establecido por la Entidad, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del "Acta de Toma de Muestras", según lo estipulado en el Anexo N° 02.

El "Informe de ensayos" deberá incluir los Informes técnicos de las pruebas y/o métodos de ensayos realizados a las muestras, los cuales serán acreditados por el Organismo de Evaluación de la Conformidad seleccionado por la Entidad, según lo establecido en el numeral 2.2.6.1.

El Área Usuaría revisará el "Informe de Ensayos" en un plazo de 3 a 7 días calendario.

De encontrarse alguna(s) observación(es) en el informe de ensayos elaborado por el Organismo de Evaluación de la Conformidad, será(n) consignada(s) en el Informe de Especialista según lo descrito en el numeral 2.2.7.3.4. y se le otorgará un plazo definido por la Entidad contratante de acuerdo a la complejidad de la observación, para el levantamiento de las observaciones correspondientes.

El Contratista deberá ingresar una carta por Mesa de Partes de la Entidad y dirigida al Área Usuaría, dentro del plazo que se le otorgue, donde comunicará el levantamiento de observaciones, a fin de proceder con la verificación correspondiente. En caso el contratista

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OPERA EL SERVICIO DE ASESORIA TÉCNICA DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AYACUCHO
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OPERA EL SERVICIO DE ASESORIA TÉCNICA DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AYACUCHO
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



incumpla con la presentación de levantamiento de observaciones en el plazo establecido, la Entidad procederá a aplicar la(s) penalidad(es) correspondiente(s), según lo establecido en el numeral 2.2.11.2 OTRAS PENALIDADES.

Comunicada la subsanación, la Entidad procederá a realizar la verificación del Levantamiento de Observaciones en presencia del Organismo de Evaluación de la Conformidad, a fin de que se proceda con la nueva Toma de Muestras del lote observado (en caso las observaciones contemplen de nuevo la aplicación de métodos de ensayos); y en caso las observaciones no requieran de realizar nuevamente ensayos al lote a través de muestreo, el especialista de la Entidad podrá realizar la verificación correspondiente.

El Contratista deberá contar con la totalidad del lote y adicionalmente el total de las muestras para subsanación de observaciones, de lo contrario se considerará como incumplimiento en el levantamiento de observaciones, pudiendo la Entidad aplicar las penalidades y/o acciones correspondientes según el numeral 2.2.11. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

Si pese al plazo de subsanación otorgado, el Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato total o parcialmente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades en las que hubiera incurrido.

Si los bienes manifiestamente no cumplen con las características y condiciones ofrecidas, la Entidad no efectuará la recepción de los mismos, debiendo considerarse como no ejecutada la etapa, aplicándose las penalidades que correspondan de acuerdo a Ley.

2.2.7.3.4. Inspecciones técnicas

El Área Usuaria podrá realizar inspecciones técnicas a los bienes en paralelo a la aplicación de métodos de ensayos realizados por el Organismo de Evaluación de la Conformidad durante el periodo de Verificación Técnica, donde el Contratista y la Entidad suscribirán el(las) Acta(s) de Verificación Técnica.

De encontrarse alguna observación en la(s) inspección(es) técnica(s) realizadas por el Área Usuaria, serán consignadas en un Informe de Especialista, y de corresponder, complementarán a las observaciones realizadas por el Organismo de Evaluación de la Conformidad. Estas observaciones serán notificadas al Contratista mediante un documento elaborado por el Área Usuaria, donde se detallen las observaciones realizadas por el Organismo de Evaluación de la Conformidad y las observaciones realizadas por el Especialista de la Entidad.

El Contratista deberá absolver las observaciones en un plazo no menor de 02 días ni mayor de 08 días calendario, contados a partir del día siguiente de realizada la notificación presencial y/o electrónica, para lo cual deberá ingresar una carta por Mesa de Partes de la Entidad y dirigida al Área Usuaria, donde comunicará el levantamiento de observaciones, a fin de que el Área Usuaria proceda a realizar la verificación de la subsanación de observaciones, dejando constancia de ello mediante la suscripción del Acta de Verificación Técnica por parte del Contratista y la Entidad.

La Entidad puede complementar las Acta(s) de Verificación Técnica con registro de evidencias filmicas y/o fotográficas de la situación encontrada en la(s) revisión(es) técnica(s).

De no encontrarse observación o de encontrarse las mismas subsanadas, el Área Usuaria elaborará el Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de la etapa de Fabricación y Embalaje.

Los formatos referenciales del Acta de Verificación Técnica y del Acta de Verificación de Levantamiento de Observaciones se encuentran en el Anexo N° 06.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA GENERAL DE ASESORIA TECNICA DEL SERVICIO EDUCATIVO
CALLE 14 DE AGOSTO 1099, PUNTA DE LA LAGUNA, AYACUCHO
CIP: 98718
Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA GENERAL DE ASESORIA TECNICA DEL SERVICIO EDUCATIVO
CALLE 14 DE AGOSTO 1099, PUNTA DE LA LAGUNA, AYACUCHO
CIP: 211541
Ing. Luis Escobar Bellón
Residente de Obra

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROSALES
YANOC Tiberio Gayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 19:14:47 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO,
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 11:41:47 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 17:55:06 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 09:38:37 -05:00

2.2.7.4. Documentación para el transporte de los bienes

A fin de garantizar que el transporte de los bienes se mantenga dentro de los niveles de calidad y seguridad, el Contratista deberá presentar al Área Usuaria, a través de Mesa de Partes de la Entidad, los documentos sobre el transporte de los bienes, en el plazo establecido por la Entidad, contabilizado a partir del día siguiente de la notificación por correo electrónico realizada por el Área Usuaria.

De no presentar la documentación completa y en el plazo estipulado por la Entidad, el Contratista será penalizado de acuerdo con el numeral 2.2.11.2. OTRAS PENALIDADES.

El Área Usuaria deberá revisar y verificar que el Contratista cumpla con las condiciones mínimas antes del inicio de la etapa de Transporte y Entrega de los bienes hasta los lugares de destino.

De existir observaciones, el Área Usuaria podrá notificar de manera electrónica al Contratista sobre las mismas, indicándole un plazo de subsanación de 02 a 08 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente calendario de la mencionada notificación.

Para la subsanación de las observaciones, el Contratista deberá ingresar una carta por Mesa de Partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, adjuntando la documentación completa y necesaria para dichos fines. La fecha de ingreso de la carta por Mesa de Partes se contabilizará como fecha fin del plazo para la subsanación de observaciones.

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el Área Usuaria notificará electrónicamente al Contratista indicándole que cuenta con la aprobación de la Documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes, sin perjuicio de las condiciones operativas y/o de vigencia documentaria que se deben mantener para la totalidad de la documentación solicitada.

La documentación requerida se detalla a continuación:

Documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes	
N°	Documentación Requerida
1	<p>Póliza de Seguro de transporte terrestre nacional</p> <p>El transporte de los bienes deberá contar con la póliza de seguro a nivel nacional. VALOR MÍNIMO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL será el 100% del valor del monto adjudicado.</p> <p>Adicionalmente la póliza deberá hacer referencia al procedimiento de selección y/o al número de contrato, pudiendo realizarse mediante un anexo a la póliza o cualquier documento adicional emitido por la aseguradora.</p> <p>Todo esto por la reposición de los bienes transportados en caso de siniestro, esta póliza deberá ser efectiva antes del inicio de la etapa de transporte y entrega de los bienes.</p>
2	<p>SCTR</p> <p>SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para el personal del contratista asignado para la realización del servicio de transporte y entrega de los bienes.</p>
3	<p>Flota de Vehículos</p> <p>Relación completa de los vehículos a utilizar especificando como mínimo: modelo, placa, tarjeta de propiedad, tarjeta de Habilitación vehicular para el transporte de mercancías, tipo de vehículo, capacidad máxima de carga de vehículo expresado en kilogramos y en pesos cúbicos, copia simple de la Tarjeta de Propiedad, SOAT vigente de cada una de las unidades, REVISIÓN TÉCNICA vehicular aprobada y vigente de acuerdo con ley.</p> <p>La antigüedad máxima de los vehículos será de 10 años, contabilizados a partir del año siguiente de fabricación de estos.</p>

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE GESTIÓN
SERVIDOR PÚBLICO
CIP: 98718

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE GESTIÓN
SERVIDOR PÚBLICO
CIP: 98718

Ing. Luis Escobar Bellino
Residente de Obra
CIP: 211541



PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiben Cayo FAU
CIP: 14347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.02.2023 18:14:54 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Efraim FAU
CIP: 22514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:41:57 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZOPRILLA QUINTANA Florencio Antonio FAU 22514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 17:55:49 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FAJFAN Maria Lupe FAU
CIP: 22514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.02.2023 09:22:45 -05:00

4	<p>Autorización para prestar Servicio de Transporte de Mercancías en General:</p> <p>Otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (acreditado mediante copia simple y/o copia simple de la página web del MTC donde figure la inscripción en el citado registro); asimismo cabe precisar que, respecto al Transporte de los bienes, este deberá cumplir con ser un vehículo cerrado a fin de garantizar la seguridad e integridad de los bienes y su distribución vía terrestre.</p> <p>En caso el contratista opte por subcontratar el servicio de transporte, deberá presentar la autorización de la empresa subcontratada.</p> <p>En caso de uso de otras vías de transporte (fluvial, marítima, etc.), el contratista deberá agregar propuesta de la ruta y tipos de vehículos a utilizar, adjuntando imagen referencial de vehículos.</p>
5	<p>Plan COVID-19</p> <p>"Plan para vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" aprobado por el sector competente, debidamente registrado en el Sistema integrado para COVID-19 (SICOVID-19) adjuntando la constancia del sector competente, la constancia del registro en SICOVID-19, el correo de envío al MINSA, según corresponda en el marco de lo establecido por el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM; Decreto Supremo 110-22-PCM; Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA; la Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC/01, modificada por la Resolución Ministerial N° 0301-2020 MTC/01, sus modificatorias y demás normas que emita el sector correspondiente.</p>

2.2.8. Etapa de transporte y entrega de los bienes

El Área Usuaría realizará la notificación electrónica al Contratista, indicándole la aprobación de la documentación presentada según lo establecido en el numeral 2.2.7.4. Documentación para el Transporte de los bienes.

Con la aprobación de la Documentación para el transporte de los bienes, la entidad elaborará los documentos que acredite la entrega de los bienes, teniendo como plazo de 3 - 15 días calendario, los mismos que serán notificados por correo electrónico al contratista a fin de que se apersona a recogerlos en un plazo no mayor de 3 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de recibida la notificación.

El inicio del plazo de la etapa de transporte y entrega de los bienes a los destinos especificados en el numeral 2.2.1. LUGAR DE ENTREGA, es a partir del día calendario siguiente de la suscripción del Acta de Recepción Documentaria por el Contratista.

Para el cómputo del plazo de la fecha de culminación del transporte y entrega de los bienes, se considera la última fecha que figure en el(los) Documentos que Acredite Entrega de los Bienes de la Entidad, según lo establecido en el numeral 2.2.3. PLAZOS DE EJECUCIÓN.

El formato referencial del Acta de Recepción Documentaria se encuentra en el Anexo N° 06.

2.2.8.1. Transporte

El Contratista deberá realizar el transporte de los bienes a las Instituciones de destino, en cumplimiento con los requisitos solicitados en el numeral 2.2.7.4. Documentos sobre el Transporte de los bienes.

El Área Usuaría, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, realizará la notificación por correo electrónico al Contratista, a fin de que se apersona a recoger el(los) Documentos que Acredite Entrega de los Bienes de la Entidad, en el plazo establecido por la Entidad, caso contrario será penalizado según el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

Al momento de la entrega del (de los) Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, se suscribirá el Acta de Recepción Documentaria por el Contratista.

En caso el destino de transporte sea una(s) Institución(es) Educativa(s), no se permite que vehículos pesados ingresen a los patios de ésta(s); en caso se evidencie de manera documentada esto, se aplicará lo estipulado en el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
ZONA DE LA COMUNIDAD Nº 12 COMITÉ DE FOMENTO DE LA COMUNIDAD DE
LA ZONA DE LA COMUNIDAD Nº 12 COMITÉ DE FOMENTO DE LA COMUNIDAD DE



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
PREVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
ZONA DE LA COMUNIDAD Nº 12 COMITÉ DE FOMENTO DE LA COMUNIDAD DE
LA ZONA DE LA COMUNIDAD Nº 12 COMITÉ DE FOMENTO DE LA COMUNIDAD DE
Ing. Luis Escobar Bellón
Residente de Obra
CIP: 211541

Cada unidad deberá transportar sólo y exclusivamente los bienes objeto de la contratación; en caso se evidencie de manera documentada la ocurrencia del incumplimiento, se aplicará lo estipulado en el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

El transporte debe efectuarse con un vehículo cerrado a fin de garantizar la seguridad e integridad de los bienes, caso contrario se aplicará lo estipulado en el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

Todo vehículo de transporte que salga en ruta deberá acompañar la carga con el(los) Documentos que Acredite Entrega de los Bienes proporcionado(s) por la Entidad y la guía de remisión del transportista. En ambos casos deberá indicar el destino final y el detalle del material transportado en conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Asimismo, durante la etapa de transporte y entrega, deberán contar con unidades de contingencia o transporte alternativo de características similares o superiores a las unidades asignadas para el servicio. En caso se produzca una avería o desperfecto que inhabiliten alguna unidad registrada, se deberá reemplazar la unidad en un lapso no mayor a 48 horas (teniendo en cuenta el personal necesario y equipado para la tarea de transbordo de los materiales).

2.2.8.2. Entrega

Es de responsabilidad del Contratista la carga y descarga de los bienes en el lugar de embarque y destino, al igual que la entrega de los bienes en buen estado de las cantidades descritas en los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, a los destinos establecidos en el numeral 2.2.2. LUGAR DE ENTREGA, así como de la devolución de la documentación sustentadora de recepción, conforme a la cantidad de juegos de Documentos que Acredite Entrega de los Bienes entregados por la Entidad.

Un juego de Documentos que Acredite Entrega de los Bienes original, debidamente firmada en original se debe quedar con la persona firmante como representante de la Institución de destino.

Los bienes serán entregados en perfecto estado de conservación, adecuadamente armados y embalados hasta su destino final, sin ningún defecto de adquisición, ni otro como consecuencia de la estiba o desestiba o del transporte.

La entrega de los bienes a los lugares de destino será sustentada con la presentación de lo siguiente:


- Guía de Remisión del Transportista
- Documentos que Acredite Entrega de los Bienes: PECOSA, Acta de entrega de Bienes, etc.
- El (Los) Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, representan la aceptación de los bienes por parte de los representantes de las Instituciones de destino, podrán ser suscritos por las siguientes autoridades:
- Representante designado y autorizado por la Entidad contratante.
- En caso la dotación se realice a una Institución Educativa, podrá suscribir un representante designado y autorizado por la UGEL y/o DRE correspondiente a la jurisprudencia de la Institución Educativa de destino.

La información que debe ser consignada en los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes es la siguiente:

- Firma legible
- Fecha de conformidad de los bienes
- Copia de DNI del firmante, donde se aprecie su firma

En caso se realice la modificación del lugar de entrega por parte del Área Usuaria, entonces el Documentos que Acredite Entrega de los Bienes podrá ser firmada por la dirección de dicha Área.

Los datos de la institución de destino y su personal para la recepción de los bienes y el firmado de Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, serán coordinados directamente por el Contratista.



Firmado digitalmente por ROBLI YANCO Tibarlo Cayo FAU
20514247221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 10:15:11 -05
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE GOBIERNO REGIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTE
SECRETARÍA DE TURISMO Y PROMOCIÓN
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO Y EMPLEO
SECRETARÍA DE DEFENSA Y FUEJOS
SECRETARÍA DE INTERIORES Y GOBIERNO LOCAL
SECRETARÍA DE LEGISLACIÓN Y ASESORIA JURÍDICA
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
SECRETARÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SECRETARÍA DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



Firmado digitalmente por CASTILLO FAREX Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 09:39:03 -05



Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B



Firmado digitalmente por ZORPILLO CUITANA Florencio Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V B

Finalizada la Entrega de la totalidad de bienes, el Contratista deberá presentar al Área Usuaría, por Mesa de Partes de la Entidad, una carta documentada que indique la culminación del transporte y entrega de la totalidad de los bienes en la(las) institución(es) de destino.

La carta deberá contener lo siguiente:

- Los Documentos que acredite Entrega de los Bienes originales establecida por la Entidad.
- Guías de remisión del transportista, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2. ENTREGA.
- Copias del DNI del firmante, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2. ENTREGA.
- Certificados de Garantía de Adquisición de los bienes (véase el numeral 2.2.12. GARANTÍA COMERCIAL DE LOS BIENES)
- Informe Fotográfico de Entrega de Bienes donde se adjunten fotografías y/o videos de los bienes siendo entregados en la(s) dirección(es) que figure(n) en el numeral 2.2.2. LUGAR DE ENTREGA. Estas fotografías y/o videos servirán para acreditar la correcta entrega de los bienes, debiendo figurar como mínimo la siguiente información:
 - Fotografía y/o video del vehículo iniciando la descarga de los bienes, en la cual se muestre la placa del vehículo.
 - Fotografía y/o video mostrando las Instalaciones de la Institución de destino. Mínimo 1 fotografía y/o video de 10 segundos aproximados.
 - Fotografía del representante de la Institución de destino, en el momento de la recepción de los bienes. Mínimo 1 fotografía y/o video de 10 segundos aproximados.
 - Fotografías y/o videos mostrando el estado de los bienes, recepcionados mostrando el logotipo y rotulado de los bienes. Mínimo 2 fotografías y/o videos de 10 segundos aproximados.

2.2.8.3. Verificación documentaria

Finalizada la Entrega de la totalidad de bienes, el Contratista deberá presentar al Área Usuaría, por Mesa de Partes de la Entidad, una carta documentada que indique la culminación del transporte y entrega de la totalidad de los bienes en la(las) institución(es) de destino.

La documentación mencionada como parte de la carta de culminación del transporte y entrega de los bienes según lo estipulado en el numeral 2.2.8.2., será parte integral de la Verificación Documentaria que realizará el Área Usuaría.

De encontrarse alguna observación en el marco de la verificación documentaria ésta deberá ser remitida al Contratista de manera electrónica y/o física por el Área Usuaría; otorgando un plazo de entre 02 a 08 días calendario para subsanarlas.

El Contratista deberá remitir al Área Usuaría una carta por Mesa de Partes de la Entidad, indicando el levantamiento de observaciones, adjuntando la subsanación correspondiente.

La fecha de ingreso de dicha comunicación a la Entidad se tomará como fecha de fin de subsanación de las observaciones.

Si pese al plazo otorgado, el Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato total o parcialmente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades a que hubiera incurrido; y en el marco de la ley vigente.

De no encontrarse observación o de encontrarse las mismas subsanadas por el Área encargada de emitir los Documentos que acredite Entrega de los Bienes, procederá a elaborar el Informe de Cumplimiento Documentario, el cual servirá para la elaboración de la Conformidad de la etapa de Transporte y Entrega de los bienes, la cual estará a cargo del Área Usuaría.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE JORAMUNTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA
CALLE 30 DE MAYO 1018, 1ª FLOOR, 1018 CRISTO REY, DE LA ZONA URBANA DE AYACUCHO
DE AYACUCHO PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wiver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE JORAMUNTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA
CALLE 30 DE MAYO 1018, 1ª FLOOR, 1018 CRISTO REY, DE LA ZONA URBANA DE AYACUCHO
DE AYACUCHO PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



Asimismo, el Área Usuaria notificará de manera presencial y/o electrónica al Contratista para que proceda con el ingreso de la(s) Factura(s) y CCI correspondiente.

2.2.9. Conformidades

2.2.9.1. Conformidad por fabricación y embalaje

Una vez notificado el "Informe de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" por la Entidad, el Contratista deberá entregar los siguientes documentos:

- Factura

Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista. Los documentos necesarios para el pago de la conformidad de la etapa de Fabricación y Embalaje de los bienes son los siguientes:

- Informe de Verificación Cuantitativa (emitido por el Área designada por la Entidad)
- Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (emitido por el Área Usuaria)
- Factura (remitido por el Contratista)
- Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista (remitido por el Contratista).

Una vez que el Área Usuaria tenga la totalidad de los documentos antes señalados, se procederá a otorgar la "Conformidad por fabricación y embalaje de los bienes" por parte de la Entidad.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los 10 días calendario siguientes a la "Conformidad por fabricación y embalaje de los bienes", siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

2.2.9.2. Conformidad por transporte y entrega

Una vez notificado el "Informe de Cumplimiento Documentario" por la Entidad, el Contratista deberá entregar los siguientes documentos:

- Factura

Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista. Los documentos necesarios para el pago de la conformidad de la etapa de Transporte y Entrega de los bienes son los siguientes:

- Informe de Cumplimiento Documentario (emitido por el Área de la Entidad que emita los Documentos que acredite Entrega de los Bienes)
- Acta de Recepción Documentaria (suscrita por el Contratista)
- Factura (remitido por el Contratista)
- Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista (remitido por el Contratista)

Una vez ingresado los documentos antes señalados por parte del Contratista y realizada su verificación, se procederá a otorgar la "Conformidad por el transporte y entrega de los bienes" por parte de la Entidad.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los 10 días calendario siguientes a la "Conformidad por el transporte y entrega de los bienes", siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

2.2.10. Forma de pago

La Entidad emitirá los pagos según el siguiente detalle:

I. PAGO POR FABRICACIÓN Y EMBALAJE DE LOS BIENES	
Forma de Pago	Monto de Pago
Para el pago por fabricación y embalaje de los bienes, el Contratista deberá seguir el procedimiento detallado en el numeral 2.2.9.1 Conformidad por Fabricación y Embalaje)	El porcentaje y/o monto del pago será definido por la Entidad.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.
"ALEJO MUÑOZ INSULAR" N° 12 CRISTO REA DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTR.
DE CORA CORA - PROVINCIA DE PERUCCO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.
"ALEJO MUÑOZ INSULAR" N° 12 CRISTO REA DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTR.
DE CORA CORA - PROVINCIA DE PERUCCO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Ing. Luis Escobar Bellico
Residente de Obra
CIP: 211541



II. PAGO POR TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIENES	
Forma de Pago	Monto de Pago
Para el pago por transporte y entrega de los bienes, el Contratista deberá seguir el procedimiento detallado en el numeral 2.2.9.2 Conformidad por Transporte y Entrega).	El porcentaje y/o monto del pago será definido por la Entidad.

2.2.11. Incumplimiento de contrato y penalidades

2.2.11.1. Penalidades

En caso que el contratista incumpliera de forma injustificada con los plazos descritos en la presente ficha de homologación, será indefectiblemente objeto de las penalidades correspondientes según las Normas Legales vigentes (Artículo N°162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones); por consiguiente, la Entidad cobrará a través de las deducciones correspondientes.

2.2.11.2. Otras penalidades

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se determinan otras penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente y directamente relacionadas con los Bienes en el ANEXO N° 4.

La aplicación de la penalidad no exceptúa al Contratista de su responsabilidad, sobre los daños a las Instituciones de destino o terceros, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

Nota 06: La Entidad contratante podrá determinar el monto (M) dependiendo de las características del Requerimiento.

2.2.11.3. Resolución de contrato

Será motivo de la Resolución de Contrato: el incumplimiento parcial o total del Contrato, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.2.12. Garantía comercial de los bienes

CONSIDERACIONES DE LA GARANTÍA	
Garantía de los Bienes	05 años
Aplicación de Garantía (Véase Nota 07)	Hasta 15 días calendario como máximo para brindar solución; contabilizado a partir del día calendario siguiente de notificada la solicitud de aplicación de garantías.

Nota 07: La Entidad contratante podrá determinar el tiempo adecuado según el requerimiento.

El Contratista es responsable por la garantía de los bienes. La garantía es por defectos de Fabricación / Adquisición y Embalaje y no por mal uso de los bienes por parte del usuario final.

El plazo de la garantía cuenta a partir del día siguiente calendario de firmado los Documentos que acredite Entrega de los Bienes por Representantes de cada Institución de destino según lo estipulado en el numeral 2.2.8.2. ENTREGA.

La garantía deberá estar acreditada por documentación del Contratista, esta documentación deberá estar firmada por su representante legal, referida a los bienes ofertados y su transporte y entrega realizada.

Se deberá entregar 01 Certificado de Garantía por cada Institución de destino, los mismos que serán remitidos a la Entidad para la elaboración de la conformidad de la prestación, estipulando claramente el inicio del plazo de garantía de los bienes, las descripciones y números de series de los mismos, de corresponder.

El Contratista garantizará la calidad de los bienes fabricados de acuerdo a los planos y demás documentos contractuales según las especificaciones técnicas del bien.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
COLECCIÓN INSTITUCIONAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE MARISCAL NIÑEZ, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
COLECCIÓN INSTITUCIONAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE MARISCAL NIÑEZ, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

La Entidad notificará al Contratista de cualquier reclamo relacionado con la garantía de manera física y/o mediante correo electrónico, el Contratista al recibir esa notificación deberá tomar las acciones correspondientes para informar y/o reparar y/o reemplazar los bienes y/o componentes y/o instalaciones defectuosas en su totalidad o en parte según sea el caso, en las Instituciones de destino sin costo alguno para éstas, ni para la Entidad.

Si el Contratista después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del plazo indicado en el cuadro de consideraciones de garantía entonces la Entidad podrá tomar las medidas correctivas que sean necesarias, por su propia cuenta y riesgo y sin perjuicio de los demás derechos que la Entidad tenga ante el Contratista, en conformidad con la legislación vigente.

2.2.13. Responsabilidad por vicios ocultos

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo de 05 años.

Este plazo cuenta a partir del día siguiente de emitida la conformidad de la prestación por parte del área usuaria.

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

3.1 De la selección:

Documentos de presentación obligatoria por el postor:

- Relación de especies de madera a utilizar en el proceso de fabricación del bien especificado en la presente ficha de homologación. Dicha relación se presentará con el formato de Ficha de presentación de producto adjunta en el Anexo N° 07.

IV. ANEXOS

- Anexo N° 01: Formato del Lugar de destino
 - Dirección(es) de Institución(es) Educativa(s) de destino
- Anexo N° 02: Pruebas y/o ensayos para la verificación de calidad
- Anexo N° 03: Planimetría
- Anexo N° 04: Cuadro de Otras penalidades
- Anexo N° 05: Requisitos que presentar para la Suscripción del Contrato
- Anexo N° 06: Actas referenciales para el proceso de ejecución contractual
- Anexo N° 07: Ficha de presentación de producto

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221.ssf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:52:55 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lucre FAU
20514347221.ssf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:39:31 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZOPRILLA QUINTANA Florencio Antonio FAU 20514347221.ssf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 17:59:01 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANCO Tiberio Cayo FAU
20514347221.ssf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 19:16:58 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIGUEL ABUIN (N° 12) CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIGUEL ABUIN (N° 12) CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ANEXO N° 01

FORMATO PARA INDICAR LUGAR DE DESTINO

- Dirección(es) de Institución(es) Educativa(s) de destino

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20814347221.pdf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:02:17 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
TORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20814347221.pdf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 17:58:16 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
PARRA María Lupe FAU
20814347221.pdf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 08:39:38 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOS Tibanio Cayo FAU
20814347221.pdf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.02.2023 19:18:05 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO NITIC MARÍA TERESA DE LOS REYES DE COPA COPA, DISTRITO
DE COPA COPA, PROVINCIA DE PUNTA CANCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO NITIC MARÍA TERESA DE LOS REYES DE COPA COPA, DISTRITO
DE COPA COPA, PROVINCIA DE PUNTA CANCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

DIRECCION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS								
Nº DE ORDEN	CÓDIGO MODULAR	CÓDIGO LOCAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	SUB TOTAL DE BIENES
1								
2								
TOTAL GENERAL								

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221.spf
Motivo: Day V' B'
Fecha: 13.03.2023 11:52:55 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZOPRILLA QUINTANA Florencia
Antonia FAU 20514347221.spf
Motivo: Day V' B'
Fecha: 13.03.2023 17:58:31 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARRAN Maria Lupe FAU
20514347221.spf
Motivo: Day V' B'
Fecha: 15.03.2023 08:39:48 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLEO
FANOD Tibano Cayo FAU
20514347221.spf
Motivo: Day V' B'
Fecha: 15.03.2023 16:18:18 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
GNP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

ANEXO N° 02

PRUEBAS Y/O ENSAYOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD

- Normas técnicas para la verificación de mobiliario
- Control de calidad

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:52:47 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florento
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 17:58:43 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 09:39:54 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tibeno Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 19:16:30 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO AGUINALDO N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA DISTRITO
DE CORA CORA PROVINCIA DE PAMPACACHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vergas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO AGUINALDO N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA DISTRITO
DE CORA CORA PROVINCIA DE PAMPACACHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

NORMAS TECNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE MOBILIARIO

El mobiliario a fabricar, al igual que la certificación de calidad se ceñirá a las siguientes normas y sus respectivas enmiendas y revisiones con actual vigencia, según corresponda por tipo de bien.

CUADRO N° 01: NORMAS TECNICAS QUE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL MOBILIARIO ESCOLAR	
CÓDIGO	TÍTULO DE LA NORMA
RV N°019-2023-MINEDU	Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular
NTP 260.006:2019	MOBILIARIO ESCOLAR. Mesa para nivel de Educación secundaria. Requisitos. 4ª Edición.
NTP 260.010:2019	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Clasificación y tipos. 4ª Edición.
NTP 260.011:2017	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Definiciones. 3ª Edición
NTP 260.012:2017	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Embalaje. 3ª Edición
NTP 260.013:2017	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Rotulado. 3ª Edición
NTP 260.014:2021	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Muestreo. 4ª Edición
NTP 260.015:2021	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Requisitos. 5ª Edición

CUADRO N° 02: NORMAS TECNICAS QUE ESTABLECEN METODOS DE ENSAYO PARA LOS BIENES Y MATERIALES	
CÓDIGO	TÍTULO
NTP 260.025:2019	MOBILIARIO. Mesas para instituciones educativas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 4ª Edición

GLOSARIO

- **Fabricación y embalaje:** corresponde que el bien se encuentre acabado y embalado, preparado para ser utilizado en conformidad de la Entidad.
- **Transporte, entrega:** corresponde que el bien sea entregado sin deterioro por el transporte y colocado en el ambiente designado por la autoridad de cada Entidad de destino. Deberá estar conforme con la Entidad.
- **Defectos Críticos:** Defectos que imposibilita el uso del producto y/o que puede afectar la seguridad del usuario.
- **Defectos Mayores:** Defectos que, sin llegar a ser críticos, en cierto plazo afectan el uso de las unidades.
- **Defectos Menores:** Defectos que no afectan el uso de las unidades.
- **Inspección por atributos:** Inspección mediante el cual se clasifica una unidad de producto como conforme o no conforme, o se cuenta el número de no conformidades en la unidad de producto, con respecto a un determinado requisito o conjunto de requisitos.
- **Límite de Calidad Aceptable (LCA):** Es el nivel máximo permisible de unidades no conformes de la muestra de un lote.
- **Lote:** Es el conjunto de muebles de un mismo modelo fabricados en un determinado período, bajo condiciones iguales.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Genaro Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 11:52:59 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 17:59:03 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Luba FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:40:03 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tadeo Ceyo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:10:59 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
"664" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO N° 120000 "SANTO ROSARIO" DE AYACUCHO DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PLAN DE MUESTREO

Se precisa que las muestras se toman bajo el nivel de inspección S1 de la NTP 260.014.2017 vigente (incluyendo sus últimas revisiones).

CUADRO N°03: TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA MOBILIARIO									
Tamaño del Lote			Niveles de Inspección Especial				Niveles de Inspección General		
			S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2	a	8	A	A	A	A	A	A	B
9	a	15	A	A	A	A	A	B	C
16	a	25	A	A	B	B	B	C	D
26	a	50	A	B	B	C	C	D	E
51	a	90	B	B	C	C	C	E	F
91	a	150	B	B	C	D	D	F	G
151	a	280	B	C	D	E	E	G	H
281	a	500	B	C	D	E	F	H	J
501	a	1200	C	C	E	F	G	J	K
1201	a	3200	C	D	E	G	H	K	L
3201	a	10000	C	D	F	G	J	L	M
10001	a	35000	C	D	F	H	K	M	N
35001	a	150000	D	E	G	J	L	N	P
150061	a	500000	D	E	G	J	M	P	Q
500001	a	más	D	E	H	K	N	Q	R

↓ = Use el primer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el tamaño de la muestra es igual o excede el tamaño del lote lleve a cabo inspección 100%

↑ = Use el primer plan de muestreo arriba de la flecha

Ac = Número de aceptación

Re = Número de rechazo

En concordancia con las letras código según el tamaño del lote, se utilizará la siguiente tabla para determinar el tamaño de la muestra y los LCA correspondientes:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elia FAU
20614347221.spf
Motivo: Day V. B.
Fecha: 13.03.2023 11:53:26 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florentino Antonio FAU 20614347221.spf
Motivo: Day V. B.
Fecha: 13.03.2023 19:00:09 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN María Lupe FAU 20614347221.spf
Motivo: Day V. B.
Fecha: 15.03.2023 09:40:11 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES LANCOC Tiberio Cayo FAU 20614347221.spf
Motivo: Day V. B.
Fecha: 15.03.2023 15:17:05

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL N.º. SECUNDARIO EN LA COLEGIO MATEO INTRIQUIL CRISTO DE LA ZONA DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

		Límite de calidad aceptable, LAC, en porcentaje de ítemes no conformes o no conformidades por 100 ítemes: (inspección normal)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nivel de riesgo	Tamaño de muestra	0,010		0,015		0,025		0,040		0,065		0,10		0,15		0,25		0,40		0,65		1,0		1,5		2,5		4,0		6,5		10		15		25		40		65		100		150		250		400		650		1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

- La selección de las muestras del lote, se debe tomar al azar y de manera tal que se obtengan unidades de todas las partes del lote.
- Si el número de unidades de producto no conformes encontrados en la muestra es igual o menor que el número de aceptación, el lote debería ser considerado aceptable. Si el número de unidades del producto no conformes es igual o mayor que el número de rechazo, el lote debería ser considerado no aceptable.
- El nivel de inspección determina la relación que existe entre el tamaño del lote y el tamaño de la muestra.
- La clasificación de Defectos para Mobiliario para Instituciones Educativas es la siguiente:

Defectos Críticos:

Falla de compresión paralela en elementos estructurales
Grano inclinado mayor al tolerado en elementos estructurales
Pudrición
Presencia de Insectos activos
Rotura
Rajaduras
Nudos muertos
Ensamble defectuoso

Defectos Mayores

Falla de compresión paralela en elementos no estructurales
Grano inclinado mayor al tolerado en elementos no estructurales
Perforaciones de insectos inactivos mayores a los permitidos
Grietas
Armado Asimétrico
Mezcla de especies
Juntas desiguales
Alabeos de piezas mayores a los tolerados
Nudos sanos no tolerados
Inestabilidad en un plano
Inestabilidad en un plano

Defectos Menores

Acabado defectuoso
Boleado irregular de aristas

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:53:48 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:40:10 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA ZORRILLA Flavianio Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 15:00:29 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANCO Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 19:17:08 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
DISTRITO REY Y ANCO
CARRILLO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
DISTRITO REY Y ANCO
CARRILLO DE AYACUCHO
Ing. Richard Wilver Cancho Vergas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

RELACION DE ENSAYOS:		
DESCRIPCION	NORMA Y/O DOCUMENTO TÉCNICO PARA ENSAYOS Y/O PROCEDIMIENTOS	ENSAYOS
MESA METAL MADERA DE 5° DE SECUNDARIA	NTP 260.025:2019 MOBILIARIO. Mesas para instituciones educativas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 4ª Edición	ESTABILIDAD CON CARGA VERTICAL EN MESAS
		DURABILIDAD HORIZONTAL
		DURABILIDAD VERTICAL
		CARGA ESTATICA VERTICAL
		CARGA ESTATICA HORIZONTAL
	Estudio sobre el contenido de humedad equilibrio de la madera en el Perú, elaborado por el CITE MADERA.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE CONTENIDO DE LA HUMEDAD EN LA MADERA DE ACUERDO AL LUGAR DE ENTREGA

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAYO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 11:54:03 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARPAN Maria Lupe FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:40:26 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CORRELLA QUINTANA Florencio Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:00:51 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 19:17:15 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ULA
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNACUYA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ULA
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNACUYA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98710

ANEXO N° 3 PLANIMETRÍA

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO,
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347321 soft
Motivo: Doy V° S°
Fecha: 12.03.2023 11:54:15 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonia FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° S°
Fecha: 13.03.2023 18:01:46 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOGIA DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:10:51 -05:00


PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2023 19:17:23 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOGIA DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO




Ing. Luis Escebar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

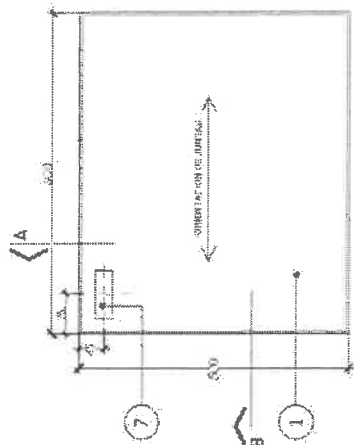

PLANTA 1
ESCALA 1/10


PRONIED
INSTITUTO NACIONAL DE AYACUCHO
REGISTRADO DEL SERVICIO EN AYACUCHO
CIP: 211541

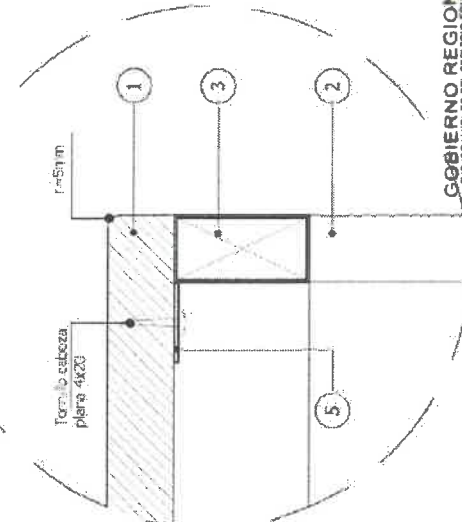


DETALLE D-01
ESCALA 1/2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


1. TABLERO DE MADERA CON UNIONES MACHIHEMBRADES O FINGER JOINT (UNIÓN ENDENTADA) $\phi=25-22\text{mm}$ ATORNILLADO A ESTRUCTURA DE ACERO CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA 4X20.
2. TUBO MECÁNICO DE ACERO ELECTROSOLDADO LAMINADO AL FRÍO 1" x 1" CALIBRE 16 (1,5 mm)
3. TUBO MECÁNICO DE ACERO ELECTROSOLDADO LAMINADO AL FRÍO 1" x 2" CALIBRE 16 (1,5 mm)
4. PERFIL DE ACERO "T" DE 1 1/2" x 1 1/2" DE 2,5MM (MÍNIMO) DE ESPESOR, PERFORADO PARA SUJECIÓN DE TABLERO.
5. PUNTOS DE SUJECIÓN DE ACERO CON PERFORACIÓN TIPO "OJO CHINO" - CALIBRE 16 (1,5mm)
6. REGATONES DE POLIPROPILENO DE 12 MM (MÍNIMO) DE EMBONE EXTERIOR O INTERIOR. LOS REGATONES PERMITIRÁN TENER UNA DISTANCIA NO MENOR DE 5 MM DEL PISO A LA ESTRUCTURA METÁLICA.
7. LOGOTIPO INSTITUCIONAL

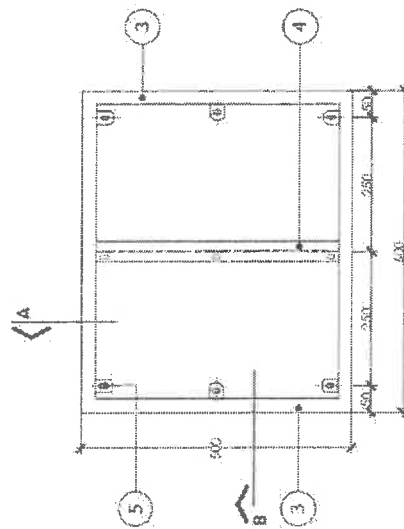


PLANTA 1 (sin tablero)
ESCALA 1/10

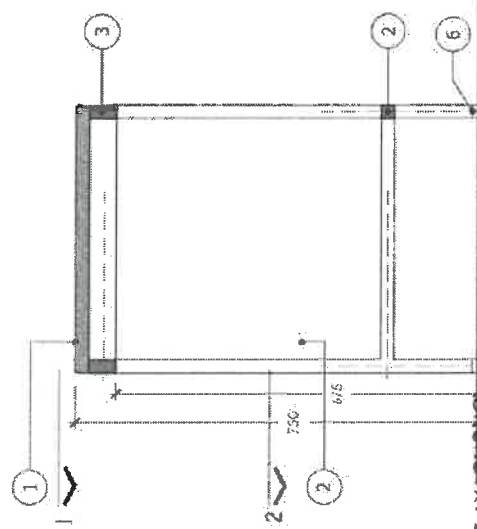

CORTE A
ESCALA 1/10

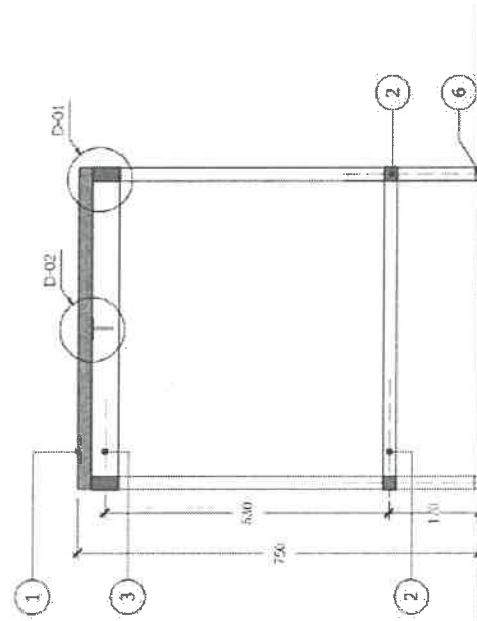

CORTE B
ESCALA 1/10

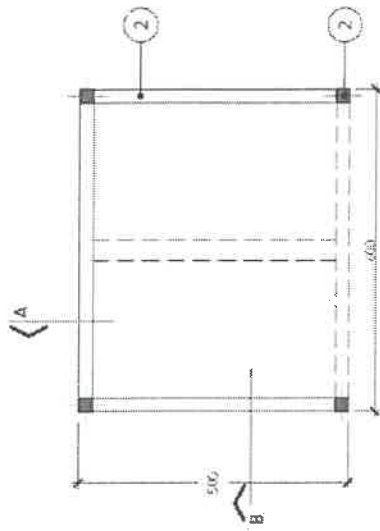

PLANTA 2
ESCALA 1/10

PRONIED
INSTITUTO NACIONAL DE AYACUCHO
REGISTRADO DEL SERVICIO EN AYACUCHO
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
REGISTRADO DEL SERVICIO EN AYACUCHO
CIP: 211541



UNIDADES: MIL METROS (mm)

MESA DE METAL MADERA 5º DE SECUNDARIA

FECHA	PROYECTO	INDICADA
13/05/2018	MSM-07	INDICADA



ANEXO N° 04 CUADRO DE OTRAS PENALIDADES

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAYO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:55:18 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 18:02:37 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:40:49 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
VANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 19:18:02 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARIACUTI, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARIACUTI, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

	de acuerdo con el numeral 2.2.8.1 Transporte					
F7	No realizar el Transporte de bienes con un vehículo cerrado de acuerdo con lo señalado en el numeral 2.2.8.1 Transporte	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 1$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 4$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 5$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	
F8	No presentar la solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad dentro del plazo establecido en numeral 2.2.7.1 Sobre la solicitud para la calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	
F9	No presentar a la Entidad los resultados de la aplicación de métodos de ensayos dentro del plazo ofertado por el Organismo de Evaluación de la Conformidad. En su propuesta técnica presentada para su designación.	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	
F10	No presentar el levantamiento de observaciones del "informe de ensayos" dentro del plazo otorgado por la Entidad Contratante.	$P = M \times Oc$ $M = 0.2$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	
F11	No presentar antes de la culminación de la etapa de Fabricación, la documentación requerida en el numeral 2.2.1 Procedencia de la madera.	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	
<p>Consideraciones:</p> <p>(*) UIT: Unidad Impositiva Tributaria, se aplicará el valor de referencia vigente, establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, en la fecha de la suscripción del contrato.</p>						

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAYO GUERRERO Gonzalez Elias FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:58:05 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FAREAN Maria Lupe FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:41:07 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA GUINTANA Francisco Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 18:03:04 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por POBLES YANQUE Benito Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 19:16:24 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA CALZADA DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA CALZADA DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ANEXO N° 05 REQUISITOS A PRESENTAR PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:58:17 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 18:33:21 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PROYACCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 96718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:41:14 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PROYACCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:18:31 -05:00

FORMATO N° 01

FORMATO N°01: CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES								
ACTIVIDADES	ETAPA: FABRICACION Y EMBALAJE DE LOS BIENES							
	MES 1				MES 2			
	día 1	día 2	día 3	día "n"	día 1	día 2	día 3	día "n"
BIEN "A"								
Actividad 1								
Actividad 2								
Actividad 3								
Actividad "n"								
BIEN "B"								
Actividad 1								
Actividad 2								
Actividad 3								
Actividad "n"								

FORMATO N° 02

FORMATO N°02: CRONOGRAMA DE ENTREGA DE BIENES								
ACTIVIDADES	ETAPA: TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIENES							
	MES 1				MES 2			
	día 1	día 2	día 3	día "n"	día 1	día 2	día 3	día "n"
INSTITUCIÓN DE DESTINO N°01								
TRANSPORTE								
ENTREGA								
INSTITUCIÓN DE DESTINO N°02								
TRANSPORTE								
ENTREGA								



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 20718



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

Notas:

- El cronograma de "Adquisición de bienes" servirá para la realización de visitas inopinadas por parte de la ENTIDAD.
- Asimismo, ambos formatos, deberán entregarse en programa MS PROJECT, MS EXCEL o similar.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:56:43 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA JIMENA Florencia Antonia FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 18:33:23 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FAREFAN Yara Lupe FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 09:41:25 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YAROC Tiberio Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 19:18:40 -05:00

FORMATO N° 03

FORMATO N°03: DESAGREGADO DE COSTOS

DESAGREGADO DE COSTOS DE BIENES A ENTREGAR A LA(S) INSTITUCIÓN(ES) BENEFICIADA(S)

REGIÓN	INSTITUCIONES DE DESTINO	DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD	COSTO UNITARIO DE ADQUISICIÓN (FABRICACIÓN Y EMBALAJE)	COSTO UNITARIO DE ENTREGA (TRANSPORTE Y ENTREGA)	COSTO UNITARIO SUB TOTAL	COSTO DE BIENES
	(1)	(2)	(C)	(A)	(B)	(A+B)	[(A+B)*C]
"A"	Institución 01	Bien "A"		\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
		Bien "B"		\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
		Bien "n"		\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
	Institución 02			\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
				\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
				\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
"B"	Institución 01			\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
				\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
	Institución 02			\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
				\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
	Institución "n"			\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
				\$/.	\$/.	\$/.	\$/.

RESUMEN DE COSTOS

COSTO TOTAL

\$/.

Consideraciones:

- (1) Se contabiliza según el número de orden del "Formato de Direcciones para la Entrega", del Anexo 01.
- (2) Según nomenclaturas del Cuadro N°01 de las presentes especificaciones técnicas.
- (A) Incluye costo del Control de Calidad, según el numeral 2.2.8.

Notas:

- Se precisa que todos los costos deben contener como máximo 02 decimales y las sumatorias deben coincidir con los totales a adjudicar.
- Asimismo, dicho formato debidamente llenado, deberá entregarse en archivo digital editable.
- Toda incompatibilidad, incluso a nivel de decimales u ordenamiento del formato distinto a lo estipulado, será tratada como observación.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 13.03.2023 11:58:58 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 13.03.2023 18:02:50 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARRAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 09:41:33 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 10:18:54 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEGIO MDTO INDUSTRIAL II 12 COSTO UNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE BAMBUCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEGIO MDTO INDUSTRIAL II 12 COSTO UNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE BAMBUCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



FORMATO N° 04

FORMATO N°04: DIRECCIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN Y ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA

Nombre de contratista o de cada empresa que conforma el consorcio	Av., Jr., Calle, Pasaje, Mz. Lote, Etc.	N°	Urbanización, Sector, Etc.	Teléfono del Local y de Propietarios	Referencia	Distrito Provincia Región

Notas:

- Máximo declarar 04 instalaciones de almacenamiento y/o talleres.
- En caso se necesite modificar los datos de la(s) dirección(es) declaradas, el Contratista deberá notificar a la Entidad mediante una carta por mesa de partes de la ENTIDAD, como plazo máximo antes del ingreso de la Solicitud de Verificación de Cantidad por la culminación de la etapa de "Adquisición y Embalaje de la totalidad de los bienes".

FORMATO N° 05

FORMATO N°05: RESPONSABLE GENERAL DE OPERACIONES

Nombres y apellidos completos	N° DNI	Cargo	N° de celular	N° teléfono fijo	Correo electrónico Institucional

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
QUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:59:28 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:41:42 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA OLIVIERA Flaminio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 12:03:42 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
VANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 16:19:02 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACUTIAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACUTIAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

FORMATO N° 06

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Por medio de la suscripción del presente documento se autoriza a (Nombre de Entidad) a realizar la notificación electrónica de las observaciones realizadas por la Entidad durante el procedimiento para suscribir el contrato, así como, para los actos efectuados durante la ejecución del contrato.

La dirección de correo electrónico autorizada es:

Correo electrónico autorizado:

[illegible]

Repita el correo electrónico autorizado:

[illegible]

Quedan exceptuados de la presente autorización, aquellos actos cuya notificación revistan formalidades especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones pública.

La notificación electrónica se acredita con la impresión del correo electrónico enviado y la Cedula de Notificación, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmación de parte del contratista.

La notificación en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación electrónica efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA
COLEJO MUÑITUBAY Nº 12 CRISTÓBAL DE LA LOCALIDAD DE TORA TORA 0510
TORA TORA PROVINCIA DE PUNTA OCHOYA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

(REPRESENTANTE LEGAL)
RUC:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAL 20514347221 por
Móvil: Day V 8*
Fecha: 13/03/2023 11:59:44 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Anterior: FAU 20514347221 soft
Motor: Joy V2 S2
Fecha: 13.03.2023 18:04:00 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Liza Lupa FAU
20514347221 soft
Movvo Day V B
Fecha: 15/03/2023 09:41:53 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NAȚIONAL
DE INFRASTRUCTURĂ EDUCATIVĂ
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANG T-Berito Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 16:19:10 -05:00.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LALE
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CUESTO REY DE LA CALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA PROV. N° 17 DE HUANUCACHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

ANEXO N° 06

MODELOS REFERENCIALES DE ACTAS PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° BF
Fecha: 13.03.2023 12:00:03 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° BF
Fecha: 13.03.2023 18:04:13 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lope FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° BF
Fecha: 15.03.2023 06:41:57 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° BF
Fecha: 15.03.2023 19:19:22 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTAUCOCHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTAUCOCHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

ACTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	
CONTRATO:	
TIPO DE BIEN:	
UBICACIÓN:	
CONTRATISTA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
FECHA:	

Siendo las _____ horas del día _____ del mes _____ del año 20____, se reunieron en el local donde se realiza el proceso de fabricación y/o almacenaje de los bienes adquiridos mediante el procedimiento de selección arriba mencionado, sitio en la dirección antes indicada; de una parte, el Sr(a) _____ en representación de la **ENTIDAD** y de la otra parte el Sr(a) _____ en representación de la empresa Contratista _____ a fin de llevar a cabo la inspección de los trabajos materia de la adquisición, encontrándose lo siguiente:

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA URBANA DE CORACORA, PROVINCIA DE PUNTA CANA, DISTRITO DE CORACORA

Ing. Luis Escobar Beltrán
Residente de Obra
CIP: 211541



PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 16.03.2023 09:42:05 -05

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA URBANA DE CORACORA, PROVINCIA DE PUNTA CANA, DISTRITO DE CORACORA



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 16.03.2023 10:19:31 -05

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas se dio lectura a la presente Acta, y no habiendo objeciones a la misma, se procedió a suscribirla por parte de los presentes.

**LA ENTIDAD
REPRESENTANTE**

Nombre
Cargo
D.N.I.

**CONTRATISTA
REPRESENTANTE**

Nombre
D.N.I.

ACTA DE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA

La firma de la presente acta da la conformidad de la recepción de documentos en original de los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA's) del Contrato N° _____, derivado del Procedimiento de selección para la _____.

Mediante la presente, se hace entrega de la cantidad de N° _____ PECOSA's en cuatro (04) juegos originales, para la entrega de los bienes correspondientes.

NOTA PARA SER CONSIDERADA

De conformidad con el numeral 2.8.9 ENTREGA DE LOS BIENES, de las Especificaciones técnicas de las Bases Integradas, se debe tener en consideración que los PECOSA, deberán ser suscritos (firmados y sellados) por el Encargado de la Institución de destino¹, dando fe de lo recibido, consignándose en cada documento: firma, post-firma, sello y fecha de recepción, copia de DNI del Encargado y documentación que acredite su cargo, debiendo recabar la entidad receptora un ejemplar original de los PECOSA, para sus efectos contables.

En caso de ausencia del Encargado de la Institución de destino², por motivos no imputables a la ENTIDAD o no contar con documentación que acredite su cargo, el PECOSA podrá ser firmado por un representante designado y autorizado por la ENTIDAD.

Los bienes serán entregados en perfecto estado de conservación, adecuadamente armados y embalados hasta su destino final, sin ningún defecto de ADQUISICIÓN / FABRICACIÓN, ni otro como consecuencia de la estiba o desestiba o del transporte.

Los datos de contacto en cada una de las Instituciones de destino para la recepción de los bienes y el firmado de los PECOSA, serán coordinados directamente por el CONTRATISTA.³

Atentamente;

NOMBRE :

DNI :

EMPRESA :

FECHA :

TELÉFONO / CELULAR:

HORA:

CORREO ELECTRONICO:

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
COMITÉ DE SELECCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
COLEGIO "FERNÁNDEZ ALFARO" DE AYACUCHO
DE CORA CORA PROVINCIA DE PUNTA CANCHA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por CAST
FARFAN María Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:42:13 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por ROSA
YANOC Rieffo Ceyo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:19:28 -05

CONTRATISTA
REPRESENTANTE

LA ENTIDAD
REPRESENTANTE

¹ Si es una Institución Educativa, los PECOSA deberán ser suscritos por el Director o Sub-director administrativo en ausencia de aquel.

² En caso de ausencia del Director o Sub-director administrativo de una Institución Educativa, el PECOSA podrá ser firmado por un representante designado y autorizado por la UGEL correspondiente a la Institución, previa coordinación con la ENTIDAD.

³ Para una Institución Educativa el contacto será coordinado directamente por el CONTRATISTA con las UGELES respectivas.

ACTA DE VERIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

CONTRATO N° _____
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN _____

Por medio del presente documento, se deja constancia que el especialista de la ENTIDAD procedió con la verificación del levantamiento de observaciones en presencia del representante de la empresa Contratista el Sr(a) _____, en el marco del contrato N° _____.

1. _____ identificado con DNI N° _____ por parte de la ENTIDAD.
2. _____ representante de la Empresa Contratista identificado con DNI N° _____.

La verificación se realizó en los ____ (n°) almacenes declarados por el contratista, durante las siguientes fechas:

DIRECCIÓN LOCAL 01:

Fecha de verificación en Local 01:

DIRECCIÓN LOCAL 02:

Fecha de verificación en Local 01:

Durante la verificación se encontró lo siguiente:

CUADRO N° 01: RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN ENCONTRADA	SUBSANADO	
			SÍ	NO
		1.		
		2.		
		1.		
		2.		
		3.		
		1.		

ANOTACIONES:

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ULA
COLEGIO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTO BAJA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98719

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 15.03.2023 19:10:48 -05

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas, del día _____, en señal de conformidad con los términos de la presente acta suscriben los intervinientes.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:42:21 -05

LA ENTIDAD
REPRESENTANTE

CONTRATISTA
REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

Nombre
D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

1

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL


ACTA DE VISITA INOPINADA N°

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	
CONTRATO:	
TIPO DE BIEN:	
UBICACIÓN:	
CONTRATISTA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
FECHA:	

Siendo las _____ horas del día ____ del mes _____ del año 20____, se reunieron en el local donde se realiza el proceso de fabricación y/o almacenaje de los bienes adquiridos mediante el contrato arriba mencionado, sito en la ubicación antes señalada, de una parte, el Sr(a) _____ en representación de la **ENTIDAD**, y de la otra parte el Sr(a) _____ en representación de la empresa Contratista

Encontrándose lo siguiente:

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA TÉCNICA Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS DE MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN U.S.A.
CALLE JOSE MARÍA PÉREZ GALVÁN Nº 12 CANTONAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CORA-CORA, DISTRITO DE CORA-CORA - PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

 Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 58118

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
 COLEGIO MAYO INDUSTRIAL N° 17-05108 (DEB) DEL MUNICIPIO DE COMANCRA, DISTRITO
 DE COMA, PROVINCIA DE ANAHUASCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
 Residente de Obra
 CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 OFICINA GENERAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL M.P.E. - REGIONAL AYACUCHO
 C/ALFARO VIAL 1005 - T. 054 200 0000 - FAX 054 200 0000
 DE CORA CORA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

 Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
 SUPERVISOR DE OBRA
 C/05-58138

PRONIE
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBL
YANC C Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° E°
Fecha: 15.03.2023 19:19:58 -05

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas se dio lectura a la presente Acta, y no habiendo objeciones a la misma, procediendo a suscribirla los presentes en señal de conformidad.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INICIACIÓN A LA EDUCACIÓN
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI
FARFAN Maria Lupe FAU
20614347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 09:42:07 -05

**LA ENTIDAD
REPRESENTANTE**
Nombre
Cargo
D.N.I.

**CONTRATISTA
REPRESENTANTE**

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA INCITAI

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antes: FAU 20514347221 sof
Motivo: Day V² B²
Fecha: 13.03.2023 18:05:04 -05:00

ACTA DE DEVOLUCIÓN DE BIENES

CONTRATO N° _____
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN _____

Siendo las _____ horas, del día _____ de _____ de 20____; se reunieron en el local de la empresa _____, el Supervisor de la ENTIDAD, _____, identificado con DNI N° _____, el representante de la empresa Contratista el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____ y el representante del Organismo de Evaluación de Conformidad _____ identificado con DNI N° _____, con la finalidad de realizar la devolución de los bienes ensayados como parte del control de calidad, en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de la _____.

ANOTACIONES:.....
.....
.....
.....

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas, en señal de conformidad con los términos de la presente acta, suscriben los intervinientes.

LA ENTIDAD REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN CERTIFICADORA DE CALIDAD REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

CONTRATISTA REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 12:03:29 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 06:42:35 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Ariente FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 18:05:18 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROSLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 19:20:10 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE AYACUCHO DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACUTINS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

 Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE AYACUCHO DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACUTINS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS

CONTRATO N° _____
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN _____

Siendo las _____ horas, del día _____ de _____ de 20____; se reunieron en los Almacenes de la empresa Contratista _____, el Supervisor de la ENTIDAD, el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____, el representante de la empresa Contratista el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____ y el representante del Organismo de Evaluación de Conformidad, _____, el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____, con la finalidad de realizar la verificación técnica a través de ensayos de funcionalidad de los bienes materia del contrato antes citado, para tales efectos se procederá a tomar el número de muestras que pasarán por control de calidad, según lo establecido en el Anexo N° 02 de las Especificaciones Técnicas, tal como se detalla a continuación:

CUADRO N° 01: MUESTRAS Y ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD			
N° DE ORDEN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE MUESTRAS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL DE MUESTRAS			

ANOTACIONES: _____



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas, en señal de conformidad con los términos de la presente acta, suscriben los intervinientes.

LA ENTIDAD
REPRESENTANTE

Nombre _____

D.N.I. _____

EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN
CERTIFICADORA DE CALIDAD
REPRESENTANTE

Nombre _____

D.N.I. _____

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:03:16 -05:00

CONTRATISTA
REPRESENTANTE

Nombre _____

D.N.I. _____

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORILLA GUSTAVO Florencio
Anterior FAU 20514347221.pdf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 15:05:39 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLE
YANGC Tibiano Cayo FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 19:20:24 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:42:41 -05:00

SERVICIO	:
MODALIDAD	:
CONTRATO	:
UBICACIÓN	:
CONTRATISTA	:

De la verificación realizada, se observan las siguientes cantidades:

[illegible]

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA LE-
COLEGIO MIXTO UNICUTRAL N.º CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA PROVINCIA DE PANAQUCHUS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

U.S. Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 76-A MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
 COLECCION DE LIBROS "S" Y "M" 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
 DE CORA, PROVINCIA DE TARMACAYOCOS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANOC Tiberio Cayo FAU
20614347221 soft
Móvil: Doy V* B*
Fecha: 16.03.2023 19:20:32 -05

CONCLUSIÓN:

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Siendo las _____ horas del día ____ de _____ del año 20____, se procedió a firmar el presente Acta por triplicado.

PRONIEI
PROGRAMA NAȚIONAL
DE ÎMBĂLȘĂRI ALE ÎNCĂLZIRII
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CAST
FARFAN, Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Activo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:42:48 -05

ÁREA DESIGNADA POR LA ENTIDAD REPRESENTANTE

ÁREA USUARIA
REPRESENTANTE

**CONTRATISTA
REPRESENTANTE**

¹ La Entidad define quien es el área competente de emitir la conformidad cuantitativa.

ANEXO N° 7

FICHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 12:02:24 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZOPRILLA QUINTANA Florencio
Anterior FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 18:06:07 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lope FAU
20314847221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:42:55 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
XAHOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 19:20:41 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 11 CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA OCHOA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vergas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 11 CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA OCHOA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 244541

Anexo N° 07

Ficha de presentación del producto

El postor deberá completar los datos de la tabla siguiente:

Nombre del requerimiento		
N°	Especie(s) maderable(s) con la(s) que atenderá el requerimiento (véase Nota 1)	Nombre o Razón social del Postor
1		
2		
...		

Nota 01: El contratista podrá proponer una especie de madera similar o superior a las indicadas en el número 2.1 del numeral 2.1.1. Características y especificaciones, siempre y cuando esta cumpla con las propiedades físicas, mecánicas y de durabilidad.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO, Gonzalo Elias FAU
20614347221 scfi
Motivo: Day v° B°
Fecha: 13.03.2023 12:02:13 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA, Ricardo
Antonio FAU 20614347221 scfi
Motivo: Day v° B°
Fecha: 13.03.2023 16:00:19 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
PAPPAN, María Lupe FAU
20614347221 scfi
Motivo: Day v° B°
Fecha: 15.03.2023 09:42:01 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANCO T. Carlo Cayo FAU
20614347221 scfi
Motivo: Day v° B°
Fecha: 15.03.2023 19:00:53 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CENTRO REGIONAL DE AYACUCHO, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CENTRO REGIONAL DE AYACUCHO, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Richard Wilver Cancho Vergas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 96718

FICHA DE HOMOLOGACIÓN

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

Código del CUBSO : 56121502-00390343

Denominación del requerimiento : Silla de metal y madera para estudiante de 5° de secundaria.

Denominación técnica : Silla de estudiante de secundaria fija de metal y madera de 41 cm x 48.2 cm x 87 cm

Unidad de medida : Unidad.

Resumen : Silla de estructura de metal, asiento y respaldar de tablero de madera y accesorios de fijación, para 01 estudiante, con 870 mm de altura total, 410 mm de ancho y 482 mm de profundidad total. Destinada a la población esudiantil de 5° del nivel secundaria de la Educación Básica Regular.

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

La silla de metal y madera para estudiante de 5° de secundaria, está conformado por los siguientes componentes:

- Estructura de silla
- Tableros de madera de silla
- Ensamblaje y accesorios

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

2.1.1. Características y especificaciones del bien

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEGIO MIO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA CUNZA DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTALEGUA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 96718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 10:14:28 -05

N°	Características	Especificación	Documento Técnico de Referencia
1. Estructura de silla			
1.1	Material	Tubo mecánico electro soldado de acero laminado al frío	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición. Numeral 5.3.1.1
1.2	Resistencia a la tracción	≥ 45 ksi [310 MPa]	ASTM A513 Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing Tabla S5.1
1.3	Límite de fluencia	≥ 32 ksi [221 MPa]	
1.4	Composición química	C máx. 0.15% Mn máx. 0.60% P máx. 0.035% S máx. 0.035%	ASTM A513 Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing Tabla1 y Tabla 2





GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEGIO MIO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA CUNZA DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTALEGUA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

1.5	Patás y respaldar		
1.5.1	Sección de tubo: estructural	Circular Ø 1"	Establecido por el Ministerio
1.5.2	Espesor nominal de la pared del tubo estructura principal	1,2 mm calibre 18	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.3.1.1 Tabla 11
1.5.3	Dimensiones estructurales	Véase Anexo N° 03 Lámina L-14	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Cuadro N°5
1.6	Arriostre inferior		
1.6.1	Sección de tubo: estructural	Cuadrado 5/8"	Establecido por el Ministerio
1.6.2	Espesor nominal de la pared del tubo	1,0 mm	Establecido por el Ministerio
1.6.3	Dimensiones estructurales	Véase Anexo N° 03 Lámina L-14	Establecido por el Ministerio
1.7	Plancha perforada		
1.7.1	Límite de fluencia (véase Nota 01)  GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OFICINA GENERAL DE ASESORIA TÉCNICA DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE AYACUCHO CALLE 20 DE SETIEMBRE N° 12 CORO REY DE LA CALABAZA DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANCHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	20[140] ≤ Ksi [Mpa] ≤ 40[275]	ASTM A1008/A1008M Standard Specification for Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy and High-Strength Low-Alloy with improved Formability. CS Tipo B Tabla 3
1.7.2	Composición química (véase Nota 01)  Ing. Richard Wilver Cancho Vargas SUPERVISOR DE OBRA CIP: 98718	C máx. 0.15% Mn máx. 0.60% P máx. 0.030% S máx. 0.035%	ASTM A1008/A1008M Standard Specification for Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy and High-Strength Low-Alloy with improved Formability. CS Tipo B Tabla 1  PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por ROBLI YANOS Tiberto Cayo FAU. 20514347221 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 16.03.2023 10:15:45 -05
1.7.3	Dimensiones	Véase Anexo N°03 Lámina L-14	Establecido por el Ministerio  PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL
1.7.4	Espesor	1,0 mm	Establecido por el Ministerio Firmado digitalmente por CASTI FARIAS María Luce FAU. 20514347221 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 16.03.2023 14:28:03 -05
1.7.5	Arreglo de perforación	60°	Establecido por el Ministerio
1.7.6	Diámetro de perforación	10 mm	Establecido por el Ministerio

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

1.7	Soldadura	<i>Metal Inner Gas (MIG) de micro alambre que no dejará escoria, previamente decapada.</i>	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.3.1.1 apartado c)
		Todas las uniones soldadas entre elementos metálicos deberán tener un cordón de soldadura continuo en todo el perímetro de la unión. Las uniones deberán tener un acabado uniforme.	Establecido por el Ministerio
1.8	Acabado	Preparación de la superficie: Los tubos deben recibir un baño de desengrase, de desoxidación (decapado), de reactivado, de fosfatizado y un baño para pasivado con el objeto de eliminar óxidos, escamas de óxido y grasas. Luego debe ser sometido a un proceso de secado para eliminar toda humedad interior y exterior.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.3.2
		Recubrimiento en polvo; recubrimiento en polvo termo convertible, de tipo epoxi o epoxi-poliéster. La película depositada será de 80 micrones mínimo, brillo semimate. Curado mediante horneado para que adquiera la apariencia adecuada, las propiedades mecánicas y químicas finales.	
1.9	Color	RAL 7032	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Anexo N° 02
1.10	Defectos no tolerables	Deformaciones, grietas, puntas o filos, salpicaduras y espacios vacíos entre o los elementos metálicos	Establecido por el Ministerio

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL N.º 1, SECUNDARIO EN LA J. L. C. DE CORA CORA PROVINCIA DE PUNO, CANTON DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL N.º 1, SECUNDARIO EN LA J. L. C. DE CORA CORA PROVINCIA DE PUNO, CANTON DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLE
YANCO Tibeño Cayo FAU
20514347221 soft
Módulo: Dey V° B°
Fecha: 16.03.2023 10:15:52 -05/

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Versión: 02

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Módulo: Dey V° B°


PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA GUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Módulo: Dey V° B°

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN María Luisa FAU
20514347221 soft
Módulo: Dey V° B°

Página 3 de 55

2. Tableros de madera de silla			
2.1	Especies de madera (Véase Nota 01, Nota 02 y Nota 03)	AGUANOMASHA (<i>Machaerium inundatum</i>)	Establecido por el Ministerio
		CACHIMBO ROJO (<i>Cariniana domestica</i>)	
		COPAIBA (<i>Copaifera paupera</i>)	
		HUAYRURO (<i>Ormosia coccinea</i>)	
		MASHONASTE (<i>Clarisia racemosa</i>)	
		REQUIA (<i>Guarea kunthiana</i>)	
		ULCUMANO (<i>Podocarpus oleifolius</i>)	
		TORNILLO (<i>Cedrelinga cateniformis</i>)	
2.2	Densidad básica	0,45 g/cm ³ a 0,70 g/cm ³	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.1
2.3	Flexión estática	MOR ≥ 501 kg/cm ²	
		MOE ≥ 90 t/cm ²	
2.4	Compresión perpendicular	ELP ≥ 41 kg/cm ²	
2.5	Cizallamiento	≥ 61 kg/cm ²	
2.6	Dureza en lados	≥ 301 kg/cm ²	
2.7	Tenacidad	≥ 1,8 kg-m	 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO <small>OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA NOROCCIDENTAL Y CENTRO SUR DEL AYACUCHO DE 2014 2016, D.R. DE CORA-CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE Tarma</small> Ing. Richard Wilver Cancho Vargas <small>SUPERVISOR DE OBRA CIP: 98718</small>
2.8	Contenido de humedad de la madera (Véase Nota 04)	<p>Para establecer el CHE de la madera a ser utilizado en los diferentes usos, en función del lugar donde prestará servicio, se deberá tomar como referencia la información brindada en el aplicativo "Calculadora CHE Perú" disponible en el Play Store indicado en el siguiente link:</p> <p>https://play.google.com/store/apps/details?id=io.itp.calculadorache&hl=es_PE&gl=US&fbclid=IwAR0pqkKVLtGOGJqP33eo6J9N6g1x_UeIL0VjBI4OPDj4BLZV-IjmMCS7S7o</p>	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.5.1

2.9	Preservación	La madera a emplearse debería resistir el ataque de insectos y hongos xilofagos, para lo cual, en previsión de posibles ataques de agentes biológicos que contribuyan a la degradación, es recomendable utilizar preservantes que garanticen la inocuidad para el uso del mobiliario.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.5.2
2.10	Juntas de tablero	Machihembrada o endentadas (Finger Joint) con listones de 50 mm de ancho como mínimo. Tener en cuenta el balance de los anillos de crecimiento de la madera para prevenir alabeos no tolerados.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.7.2
2.11	Dimensiones de tableros (Véase Anexo N°03, Lámina L-14A)		
2.11.1	Asiento		
2.11.1.1	Profundidad	380 mm	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Cuadro N°5
2.11.1.2	Ancho	410 mm	
2.11.1.3	Espesor	22-25 mm	Establecido por el Ministerio
2.11.2	Respaldar		
2.11.2.1	Altura	250 mm	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Cuadro N°5
2.11.2.2	Ancho	410 mm	
2.11.2.3	Espesor	Véase Anexo N° 3 Plano L-14A	Establecido por el Ministerio
2.12	Encolado	Colas PVA con 48% de sólidos como mínimo, no tener una antigüedad de fabricación mayor a 6 meses y de fraguado al ambiente. El adhesivo debe colocarse en la superficie de las dos piezas a encolar	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.8

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA URBANA DE AYACUCHO
CALLE 100 N° 1200, 5ª ETAPA, 12000, AYACUCHO, PERÚ
DE AYACUCHO, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas

SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 10:26:31 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencia Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 17:48:24 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA URBANA DE AYACUCHO
CALLE 100 N° 1200, 5ª ETAPA, 12000, AYACUCHO, PERÚ
DE AYACUCHO, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROSA YANCO Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 12:16:11 -05

2.13	Lijado	Lijado manual o mecánico. Grano mínimo de 150 grit.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.9
		La superficie debe quedar totalmente lisa y suave al tacto, libre de astillas, irregularidades, cantos vivos y poros levantados; las aristas serán redondeadas.	
2.14	Acabado	Laca selladora mate o semi- mate translúcida o lacas catalizadas o un material de recubrimiento con dureza y durabilidad equivalente o superior a las consideraciones técnicas siguientes: - Base de nitrocelulosa, aditivos plásticos y metálicos - Sólidos en Volumen 27 ± 2 % - Espesor de Película Seca 2.0 – 3.0 mils por capa	NTP 260.008:2019 MOBILIARIO ESCOLAR. Silla para nivel de educación secundaria. Requisitos. 4ª Edición Numeral 7.2.5
		Mínimo 3 capas, aplicado en la totalidad de las superficies.	Establecido por el Ministerio
2.15	Defectos no tolerables en madera		
2.15.1	Perforaciones grandes	Mayor de 3 Agujeros con diámetro mayores a 6mm, por metro lineal y no alineados	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.4  GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OFICINA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA UG EJECUTIVO MUNICIPAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA ALCAZAR DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PAMPACORCA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Ing. Richard Wilver Cancho Vargas SUPERVISOR DE OBRA CIP: 98718
2.15.2	Rajaduras y Grietas	Mayor a 20 mm de largo, 0,5 mm de ancho, y mayor a la tercera parte del espesor de la pieza.	
2.15.3	Inclinación del grano	Mayor a 10°	
2.15.4	Falla de compresión paralela	Máximo en dos lados consecutivos y no perjudiquen la solidez.	
2.15.5	Defectos de forma	Mayor al 0,3% de la longitud de la pieza	
2.15.6	Presencia de hongos de pudrición	No se admiten	
2.15.7	Presencia de insectos activos	No se admiten	

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA UG
EJECUTIVO MUNICIPAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA ALCAZAR DE CORACORA, DISTRITO
DE CORACORA, PROVINCIA DE PAMPACORCA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211641

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLE
YANUC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doc V° B°
Fecha: 18.03.2023 10:18:05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Versión 02


Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doc V° B°


PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonia FAU 20514347221 soft
Motivo: Doc V° B°

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTELLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doc V° B°

2.15.8	Defectos por nudos	Mayor de 20 mm de diámetro y mayor a la cuarta parte del ancho del material	
2.15.9	Nudos muertos	No se admiten	
2.15.10	Mezcla de especies	No se admiten	
2.15.11	Presencia de médula y/o corteza	No se admiten	
2.15.12	Inestabilidad en un plano	No se admiten	NTP 260.014:2021 MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Muestreo. 4ª Edición Anexo A
2.15.13	Ensamblajes defectuosos	No se admiten	Establecido por el Ministerio
2.15.14	Acabado defectuoso	No se admiten	
2.16	Defectos tolerables		
2.16.1	Perforaciones pequeñas	Agujeros de 1 mm a 3 mm de diámetro, que sumados sus diámetros den un máximo de 6 mm en un área de 100 cm ² , no alineados ni pasantes	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.3 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. CUE 30 MO "D. S. TRAIL" 12 OMSO REY, DEL DISTRITO DE CORA, PROVINCIA DE SAN VICENTE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
2.16.2	Mancha azul	No cuantificable mientras no afecte la resistencia de la madera	
3. Accesorios y piezas de ensamble			 Ing. Richard Wilver Cancho Vergas SUPERVISOR DE OBRA CIP: 98718
3.1	Regatones		
3.1.1	Material	Polipropileno (PP)	Establecido por el Ministerio
3.1.2	Dimensiones	12 mm (mínimo) de embone exterior o interior a la estructura metálica. Distancia no menor de 5 mm de separación entre el piso y la estructura metálica. (Véase Lámina L-14A)	Establecido por el Ministerio
3.1.3	Color	RAL 9005 (negro)	Establecido por el Ministerio
3.2	Platina de acero electrosoldado		
3.2.1	Material	Acero laminado	Establecido por el Ministerio
3.2.2	Dimensiones mínimas	25mm x 30mm (Véase Lámina L-14A)	Establecido por el Ministerio



2.1.2.2. Identificación de fabricante

Para la identificación del fabricante de la silla de metal y madera para estudiante de 5° de secundaria, se colocará una lámina autoadhesiva en cada uno de los bienes a adquirir. Este rotulado tendrá las siguientes características:

Características	Especificación
Dimensiones	8-12 cm (ancho) x 4-8 cm (alto)
Material	Autoadhesivo
Color	Marrón
Fuente	Arial
Tamaño de letra	7 puntos mín.
Información a consignar	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de la entidad usuaria en el encabezado - Nombre del procedimiento de selección - Descripción de los bienes (código del bien y Nombre del bien) - Nombre del contratista, dirección y teléfono
Ubicación	Parte inferior del bien

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN N°

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Código del bien, Nombre del Bien)

NOMBRE DEL CONTRATISTA (indicar el nombre de todas las empresas que conforman el consorcio de corresponder)

DIRECCIÓN

TELÉFONO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA CIUDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACUTIAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIEC
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANCOC Liborio Cayo FAU:
20614347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 16.03.2023 10:16:54 -05

PRONIEC
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI
FARFAN Maria Lupe FAU:
20614347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 13.03.2023 14:26:55 -05

2.1.3. Embalaje

Los bienes deben de estar embalados en su totalidad, de forma que no se dañen o deterioren durante el transporte hasta el destino final, tomando en cuenta para la envoltura y embalaje, según lo indicado en la NTP 260.012:2017 MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Embalaje. 3ª Edición.

PRONIEC
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA GUINERANA Florencio
FAU: 20614347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 09.03.2023 17:50:54 -05:00

2.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

2.2.1. Procedencia de la madera

El contratista debe garantizar el origen legal de la madera que utiliza como materia prima para la fabricación de mobiliarios de madera. Para ello, la madera que se adquiere debe estar sustentada con la Gufa de Transporte Forestal (GTF), conforme a lo establecido en el Artículo 168 del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado mediante Decreto

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA CIUDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACUTIAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido

PRONIEC
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU:
20614347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 08.03.2023 16:30:13 -05:00

Supremo N° 018-2015-MINAGRI, en el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, según corresponda:

- Para los casos de madera de especies forestales nativas, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Transporte Forestal (GTF) que ampara la procedencia de la madera. En los casos de títulos habilitantes, en la GTF debe estar consignada la resolución de aprobación del plan de manejo forestal o resolución que aprueba el aprovechamiento forestal (reingresos, movilización de saldos, etc.).
- Para los casos de madera de especies forestales introducidas, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Remisión (GR) con la descripción de la especie que la identifique como introducida y el número de registro de la plantación.
- Para los casos de madera importada, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Remisión (GR) y los documentos de importación.

En el caso el contratista no pueda garantizar el origen legal de la madera, la Entidad contratante podrá notificar a las entidades sancionadoras, en el marco del Art. 215 del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.

2.2.2. Lugar de entrega

El lugar de entrega de los bienes será determinado por la Entidad contratante, para lo cual brindará el detalle de la(s) dirección(es) respectiva(s). Para ello, podrá tomar en consideración el formato "Dirección(es) de Institución(es) de destino", adjunto en el Anexo N° 01.

Cualquier cambio respecto al lugar de entrega de los bienes dentro de la misma provincia, será comunicado al Contratista por la Entidad contratante, mediante correo electrónico hasta el inicio de la etapa de transporte y entrega de los bienes, sin que dicho cambio suponga una variación en plazos ni costos contractuales de ninguna índole.

En caso la Entidad contratante determine que la entrega de los bienes será en recintos de Instituciones Educativas Públicas, se podrá tomar en consideración el formato "Direcciones de Instituciones Educativas" adjunto en el Anexo N° 01. Asimismo, la Entidad contratante deberá realizar mediante correo electrónico, la notificación al Contratista, respecto de cualquier cambio sobre la asignación de los códigos modulares para la Institución Educativa, sin que dicho cambio suponga el incremento de costos o de tiempo de entrega, todo ello, antes de la elaboración de los Documentos que Acrediten la Entrega de los Bienes.

2.2.3. Etapas de la ejecución contractual

La ejecución se dará en 03 etapas:

1. Etapa de fabricación y embalaje de bienes
2. Etapa de Control de Calidad
3. Etapa de transporte y entrega de bienes

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEGIO INDUSTRIAL N° 12 COMPLEJO DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 21184

ETAPAS DE EJECUCIÓN		
N°	ETAPA	DESCRIPCIÓN
1)	Fabricación y embalaje de los bienes	El Contratista deberá llevar a cabo la fabricación de los bienes según lo establecido en la Sección Técnica de la presente ficha y sus respectivos anexos; y los numerales 2.2.6.1. Fabricación y 2.2.6.2. Embalaje.
2)	Control de Calidad	El contratista deberá llevar a cabo el control de calidad de los bienes, según lo establecido en el numeral 2.2.7.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
FARFÁN María Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 12:17:10 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Genzo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 16:30:24 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
SORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 17:51:18 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFÁN María Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 14:27:02 -05:00

3)	Transporte y entrega de los bienes	El Contratista deberá transportar y entregar la totalidad de los bienes, según lo establecido en los numerales 2.2.8.1. Transporte y 2.2.8.2. Entrega.
----	------------------------------------	--

Consideraciones:

A partir de la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de los bienes, se ingresa a la etapa de control de calidad, dentro de dicho periodo se realizarán las siguientes actividades:

- Verificación Cuantitativa, a partir del día siguiente hábil del ingreso de la "Solicitud de verificación de cantidad por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes" (véase numeral 2.2.7.2)
- Verificación Técnica (véase numeral 2.2.7.3.), a partir del día hábil siguiente de emitido el Informe de Verificación Cuantitativa, contará con las siguientes subetapas:
 - Toma de muestras por parte del Organismo de Evaluación de la Conformidad (véase numeral 2.2.7.1.), a partir del día siguiente hábil de emitido el Informe de Verificación Cuantitativa.
 - Aplicación de métodos de ensayos de los bienes a cargo del Organismo de Evaluación de la Conformidad, a partir del día siguiente hábil de la suscripción del Acta de Toma de Muestras.
 - El Área Usuaria realizará las Inspecciones Técnicas a los bienes, las cuales físicamente se ejecutarán dentro del plazo máximo programado para la aplicación de métodos de ensayos antes mencionados.
- Verificación de la documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes, a partir del día siguiente hábil del ingreso de dicha documentación al Área Usuaria (véase numeral 2.2.7.4).
- Elaboración y notificación de los documentos que acredite entrega de los bienes, a partir del día siguiente hábil de realizada la notificación indicando la aprobación al sustento de las condiciones mínimas para el transporte de los bienes. Finaliza con la entrega de los documentos que acredite entrega de los bienes y la suscripción del Acta de Recepción Documentaria, entre la Entidad Contratante y el Contratista (véase numeral 2.2.8).

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL
DIRECCIÓN DE INFRACSTRUCTURA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SUMINISTROS
DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Ing. Richard Wiver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL
DIRECCIÓN DE INFRACSTRUCTURA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SUMINISTROS
DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



2.2.4. Plazos de ejecución

El plazo de ejecución por cada etapa será determinado por la entidad contratante de acuerdo con la cantidad de bienes a adquirir, la ubicación y accesibilidad al (a los) lugar(es) de destino, y cualquier otra consideración propia del requerimiento específico de la Entidad.

Considerar la información contenida en el siguiente cuadro, de forma referencial, para los plazos de la ejecución contractual.

PLAZO DE EJECUCIÓN (días calendario)				
Cantidad de bienes a adquirir (Und.)	Etapas de fabricación y embalaje (días)	Etapas de control de calidad (días)	Etapas de transporte y entrega (días)	Plazo total de ejecución (días)
1-1,000	10-80	70-75	5-10	85-165
1,000-5,000	40-100	75-80	10-30	125-210
5,000 – 10,000	60-130	75-80	30-50	165-260
10,000 – más	Más de 130	Más de 80	Más de 50	Más de 260

En el siguiente cuadro se detalla el inicio y fin de los plazos respectivos por cada etapa:

PLAZO DE EJECUCIÓN			
N°	ETAPA	PLAZO	
1)	Fabricación y embalaje de los bienes	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día siguiente de suscrito el contrato. (véase numeral 2.2.5.1 Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de fabricación y embalaje, por parte del contratista, se tomará en cuenta el día del ingreso de la Solicitud de verificación de cantidad. (véase numeral 2.2.6.1 Fabricación)
2)	Control de Calidad	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día siguiente del ingreso de la "Solicitud de verificación de cantidad por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes" (véase numeral 2.2.7.2)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de control de calidad, por parte del contratista, se tomará en cuenta la entrega de los Documentos que acrediten la entrega de bienes y la suscripción del ACTA DE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA, entre el Área usuaria y el CONTRATISTA. (véase numeral 2.2.8.2)
3)	Transporte y entrega de los bienes	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día calendario siguiente de suscrita el Acta de Recepción Documentaria, referida a las "Actas de Entrega de Bienes" entregadas por la Entidad al Contratista. (véase numeral 2.2.8.1 Transporte)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de transporte y entrega, por parte del contratista, deberá ingresar una carta en la cual deberá comunicar el término del Transporte y Entrega de los bienes, y se tomará en cuenta la fecha máxima de recepción consignada en los Documentos que acredite Entrega de los Bienes. (véase numeral 2.2.8.2 Entrega)

Nota 04: La propuesta del Contratista deberá considerar las previsiones necesarias para realizar la entrega en las instituciones beneficiadas, según las condiciones climáticas imperantes en la zona.

GOBIERNO REGIONAL DE
 OBRA, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

2.2.5. Consideraciones generales

2.2.5.1. Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato

Para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar los siguientes documentos:

Documentación a presentar:

- Cronograma de ejecución del contrato.
- Detalle de los precios unitarios del precio ofertado.
- Presentación de talleres de producción y almacenes.
- Presentación de responsable general de operaciones.
- Declaración Jurada de Almacenaje de los Bienes.
- Plan Covid-19

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL "CRISTO REY" EN LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNACUCHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL "CRISTO REY" EN LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNACUCHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.03.2023 16:30:45 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.03.2023 17:51:49 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:27:17 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2023 10:17:26 -05:00

En el siguiente cuadro se detallan los documentos antes mencionados:

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		
#	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
a)	Cronograma de ejecución del contrato	<p>Deberá incluir fechas y plazos programados para todas las etapas del contrato establecidos en el numeral 2.2.4. PLAZOS DE EJECUCIÓN.</p> <p>El Contratista deberá presentar un Cronograma Gantt en archivo nativo (formato editable) en programa MS Project, MS Excel o similar. Para ello, deberá ceñirse a los FORMATO N° 01 y FORMATO N° 02, adjuntos en el Anexo N° 05.</p>
b)	Detalle de los precios unitarios del precio ofertado	<p>El cuadro de "Detalle de los precios unitarios del precio ofertado" deberá ser desagregado por Institución de destino, y deberá detallar los costos de adquisición y entrega según la región donde se ubiquen las Instituciones de destino.</p> <p>Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N°03, adjunto en el Anexo N° 05.</p>
c)	Presentación de las ubicaciones de los talleres de producción y almacenes	<p>Se deberá presentar la(s) dirección(es) de su(s) instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes (máximo 04 instalaciones de almacenamiento y/o talleres de fabricación) y los datos del personal técnico de contacto.</p> <p>Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N° 04, adjunto en el Anexo N°05.</p>
d)	Presentación de responsable general de operaciones	<p>Se deberá presentar un formato donde se deberá designar un responsable, el que deberá contar con capacidad de decisión frente a cualquier contingencia que se presente y quien será la persona autorizada para coordinar directamente con la Entidad contratante aspectos relacionados con las prestaciones.</p> <p>Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N° 05, adjunto en el Anexo N° 05.</p>
e)	Declaración Jurada de Almacenaje de los Bienes	<p>El postor ganador deberá remitir una Declaración Jurada donde se compromete a realizar el almacenaje de los bienes en ambientes techados, sin goteras, sin filtraciones, a fin de garantizar la calidad e integridad de los bienes fabricados y/o almacenados.</p> <p>En caso de incumplimiento se aplicarán las penalidades estipuladas en el numeral 2.2.11.2. OTRAS PENALIDADES.</p>
<p>Consideraciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos los documentos indicados en el presente numeral deberán ser presentados de forma digital e impresa, con la firma del representante legal, en idioma castellano. - Toda la documentación a ser entregada por el Contratista se remitirá por Mesa de Partes de la Entidad contratante y/o el canal determinado por dicha Entidad. - La Entidad contratante se encargará de revisar el "Cronograma de ejecución del contrato" y el "Detalle de los precios unitarios del precio ofertado" de la propuesta económica, para garantizar que se cumpla con el plazo de ejecución establecido. Luego de la revisión se emitirá la conformidad respectiva o se plantearán las observaciones que deben ser subsanadas por el postor dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. - La presentación del cronograma no significa que existirá una variación del plazo de ejecución contractual con el que cuenta el Contratista para la ejecución de sus prestaciones, los cuales se indicarán según lo estipulado en el numeral 2.2.3. PLAZOS DE EJECUCIÓN. 		

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 OBRA DE ENTREGA DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA L.
 COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL "C" DE TAYANAHUAYAN, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PUNTA CANCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
 Residente de Obra
 CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 OBRA DE ENTREGA DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA L.
 COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL "C" DE TAYANAHUAYAN, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PUNTA CANCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Richard Wlwyer Cancho Vargas
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 98718

PRONIEI
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
 YANOC Tiberio Cayo FAU:
 20514347221 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 16.03.2023 10:17:34 -05

PRONIEI
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI
 FARFAN Lilia Lupe FAU:
 20514347221 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 16.03.2023 14:27:25 -05

PRONIEI
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
 ZORRILLA CUPITANA Florencia
 Antonio FAU: 20514347221 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 09.03.2023 17:52:14 -05

PRONIEI
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
 GUERRERO Genzele E. FAU:
 20514347221 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 09.03.2023 16:30:59 -05:00

2.2.5.2. Entrega de adelanto

La Entidad contratante determina si se otorga adelanto de pago al contratista. De ser el caso, el contratista podrá solicitar dentro del plazo establecido por la Entidad contrante la entrega del adelanto del 30% del monto del contrato, a partir del día siguiente de suscrito el Contrato, según lo dispuesto en el Artículo N° 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Entidad contrante establecerá el plazo de entrega del adelanto a favor del Contratista.

El pago del adelanto se hará en la moneda establecida por la Entidad contrante.

2.2.5.3 Sobre las comunicaciones electrónicas emitidas por la entidad

El Área Usaria de cada Entidad contratante determinará el correo electrónico a través del cual se realizarán todas las comunicaciones que emita durante la ejecución del contrato, lo cual será comunicado después de su suscripción.

En el caso que el Área Usaria realice alguna modificación (ya sea un cambio y/o la adición de una nueva dirección electrónica para la comunicación) a la presente dirección, esta será notificada al Contratista vía correo electrónico durante la ejecución contractual.

La Entidad comunicará a la(s) Institución(es) de destino el contenido de las bases del presente procedimiento de selección con la finalidad que se tome conocimiento de la documentación y procedimientos que se seguirán en la entrega de los bienes.

2.2.6. Etapa de fabricación y embalaje de bienes

El Contratista deberá llevar a cabo la fabricación y embalaje de los bienes según lo establecido en las presentes especificaciones técnicas y sus respectivos anexos.

El Contratista deberá presentar a través de una comunicación por Mesa de Partes de la Entidad, dirigida al Área Usaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, su Solicitud de Calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad adjuntando la información sustentatoria respecto a los Requisitos Mínimos para la selección de los Organismos de Evaluación de la Conformidad, dentro de los 10 días calendario contabilizados a partir del día calendario siguiente de suscrito el contrato, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.3.

Las muestras fabricadas por el Contratista no están incluidas en las cantidades propuestas a ser entregadas en las Instituciones beneficiadas; sin embargo, las muestras sí se contabilizan para la Verificación Cuantitativa.

A partir de la fecha de ingreso de la carta del Contratista donde comunica la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de los bienes, se llevará a cabo el proceso de control de calidad.

2.2.6.1. Finalización de la etapa de fabricación

El Contratista deberá ingresar, a través de Mesa de Partes, una carta dirigida a la Entidad, con copia al Área Usaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, su Solicitud de Calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad, en la cual deberá comunicar la culminación de la fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes.

La carta deberá contener la siguiente documentación:

- Solicitud de verificación de cantidades por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes.
- Documentación sobre la Procedencia de la Madera indicado en el numeral 2.2.1. PROCEDENCIA DE LA MADERA.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procederá a aplicar la(s) penalidad(es) correspondiente(s), según lo establecido en el numeral 2.2.11. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2.6.2. Proceso de Embalaje

Los bienes deben de estar embalados en su totalidad, de forma que no se dañen o deterioren durante el transporte y almacenamiento hasta el destino final, tomando en cuenta para la envoltura y embalaje lo indicado en el numeral 2.1.3 Embalaje.

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANOC Tiberio Cayo FAJ
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 16.03.2023 10:17:44 -05

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI
FARFAN Maria Lupe FAJ
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 10.02.2023 14:27:30 -05

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUISTANA Florencia
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 09.03.2023 17:53:44 -05:0

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAJ
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 09.03.2023 18:31:11 -05:00



La Entidad podrá realizar inspecciones inopinadas a las instalaciones de la fábrica y/o almacenes para verificar o supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, procesos productivos, en aras de velar por el cumplimiento de los plazos de ejecución de la etapa de Fabricación y Embalaje, sin que ello perjudique el desarrollo del proceso de adquisición.

Los análisis de las muestras obtenidas dentro del plazo de adquisición no representan una paralización en los tiempos de ejecución contractual de los bienes contratados.

Al finalizar las Inspecciones Inopinadas, se deberá suscribir el Acta de visita inopinada, por el representante del Contratista y la Entidad.

El formato referencial del Acta de Visita Inopinada se encuentra en el Anexo N° 06.

Durante el periodo del proceso de control de calidad se realizarán actividades para la emisión de la conformidad de la etapa de fabricación, y posteriormente, el informe de cumplimiento de especificaciones técnicas a verificación de la documentación referida al sustento de las condiciones mínimas previo al inicio de la etapa de transporte.

El control de calidad involucra la participación del Contratista, la Entidad, el Área Usuaria, el Área designada para el conteo de bienes y el Organismo de Evaluación de la Conformidad en las siguientes actividades:

- Verificación Cuantitativa por parte del Área designada por la Entidad.
- Verificación Técnica: Elección del organismo de evaluación de la conformidad, Toma de Muestras y aplicación de los métodos de ensayos por el Organismo de Evaluación de la Conformidad, y las Inspecciones Técnicas por la Entidad.

Los empaques de los bienes y los costos que se generen producto de la Verificación Cuantitativa y de la Verificación Técnica serán realizados y asumidos por el Contratista.

Posteriormente se procede a la verificación de la documentación referida al sustento de las condiciones mínimas para el transporte presentado por el contratista, previo al inicio de la etapa de transporte. Presentación de la documentación referida al Transporte de Bienes por parte del Contratista.

El Contratista deberá ingresar la “Solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad”, consignando mínimo de 02 y un máximo 03 propuestas, las cuales serán calificadas por el Área Usuaria, Área de logística, Organo Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, con la finalidad de que cumplan con los requisitos mínimos para realizar la Verificación Técnica a través de métodos de ensayo (según lo especificado en el Anexo N° 02). El Organismo de Evaluación de la Conformidad deberá cumplir con los siguientes Requisitos Mínimos:

1. Deberá acreditar experiencia específica en la realización de los métodos de ensayos descritos en el ANEXO 02. Dicha experiencia deberá ser acreditada mediante copia simple de contratos u órdenes de servicio, con una antigüedad no mayor de 5 años, y su respectiva conformidad o constancia de prestación efectuada; y/o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite fehacientemente con voucher de depósito y/o reporte de estado de cuenta o

cancelación en el documento; y/o otros documentos que acrediten fehacientemente la elaboración del informe.

2. La propuesta sobre el plazo de ejecución del servicio no deberá superar los 40 días calendarios como máximo.

El Contratista deberá presentar a través de una comunicación por Mesa de Partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, Área de logística, Organismo Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, su Solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad adjuntando la información sustentatoria respecto a los Requisitos Mínimos para la selección de los Organismos de Evaluación de Conformidad, dentro de los 10 días calendario contabilizados a partir del día calendario siguiente de suscrito el contrato.

El Área Usuaria, Área de logística, Organismo Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, notificará al Contratista respecto a la calificación de las propuestas del Organismo de Evaluación de la Conformidad, dentro de los 05 días hábiles siguientes a la recepción de dichas propuestas.

De existir observaciones a las propuestas para la calificación, el Área Usuaria, Área de logística, Organismo Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, notificará de manera electrónica al Contratista sobre las mismas, indicándole un plazo de subsanación de 02 a 08 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente calendario de la mencionada notificación hasta el ingreso de la subsanación correspondiente, por Mesa de partes de la Entidad.

Dentro del plazo establecido para levantar las observaciones, el contratista deberá entregar una carta por mesa de partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, Área de logística, Organismo Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, adjuntando la documentación completa y necesaria para dichos fines.

De no encontrarse observaciones, o encontrarse las mismas subsanadas, el Área Usuaria, Área de logística, Organismo Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, notificará electrónicamente al Contratista que cuenta con la aprobación de la documentación requerida sustentatoria para su elección del Organismo de Evaluación de la Conformidad y adjuntará la calificación de las propuestas presentadas con la finalidad de que el contratista pueda elegir al Organismo de Evaluación de la Conformidad.

2.2.7.2. Verificación cuantitativa

Una vez que el Contratista ingresa su carta de culminación de la fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes, la Entidad contratante designará al Área encargada de realizar la verificación cuantitativa, en presencia de un especialista del Área Usuaria.

El Área designada por la Entidad, procederá con la verificación de las cantidades de los bienes en su totalidad (por unidad de bien, no piezas). Cabe señalar, que los bienes deben estar empaquetados y embalados en el momento de la verificación, según lo establecido en el numeral 2.2.6.2. Embalaje.

La Verificación Cuantitativa deberá efectuarse en el(los) almacén(es) consignado(s) por el Contratista, en el plazo establecido por la Entidad, para lo cual la Entidad programará la fecha y hora, previa comunicación con el Contratista.

De no contar con el 100% de los bienes fabricados y embalados, incluyendo la totalidad de las muestras, se considerará como incumplimiento por parte del Contratista, no representa una observación y la Entidad procederá a aplicar las penalidades que corresponda de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se tendrá que reiniciar la verificación cuantitativa una vez que el Contratista lo solicite nuevamente al ingresar una segunda carta de Solicitud de Verificación de cantidad por la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes, por Mesa de Partes de la Entidad, con copia al Área Usuaria, para proceder con la Verificación Cuantitativa según lo anteriormente descrito. (Véase Nota 05)

Al término de la verificación cuantitativa, se deberá suscribir el Acta de Verificación Cuantitativa de bienes por ambas partes (Contratista y representantes de la Entidad), en la que se consignará el cumplimiento de la obligación del Contratista.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. "JOSÉ SOLOMÓN IÑIGO SÁNCHEZ" N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Página 16 de 55

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. "JOSÉ SOLOMÓN IÑIGO SÁNCHEZ" N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



La verificación cuantitativa finaliza con la emisión del "Informe de Verificación Cuantitativa" de parte del Área designada, donde se comunicará al Área Usuaria, el resultado del trabajo de verificación cuantitativa, en el cual se deberá adjuntar el Acta de Verificación Cuantitativa.

El formato referencial para el Acta de Verificación Cuantitativa se encuentra en el Anexo N° 06.

Nota 05: El proceso de control de calidad inicia a partir del ingreso de la "Solicitud de verificación de cantidad por la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes" por parte del Contratista, vía Mesa de Partes de la Entidad contratante.

2.2.7.3. Verificación técnica

Después de emitido el "Informe de Verificación Cuantitativa", la Entidad y un Organismo de Evaluación de la Conformidad realizarán la Verificación Técnica.

La Verificación Técnica inicia con la toma de muestras de los bienes fabricados, continúa con la aplicación de métodos de ensayos a las muestras, así como con las Inspecciones técnicas por parte del Área Usuaria y culmina con la emisión del "Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" del Área Usuaria.

La calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad será realizada por el Área Usuaria, remitiendo el resultado de la calificación de las propuestas al contratista, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.1.

La elección del Organismo de Evaluación de la Conformidad será realizada por el contratista, tomando en cuenta la calificación realizada por el Área Usuaria de la Entidad contratante.

Los costos de las pruebas y/o aplicación de métodos de ensayos para las muestras, así como los gastos generados para la presencia del personal de laboratorio y la toma de muestras por la contratación del Organismo de Evaluación de la Conformidad deberán ser asumidos por el Contratista, incluyendo volver a aplicar los métodos de ensayos en caso los bienes se encuentren observados.

2.2.7.3.1. Sobre las muestras y la aplicación de métodos de ensayo.

El contratista debe proveer las muestras para cada tipo de bien según corresponda, de acuerdo con lo señalado en el Anexo N° 02.

Se precisa que el Organismo de Evaluación de la Conformidad realizará la aplicación de métodos de ensayos y pruebas a las muestras tomadas de los bienes según lo estipulado en el Anexo N° 02.

El número de muestras para los ensayos y/o pruebas para la certificación serán fabricadas por el Contratista, de acuerdo con la NTP 260.014.2021. Las muestras fabricadas por el contratista no están incluidas en las cantidades propuestas a ser entregadas en las Instituciones de destino; sin embargo, las muestras sí se contabilizan para la Verificación Cuantitativa según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2.

2.2.7.3.2. Toma de muestras

A partir del día siguiente hábil de recibido el Informe de Verificación Cuantitativa en el Área Usuaria, indicando la conformidad de la misma, el Área Usuaria y el Contratista coordinarán la fecha para la Toma de Muestras.

La toma de muestras para la aplicación de métodos de ensayos se deberá realizar en uno de los almacenes del Contratista en presencia de un representante de la Entidad. La(s) dirección(es) del (de los) almacén(es) debe coincidir con la información presentada para la suscripción del contrato o, de corresponder, con la información modificada mediante el procedimiento establecido en el numeral 2.2.5.1. Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRACSTRUCTURA EDUCATIVA
CIP: 98718

Ing. Richard Wiver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROELIS YANCO Tobar Cuyo FAU
20514347221 soft
Molivo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2023 10:18:18 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por PRILLA QUINTANA Tobarpo
20514347221 soft
Molivo: Doy V° B°
Fecha: 09.03.2023 17:54:35 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO JERREIRO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Molivo: Doy V° B°
Fecha: 06.03.2023 19:31:51 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Molivo: Doy V° B°

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRACSTRUCTURA EDUCATIVA
CIP: 98718



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra

Si los bienes manifiestamente no cumplen con las características y condiciones ofrecidas, la Entidad no efectuará la recepción de los mismos, debiendo considerarse como no ejecutada la etapa, aplicándose las penalidades que correspondan de acuerdo a Ley.

2.2.7.3.4. Inspecciones técnicas

El Área Usuaria podrá realizar inspecciones técnicas a los bienes en paralelo a la aplicación de métodos de ensayos realizados por el Organismo de Evaluación de la Conformidad durante el periodo de Verificación Técnica, donde el Contratista y la Entidad suscribirán el(las) Acta(s) de Verificación Técnica.

De encontrarse alguna observación en la(s) inspección(es) técnica(s) realizadas por el Área Usuaria, serán consignadas en un Informe de Especialista, y de corresponder, complementarán a las observaciones realizadas por el Organismo de Evaluación de la Conformidad. Estas observaciones serán notificadas al Contratista mediante un documento elaborado por el Área Usuaria, donde se detallen las observaciones realizadas por el Organismo de Evaluación de la Conformidad y las observaciones realizadas por el Especialista de la Entidad.

El Contratista deberá absolver las observaciones en un plazo no menor de 02 días ni mayor de 08 días calendario, contados a partir del día siguiente de realizada la notificación presencial y/o electrónica, para lo cual deberá ingresar una carta por Mesa de Partes de la Entidad y dirigida al Área Usuaria, donde comunicará el levantamiento de observaciones, a fin de que el Área Usuaria proceda a realizar la verificación de la subsanación de observaciones, dejando constancia de ello mediante la suscripción del Acta de Verificación Técnica por parte del Contratista y la Entidad.

La Entidad puede complementar las Acta(s) de Verificación Técnica con registro de evidencias filmicas y/o fotográficas de la situación encontrada en la(s) revisión(es) técnica(s).

De no encontrarse observación o de encontrarse las mismas subsanadas, el Área Usuaria elaborará el Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de la etapa de Fabricación y Embalaje.

Los formatos referenciales del Acta de Verificación Técnica y del Acta de Verificación de Levantamiento de Observaciones se encuentran en el Anexo N° 06.

2.2.7.4. Documentación para el transporte de los bienes

A fin de garantizar que el transporte de los bienes se mantenga dentro de los niveles de calidad y seguridad, el Contratista deberá presentar al Área Usuaria, a través de Mesa de Partes de la Entidad, los documentos sobre el transporte de los bienes, en el plazo establecido por la Entidad, contabilizado a partir del día siguiente de la notificación por correo electrónico realizada por el Área Usuaria.

De no presentar la documentación completa y en el plazo estipulado por la Entidad, el Contratista será penalizado de acuerdo con el numeral 2.2.11.2. OTRAS PENALIDADES.

El Área Usuaria deberá revisar y verificar que el Contratista cumpla con las condiciones mínimas antes del inicio de la etapa de Transporte y Entrega de los bienes hasta los lugares de destino.

De existir observaciones, el Área Usuaria podrá notificar de manera electrónica al Contratista sobre las mismas, indicándole un plazo de subsanación de 02 a 08 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente calendario de la mencionada notificación.

Para la subsanación de las observaciones, el Contratista deberá ingresar una carta por Mesa de Partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, adjuntando la documentación completa y necesaria para dichos fines. La fecha de ingreso de la carta por Mesa de Partes se contabilizará como fecha fin del plazo para la subsanación de observaciones.

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el Área Usuaria notificará electrónicamente al Contratista indicándole que cuenta con la

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO
CALLE 50 N° 1012, ETAPA II, URB. SAN JUAN DE LOS RIOS, C.A. 20030, AYACUCHO
25 CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO, PERU
Ing. Richard Wlver Sánchez Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AYACUCHO
CALLE 50 N° 1012, ETAPA II, URB. SAN JUAN DE LOS RIOS, C.A. 20030, AYACUCHO
25 CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO, PERU
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



aprobación de la Documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes, sin perjuicio de las condiciones operativas y/o de vigencia documentaria que se deben mantener para la totalidad de la documentación solicitada.

La documentación requerida se detalla a continuación:

Documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes	
N°	Documentación Requerida
1	<p>Póliza de Seguro de transporte terrestre nacional</p> <p>El transporte de los bienes deberá contar con la póliza de seguro a nivel nacional.</p> <p>VALOR MÍNIMO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL será el 100% del valor del monto adjudicado.</p> <p>Adicionalmente la póliza deberá hacer referencia al procedimiento de selección y/o al número de contrato, pudiendo realizarse mediante un anexo a la póliza o cualquier documento adicional emitido por la aseguradora.</p> <p>Todo esto por la reposición de los bienes transportados en caso de siniestro, esta póliza deberá ser efectiva antes del inicio de la etapa de transporte y entrega de los bienes.</p>
2	<p>SCTR</p> <p>SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para el personal del contratista asignado para la realización del servicio de transporte y entrega de los bienes.</p>
3	<p>Flota de Vehículos</p> <p>Relación completa de los vehículos a utilizar especificando como mínimo: modelo, placa, tarjeta de propiedad, tarjeta de Habilitación vehicular para el transporte de mercancías, tipo de vehículo, capacidad máxima de carga de vehículo expresado en kilogramos y en pesos cúbicos, copia simple de la Tarjeta de Propiedad, SOAT vigente de cada una de las unidades, REVISIÓN TÉCNICA vehicular aprobada y vigente de acuerdo con ley.</p> <p>La antigüedad máxima de los vehículos será de 10 años, contabilizados a partir del año siguiente de fabricación de estos.</p>
4	<p>Autorización para prestar Servicio de Transporte de Mercancías en General:</p> <p>Otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (acreditado mediante copia simple y/o copia simple de la página web del MTC donde figure la inscripción en el citado registro); asimismo cabe precisar que, respecto al Transporte de los bienes, este deberá cumplir con ser un vehículo cerrado a fin de garantizar la seguridad e integridad de los bienes y su distribución vía terrestre.</p> <p>En caso el contratista opte por subcontratar el servicio de transporte, deberá presentar la autorización de la empresa subcontratada.</p> <p>En caso de uso de otras vías de transporte (fluvial, marítima, etc.), el contratista deberá agregar propuesta de la ruta y tipos de vehículos a utilizar, adjuntando imagen referencial de vehículos.</p>
5	<p>Plan COVID-19</p> <p>"Plan para vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" aprobado por el sector competente, debidamente registrado en el Sistema integrado para COVID-19 (SICOVID-19) adjuntando la constancia del sector competente, la constancia del registro en SICOVID-19, el correo de envío al MINSA, según corresponda en el marco de lo establecido por el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM; Decreto Supremo 110-22-PCM; Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA; la Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC/01, modificada por la Resolución Ministerial N° 0301-2020 MTC/01, sus modificatorias y demás normas que emita el sector correspondiente.</p>

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE GOBIERNO REGIONAL
Ing. Richard Wiver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE GOBIERNO REGIONAL
Ing. José Sebastián Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

2.2.8.

El Área Usuaría realizará la notificación electrónica al Contratista, indicándole la aprobación de la documentación presentada según lo establecido en el numeral 2.2.7.4. Documentación para el Transporte de los bienes.

Con la aprobación de la Documentación para el transporte de los bienes, la entidad elaborará los documentos que acredite la entrega de los bienes, teniendo como plazo de 3 - 15 días calendario, los mismos que serán notificados por correo electrónico al contratista a fin de que se apersona a recogerlos en un plazo no mayor de 3 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de recibida la notificación.

El inicio del plazo de la etapa de transporte y entrega de los bienes a los destinos especificados en el numeral 2.2.1. LUGAR DE ENTREGA, es a partir del día calendario siguiente de la suscripción del Acta de Recepción Documentaria por el Contratista.

Para el cómputo del plazo de la fecha de culminación del transporte y entrega de los bienes, se considera la última fecha que figure en el(los) Documentos que acredite Entrega de los Bienes de la Entidad, según lo establecido en el numeral 2.2.3. PLAZOS DE EJECUCIÓN

El formato referencial del Acta de Recepción Documentaria se encuentra en el Anexo N° 06.

2.2.8.1. Transporte:

El Contratista deberá realizar el transporte de los bienes a las Instituciones de destino, en cumplimiento con los requisitos solicitados en el numeral 2.2.7.4. Documentos sobre el Transporte de los bienes.

El Área Usuaría, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, realizará la notificación por correo electrónico al Contratista, a fin de que se apersona a recoger el(los) Documentos que acredite Entrega de los Bienes de la Entidad, en el plazo establecido por la Entidad, caso contrario será penalizado según el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

Al momento de la entrega del (de los) Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, se suscribirá el Acta de Recepción Documentaria por el Contratista.

En caso el destino de transporte sea una(s) Institución(es) Educativa(s), no se permite que vehículos pesados ingresen a los patios de ésta(s); en caso se evidencie de manera documentada esto, se aplicará lo estipulado en el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

Cada unidad deberá transportar sólo y exclusivamente los bienes objeto de la contratación; en caso se evidencie de manera documentada la ocurrencia del incumplimiento, se aplicará lo estipulado en el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

El transporte debe efectuarse con un vehículo cerrado a fin de garantizar la seguridad e integridad de los bienes, caso contrario se aplicará lo estipulado en el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

Todo vehículo de transporte que salga en ruta deberá acompañar la carga con el(los) Documentos que acredite Entrega de los Bienes proporcionado(s) por la Entidad y la guía de remisión del transportista. En ambos casos deberá indicar el destino final y el detalle del material transportado en conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Asimismo, durante la etapa de transporte y entrega, deberán contar con unidades de contingencia o transporte alternativo de características similares o superiores a las unidades asignadas para el servicio. En caso se produzca una avería o desperfecto que inhabiliten alguna unidad registrada, se deberá reemplazar la unidad en un lapso no mayor a 48 horas (teniendo en cuenta el personal necesario y equipado para la tarea de transbordo de los materiales).

2.2.8.2. Entrega

Es de responsabilidad del Contratista la carga y descarga de los bienes en el lugar de embarque y destino, al igual que la entrega de los bienes en buen estado de las cantidades descritas en los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, a los destinos establecidos en el numeral 2.2.2. LUGAR DE ENTREGA, así como de la devolución de la documentación sustentadora de recepción, conforme a la cantidad de juegos de Documentos que Acredite Entrega de los Bienes entregados por la Entidad.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 08718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

 Ing. Luis Escobar Belldo
Resistente de obra
CIP: 21 1541

Un juego de Documentos que acredite Entrega de los Bienes original, debidamente firmada en original se debe quedar con la persona firmante como representante de la Institución de destino.

Los bienes serán entregados en perfecto estado de conservación, adecuadamente armados y embalados hasta su destino final, sin ningún defecto de adquisición, ni otro como consecuencia de la estiba o desestiba o del transporte.

La entrega de los bienes a los lugares de destino será sustentada con la presentación de lo siguiente:

- Guía de Remisión del Transportista
- Documentos que acredite Entrega de los Bienes: PECOSA, Acta de entrega de Bienes, etc
- El (Los) Documentos que acredite Entrega de los Bienes, representan la aceptación de los bienes por parte de los representantes de las Instituciones de destino, podrán ser suscritos por las siguientes autoridades:
- Representante designado y autorizado por la Entidad contratante.
- En caso la dotación se realice a una Institución Educativa, podrá suscribir un representante designado y autorizado por la UGEL y/o DRE correspondiente a la jurisprudencia de la Institución Educativa de destino.

La información que debe ser consignada en los Documentos que acredite Entrega de los Bienes es la siguiente:

- Firma legible
- Fecha de conformidad de los bienes
- Copia de DNI del firmante, donde se aprecie su firma.

En caso se realice la modificación del lugar de entrega por parte del Área Usuaria, entonces el Documentos que acredite Entrega de los Bienes podrá ser firmada por la dirección de dicha Área.

Los datos de la institución de destino y su personal para la recepción de los bienes y el firmado del Documentos que acredite Entrega de los Bienes, serán coordinados directamente por el Contratista.

Finalizada la Entrega de la totalidad de bienes, el Contratista deberá presentar al Área Usuaria, por Mesa de Partes de la Entidad, una carta documentada que indique la culminación del transporte y entrega de la totalidad de los bienes en la(las) institución(es) de destino.

La carta deberá contener lo siguiente:

- Los Documentos que acredite Entrega de los Bienes originales establecida por la Entidad.
- Guías de remisión del transportista, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2. ENTREGA.
- Copias del DNI del firmante, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2. ENTREGA.
- Certificados de Garantía de Adquisición de los bienes (véase el numeral 2.2.12. GARANTÍA COMERCIAL DE LOS BIENES)
- Informe Fotográfico de Entrega de Bienes donde se adjunten fotografías y/o videos de los bienes siendo entregados en la(s) dirección(es) que figure(n) en el numeral 2.2.2. LUGAR DE ENTREGA. Estas fotografías y/o videos servirán para acreditar la correcta entrega de los bienes, debiendo figurar como mínimo la siguiente información:
 - Fotografía y/o video del vehículo iniciando la descarga de los bienes, en la cual se muestre la placa del vehículo.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SUMINISTROS
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y OBRAS
DIRECCIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Ing. Richard Wiver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 38716



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SUMINISTROS
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y OBRAS
DIRECCIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Ing. Víctor Bar Celido
Residente de Obra
CIP: 211541



- Fotografía y/o video mostrando las Instalaciones de la Institución de destino. Mínimo 1 fotografía y/o video de 10 segundos aproximados.
- Fotografía del representante de la Institución de destino, en el momento de la recepción de los bienes. Mínimo 1 fotografía y/o video de 10 segundos aproximados.
- Fotografías y/o videos mostrando el estado de los bienes, recepcionados mostrando el logotipo y rotulado de los bienes. Mínimo 2 fotografías y/o videos de 10 segundos aproximados.

2.2.8.3. Verificación documentaria

Finalizada la Entrega de la totalidad de bienes, el Contratista deberá presentar al Área Usuaría, por Mesa de Partes de la Entidad, una carta documentada que indique la culminación del transporte y entrega de la totalidad de los bienes en la(las) institución(es) de destino.

La documentación mencionada como parte de la carta de culminación del transporte y entrega de los bienes según lo estipulado en el numeral 2.2.8.2., será parte integral de la Verificación Documentaria que realizará el Área Usuaría.

De encontrarse alguna observación en el marco de la verificación documentaria ésta deberá ser remitida al Contratista de manera electrónica y/o física por el Área Usuaría; otorgando un plazo de entre 02 a 08 días calendario para subsanarlas.

El Contratista deberá remitir al Área Usuaría una carta por Mesa de Partes de la Entidad, indicando el levantamiento de observaciones, adjuntando la subsanación correspondiente.

La fecha de ingreso de dicha comunicación a la Entidad se tomará como fecha de fin de subsanación de las observaciones.

Si pese al plazo otorgado, el Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato total o parcialmente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades a que hubiera incurrido; y en el marco de la ley vigente.

De no encontrarse observación o de encontrarse las mismas subsanadas por el Área encargada de emitir los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, procederá a elaborar el Informe de Cumplimiento Documentario, el cual servirá para la elaboración de la Conformidad de la etapa de Transporte y Entrega de los bienes, la cual estará a cargo del Área Usuaría.

Asimismo, el Área Usuaría notificará de manera presencial y/o electrónica al Contratista para que proceda con el ingreso de la(s) Factura(s) y CCI correspondiente.

2.2.9. Conformidades

2.2.9.1. Conformidad por fabricación y embalaje

Una vez notificado el "Informe de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" por la Entidad, el Contratista deberá entregar los siguientes documentos:

- Factura

Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista
Los documentos necesarios para el pago de la conformidad de la etapa de Fabricación y Embalaje de los bienes son los siguientes:

- Informe de Verificación Cuantitativa (emitido por el Área designada por la Entidad)
- Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (emitido por el Área Usuaría)
- Factura (remitido por el Contratista)
- Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista (remitido por el Contratista).

Una vez que el Área Usuaría tenga la totalidad de los documentos antes señalados, se procederá a otorgar la "Conformidad por fabricación y embalaje de los bienes" por parte de la Entidad.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Empleado digitalmente por ROBLES
NICOLAS Tiberio Cayo FAU
514347221 soft
livo: Day V B
date: 10.03.2023 10:22:48 -06:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Empleado digitalmente por CASTILLO
FRAN Maria Lupe FAU
514347221 soft
livo: Day V B
date: 10.03.2023 14:28:49 -06:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Empleado digitalmente por
ERRERO Gonzalo Elias FAU
514347221 soft
livo: Day V B
date: 09.03.2023 16:33:10 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Empleado digitalmente por BRAVO
ERRERO Gonzalo Elias FAU
514347221 soft
livo: Day V B
date: 09.03.2023 16:33:10 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA Y OBRAS
CIP: 98718

Ing. Richard Wiver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA Y OBRAS
CIP: 98718

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

Nota 06: La Entidad contratante podrá determinar el monto (M) dependiendo de las características del Requerimiento.

2.2.11.3. Resolución de contrato

Será motivo de la Resolución de Contrato: el incumplimiento parcial o total del Contrato, en el marco de la Ley de Contrataciones de Estado.

2.2.12. Garantía comercial de los bienes

CONSIDERACIONES DE LA GARANTIA	
Garantía de los Bienes	05 años
Aplicación de Garantía (Véase Nota 07)	Hasta 15 días calendario como máximo para brindar solución; contabilizado a partir del día calendario siguiente de notificada la solicitud de aplicación de garantías.

Nota 07: La Entidad contratante podrá determinar el tiempo adecuado según el requerimiento.

El Contratista es responsable por la garantía de los bienes. La garantía es por defectos de Fabricación / Adquisición y Embalaje y no por mal uso de los bienes por parte del usuario final.

El plazo de la garantía cuenta a partir del día siguiente calendario de firmado los Documentos que acredite Entrega de los Bienes por Representantes de cada Institución de destino según lo estipulado en el numeral 2.2.8.2. ENTREGA.

La garantía deberá estar acreditada por documentación del Contratista, esta documentación deberá estar firmada por su representante legal, referida a los bienes ofertados y su transporte y entrega realizada.

Se deberá entregar 01 Certificado de Garantía por cada Institución de destino, los mismos que serán remitidos a la Entidad para la elaboración de la conformidad de la prestación, estipulando claramente el inicio del plazo de garantía de los bienes, las descripciones y números de series de los mismos, de corresponder.

El Contratista garantizará la calidad de los bienes fabricados de acuerdo a los planos y demás documentos contractuales según las especificaciones técnicas del bien.

La Entidad notificará al Contratista de cualquier reclamo relacionado con la garantía de manera física y/o mediante correo electrónico, el Contratista al recibir esa notificación deberá tomar las acciones correspondientes para informar y/o reparar y/o reemplazar los bienes y/o componentes y/o instalaciones defectuosas en su totalidad o en parte según sea el caso, en las Instituciones de destino sin costo alguno para éstas, ni para la Entidad.

Si el Contratista después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del plazo indicado en el cuadro de consideraciones de garantía entonces la Entidad podrá tomar las medidas correctivas que sean necesarias, por su propia cuenta y riesgo y sin perjuicio de los demás derechos que la Entidad tenga ante el Contratista, en conformidad con la legislación vigente.

2.2.13. Responsabilidad por vicios ocultos

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo de 05 años.

Este plazo cuenta a partir del día siguiente de emitida la conformidad de la prestación por parte del área usuaria.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 09.03.2023 16:33:37 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ULA
DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACACHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ULA
DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACACHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA GUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 09.03.2023 17:07:08 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 10.03.2023 14:28:12 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES ANCO Tibanio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

3.1 De la selección:

Documentos de presentación obligatoria por el postor:

- Relación de especies de madera a utilizar en el proceso de fabricación del bien especificado en la presente ficha de homologación. Dicha relación se presentará con el formato de Ficha de presentación de producto adjunta en el Anexo N° 06.

IV. ANEXOS

- Anexo N° 01: Formato del Lugar de destino
 - Dirección(es) de Institución(es) Educativa(s) de destino
- Anexo N° 02: Pruebas y/o ensayos para la verificación de calidad
- Anexo N° 03: Planimetría
- Anexo N° 04: Cuadro de Otras penalidades
- Anexo N° 05: Requisitos que presentar para la Suscripción del Contrato
- Anexo N° 06: Actas referenciales para el proceso de ejecución contractual
- Anexo N° 07: Ficha de presentación de producto

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO,
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soñ
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 18:33:52 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antorio FAU 20514347221 soñ
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 17:57:21 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
PARFAN Maria Luisa FAU
20514347221 soñ
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:29:29 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES,
YANCO Tibaro Cayo FAU
20514347221 soñ
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 10:23:10 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEJO WOTO INGSITUAL N° 12 CRISTÓBEL DE LA LOCALIDAD DE COMA CORA, DISTRITO
DE COMA CORA, PROVINCIA DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEJO WOTO INGSITUAL N° 12 CRISTÓBEL DE LA LOCALIDAD DE COMA CORA, DISTRITO
DE COMA CORA, PROVINCIA DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

ANEXO N° 01 FORMATO PARA INDICAR LUGAR DE DESTINO

- Dirección(es) de Institución(es) Educativa(s) de destino

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.L.
COLEGIO N° 12 CRISTO REY DE LA ALFARERÍA DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.L.
COLEGIO N° 12 CRISTO REY DE LA ALFARERÍA DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 08.08.2023 16:34:06 -05:03

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTERA Florencia
Autor: e FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 08.08.2023 17:27:35 -05:03

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:25:36 -05:03

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANCO Tiberio Cajo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 10:23:24 -05:00

DIRECCION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS								
N° DE ORDEN	CÓDIGO MODULAR	CÓDIGO LOCAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	SUB TOTAL DE BIENES
1								
2								
TOTAL GENERAL								

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20614347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 06.03.2023 10:34:00 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA OLIVIANA Estefania Antonio FAU 20614347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 06.03.2023 17:07:51 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARRAN Maria Lupe FAU 20614347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:29:42 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANCO Tercio Cayo FAU 20614347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 10:23:41 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEJO MONTAÑAS N° 12 CRISTO REYES DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PERUQUICHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEJO MONTAÑAS N° 12 CRISTO REYES DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PERUQUICHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 21541

ANEXO N° 02 PRUEBAS Y/O ENSAYOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD

- Normas técnicas para la verificación de mobiliario
- Control de calidad

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.03.2023 16:44:50 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.03.2023 17:58:11 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:29:54 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
PANDC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.03.2023 10:23:40 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEJO MDTU AND. S'RAL Y U CRISTO REY DE LA ESCALADA DE CORA-CORA, DISTR.
DE CORA-CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANALES, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEJO MDTU AND. S'RAL Y U CRISTO REY DE LA ESCALADA DE CORA-CORA, DISTR.
DE CORA-CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANALES, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

NORMAS TECNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE MOBILIARIO

El mobiliario a fabricar, al igual que la certificación de calidad se ceñirá a las siguientes normas y sus respectivas enmiendas y revisiones con actual vigencia, según corresponda por tipo de bien.

CUADRO N° 01: NORMAS TECNICAS QUE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL MOBILIARIO ESCOLAR	
CÓDIGO	TÍTULO DE LA NORMA
RVM N°019-2023-MINEDU	Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular
NTP 260.008:2019	MOBILIARIO ESCOLAR. Silla para nivel de educación secundaria. Requisitos. 4ª Edición
NTP 260.010:2019	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Clasificación y tipos. 4ª Edición
NTP 260.011:2017	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Definiciones. 3ª Edición
NTP 260.012:2017	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Embalaje. 3ª Edición
NTP 260.013:2017	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Rotulado. 3ª Edición
NTP 260.014:2021	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Muestreo. 4ª Edición
NTP 260.015:2021	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Requisitos. 5ª Edición

CUADRO N° 02: NORMAS TECNICAS QUE ESTABLECEN METODOS DE ENSAYO PARA LOS BIENES Y MATERIALES	
CÓDIGO	TÍTULO
NTP 260.026:2019	MUEBLES: Sillas para instituciones educativas. Requisitos de seguridad y determinación de la estabilidad, la resistencia y la durabilidad. 4ª Edición

GLOSARIO

- Fabricación y embalaje:** corresponde que el bien se encuentre acabado y embalado, preparado para ser utilizado en conformidad de la Entidad.
- Transporte, entrega:** corresponde que el bien sea entregado sin deterioro por el transporte y colocado en el ambiente designado por la autoridad de cada Entidad de destino. Deberá estar conforme con la Entidad.
- Defectos Críticos:** Defectos que imposibilita el uso del producto y/o que puede afectar la seguridad del usuario.
- Defectos Mayores:** Defectos que, sin llegar a ser críticos, en cierto plazo afectan el uso de las unidades.
- Defectos Menores:** Defectos que no afectan el uso de las unidades.
- Inspección por atributos:** Inspección mediante el cual se clasifica una unidad de producto como conforme o no conforme, o se cuenta el número de no conformidades en la unidad de producto, respecto a un determinado requisito o conjunto de requisitos.
- Límite de Calidad Aceptable (LCA):** Es el nivel máximo permisible de unidades no conformes de muestra de un lote.
- Lote:** Es el conjunto de muebles de un mismo modelo fabricados en un determinado período, bajo condiciones iguales.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 18:44:06 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 17:58:29 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:30:14 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 10:23:58 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE MANEJO DE Bienes, Equipos y Materiales
Ing. Richard Wiver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE MANEJO DE Bienes, Equipos y Materiales
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



PLAN DE MUESTREO

Se precisa que las muestras se toman bajo el nivel de inspección S1 de la NTP 260.014.2017 vigente (incluyendo sus últimas revisiones).

CUADRO N°03: TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA MOBILIARIO									
Tamaño del Lote			Niveles de Inspección Especial				Niveles de Inspección General		
			S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2	a	8	A	A	A	A	A	A	B
9	a	15	A	A	A	A	A	B	C
16	a	25	A	A	B	B	B	C	D
26	a	50	A	B	B	C	C	D	E
51	a	90	B	B	C	C	C	E	F
91	a	150	B	B	C	D	D	F	G
151	a	280	B	C	D	E	E	G	H
281	a	500	B	C	D	E	F	H	J
501	a	1200	C	C	E	F	G	J	K
1201	a	3200	C	D	E	G	H	K	L
3201	a	10000	C	D	F	G	J	L	M
10001	a	35000	C	D	F	H	K	M	N
35001	a	150000	D	E	G	J	L	N	P
150061	a	500000	D	E	G	J	M	P	Q
500001	a	más	D	E	H	K	N	Q	R

↓ = Use el primer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el tamaño de la muestra es igual o excede el tamaño del lote lleve a cabo inspección 100%
 ↑ = Use el primer plan de muestreo arriba de la flecha
 Ac = Número de aceptación
 Re = Número de rechazo

En concordancia con las letras código según el tamaño del lote, se utilizará la siguiente tabla para determinar de la muestra y los LCA correspondientes:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 16:43:50 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 17:58:40 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
PARRAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:30:23 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANCO Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 16:20:05 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
COLEGIO MUTO INDUSTRIAL N° 12 (BARRIO) DE LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO
DE CORACORA, PROVINCIA DE PUNACUCHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211841



Ing. Richard Wilver Cancho Vergas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

- La selección de las muestras del lote, se debe tomar al azar y de manera tal que se obtengan unidades de todas las partes del lote.
- Si el número de unidades de producto no conformes encontrados en la muestra es igual o menor que el número de aceptación, el lote debería ser considerado aceptable. Si el número de unidades del producto no conformes es igual o mayor que el número de rechazo, el lote debería ser considerado no aceptable.
- El nivel de inspección determina la relación que existe entre el tamaño del lote y el tamaño de la muestra.
- La clasificación de Defectos para Mobiliario para Instituciones Educativas es la siguiente:

<u>Defectos Críticos:</u>	<u>Defectos Mayores</u>	<u>Defectos Menores</u>
Falla de compresión paralela en elementos estructurales	Falla de compresión paralela en elementos no estructurales	Acabado defectuoso
Grano inclinado mayor al tolerado en elementos estructurales	Grano inclinado mayor al tolerado en elementos no estructurales	Boleado irregular de aristas
Pudrición	Perforaciones de insectos inactivos mayores a los permitidos	
Presencia de Insectos activos	Grietas	
Rotura	Armado Asimétrico	
Rajaduras	Mezcla de especies	
Nudos muertos	Juntas desiguales	
Ensamble defectuoso	Alabeos de piezas mayores a los tolerados	
	Nudos sanos no tolerados	
	Inestabilidad en un plano	

RELACION DE ENSAYOS:

DESCRIPCION	NORMA TECNICA PARA ENSAYOS	ENSAYOS
SILLA DE METAL Y MADERA DE 5° SECUNDARIA	NPT 260.026:2019 MUEBLES. Sillas para instituciones educativas. Requisitos de seguridad y determinación de la estabilidad, la resistencia y la durabilidad. 4ª Edición	ESTABILIDAD FRONTAL
		ESTABILIDAD LATERAL
		ESTABILIDAD TRASERA
		DURABILIDAD EN EL ASIENTO Y RESPALDAR (MAXIMO)
		CARGA ESTATICA POR COMPONENTE - ASIENTO Y RESPALDAR
		IMPACTO SOBRE ASIENTO
		IMPACTO SOBRE ESPALDAR
	Estudio sobre el contenido de humedad equilibrio de la madera en el Perú, elaborado por el CITE MADERA.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE CONTENIDO DE LA HUMEDAD EN LA MADERA DE ACUERDO AL LUGAR DE ENTREGA

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
Motivo: Dey V B
Fecha: 09.03.2023 13:42:55 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Elicencio Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Dey V B
Fecha: 09.03.2023 18:00:03 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO PARRAN Maria Lupe FAU 20514347221 soft
Motivo: Dey V B
Fecha: 10.03.2023 14:30:35 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Dey V B
Fecha: 10.03.2023 10:24:30 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DPTA. DE JORAMUNTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLONIA MIXTA INDUSTRIAL N° 17 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE COMA CORA, DISTRITO DE COMA CORA PROVINCIA DE PARIACUTI, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DPTA. DE JORAMUNTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLONIA MIXTA INDUSTRIAL N° 17 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE COMA CORA, DISTRITO DE COMA CORA PROVINCIA DE PARIACUTI, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

ANEXO N° 3 PLANIMETRÍA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AREA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA
URBANA DEL DISTRITO DE LA LAGUNA DE SAN PEDRO DE CAYANILLA - PROVINCIA DE
AYACUCHO"



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soh
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 16:42:41 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soh
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 18:00:14 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soh
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:30:46 -05:00


PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soh
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 10:24:38 -05:00


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AREA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE LA LAGUNA DE SAN PEDRO DE CAYANILLA - PROVINCIA DE
AYACUCHO"




Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

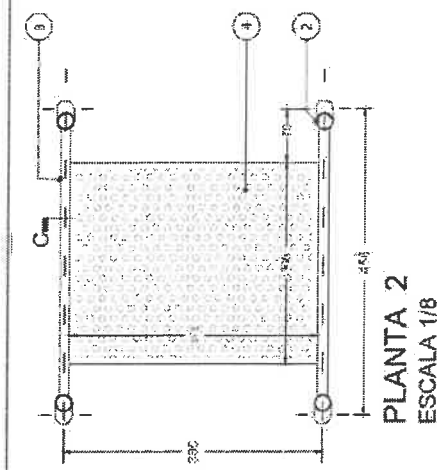

PLANTA 2
ESCALA 1/8

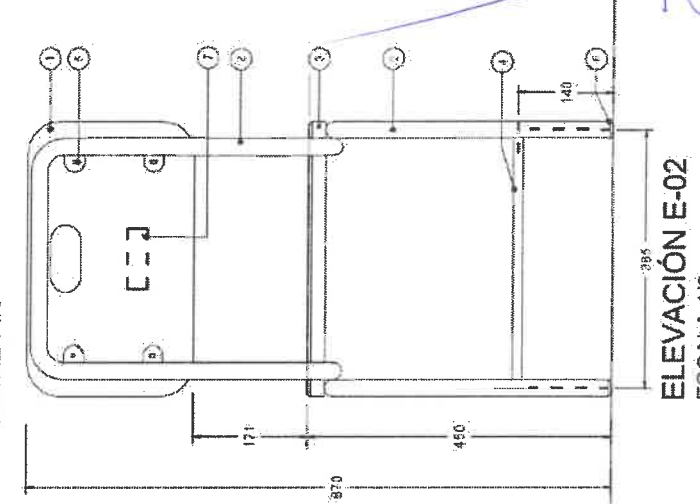

ELEVACIÓN E-02

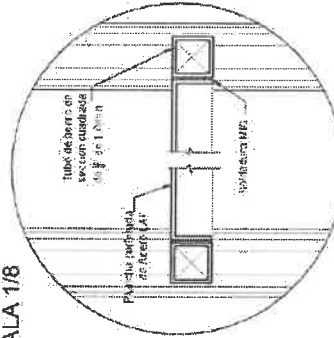

CORTE C
ESCALA 1/2

1. TABLERO DE RESPALDO, MADERA CON UNIONES MACHI-HEBRADAS, O FINGER JOINT (UNIÓN ENDENTADA) $\phi = 22-18\text{mm}$ ATORNILLADO A ESTRUCTURA METÁLICA CON TORNILLOS DE CAJEZA PLANA $\phi \times L = 5$.
2. TUBO MECÁNICO ELECTROSOLDADO DE ACERO LAMINADO AL FRÍO DE SECCIÓN CIRCULAR $\phi = 1"$ y $e = 12\text{mm}$.
3. TABLERO DE ASIENTO, MADERA CON UNIONES MACHI-HEBRADAS O FINGER JOINT $\phi = 25-22\text{mm}$ ATORNILLADO A ESTRUCTURA METÁLICA CON TORNILLOS DE CAJEZA PLANA $\phi \times L = 20$.
4. PLANCHA DE ACERO LAMINADO AL FRÍO DE ESPESOR 100mm CON PERFORACIONES DE 210mm CON ARREGLO A $65"$ CON BARRO PERIMETRAL EN $1"$ SOLDADO A LA ESTRUCTURA.
5. ALETA DE SULECIÓN CON PERFORACION TIPO "O" $\phi = 40\text{mm}$, PLATINA DE ACERO ELECTROSOLDADO $L \times \phi = 150\text{mm}$ SOLDADA A ESTRUCTURA METÁLICA.
6. REGATONES DE POLIPROPILENO DE 12mm (MÍNIMO) DE BOMBEO EXTERIOR O INTERIOR, LOS REGATONES PERMITIRÁN TENER UNA DISTANCIA NO MENOR DE 5mm DEL PISO A LA ESTRUCTURA METÁLICA.
7. LOGO TIPO INSTITUCIONAL.
8. TUBO DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA DE $3"$ $\phi = 10\text{mm}$.

UNIDADES: MILIMETROS (mm)

GOBIERNO REGIONAL DE YACAJCHO
GOBIERNO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO BILINGÜE
COLLEJO MUNITO MUNITAL, DISTRITO DE YACAJ, PROVINCIA DE YACAJ, DEPARTAMENTO DE YACAJ
DE COPIA CORA

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 21541



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

PREZIO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP- 98718

 **Ministerio
de Educación**

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFORMATICA EDUCATIVA





SILLA DE METAL MADERA DE 5º DE SECUNDARIA

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA E EDUCATIVA

INDICATION: SS-M-07

L-14

Versión 02

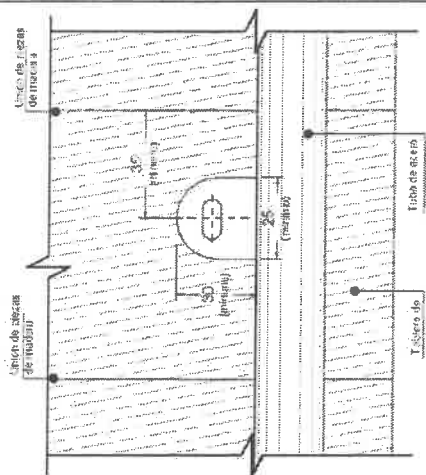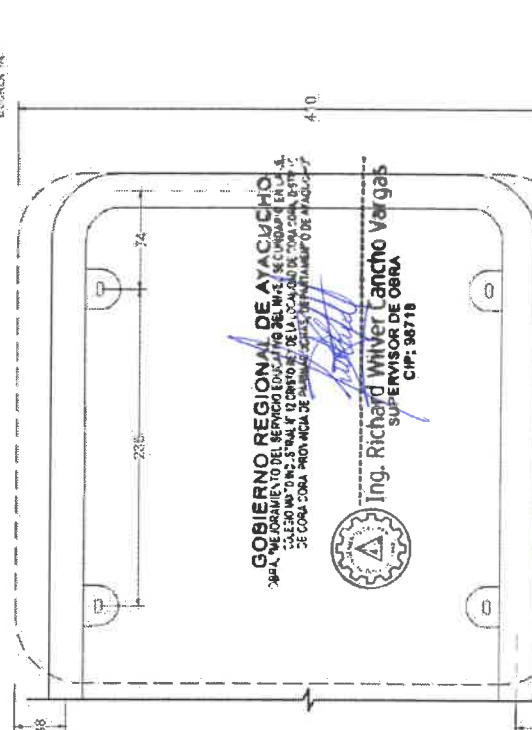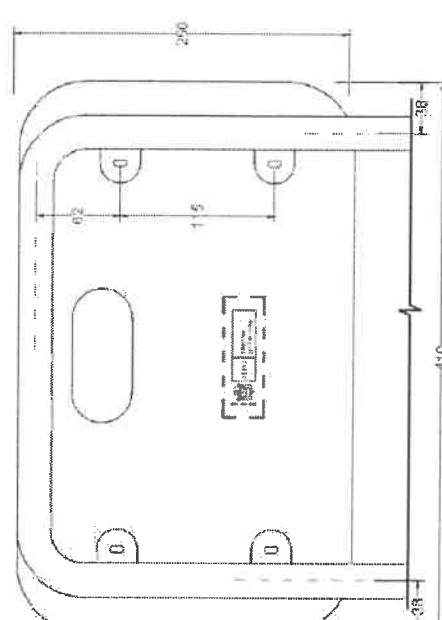

DETALLE DE REGATÓN

UNIDADES: MILIMETROS (mm)

SILLA DE METAL MADERA DE 5° DE SECUNDARIA


copy to	SEM-07	LIBRA	L-14A
FILE NO.	INDICADA		Expendido de \$

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INYERSTRUCION EDUCATIVA

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

SELECCIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA

Version 02

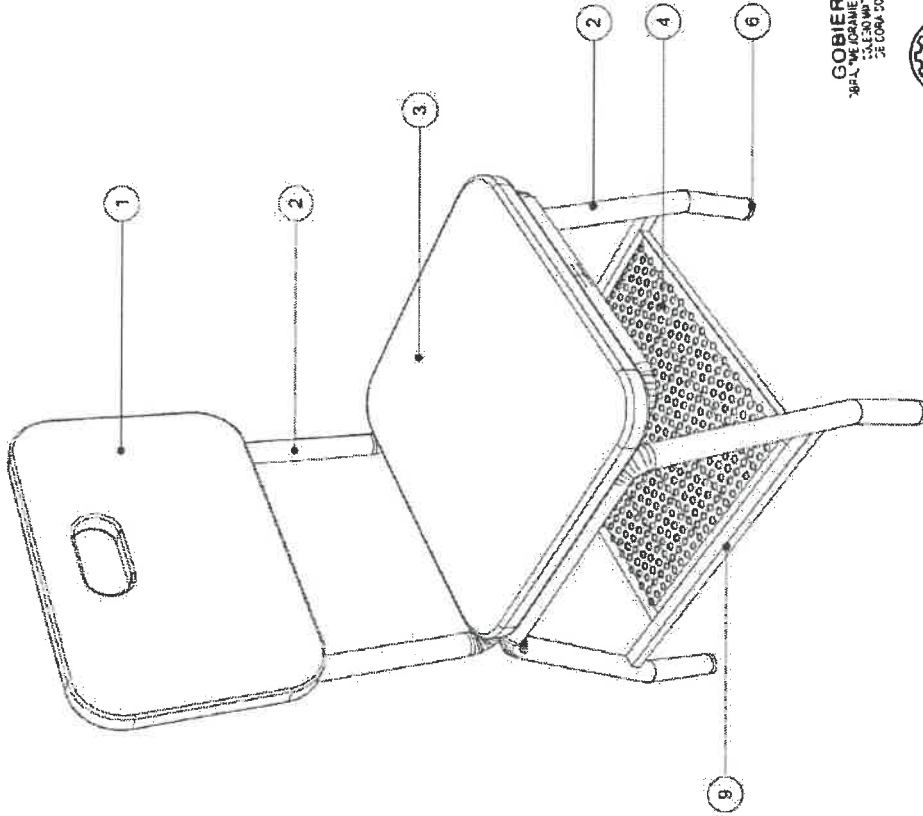

PRONIED
PERU
Ministerio de Educación
Instituto Nacional de Infraestructura Educativa

1. Sede del Ministerio de Educación
2. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
3. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
4. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
5. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
6. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
7. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
8. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
9. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa

PRONIED
PERU
Ministerio de Educación
Instituto Nacional de Infraestructura Educativa

1. Sede del Ministerio de Educación
2. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
3. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
4. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
5. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
6. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
7. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
8. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
9. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa

PRONIED
PERU
Ministerio de Educación
Instituto Nacional de Infraestructura Educativa

1. Sede del Ministerio de Educación
2. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
3. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
4. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
5. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
6. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
7. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
8. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
9. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE INGENIERÍA DE OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE ACERO



Ing. Richard Wiver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

DETALLES GENERALES

1. TABLERO DE RESPALDO, MADERA CON UNIONES MACHIHERRADAS O FINGER JOINT (UNIÓN ENDENTADA) 8"
2. TUBO MECÁNICO ELECTROSOLDADO DE ACERO LAMINADO AL FRÍO DE SECCIÓN CIRCULAR Ø = 1" y e = 2 mm
3. TABLERO DE ASIENTO, MADERA CON UNIONES MACHIHERRADAS O FINGER JOINT 8" 25-42mm ATORNILLADO A ESTRUCTURA METÁLICA CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA 4X20
4. PLANCHAS DE ACERO LAMINADO AL FRÍO DE ESPESOR 1.00 MM CON PERFORACIONES DE Ø10MM CON ARREGLO A 60° Y CON VARCO PERIMETRAL EN L SOLDADO A LA ESTRUCTURA
5. ALETA DE SUECIÓN CON PERFORACION TIPO "OJO CHINO", PLATINA DE ACERO ELECTROSOLDADO LAF e=1.5mm SOLDADA A ESTRUCTURA METÁLICA
6. REGATONES DE POLIPROPILENO DE 12mm (MÍNIMO) DE ESPESOR EXTERIOR O INTERIOR, LOS REGATONES PERMITIRÁN TENER UNA DISTANCIA NO MENOR DE 5 MM DEL PISO A LA ESTRUCTURA METÁLICA
7. LOGOTIPO INSTITUCIONAL
8. TUBO DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA DE 2" e=1.0 mm.

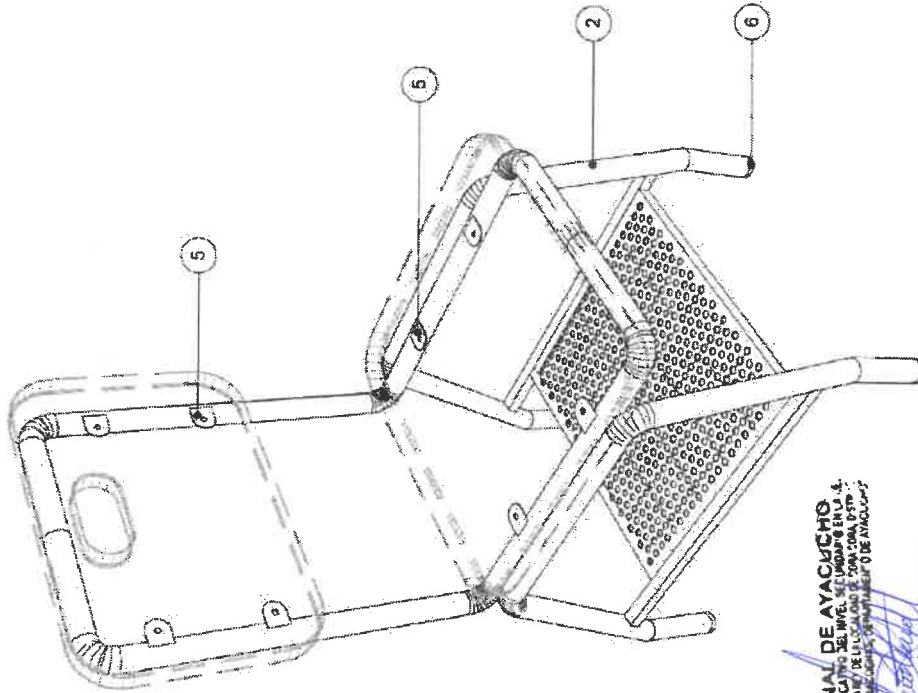

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE INGENIERÍA DE OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE ACERO



Ing. Luis Escobar Delgado
Residente de Obra
CIP: 21118

PRONIED
PERU
Ministerio de Educación
Instituto Nacional de Infraestructura Educativa

1. Sede del Ministerio de Educación
2. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
3. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
4. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
5. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
6. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
7. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
8. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
9. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa

1. Sede del Ministerio de Educación
2. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
3. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
4. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
5. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
6. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
7. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
8. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
9. Sede del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa

UNIDADES: MILIMETROS (mm)

SILLA DE METAL MADERA DE 5º DE SECUNDARIA

SSM-07

INDICADA

PRONIED
PERU
Ministerio de Educación
Instituto Nacional de Infraestructura Educativa

Version 02

L-14B

ANEXO N° 04 CUADRO DE OTRAS PENALIDADES

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.09.2023 16:41:01 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.09.2023 16:01:16 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
PARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.09.2023 14:51:17 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.09.2023 10:26:30 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.L.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARIMACOCCHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.L.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARIMACOCCHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

OTRAS PENALIDADES

Tipo	Supuestos de aplicación de Penalidad	Forma referencial de cálculo				Procedimiento
		1 a 100 bienes	100 a 1000 bienes	1000 a 5000 bienes	5000 a más bienes	
F1	No presentar la totalidad de la documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el transporte de los bienes a la Entidad, según las condiciones del numeral 2.2.7.4. Documentación para el Transporte de los bienes	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
F2	No levantar las observaciones realizadas por la Entidad a la documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el transporte de los bienes luego del plazo estipulado en el numeral 2.2.7.4. Documentación para el Transporte de los bienes	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F3	No recoger los Documentos que acredite Entrega de los Bienes ni suscribir el Acta de Entrega Documentaria según lo estipulado en el numeral 2.2.8.1 Transporte	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F4	No cumplir con el almacenaje adecuado (ambiente techado, sin goteras, sin filtraciones y con cobertura en óptimas condiciones), de acuerdo con el Numeral 2.2.5.1 Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 1$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 4$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F5	Ingresar con vehículos pesados a los patios de Instituciones Educativas para realizar la estiba y/o descarga de bienes según numeral 2.2.8.1 Transporte	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 1$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F6	No transportar exclusivamente los bienes objeto de la presente contratación en los vehículos del contratista,	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	

Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
CARRERA DE INGENIERÍA Y/O DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CALLE CORA CORA PROVINCIA DE PARINACÓCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Richard Wiver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
C.R.C. 183748



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
CARRERA DE INGENIERÍA Y/O DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CALLE CORA CORA PROVINCIA DE PARINACÓCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

	de acuerdo con el numeral 2.2.8.1 Transporte				
F7	No realizar el Transporte de bienes con un vehículo cerrado de acuerdo con lo señalado en el numeral 2.2.8.1 Transporte	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 1$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 4$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 5$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia
F8	No presentar la solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad dentro del plazo establecido en numeral 2.2.7.1 Sobre la solicitud para la calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia
F9	No presentar a la Entidad los resultados de la aplicación de métodos de ensayos dentro del plazo ofertado por el Organismo de Evaluación de la Conformidad. En su propuesta técnica presentada para su designación.	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia
F10	No presentar el levantamiento de observaciones del "informe de ensayos" dentro del plazo otorgado por la Entidad Contrante.	$P = M \times Oc$ $M = 0.2$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia
F11	No presentar antes de la culminación de la etapa de Fabricación, la documentación requerida en el numeral 2.2.1 Procedencia de la madera.	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia
		Consideraciones: (*) UIT: Unidad Impositiva Tributaria, se aplicará el valor de referencia vigente, establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, en la fecha de la suscripción del contrato.			

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day V* B*
Fecha: 09.03.2023 16:40:30 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupa FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day V* B*
Fecha: 10.03.2023 14:31:33 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencia Antonio FAU 20514347221.pdf
Motivo: Day V* B*
Fecha: 09.03.2023 18:01:53 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day V* B*
Fecha: 16.03.2023 10:25:47 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEGIO N° 10 INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACAS LOCAL, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Sancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEGIO N° 10 INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACAS LOCAL, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

ANEXO N° 05

REQUISITOS A PRESENTAR PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.03.2023 10:40:15 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.03.2023 18:02:14 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupa FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:31:40 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.03.2023 10:25:54 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 DISTRITO DE LA LINDA DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 DISTRITO DE LA LINDA DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

FORMATO N° 01

FORMATO N°01: CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES								
ACTIVIDADES	ETAPA: FABRICACION Y EMBALAJE DE LOS BIENES							
	MES 1				MES 2			
	día 1	día 2	día 3	día "n"	día 1	día 2	día 3	día "n"
BIEN "A"								
Actividad 1								
Actividad 2								
Actividad 3								
Actividad "n"								
BIEN "B"								
Actividad 1								
Actividad 2								
Actividad 3								
Actividad "n"								

FORMATO N° 02

FORMATO N°02: CRONOGRAMA DE ENTREGA DE BIENES								
ACTIVIDADES	ETAPA: TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIENES							
	MES 1				MES 2			
	día 1	día 2	día 3	día "n"	día 1	día 2	día 3	día "n"
INSTITUCIÓN DE DESTINO N°01								
TRANSPORTE								
ENTREGA								
INSTITUCIÓN DE DESTINO N°02								
TRANSPORTE								
ENTREGA								



Ing. Richard Wilmer Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Notas:

- El cronograma de "Adquisición de bienes" servirá para la realización de visitas inopinadas por parte de la ENTIDAD.
- Asimismo, ambos formatos, deberán entregarse en programa MS PROJECT, MS EXCEL o similar.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elías FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 18:40:03 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZOPRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 18:02:25 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Nara Luce FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:31:48 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 10:06:10 -05:00



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA LE
COLEGIO MIXTO INUITA N° 12 CRISTO REA DEL LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROV. AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FORMATO N° 03

FORMATO N°03: DESAGREGADO DE COSTOS

DESAGREGADO DE COSTOS DE BIENES A ENTREGAR A LA(S) INSTITUCION(ES) BENEFICIADA(S)

REGIÓN	INSTITUCIONES DE DESTINO	DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD	COSTO UNITARIO DE ADQUISICIÓN (FABRICACIÓN Y EMBALAJE)	COSTO UNITARIO DE ENTREGA (TRANSPORTE Y ENTREGA)	COSTO UNITARIO SUB TOTAL	COSTO DE BIENES
	(1)	(2)	(C)	(A)	(B)	(A+B)	[(A+B)*C]
"A"	Institución 01	Bien "A"		SI.	SI.	SI.	SI.
		Bien "B"		SI.	SI.	SI.	SI.
		Bien "n"		SI.	SI.	SI.	SI.
	Institución 02			SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
"B"	Institución 01			SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
	Institución 02			SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
	Institución "n"			SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.

RESUMEN DE COSTOS

COSTO TOTAL

SI.

Consideraciones:

- (1) Se contabiliza según el número de orden del "Formato de Direcciones para la Entrega", del Anexo 01.
- (2) Según nomenclaturas del Cuadro N°01 de las presentes especificaciones técnicas.
- (A) Incluye costo del Control de Calidad, según el numeral 2.2.8.

Notas:

- Se precisa que todos los costos deben contener como máximo 02 decimales y las sumatorias deben coincidir con los totales a adjudicar.
- Asimismo, dicho formato debidamente llenado, deberá entregarse en archivo digital editable.
- Toda incompatibilidad, incluso a nivel de decimales u ordenamiento del formato distinto a lo estipulado, será tratada como observación.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 16:39:47 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
"OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. "J. LEONARDO RODRIGUEZ V. DE CRISTO" N° 1, LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
"OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO NÚCLEO INDUSTRIAL "J. LEONARDO RODRIGUEZ V. DE CRISTO" N° 1, LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencio Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 19:02:36 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO PARFAN María Lupe FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:31:55 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 10:26:23 -05:00

FORMATO N° 04

FORMATO N°04: DIRECCIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN Y ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA

Nombre de contratista o de cada empresa que conforma el consorcio	Av., Jr., Calle, Pasaje, Mz. Lote, Etc.	N°	Urbanización, Sector, Etc.	Teléfono del Local y de Propietarios	Referencia	Distrito Provincia Región

Notas:

- Máximo declarar 04 instalaciones de almacenamiento y/o talleres.
- En caso se necesite modificar los datos de la(s) dirección(es) declaradas, el Contratista deberá notificar a la Entidad mediante una carta por mesa de partes de la ENTIDAD, como plazo máximo antes del ingreso de la Solicitud de Verificación de Cantidad por la culminación de la etapa de "Adquisición y Embalaje de la totalidad de los bienes".

FORMATO N° 05

FORMATO N°05: RESPONSABLE GENERAL DE OPERACIONES

Nombres y apellidos completos	N° DNI	Cargo	N° de celular	N° teléfono fijo	Correo electrónico Institucional

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUSPERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 08.03.2023 10:28:34 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO N° 2002, S/NAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PAMBA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO N° 2002, S/NAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PAMBA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 241541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 08.03.2023 10:32:48 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: CASTILLO
FARRAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:32:01 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tibasio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 10:28:31 -05:00

FORMATO N° 06

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Por medio de la suscripción del presente documento se autoriza a (Nombre de Entidad) a realizar la notificación electrónica de las observaciones realizadas por la Entidad durante el procedimiento para suscribir el contrato, así como, para los actos efectuados durante la ejecución del contrato.

La dirección de correo electrónico autorizada es:

Correo electrónico autorizado:

[illegible]

Repita el correo electrónico autorizado:

[illegible]

Quedan exceptuados de la presente autorización, aquellos actos cuya notificación revistan formalidades especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones pública.

La notificación electrónica se acredita con la impresión del correo electrónico enviado y la Cedula de Notificación, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmación de parte del contratista.

La notificación en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación electrónica efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

(REPRESENTANTE LEGAL)
RUC:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
Motivo: Soy el autor
Fecha: 02-03-2023 16:39:18 -0500

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA CIUDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA OCHOS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Version 02

Firmado digitalmente por
ZORP LLA LLINTANA Exercicio
Antonio FAJ 20514347221 soft
Módulo: Ley V Bº
Fecha: 08/03/2023 18:02:59 -C5:03

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA
CIDMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
2DE14347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
E-2012-12-23 20:05:14 140512 05:05

PRONIED
PROGRAMA NAȚIONAL
DE INFRASTRUCTURĂ EDUCATIVĂ
SIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2023 10:22:40 -05:30

ANEXO N° 06

MODELOS REFERENCIALES DE ACTAS PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.03.2023 18:39:03 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANCO Pinedo Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.03.2023 10:27:49 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florentino
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.03.2023 16:03:11 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Mane Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:32:17 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLESIOMOTO INDUSTRIAL N° 12 COMITÉ DE LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO
DE CORACORA PROVINCIA DE PUNTAUCOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718




Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

ACTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	
CONTRATO:	
TIPO DE BIEN:	
UBICACIÓN:	
CONTRATISTA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
FECHA:	

Siendo las _____ horas del día ____ del mes _____ del año 20 __, se reunieron en el local donde se realiza el proceso de fabricación y/o almacenaje de los bienes adquiridos mediante el procedimiento de selección arriba mencionado, sitio en la dirección antes indicada; de una parte, el Sr(a) _____ en representación de la **ENTIDAD** y de la otra parte el Sr(a) _____ en representación de la empresa Contratista _____ a fin de llevar a cabo la inspección de los trabajos materia de la adquisición, encontrándose lo siguiente:

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AREA DE LICENCIAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.
CICLO VAO 2010, ETAPA Nº 12 CENTRO DE LULLO CALCHO DE CORA CORA D.F.T.P.
DE CORA CORA PROVINCIA DE PUNTA OCHOYA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

 Ing. Richard Wilver Lancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 ZARPA DEL AGUAMAYO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO SECUNDARIO YU-1
 C/LEONARDO DÍAZ, S/NAL Nº 12 CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTR.
 DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

 Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 98718

PRONIEI
PROGRAMA NAȚIONAL
DE INFRASTRUCTURĂ DIGITALĂ
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANOC Tiberio Cayo FAJ
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2023 10:28:12 -05

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas se dio lectura a la presente Acta, y no habiendo objeciones a la misma, se procedió a suscribirla por parte de los presentes.

[illegible]

LA ENTIDAD REPRESENTANTE

Nombre

Cargo

D.N.I.

**CONTRATISTA
REPRESENTANTE**

Nombre

D.N.I.

ACTA DE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA

La firma de la presente acta da la conformidad de la recepción de documentos en original de los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA's) del Contrato N° _____, derivado del Procedimiento de selección para la _____.

Mediante la presente, se hace entrega de la cantidad de N° _____ PECOSA's en cuatro (04) juegos originales, para la entrega de los bienes correspondientes.

NOTA PARA SER CONSIDERADA

De conformidad con el numeral 2.8.9 ENTREGA DE LOS BIENES, de las Especificaciones técnicas de las Bases Integradas, se debe tener en consideración que los PECOSA, deberán ser suscritos (firmados y sellados) por el Encargado de la Institución de destino¹, dando fe de lo recibido, consignándose en cada documento: firma, post-firma, sello y fecha de recepción, copia de DNI del Encargado y documentación que acredite su cargo, debiendo recabar la entidad receptora un ejemplar original de los PECOSA, para sus efectos contables.

En caso de ausencia del Encargado de la Institución de destino², por motivos no imputables a la ENTIDAD o no contar con documentación que acredite su cargo, el PECOSA podrá ser firmado por un representante designado y autorizado por la ENTIDAD.

Los bienes serán entregados en perfecto estado de conservación, adecuadamente armados y embalados hasta su destino final, sin ningún defecto de ADQUISICIÓN / FABRICACIÓN, ni otro como consecuencia de la estiba o desestiba o del transporte.

Los datos de contacto en cada una de las Instituciones de destino para la recepción de los bienes y el firmado de los PECOSA, serán coordinados directamente por el CONTRATISTA.³

Atentamente;

NOMBRE :

DNI :

EMPRESA :

FECHA :

TELÉFONO / CELULAR:

HORA:

CORREO ELECTRONICO:

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA UGEL
COLEGIO MUYO INDI TIPA N° 12 CASIO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA - PROVINCIA DE PÁNUCO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBL
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 10:28:30 -05

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CAST
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:32:40 -05

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 18:03:50 -05X

CONTRATISTA
REPRESENTANTE

LA ENTIDAD
REPRESENTANTE

¹ Si es una Institución Educativa, los PECOSA deberán ser suscritos por el Director o Sub-director administrativo en ausencia de aquel.

² En caso de ausencia del Director o Sub-director administrativo de una Institución Educativa, el PECOSA podrá ser firmado por un representante designado y autorizado por la UGEL correspondiente a la Institución, previa coordinación con la ENTIDAD.

³ Para una Institución Educativa el contacto será coordinado directamente por el CONTRATISTA con las UGELES respectivas.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA UGEL
COLEGIO MUYO INDI TIPA N° 12 CASIO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA - PROVINCIA DE PÁNUCO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

ACTA DE VERIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

CONTRATO N° _____
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN _____

Por medio del presente documento, se deja constancia que el especialista de la ENTIDAD procedió con la verificación del levantamiento de observaciones en presencia del representante de la empresa Contratista el Sr(a) _____, en el marco del contrato N° _____.

1. _____ identificado con DNI N° _____ por parte de la ENTIDAD.
2. _____ representante de la Empresa Contratista identificado con DNI N° _____.

La verificación se realizó en los ____ (n°) almacenes declarados por el contratista, durante las siguientes fechas:

DIRECCIÓN LOCAL 01:

Fecha de verificación en Local 01:

DIRECCIÓN LOCAL 02:

Fecha de verificación en Local 01:

Durante la verificación se encontró lo siguiente:

CUADRO N° 01: RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN ENCONTRADA	SUBSANADO	
			SÍ	NO
		1.		
		2.		
		1.		
		2.		
		3.		
		1.		

ANOTACIONES:

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
"BPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA
"CASCADORA" DEL DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE AYACUCHO"



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98719

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas, del día _____, en señal de conformidad con los términos de la presente acta suscriben los intervinientes.

LA ENTIDAD
REPRESENTANTE

Nombre _____
D.N.I. _____

CONTRATISTA
REPRESENTANTE

Nombre _____
D.N.I. _____

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	
CONTRATO:	
TIPO DE BIEN:	
UBICACIÓN:	
CONTRATISTA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
FECHA:	

Siendo las _____ horas del día ____ del mes _____ del año 20____, se reunieron en el local donde se realiza el proceso de fabricación y/o almacenaje de los bienes adquiridos mediante el contrato arriba mencionado, sito en la ubicación antes señalada, de una parte, el Sr(a) _____ en representación de la **ENTIDAD**, y de la otra parte el Sr(a) _____ en representación de la empresa Contratista

Encontrándose lo siguiente:

add digitalmente per ROBLES
CC: Tilarie Cayo FAU
14347221 soft
cc: Doy Y' B'
a: 18.03.2023 10:23:48 -08:00

FAU 20514347221 scd
vol: Gay V° S°
A 06.03.2023 18:24:22 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas se dio lectura a la presente Acta, y no habiendo objeciones a la misma, procediendo a suscribirla los presentes en señal de conformidad.

Envio digitalizado por GRAYO
ERRERO Gonzalo Elias FAU
14347221 soft
Cvd: Doy V* B*
Sa: 06/03/2003 10:42:00 -0500

LA ENTIDAD REPRESENTANTE

Nombre

Cargo

D.N.I.

**CONTRATISTA
REPRESENTANTE**

Nombre

D.N.I.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE FOMENTO Y TURISMO
CALLE JAZOZUO 100, PUNTO 1, C/ 100, PUNTO 1, C/ 100, PUNTO 1
DE CONJUNTO INDUSTRIAL DE AYACUCHO, PUNTO 1, C/ 100, PUNTO 1, C/ 100, PUNTO 1

ACTA DE DEVOLUCIÓN DE BIENES

CONTRATO N° _____
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN _____

Siendo las _____ horas, del día _____ de _____ de 20____; se reunieron en el local de la empresa _____, el Supervisor de la ENTIDAD, _____, identificado con DNI N° _____, el representante de la empresa Contratista el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____ y el representante del Organismo de Evaluación de Conformidad _____ identificado con DNI N° _____, con la finalidad de realizar la devolución de los bienes ensayados como parte del control de calidad, en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de la _____.

ANOTACIONES:.....
.....
.....
.....

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas, en señal de conformidad con los términos de la presente acta, suscriben los intervinientes.

LA ENTIDAD REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN CERTIFICADORA DE CALIDAD REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

CONTRATISTA REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA DEL
COLEJO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CANTONEL DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PASTAZA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA DEL
COLEJO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CANTONEL DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PASTAZA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS

CONTRATO N° _____
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN _____

Siendo las _____ horas, del día _____ de _____ de 20____; se reunieron en los Almacenes de la empresa Contratista _____, el Supervisor de la ENTIDAD, el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____, el representante de la empresa Contratista el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____ y el representante del Organismo de Evaluación de Conformidad, _____, el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____, con la finalidad de realizar la verificación técnica a través de ensayos de funcionalidad de los bienes materia del contrato antes citado, para tales efectos se procederá a tomar el número de muestras que pasarán por control de calidad, según lo establecido en el Anexo N° 02 de las Especificaciones Técnicas, tal como se detalla a continuación:

CUADRO N° 01: MUESTRAS Y ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD			
N° DE ORDEN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE MUESTRAS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL DE MUESTRAS			

ANOTACIONES:



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas, en señal de conformidad con los términos de la presente acta, suscriben los intervinientes.

LA ENTIDAD
REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN
CERTIFICADORA DE CALIDAD
REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

CONTRATISTA
REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: ROBLI
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 10:29:05 -05

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: CASTI
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:33:13 -05

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ZORRILLA QUI, TANA Florenel
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09.03.2023 18:06:27 -05

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA DE LA LOCALIDAD DE COCA, DISTRITO DE COCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211641



ACTA DE VERIFICACIÓN CUANTITATIVA N°

SERVICIO :
MODALIDAD :
CONTRATO :
UBICACIÓN :
CONTRATISTA :

Siendo las _____ horas, del día _____ de _____ de 20____; estando en las instalaciones de la empresa Contratista _____, se reunieron: de una parte, el(la) Sr(a) _____, identificado con DNI N° _____, en representación de la empresa contratista _____; otra parte el Sr(a) _____, identificado con DNI N° _____, quien actúa en representación del área¹ _____; y el Sr(a) _____, identificado con DNI N° _____, en representación del área usuaria, para realizar la verificación cuantitativa del Contrato N° _____; derivado de la _____ de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, a fin de realizar la verificación cuantitativa de los bienes.

De la verificación realizada, se observan las siguientes cantidades:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD VERIFICADA

CONCLUSIÓN:



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 06.03.2023 18:35:18 -05

Siendo las _____ horas del día _____ de _____ del año 20____, se procedió a firmar el presente Acta por triplicado.

ÁREA DESIGNADA POR LA
ENTIDAD
REPRESENTANTE

ÁREA USUARIA
REPRESENTANTE

CONTRATISTA
REPRESENTANTE

¹ La Entidad define quien es el área competente de emitir la conformidad cuantitativa.
Versión 02

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
FARRAN...
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 14.03.2023 14:33:23

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
ALCALDIA DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.
COLEGIO N° 12 CRISTÓBAL DE LA CALZADA DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNAJUNGO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



ANEXO N° 7 FICHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221.pdf
Método: Dey V1 B
Fecha: 09.03.2023 16:35:40 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
TORRILLA QUINTANA Fernando
Antonio FAU 20514347221.pdf
Método: Dey V1 B
Fecha: 09.03.2023 18:04:54 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
PARFAN Maria Luce FAU
20514347221.pdf
Método: Dey V1 B
Fecha: 10.03.2023 14:34:56 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANDE Tibério Cayo FAU
20514347221.pdf
Método: Dey V1 B
Fecha: 10.03.2023 10:26:33 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA
URBANA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA
URBANA" COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO
DE CORACORA, PROVINCIA DE PAMPA DE CRUZ, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA
URBANA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA
URBANA" COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO
DE CORACORA, PROVINCIA DE PAMPA DE CRUZ, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

Anexo N° 07

Ficha de presentación del producto

El postor deberá completar los datos de la tabla siguiente:

Nombre del requerimiento		
N°	Especie(s) maderable(s) con la(s) que atenderá el requerimiento (véase Nota 1)	Nombre o Razón social del Postor
1		
2		
...		

Nota 01: El contratista podrá proponer una especie de madera similar o superior a las indicadas en el número 2.1 del numeral 2.1.1. Características y especificaciones, siempre y cuando esta cumpla con las propiedades físicas, mecánicas y de durabilidad.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por SPANIO
QUERRERO, Gonzalo Elias FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 08.03.2023 16:35:23 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA, Flaminio
Antonio FAU 20514347221.pdf
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 09.03.2023 18:04:46 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN, María Luján FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 10.03.2023 14:35:03 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANCO, Tiberio Cayo FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 16.03.2023 19:32:08 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
"B.R.A. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
"B.R.A. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

FICHA DE HOMOLOGACIÓN

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

Código del CUBSO	: 56121502-00390344
Denominación del requerimiento	: Silla de metal y madera para estudiante de 3° - 4° de secundaria.
Denominación técnica	: Silla de estudiante de secundaria fija de metal y madera de 41 cm x 48.2 cm x 84 cm
Unidad de medida	: Unidad.
Resumen	: Silla de estructura de metal, asiento y respaldo de tablero de madera y accesorios de fijación, para 01 estudiante, con 840 mm de altura total, 410 mm de ancho y 482 mm de profundidad total. Destinada a la población estudiantil de 3° a 4° del nivel secundaria de la Educación Básica Regular.

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

La silla de metal y madera para estudiante de 3° - 4° de secundaria, está conformado por los siguientes componentes:

- Estructura de silla
- Tableros de madera de silla
- Ensamblaje y accesorios

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

2.1.1. Características y especificaciones del bien

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLONIA N° 10 INS. S. N° 12 COMITÉ REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE TAMBILLO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

 Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 58718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: ROBLI YANOC T. Benio Cayo FAU.
C05614347221 soft
Móvil: 987 654 321
Fecha: 16/03/2023 09:25:52 -05

N°	Características	Especificación	Documento Técnico de Referencia
1. Estructura de silla			
1.1	Material	Tubo mecánico electro soldado de acero laminado al frío	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.3.1.1
1.2	Resistencia a la tracción	≥ 45 ksi [310 MPa]	ASTM A513 Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing Tabla S5.1
1.3	Límite de fluencia	≥ 32 ksi [221 MPa]	
1.4	Composición química	C máx. 0.15% Mn máx. 0.60% P máx. 0.035% S máx. 0.035%	ASTM A513 Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing Tabla 1 y Tabla 2

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLONIA N° 10 INS. S. N° 12 COMITÉ REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE TAMBILLO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



1.5	Patas y respaldar		
1.5.1	Sección de tubo: estructural	Circular Ø 1"	Establecido por el Ministerio
1.5.2	Espesor nominal de la pared del tubo estructura principal	1,2 mm calibre 18	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.3.1.1 Tabla 11
1.5.3	Dimensiones estructurales	Véase Anexo N° 03 Lámina L-12	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Cuadro N°5
1.6	Arriostre inferior		
1.6.1	Sección de tubo: estructural	Cuadrado 5/8"	Establecido por el Ministerio
1.6.2	Espesor nominal de la pared del tubo	1,0 mm	Establecido por el Ministerio
1.6.3	Dimensiones estructurales	Véase Anexo N° 03 Lámina L-12	Establecido por el Ministerio
1.7	Plancha perforada		
1.7.1	Límite de fluencia (véase Nota 01)	$20[140] \leq \text{Ksi [Mpa]} \leq 40[275]$	ASTM A1008/A1008M Standard Specification for Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy and High-Strength Low-Alloy with improved Formability. CS Tipo B Tabla 3
1.7.2	Composición química (véase Nota 01)	C máx. 0.15% Mn máx. 0.60% P máx. 0.030% S máx. 0.035%	ASTM A1008/A1008M Standard Specification for Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy and High-Strength Low-Alloy with improved Formability. CS Tipo B Tabla 1
1.7.3	Dimensiones	Véase Anexo N°03 Lámina L-12	Establecido por el Ministerio
1.7.4	Espesor	1,0 mm	Establecido por el Ministerio
1.7.5	Arreglo de perforación	60°	Establecido por el Ministerio

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE INFRACRUCIA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE EDUCACIÓN

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 90718



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE INFRACRUCIA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE EDUCACIÓN

Ing. Luis Escobar Bellio
Residente de Obra
CIP: 211541



PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRACRUCIA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por POBLI
YAL OC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:26:01 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRACRUCIA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:18:00 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRACRUCIA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA OJUNTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 14:26:52 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRACRUCIA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:56:55 -05:00

1.7.6	Diámetro de perforación	10 mm	Establecido por el Ministerio
1.7	Soldadura	<i>Metal Inner Gas (MIG) de micro alambre que no dejará escoria, previamente decapada.</i>	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.3.1.1 apartado c)
		Todas las uniones soldadas entre elementos metálicos deberán tener un cordón de soldadura continuo en todo el perímetro de la unión. Las uniones deberán tener un acabado uniforme.	Establecido por el Ministerio
1.8	Acabado	Preparación de la superficie: Los tubos deben recibir un baño de desengrase, de desoxidación (decapado), de reactivado, de fosfatizado y un baño para pasivado con el objeto de eliminar óxidos, escamas de óxido y grasas. Luego debe ser sometido a un proceso de secado para eliminar toda humedad interior y exterior.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.3.2
		Recubrimiento en polvo; recubrimiento en polvo termo convertible, de tipo epoxi o epoxi-poliéster. La película depositada será de 80 micrones mínimo, brillo semimate. Curado mediante horneado para que adquiera la apariencia adecuada, las propiedades mecánicas y químicas finales.	
1.9	Color	RAL 5024	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Anexo N° 02
1.10	Defectos no tolerables	Deformaciones, grietas, puntas o filos, salpicaduras y espacios vacíos entre o los elementos metálicos	Establecido por el Ministerio

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.
CALLEO WAT'UNB, S/NAL Y 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTR.
DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 58718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.
CALLEO WAT'UNB, S/NAL Y 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTR.
DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellón
Residente de Obra
CIP: 211541



PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANCC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2023 09:26:09-05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

2. Tableros de madera de silla

2.1	Especies de madera (Véase Nota 01, Nota 02 y Nota 03)	AGUANOMASHA (<i>Machaerium inundatum</i>)	Establecido por el Ministerio
		CACHIMBO ROJO (<i>Cariniana domestica</i>)	
		COPAIBA (<i>Copaifera paupera</i>)	
		HUAYRURO (<i>Ormosia coccinea</i>)	
		MASHONASTE (<i>Clarisia racemosa</i>)	
		REQUIA (<i>Guarea kunthiana</i>)	
		ULCUMANO (<i>Podocarpus oleifolius</i>)	
		TORNILLO (<i>Cedrelinga cateniformis</i>)	
2.2	Densidad básica	0,45 g/cm ³ a 0,70 g/cm ³	<p>NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición</p> <p>Numeral 5.1.1</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA COLEJO UNIÓN S. 12 DISTRICTO DE LINDA OCHO DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANAL, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO</p> <p>Ing. Richard Wilver Cancho Vargas SUPERVISOR DE OBRA CIP: 98718</p>
2.3	Flexión estática	MOR ≥ 501 kg/cm ²	
		MOE ≥ 90 t/cm ²	
2.4	Compresión perpendicular	ELP ≥ 41 kg/cm ²	
2.5	Cizallamiento	≥ 61 kg/cm ²	
2.6	Dureza en lados	≥ 301 kg/cm ²	
2.7	Tenacidad	≥ 1,8 kg-m	
2.8	Contenido de humedad de la madera (Véase Nota 04)	<p>Para establecer el CHE de la madera a ser utilizado en los diferentes usos, en función del lugar donde prestará servicio, se deberá tomar como referencia la información brindada en el aplicativo "Calculadora CHE Perú" disponible en el Play Store indicado en el siguiente link:</p> <p>https://play.google.com/store/apps/details?id=io.itp.calculadorache&hl=es_PE&gl=US&fbclid=IwAR0pqkKVLtGOGJqP33eo6J9N6g1x_UeIL0VjBI4OPDj4BLZV-IJmMCS7S7o</p>	<p>NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición</p> <p>Numeral 5.1.5.1</p> <p>Ing. Luis Escobar Bellón Residente de Obra CIP: 211541</p>

2.9	Preservación	La madera a emplearse debería resistir el ataque de insectos y hongos xilófagos, para lo cual, en previsión de posibles ataques de agentes biológicos que contribuyan a la degradación, es recomendable utilizar preservantes que garanticen la inocuidad para el uso del mobiliario.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.5.2
2.10	Juntas de tablero	Machihembrada o endentadas (Finger Joint) con listones de 50 mm de ancho como mínimo.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.7.2
		Tener en cuenta el balance de los anillos de crecimiento de la madera para prevenir alabeos no tolerados.	
2.11	Dimensiones de tableros (Véase Anexo N°03, Lámina L-12A)		
2.11.1	Asiento		
2.11.1.1	Profundidad	380 mm	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Cuadro N°5
2.11.1.2	Ancho	410 mm	
2.11.1.3	Espesor	22-25 mm	Establecido por el Ministerio
2.11.2	Respaldar		
2.11.2.1	Altura	250 mm	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Cuadro N°5
2.11.2.2	Ancho	410 mm	
2.11.2.3	Espesor	Véase Anexo N° 3 Plano L-12A	Establecido por el Ministerio
2.12	Encolado	Colas PVA con 48% de sólidos como mínimo, no tener una antigüedad de fabricación mayor a 6 meses y de fraguado al ambiente. El adhesivo debe colocarse en la superficie de las dos piezas a encolar	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.8

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA URBANA DE TAYACAN
CALLE 12 DE OCTUBRE N° 1210, TAYACAN, PROVINCIA DE TAYACAN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wliver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:19:30 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 12.03.2023 14:27:45 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARRAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 11:00:12 -05:00


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA URBANA DE TAYACAN
CALLE 12 DE OCTUBRE N° 1210, TAYACAN, PROVINCIA DE TAYACAN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Resistente a Obra
CIP: 211541



PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLIN VANCOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:28:37 -05:00

2.13	Lijado	Lijado manual o mecánico. Grano mínimo de 150 grit.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.9
		La superficie debe quedar totalmente lisa y suave al tacto, libre de astillas, irregularidades, cantos vivos y poros levantados; las aristas serán redondeadas.	
2.14	Acabado	Laca selladora mate o semi- mate translúcida o lacas catalizadas o un material de recubrimiento con dureza y durabilidad equivalente o superior a las consideraciones técnicas siguientes: - Base de nitrocelulosa, aditivos plásticos y metálicos - Sólidos en Volumen 27 ± 2 % - Espesor de Película Seca 2.0 – 3.0 mils por capa	NTP 260.008:2019 MOBILIARIO ESCOLAR. Silla para nivel de educación secundaria. Requisitos. 4ª Edición Numeral 7.2.5
		Mínimo 3 capas, aplicado en la totalidad de las superficies.	
2.15	Defectos no tolerables en madera		
2.15.1	Perforaciones grandes	Mayor de 3 Agujeros con diámetro mayores a 6mm, por metro lineal y no alineados	<div><div><div>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO</div><div>DEPARTAMENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.I. COLEJO Nº 10, S/TALE Y 12 GRUPOS DEL AREA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA - PROVINCIA DE HUACACHICA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO</div></div><div><div></div><div><div>Ing. Richard Wilver Cancho Vergas</div><div>SUPERVISOR DE OBRA</div><div>CIP: 08718</div></div></div></div> <div><div>NTP 260.015:2021 MUEBLES.</div><div>Mobiliario para Instituciones</div><div>Educativas. Requisitos. 5ª Edición</div><div>Numeral 5.1.4</div></div>
2.15.2	Rajaduras y Grietas	Mayor a 20 mm de largo, 0,5 mm de ancho, y mayor a la tercera parte del espesor de la pieza.	
2.15.3	Inclinación del grano	Mayor a 10º	
2.15.4	Falla de compresión paralela	Máximo en dos lados consecutivos y no perjudiquen la solidez.	
2.15.5	Defectos de forma	Mayor al 0,3% de la longitud de la pieza	
2.15.6	Presencia de hongos de pudrición	No se admiten	
2.15.7	Presencia de insectos activos	No se admiten	

2.15.8	Defectos por nudos	Mayor de 20 mm de diámetro y mayor a la cuarta parte del ancho del material	
2.15.9	Nudos muertos	No se admiten	
2.15.10	Mezcla de especies	No se admiten	
2.15.11	Presencia de médula y/o corteza	No se admiten	
2.15.12	Inestabilidad en un plano	No se admiten	NTP 260.014:2021 MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Muestreo. 4ª Edición Anexo A
2.15.13	Ensamblajes defectuosos	No se admiten	Establecido por el Ministerio
2.15.14	Acabado defectuoso	No se admiten	
2.16	Defectos tolerables		
2.16.1	Perforaciones pequeñas	Agujeros de 1 mm a 3 mm de diámetro, que sumados sus diámetros den un máximo de 6 mm en un área de 100 cm ² , no alineados ni pasantes	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.3
2.16.2	Mancha azul	No cuantificable mientras no afecte la resistencia de la madera	
3. Accesorios y piezas de ensamble			GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SECRETARÍA DE DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA UG CALEDO VÍCTOR DÍAZ SÁNCHEZ 12 CAYSTO Nº 12 DE LA LOCALIDAD DE CAYSTO, DISTRITO DE CAYSTO, PROVINCIA DE HUANCAJANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
3.1	Regatones		Ing. Richard Wilver Cancho Vargas SUPERVISOR DE OBRA CIP: 98718
3.1.1	Material	Polipropileno (PP)	Establecido por el Ministerio
3.1.2	Dimensiones	12 mm (mínimo) de embone exterior o interior a la estructura metálica. Distancia no menor de 5 mm de separación entre el piso y la estructura metálica. (Véase Lámina L-12A)	Establecido por el Ministerio
3.1.3	Color	RAL 9005 (negro)	Establecido por el Ministerio
3.2	Platina de acero electrosoldado		
3.2.1	Material	Acero laminado	Establecido por el Ministerio
3.2.2	Dimensiones mínimas	25mm x 30mm (Véase Lámina L-12A)	Establecido por el Ministerio



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA UG
CALEDO VÍCTOR DÍAZ SÁNCHEZ 12 CAYSTO Nº 12 DE LA LOCALIDAD DE CAYSTO, DISTRITO DE CAYSTO, PROVINCIA DE HUANCAJANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Celis
Residente de Obra
CIP: 21154

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
ANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Moje: Doy Vº Bº
Fecha: 16.05.2023 09:28:52 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Moje: Doy Vº Bº

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Moje: Doy Vº Bº

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Moje: Doy Vº Bº

3.2.3	Tipo de perforación	"ojo chino"	Establecido por el Ministerio
3.2.4	Espesor	1,5 mm calibre 16	Establecido por el Ministerio
3.2.5	Soldadura	Metal Inner Gas (MIG) de micro alambre que no dejara escoria, previamente decapada.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.3.1.1 apartado c)
3.3	Tornillos		
3.3.1	Tipo	Tornillos de cabeza plana autorroscantes.	Establecido por el Ministerio
3.3.2	Dimensión tornillo para asiento	4 mm x 20 mm	Establecido por el Ministerio
3.3.3	Dimensión tornillo para respaldar	4 mm x 15 mm	Establecido por el Ministerio

Nota 01: Los postores deberán presentar relación de especies de madera a utilizar en el proceso de fabricación, según lo estipulado en el numeral 3.1 De la Selección del capítulo III Información Complementaria.

Nota 02: El contratista podrá proponer una especie de madera similar o superior a las indicadas en el numeral 2.1, siempre y cuando esta cumpla con las características de la madera indicadas entre los numerales 2.2 al 2.9, para lo cual debe presentar la(s) ficha(s) técnica(s) de la especie(s) de madera, suscrita por el Contratista, especialista en el control de calidad de productos de madera o un laboratorio especializado en la investigación de la madera.

La propuesta deberá ser aprobada por la Entidad contratante, para esto, el contratista deberá presentar una solicitud a la Entidad contratante dentro de los 10 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, sin que se genere sobrecostos y modificaciones a los plazos contractuales establecidos por la Entidad.

Nota 03: Los listones de madera que componen cada uno de los elementos, asiento y respaldar de madera deberán ser de una misma especie maderable.

Nota 04: Se utilizará el Programa para determinar el Contenido de Humedad de Equilibrio (CHE) de la madera a nivel nacional. El aplicativo web "CHE Peru", se encuentra disponible en el siguiente enlace: <http://citemadera.itp.gob.pe/proyectos/che/>.

2.1.2. Marcado y/o rotulado

2.1.2.1. Logotipo Institucional

Para identificar la procedencia institucional de la silla de metal y madera para estudiante de 3° - 4° de secundaria, se colocará mediante técnica de pirograbado el logotipo institucional de la entidad contratante, en cada uno de los bienes a adquirir de acuerdo a lo señalado en la Lámina L-12A.

El logo institucional tendrá las siguientes características:

Características	Especificación
Dimensiones	9 cm (ancho) x 3 cm (alto)
Grabado	Pirograbado
Fuente	Arial
Tamaño de letra	7 puntos mín.



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ULA
"COLEJO MONTAÑAS" N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA OCHOYAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellio
Residente de Obra
CIP: 21154

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBILLO
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:28:55 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL


Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:28:28 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Aranda FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:28:49 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 11:00:28 -05:00



2.1.2.2. Identificación de fabricante

Para la identificación del fabricante de la silla de metal y madera para estudiante de 3° - 4° de secundaria, se colocará una lámina autoadhesiva en cada uno de los bienes a adquirir. Este rotulado tendrá las siguientes características:

Características	Especificación
Dimensiones	8-12 cm (ancho) x 4-8 cm (alto)
Material	Autoadhesivo
Color	Verde
Fuente	Arial
Tamaño de letra	7 puntos mín.
Información a consignar	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de la entidad usuaria en el encabezado - Nombre del procedimiento de selección - Descripción de los bienes (código del bien y Nombre del bien) - Nombre del contratista, dirección y teléfono
Ubicación	Parte inferior del bien

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN N°

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Código del bien, Nombre del Bien)

NOMBRE DEL CONTRATISTA (indicar el nombre de todas las empresas que conforman el consorcio de corresponder)

DIRECCIÓN

TELÉFONO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.
EJECUCIÓN VOTADA N° 12 ORDINARIO DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PANA DE AZÚCAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBERTO
FARFAN María Lúcia FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 11:03:38 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CAST
FARFAN María Lúcia FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 11:03:38 -05

2.1.3. Embalaje

Los bienes deben de estar embalados en su totalidad, de forma que no se dañen o deterioren durante el transporte hasta el destino final, tomando en cuenta para la envoltura y embalaje, según lo indicado en la NTP 260.012:2017 MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Embalaje, 3ª Edición.

2.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

2.2.1. Procedencia de la madera

El contratista debe garantizar el origen legal de la madera que utiliza como materia prima para la fabricación de mobiliarios de madera. Para ello, la madera que se adquiere debe estar sustentada con la Guía de Transporte Forestal (GTF), conforme a lo establecido en el Artículo 168 del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, en el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, según corresponda:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ERASMO
FARFAN María Lúcia FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 11:03:38 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 11:03:38 -05

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.
EJECUCIÓN VOTADA N° 12 ORDINARIO DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PANA DE AZÚCAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido

- Para los casos de madera de especies forestales nativas, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Transporte Forestal (GTF) que ampara la procedencia de la madera. En los casos de títulos habilitantes, en la GTF debe estar consignada la resolución de aprobación del plan de manejo forestal o resolución que aprueba el aprovechamiento forestal (reingresos, movilización de saldos, etc.).
- Para los casos de madera de especies forestales introducidas, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Remisión (GR) con la descripción de la especie que la identifique como introducida y el número de registro de la plantación.
- Para los casos de madera importada, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Remisión (GR) y los documentos de importación.

En el caso el contratista no pueda garantizar el origen legal de la madera, la Entidad contratante podrá notificar a las entidades sancionadoras, en el marco del Art. 215 del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.

2.2.2. Lugar de entrega

El lugar de entrega de los bienes será determinado por cada Entidad contratante, para lo cual brindará el detalle de la(s) dirección(es) respectiva(s). Para ello, podrá tomar en consideración el formato "Dirección(es) de Institución(es) de destino", adjunto en el Anexo N° 01.

Cualquier cambio respecto al lugar de entrega de los bienes dentro de la misma provincia, será comunicado al Contratista por la Entidad contratante, mediante correo electrónico hasta el inicio de la etapa de transporte y entrega de los bienes, sin que dicho cambio suponga una variación en plazos ni costos contractuales de ninguna índole.

En caso la Entidad contratante determine que la entrega de los bienes será en recintos de Instituciones Educativas Públicas, se podrá tomar en consideración el formato "Direcciones de Instituciones Educativas" adjunto en el Anexo N° 01. Asimismo, la Entidad contratante deberá realizar mediante correo electrónico, la notificación al Contratista, respecto de cualquier cambio sobre la asignación de los códigos modulares para la Institución Educativa, sin que dicho cambio suponga el incremento de costos o de tiempo de entrega, todo ello, antes de la elaboración de los Documentos que Acrediten la Entrega de los Bienes.

2.2.3. Etapas de la ejecución contractual

La ejecución se dará en 03 etapas:

1. Etapa de fabricación y embalaje de bienes
2. Etapa de control de calidad
3. Etapa de transporte y entrega de bienes

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.L.
COLEGIO N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PAMPAHUASI, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

 Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ETAPAS DE EJECUCIÓN		
N°	ETAPA	DESCRIPCIÓN
1)	Fabricación y embalaje de los bienes	El Contratista deberá llevar a cabo la fabricación de los bienes según lo establecido en la Sección Técnica de la presente ficha y sus respectivos anexos; y los numerales 2.2.6.1. Fabricación y 2.2.6.2. Embalaje.
2)	Control de Calidad	El contratista deberá llevar a cabo el control de calidad de los bienes, según lo establecido en el numeral 2.2.7.
3)	Transporte y entrega de los bienes	El Contratista deberá transportar y entregar la totalidad de los bienes, según lo establecido en los numerales 2.2.8.1. Transporte y 2.2.8.2. Entrega.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.L.
COLEGIO N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PAMPAHUASI, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

 Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI YANOC Tiberio Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 09:29:21 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 14:28:51 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florinda Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 14:31:03 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 14:31:03 -05:00

Consideraciones:

A partir de la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de los bienes, se ingresa a la etapa de control de calidad, dentro de dicho periodo se realizarán las siguientes actividades:

- Verificación Cuantitativa, a partir del día siguiente hábil del ingreso de la "Solicitud de verificación de cantidad por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes" (véase numeral 2.2.7.2)
- Verificación Técnica (véase numeral 2.2.7.3.), a partir del día hábil siguiente de emitido el Informe de Verificación Cuantitativa, contará con las siguientes subetapas:
 - Toma de muestras por parte del Organismo de Evaluación de la Conformidad (véase numeral 2.2.7.1.), a partir del día siguiente hábil de emitido el Informe de Verificación Cuantitativa.
 - Aplicación de métodos de ensayos de los bienes a cargo del Organismo de Evaluación de la Conformidad, a partir del día siguiente hábil de la suscripción del Acta de Toma de Muestras.
 - El Área Usuaria realizará las Inspecciones Técnicas a los bienes, las cuales físicamente se ejecutarán dentro del plazo máximo programado para la aplicación de métodos de ensayos antes mencionados.
- Verificación de la documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes, a partir del día siguiente hábil del ingreso de dicha documentación al Área Usuaria (véase numeral 2.2.7.4).
- Elaboración y notificación de los documentos que acredite entrega de los bienes, a partir del día siguiente hábil de realizada la notificación indicando la aprobación al sustento de las condiciones mínimas para el transporte de los bienes. Finaliza con la entrega de los documentos que acredite entrega de los bienes y la suscripción del Acta de Recepción Documentaria, entre la Entidad Contratante y el Contratista (véase numeral 2.2.8).

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Richard Wiver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CNP: 98718

2.2.4. Plazos de ejecución

El plazo de ejecución por cada etapa será determinado por la Entidad contratante de acuerdo con la cantidad de bienes a adquirir, la ubicación y accesibilidad al (a los) lugar(es) de destino, y cualquier otra consideración propia del requerimiento específico de la Entidad.

Considerar la información contenida en el siguiente cuadro, de forma referencial, para los plazos de la ejecución contractual.

PLAZO DE EJECUCIÓN (días calendario)				
Cantidad de bienes a adquirir (Und.)	Etapas de fabricación y embalaje (días)	Etapas de control de calidad (días)	Etapas de transporte y entrega (días)	Plazo total de ejecución (días)
1-1,000	10-80	70-75	5-10	85-165
1,000-5,000	40-100	75-80	10-30	125-210
5,000 – 10,000	60-130	75-80	30-50	165-260
10,000 – más	Más de 130	Más de 80	Más de 50	Más de 260

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Lelliao
Residente de Obra
Cip: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Eliza FAU 00614347221 soft
Motivo: Day V^{ta} B^a
Fecha: 10.03.2023 14:29:09 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA OLIVERA Fabrice Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V^{ta} B^a
Fecha: 10.03.2023 14:31:15 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN María Lupe FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V^{ta} B^a
Fecha: 10.03.2023 11:00:48 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V^{ta} B^a
Fecha: 10.03.2023 09:29:29 -05:00

En el siguiente cuadro se detalla el inicio y fin de los plazos respectivos por cada etapa:

PLAZO DE EJECUCIÓN			
N°	ETAPA	PLAZO	
1)	Fabricación y embalaje de los bienes	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día siguiente de suscrito el contrato. (véase numeral 2.2.5.1 Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de fabricación y embalaje, por parte del contratista, se tomará en cuenta el día del ingreso de la Solicitud de verificación de cantidad. (véase numeral 2.2.6.1 Fabricación)
2)	Control de Calidad	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día siguiente del ingreso de la "Solicitud de verificación de cantidad por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes" (véase numeral 2.2.7.2)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de control de calidad, por parte del contratista, se tomará en cuenta la entrega de los Documentos que acrediten la entrega de bienes y la suscripción del ACTA DE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA, entre el Área usuaria y el CONTRATISTA. (véase numeral 2.2.8.2)
3)	Transporte y entrega de los bienes	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día calendario siguiente de suscrita el Acta de Recepción Documentaria, referida a las "Actas de Entrega de Bienes" entregadas por la Entidad al Contratista. (véase numeral 2.2.8.1 Transporte)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de transporte y entrega, por parte del contratista, deberá ingresar una carta en la cual deberá comunicar el término del Transporte y Entrega de los bienes, y se tomará en cuenta la fecha máxima de recepción consignada en los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes. (véase numeral 2.2.8.2 Entrega)
Nota 04: La propuesta del Contratista deberá considerar las previsiones necesarias para realizar la entrega en las instituciones beneficiadas, según las condiciones climáticas imperantes en la zona.			

2.2.5. Consideraciones generales

2.2.5.1. Requisitos a presentar para la suscripción del contrato

Para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar los siguientes documentos:

Documentación a presentar:

- Cronograma de ejecución del contrato.
- Detalle de los precios unitarios del precio ofertado.
- Presentación de talleres de producción y almacenes.
- Presentación de responsable general de operaciones.
- Declaración Jurada de Almacenaje de los Bienes.
- Plan Covid-19

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEGIO VOTADORS, STAL N° 12 COMITÉ DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEGIO VOTADORS, STAL N° 12 COMITÉ DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Celis
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Cayo FAU.
20614347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 09:31:25 -05:00

En el siguiente cuadro se detallan los documentos antes mencionados:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 14:00:00 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA GUINIANA Florencia Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 14:32:21 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FAREAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 09:31:25 -05:00

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		
#	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
a)	Cronograma de ejecución del contrato	<p>Deberá incluir fechas y plazos programados para todas las etapas del contrato establecidos en el numeral 2.2.4. PLAZOS DE EJECUCIÓN.</p> <p>El Contratista deberá presentar un Cronograma Ganntt en archivo nativo (formato editable) en programa MS Project, MS Excel o similar. Para ello, deberá ceñirse a los FORMATO N° 01 y FORMATO N° 02, adjuntos en el Anexo N° 05.</p>
b)	Detalle de los precios unitarios del precio ofertado	<p>El cuadro de "Detalle de los precios unitarios del precio ofertado" deberá ser desagregado por Institución de destino, y deberá detallar los costos de adquisición y entrega según la región donde se ubiquen las Instituciones de destino.</p> <p>Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N°03, adjunto en el Anexo N° 05.</p>
c)	Presentación de las ubicaciones de los talleres de producción y almacenes	<p>Se deberá presentar la(s) dirección(es) de su(s) instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes (máximo 04 instalaciones de almacenamiento y/o talleres de fabricación) y los datos del personal técnico de contacto.</p> <p>Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N° 04, adjunto en el Anexo N°05.</p>
d)	Presentación de responsable general de operaciones	<p>Se deberá presentar un formato donde se deberá designar un responsable, el que deberá contar con capacidad de decisión frente a cualquier contingencia que se presente y quien será la persona autorizada para coordinar directamente con la Entidad contrante aspectos relacionados con las prestaciones.</p> <p>Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N° 05, adjunto en el Anexo N° 05.</p>
e)	Declaración Jurada de Almacenaje de los Bienes	<p>El postor ganador deberá remitir una Declaración Jurada donde se compromete a realizar el almacenaje de los bienes en ambientes techados, sin goteras, sin filtraciones, a fin de garantizar la calidad e integridad de los bienes fabricados y/o almacenados.</p> <p>En caso de incumplimiento se aplicarán las penalidades estipuladas en el numeral 2.2.11.2. OTRAS PENALIDADES.</p>
<p>Consideraciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos los documentos indicados en el presente numeral deberán ser presentados de forma digital e impresa, con la firma del representante legal, en idioma castellano. - Toda la documentación a ser entregada por el Contratista se remitirá por Mesa de Partes de la Entidad contratante y/o el canal determinado por dicha Entidad. - La Entidad contratante se encargará de revisar el "Cronograma de ejecución del contrato" y el "Detalle de los precios unitarios del precio ofertado" de la propuesta económica, para garantizar que se cumpla con el plazo de ejecución establecido. Luego de la revisión se emitirá la conformidad respectiva o se plantearán las observaciones que deben ser subsanadas por el postor dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. - La presentación del cronograma no significa que existirá una variación del plazo de ejecución contractual con el que cuenta el Contratista para la ejecución de sus prestaciones, los cuales se indicarán según lo estipulado en el numeral 2.2.3. PLAZOS DE EJECUCIÓN. 		

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
 SECCION DE INGENIERIA DE OBRAS
 Ing. Richard Wilver Cancho Vergas
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
 SECCION DE INGENIERIA DE OBRAS
 Ing. Luis Escobar
 Residente de Obra
 CIP: 21151

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANCC Tiberio Cayo FAU
 20614347221 soft
 Motivo: Day 1° B°
 Fecha: 16.03.2023 09:31:32 -0500

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
 20614347221 soft
 Motivo: Day 1° B°

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA GUINIANA Florencio Antonio FAU 20614347221 soft
 Motivo: Day 1° B°

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU 20614347221 soft
 Motivo: Day 1° B°

2.2.5.2. Entrega de adelanto

La Entidad contratante determina si se otorga adelanto de pago al contratista. De ser el caso, el contratista podrá solicitar dentro del plazo establecido por la Entidad contratante la entrega del adelanto del 30% del monto del contrato, a partir del día siguiente de suscrito el Contrato, según lo dispuesto en el Artículo N° 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Entidad contratante establecerá el plazo de entrega del adelanto a favor del Contratista.

El pago del adelanto se hará en la moneda establecida por la Entidad contratante.

2.2.5.3 Sobre las comunicaciones electrónicas emitidas por la Entidad

El Área Usuaria de cada Entidad contratante determinará el correo electrónico a través del cual se realizarán todas las comunicaciones que emita durante la ejecución del contrato, lo cual será comunicado después de su suscripción.

En el caso que el Área Usuaria realice alguna modificación (ya sea un cambio y/o la adición de una nueva dirección electrónica para la comunicación) a la presente dirección, esta será notificada al Contratista vía correo electrónico durante la ejecución contractual.

La Entidad comunicará a la(s) Institución(es) de destino el contenido de las bases del presente procedimiento de selección con la finalidad que se tome conocimiento de la documentación y procedimientos que se seguirán en la entrega de los bienes.

2.2.6. Etapa de fabricación y embalaje de bienes

El Contratista deberá llevar a cabo la fabricación y embalaje de los bienes según lo establecido en las presentes especificaciones técnicas y sus respectivos anexos.

El Contratista deberá presentar a través de una comunicación por Mesa de Partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, su Solicitud de Calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad adjuntando la información sustentatoria respecto a los Requisitos Mínimos para la selección de los Organismos de Evaluación de la Conformidad, dentro de los 10 días calendario contabilizados a partir del día calendario siguiente de suscrito el contrato, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.3.

Las muestras fabricadas por el Contratista no están incluidas en las cantidades propuestas a ser entregadas en las Instituciones beneficiadas; sin embargo, las muestras sí se contabilizan para la Verificación Cuantitativa.

A partir de la fecha de ingreso de la carta del Contratista donde comunica la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de los bienes, se llevará a cabo el proceso de control de calidad

2.2.6.1. Finalización de la etapa de fabricación

El Contratista deberá ingresar, a través de Mesa de Partes, una carta dirigida a la Entidad, con copia al Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, su Solicitud de Calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad, en la cual deberá comunicar la culminación de la fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes.

La carta deberá contener la siguiente documentación:

- Solicitud de verificación de cantidades por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes.
- Documentación sobre la Procedencia de la Madera indicado en el numeral 2.2.1. PROCEDENCIA DE LA MADERA.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procederá a aplicar la(s) penalidad(es) correspondiente(s), según lo establecido en el numeral 2.2.11. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ASESORIA
Ing. Richard Wilver Carcho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 38718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ASESORIA
Ing. Luis José Bello
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 24154

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANGC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 18.02.2023 09:32:32 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 10.03.2023 14:28:55 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 13.03.2023 14:33:28 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 11:01:05 -05:00

2.2.6.2. Proceso de embalaje

Los bienes deben de estar embalados en su totalidad, de forma que no se dañen o deterioren durante el transporte y almacenamiento hasta el destino final, tomando en cuenta para la envoltura y embalaje, lo indicado en el numeral 2.1.3 Embalaje.

2.2.6.3. Inspecciones inopinadas

La Entidad podrá realizar inspecciones inopinadas a las instalaciones de la fábrica y/o almacenes para verificar o supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, procesos productivos, en aras de velar por el cumplimiento de los plazos de ejecución de la etapa de Fabricación y Embalaje, sin que ello perjudique el desarrollo del proceso de adquisición.

En las Inspecciones Inopinadas realizadas durante el proceso de fabricación de los bienes, la Entidad podrá tomar muestras de los bienes que se encuentren terminados hasta ese momento para analizarlos con equipos de medición para determinar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Los análisis de las muestras obtenidas dentro del plazo de adquisición no representan una paralización en los tiempos de ejecución contractual de los bienes contratados.

Asimismo, la Entidad verificará los procesos de fabricación y el apilado, tanto de la materia prima como de los bienes conforme al avance hasta el momento de realizada la inspección inopinada.

Al finalizar las Inspecciones Inopinadas, se deberá suscribir el Acta de visita inopinada, por el representante del Contratista y la Entidad.

Las inspecciones inopinadas serán programadas dentro del horario establecido por Entidad.

El formato referencial del Acta de Visita Inopinada se encuentra en el Anexo N° 06.

2.2.7. Control de calidad

Durante el periodo del proceso de control de calidad se realizarán actividades para la emisión de la conformidad de la etapa de fabricación, y posteriormente, el informe de cumplimiento de especificaciones técnicas a verificación de la documentación referida al sustento de las condiciones mínimas previo al inicio de la etapa de transporte.

El control de calidad inicia con la Verificación Cuantitativa y culmina con la emisión del Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

El control de calidad involucra la participación del Contratista, la Entidad, el Área Usaria, el Área designada para el conteo de bienes y el Organismo de Evaluación de la Conformidad en las siguientes actividades:

- Verificación Cuantitativa por parte del Área designada por la Entidad.
- Verificación Técnica: Elección del organismo de evaluación de la conformidad, Toma de Muestras y aplicación de los métodos de ensayos por el Organismo de Evaluación de la Conformidad, y las Inspecciones Técnicas por la Entidad.

Los empaques de los bienes y los costos que se generen producto de la Verificación Cuantitativa y de la Verificación Técnica serán realizados y asumidos por el Contratista.

Posteriormente se procede a la verificación de la documentación referida al sustento de las condiciones mínimas para el transporte presentado por el contratista, previo al inicio de la etapa de transporte. Presentación de la documentación referida al Transporte de Bienes por parte del Contratista.

2.2.7.1. Sobre la solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad

El Contratista deberá ingresar la "Solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad", consignando mínimo de 02 y un máximo 03 propuestas, las cuales serán calificadas por el Área Usaria, Área de logística, Organo Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, con la finalidad de que cumplan con los requisitos mínimos para realizar la Verificación Técnica a través de métodos de ensayo (según lo especificado en el Anexo N° 02). El Organismo de Evaluación de la Conformidad deberá cumplir con los siguientes Requisitos Mínimos:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Versión: 02

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO, Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 08:32:46 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA, Quintana Florencia Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 08:32:46 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARRAN, Maria Lupe FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 08:32:46 -05

Página 15 de 55.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO DEL SECTOR EDUCATIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN
Ing. Richard Wilver Lancha Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO DEL SECTOR EDUCATIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN
Ing. Luis Escobar Bellón
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLINO, Tiberio Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 08:32:46 -05

1. Deberá acreditar experiencia específica en la realización de los métodos de ensayos descritos en el ANEXO 02. Dicha experiencia deberá ser acreditada mediante copia simple de contratos u órdenes de servicio, con una antigüedad no mayor de 5 años, y su respectiva conformidad o constancia de prestación efectuada; y/o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite fehacientemente con voucher de depósito y/o reporte de estado de cuenta o cancelación en el documento; y/o otros documentos que acrediten fehacientemente la elaboración del informe.
2. La propuesta sobre el plazo de ejecución del servicio no deberá superar los 40 días calendarios como máximo.

El Contratista deberá presentar a través de una comunicación por Mesa de Partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, su Solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad adjuntando la información sustentatoria respecto a los Requisitos Mínimos para la selección de los Organismos de Evaluación de Conformidad, dentro de los 10 días calendario contabilizados a partir del día calendario siguiente de suscrito el contrato.

El Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, notificará al Contratista respecto a la calificación de las propuestas del Organismo de Evaluación de la Conformidad, dentro de los 05 días hábiles siguientes a la recepción de dichas propuestas.

De existir observaciones a las propuestas para la calificación, el Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, notificará de manera electrónica al Contratista sobre las mismas, indicándole un plazo de subsanación de 02 a 08 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente calendario de la mencionada notificación hasta el ingreso de la subsanación correspondiente, por Mesa de partes de la Entidad.

Dentro del plazo establecido para levantar las observaciones, el contratista deberá entregar una carta por mesa de partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, adjuntando la documentación completa y necesaria para dichos fines.

De no encontrarse observaciones, o encontrarse las mismas subsanadas, el Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, notificará electrónicamente al Contratista que cuenta con la aprobación de la documentación requerida sustentatoria para su elección del Organismo de Evaluación de la Conformidad y adjuntará la calificación de las propuestas presentadas con la finalidad de que el contratista pueda elegir al Organismo de Evaluación de la Conformidad.

2.2.7.2. Verificación cuantitativa

Una vez que el Contratista ingresa su carta de culminación de la fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes, la Entidad contratante designará al Área encargada de realizar la verificación cuantitativa, en presencia de un especialista del Área Usuaria.

El Área designada por la Entidad, procederá con la verificación de las cantidades de los bienes en su totalidad (por unidad de bien, no piezas). Cabe señalar, que los bienes deben estar empaquetados y embalados en el momento de la verificación, según lo establecido en el numeral 2.2.6.2. Embalaje.

La Verificación Cuantitativa deberá efectuarse en el(los) almacén(es) consignado(s) por el Contratista, en el plazo establecido por la Entidad, para lo cual la Entidad programará la fecha y hora, previa comunicación con el Contratista.

De no contar con el 100% de los bienes fabricados y embalados, incluyendo la totalidad de las muestras, se considerará como incumplimiento por parte del Contratista, no representa una observación y la Entidad procederá a aplicar las penalidades que corresponda de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se tendrá que reiniciar la verificación cuantitativa una vez que el Contratista lo solicite nuevamente al ingresar una segunda carta de Solicitud de Verificación de cantidad por la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes, por

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Ing. Richard Wiver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Ing. Luis Escobar Bellio
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por RDBU
YANOC Tbarco Cayo FAU
20514347221 soh
Motivo: Day V° B°
Fecha: 19.03.2023 09:33:59 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soh
Motivo: Day V° B°
Fecha: 19.03.2023 14:01:47 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTERO Florencia
Antonio FAU 20514347221 soh
Motivo: Day V° B°
Fecha: 19.03.2023 14:02:07 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soh
Motivo: Day V° B°
Fecha: 19.03.2023 14:01:59 -05

Mesa de Partes de la Entidad, con copia al Área Usuaría, para proceder con la Verificación Cuantitativa según lo anteriormente descrito. (Véase Nota 05)

Al término de la verificación cuantitativa, se deberá suscribir el Acta de Verificación Cuantitativa de bienes por ambas partes (Contratista y representantes de la Entidad), en la que se consignará el cumplimiento de la obligación del Contratista.

La verificación cuantitativa finaliza con la emisión del "Informe de Verificación Cuantitativa" de parte del Área designada, donde se comunicará al Área Usuaría, el resultado del trabajo de verificación cuantitativa, en el cual se deberá adjuntar el Acta de Verificación Cuantitativa.

El formato referencial para el Acta de Verificación Cuantitativa se encuentra en el Anexo N° 06.

Nota 05: El proceso de control de calidad inicia a partir del ingreso de la "Solicitud de verificación de cantidad por la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes" por parte del Contratista, vía Mesa de Partes de la Entidad contratante.

2.2.7.3. Verificación técnica

Después de emitido el "Informe de Verificación Cuantitativa", la Entidad y un Organismo de Evaluación de la Conformidad realizarán la Verificación Técnica.

La Verificación Técnica inicia con la toma de muestras de los bienes fabricados, continúa con la aplicación de métodos de ensayos a las muestras, así como con las Inspecciones técnicas por parte del Área Usuaría y culmina con la emisión del "Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" del Área Usuaría.

La calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad será realizada por el Área Usuaría, remitiendo el resultado de la calificación de las propuestas al contratista, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.1.

La elección del Organismo de Evaluación de la Conformidad será realizada por el contratista, tomando en cuenta la calificación realizada por el Área Usuaría de la Entidad contratante.

Los costos de las pruebas y/o aplicación de métodos de ensayos para las muestras, así como los gastos generados para la presencia del personal de laboratorio y la toma de muestras por la contratación del Organismo de Evaluación de la Conformidad deberán ser asumidos por el Contratista, incluyendo volver a aplicar los métodos de ensayos en caso los bienes se encuentren observados.

2.2.7.3.1. Sobre las muestras y la aplicación de métodos de ensayo.

El contratista debe proveer las muestras para cada tipo de bien según corresponda, de acuerdo con lo señalado en el Anexo N°02.

Se precisa que el Organismo de Evaluación de la Conformidad realizará la aplicación de métodos de ensayos y pruebas a las muestras tomadas de los bienes según lo estipulado en el Anexo N° 02.

El número de muestras para los ensayos y/o pruebas para la certificación serán fabricadas por el Contratista, de acuerdo con la NTP 260.014.2021. Las muestras fabricadas por el contratista no están incluidas en las cantidades propuestas a ser entregadas en las Instituciones de destino; sin embargo, las muestras sí se contabilizan para la Verificación Cuantitativa según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2.

2.2.7.3.2. Toma de muestras.

A partir del día siguiente hábil de recibido el Informe de Verificación Cuantitativa en el Área Usuaría, indicando la conformidad de la misma, el Área Usuaría y el Contratista coordinarán la fecha para la Toma de Muestras.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 30716

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Ing. Luis Esquivel
Residente de Obra
CIP: 24354

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 09:34:03 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elías FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 14:20:26 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florindo
Antonio FAU 20514347221.pdf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 14:34:22 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Blanca Lupe FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 11:04:23 -05:00

La toma de muestras para la aplicación de métodos de ensayos se deberá realizar en uno de los almacenes del Contratista en presencia de un representante de la Entidad. La(s) dirección(es) del (de los) almacén(es) debe coincidir con la información presentada para la suscripción del contrato o, de corresponder, con la información modificada mediante el procedimiento establecido en el numeral 2.2.5.1. Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato.

Se precisa que las muestras se toman bajo el nivel de inspección S1 de la NTP 260.014.2021 vigente.

El Organismo de Evaluación de la Conformidad tomará la cantidad de muestras del tipo de mobiliario, realizando una selección de manera aleatoria, en presencia de un representante del Contratista y del Área Usuaria, procediendo a llevarlos a sus instalaciones para la evaluación y/o procedimientos correspondientes, según lo estipulado en la NTP 260.014.2021. En este momento se suscribirá el Acta de Toma de Muestras entre la Entidad, el Contratista y el Organismo de Evaluación de la Conformidad.

Es de responsabilidad del Contratista programar la fecha de toma de muestras para la aplicación de métodos de ensayos y cumplir con entregar la documentación requerida en los plazos establecidos.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procederá a aplicar la(s) penalidad(es) correspondiente, según lo establecido en el numeral 2.2.11. Incumplimiento de Contrato y Penalidades.

El formato referencial del Acta de Toma de Muestras se encuentra en el Anexo N° 06.

2.2.7.3.3. Métodos de ensayo

El Contratista deberá entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, el "Informe de ensayos" en el plazo establecido por la Entidad, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del "Acta de Toma de Muestras", según lo estipulado en el Anexo N° 02.

El "Informe de ensayos" deberá incluir los Informes técnicos de las pruebas y/o métodos de ensayos realizados a las muestras, los cuales serán acreditados por el Organismo de Evaluación de la Conformidad seleccionado por la Entidad, según lo establecido en el numeral 2.2.6.1.

El Área Usuaria revisará el "Informe de Ensayos" en un plazo de 3 a 7 días calendario.

De encontrarse alguna(s) observación(es) en el informe de ensayos elaborado por el Organismo de Evaluación de la Conformidad, será(n) consignada(s) en el Informe de Especialista según lo descrito en el numeral 2.2.7.3.4. y se le otorgará un plazo definido el Entidad contratante de acuerdo a la complejidad de la observación, para el levantamiento de las observaciones correspondientes.

El Contratista deberá ingresar una carta por Mesa de Partes de la Entidad y dirigida al Área Usuaria, dentro del plazo que se le otorgue, donde comunicará el levantamiento de observaciones, a fin de proceder con la verificación correspondiente. En caso el contratista incumpla con la presentación de levantamiento de observaciones en el plazo establecido, la Entidad procederá a aplicar la(s) penalidad(es) correspondiente(s), según lo establecido en el numeral 2.2.11.2 OTRAS PENALIDADES.

Comunicada la subsanación, la Entidad procederá a realizar la verificación del Levantamiento de Observaciones en presencia del Organismo de Evaluación de la Conformidad, a fin de que se proceda con la nueva Toma de Muestras del lote observado (en caso las observaciones contemplen de nuevo la aplicación de métodos de ensayos); y en caso las observaciones no requieran de realizar nuevamente ensayos al lote a través de muestreo, el especialista de la Entidad podrá realizar la verificación correspondiente.

El Contratista deberá contar con la totalidad del lote y adicionalmente el total de las muestras para subsanación de observaciones, de lo contrario se considerará como

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE INGENIERÍA DE CONFORMIDAD
CALLE SAN MARTÍN 100, PUNTO DE LA LUNA, LA LINDA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CIP: 98718

Ing. Richard Wiver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE INGENIERÍA DE CONFORMIDAD
CALLE SAN MARTÍN 100, PUNTO DE LA LUNA, LA LINDA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CIP: 211541

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



incumplimiento en el levantamiento de observaciones, pudiendo la Entidad aplicar las penalidades y/o acciones correspondientes según el numeral 2.2.11. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

Si pese al plazo de subsanación otorgado, el Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato total o parcialmente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades en las que hubiera incurrido.

Si los bienes manifiestamente no cumplen con las características y condiciones ofrecidas, la Entidad no efectuará la recepción de los mismos, debiendo considerarse como no ejecutada la etapa, aplicándose las penalidades que correspondan de acuerdo a Ley.

2.2.7.3.4. Inspecciones técnicas

El Área Usuaria podrá realizar inspecciones técnicas a los bienes en paralelo a la aplicación de métodos de ensayos realizados por el Organismo de Evaluación de la Conformidad durante el periodo de Verificación Técnica, donde el Contratista y la Entidad suscribirán el(las) Acta(s) de Verificación Técnica.

De encontrarse alguna observación en la(s) inspección(es) técnica(s) realizadas por el Área Usuaria, serán consignadas en un Informe de Especialista, y de corresponder, complementarán a las observaciones realizadas por el Organismo de Evaluación de la Conformidad. Estas observaciones serán notificadas al Contratista mediante un documento elaborado por el Área Usuaria, donde se detallen las observaciones realizadas por el Organismo de Evaluación de la Conformidad y las observaciones realizadas por el Especialista de la Entidad.

El Contratista deberá absolver las observaciones en un plazo no menor de 02 días ni mayor de 08 días calendario, contados a partir del día siguiente de realizada la notificación presencial y/o electrónica, para lo cual deberá ingresar una carta por Mesa de Partes de la Entidad y dirigida al Área Usuaria, donde comunicará el levantamiento de observaciones, a fin de que el Área Usuaria proceda a realizar la verificación de la subsanación de observaciones, dejando constancia de ello mediante la suscripción del Acta de Verificación Técnica por parte del Contratista y la Entidad.

La Entidad puede complementar las Acta(s) de Verificación Técnica con registro de evidencias filmicas y/o fotográficas de la situación encontrada en la(s) revisión(es) técnica(s).

De no encontrarse observación o de encontrarse las mismas subsanadas, el Área Usuaria elaborará el Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de la etapa de Fabricación y Embalaje.

Los formatos referenciales del Acta de Verificación Técnica y del Acta de Verificación de Levantamiento de Observaciones se encuentran en el Anexo N° 06.

2.2.7.4. Documentación para el transporte de los bienes

A fin de garantizar que el transporte de los bienes se mantenga dentro de los niveles de calidad y seguridad, el Contratista deberá presentar al Área Usuaria, a través de Mesa de Partes de la Entidad, los documentos sobre el transporte de los bienes, en el plazo establecido por la Entidad, contabilizado a partir del día siguiente de la notificación por correo electrónico realizada por el Área Usuaria.

De no presentar la documentación completa y en el plazo estipulado por la Entidad, el Contratista será penalizado de acuerdo con el numeral 2.2.11.2. OTRAS PENALIDADES.

El Área Usuaria deberá revisar y verificar que el Contratista cumpla con las condiciones mínimas antes del inicio de la etapa de Transporte y Entrega de los bienes hasta los lugares de destino.

De existir observaciones, el Área Usuaria podrá notificar de manera electrónica al Contratista sobre las mismas, indicándole un plazo de subsanación de 02 a 08 días

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL MPPE, SECTORAL EN LA
CALLE 200 M. TUBOS ESTABILIZADORES DE CALIDAD DE 750M TONN. OTB
DE CORA CORA PROVINCIA DE Tarma, Tarma, Tarma

Ing. Richard Wiver Lancha Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
RECTORADO DEL AYACUCHO
CALLE 200 M. TUBOS ESTABILIZADORES DE CALIDAD DE 750M TONN. OTB
DE CORA CORA PROVINCIA DE Tarma, Tarma, Tarma

Ing. Luis Escobar Edilgo
Residente de Obra
CIP: 211541



calendario, contabilizados a partir del día siguiente calendario de la mencionada notificación.

Para la subsanación de las observaciones, el Contratista deberá ingresar una carta por Mesa de Partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, adjuntando la documentación completa y necesaria para dichos fines. La fecha de ingreso de la carta por Mesa de Partes se contabilizará como fecha fin del plazo para la subsanación de observaciones.

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el Área Usuaria notificará electrónicamente al Contratista indicándole que cuenta con la aprobación de la Documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes, sin perjuicio de las condiciones operativas y/o de vigencia documentaria que se deben mantener para la totalidad de la documentación solicitada.

La documentación requerida se detalla a continuación:

Documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes	
N°	Documentación Requerida
1	<p>Póliza de Seguro de transporte terrestre nacional</p> <p>El transporte de los bienes deberá contar con la póliza de seguro a nivel nacional.</p> <p>VALOR MÍNIMO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL será el 100% del valor del monto adjudicado.</p> <p>Adicionalmente la póliza deberá hacer referencia al procedimiento de selección y/o al número de contrato, pudiendo realizarse mediante un anexo a la póliza o cualquier documento adicional emitido por la aseguradora.</p> <p>Todo esto por la reposición de los bienes transportados en caso de siniestro, esta póliza deberá ser efectiva antes del inicio de la etapa de transporte y entrega de los bienes.</p>
2	<p>SCTR</p> <p>SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para el personal del contratista asignado para la realización del servicio de transporte y entrega de los bienes.</p>
3	<p>Flota de Vehículos</p> <p>Relación completa de los vehículos a utilizar especificando como mínimo: modelo, placa, tarjeta de propiedad, tarjeta de Habilitación vehicular para el transporte de mercancías, tipo de vehículo, capacidad máxima de carga de vehículo expresado en kilogramos y en pesos cúbicos, copia simple de la Tarjeta de Propiedad, SOAT vigente de cada una de las unidades, REVISIÓN TÉCNICA vehicular aprobada y vigente de acuerdo con ley.</p> <p>La antigüedad máxima de los vehículos será de 10 años, contabilizados a partir del año siguiente de fabricación de estos.</p>
4	<p>Autorización para prestar Servicio de Transporte de Mercancías en General:</p> <p>Otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (acreditado mediante copia simple y/o copia simple de la página web del MTC donde figure la inscripción en el citado registro); asimismo cabe precisar que, respecto al Transporte de los bienes, este deberá cumplir con ser un vehículo cerrado a fin de garantizar la seguridad e integridad de los bienes y su distribución vía terrestre.</p> <p>En caso el contratista opte por subcontratar el servicio de transporte, deberá presentar la autorización de la empresa subcontratada.</p> <p>En caso de uso de otras vías de transporte (fluvial, marítima, etc.), el contratista deberá agregar propuesta de la ruta y tipos de vehículos a utilizar, adjuntando imagen referencial de vehículos.</p>

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por ROBLES,
ALDO TILIANO Cayo FAU
514347221 sop
alivir: Day V° B°
fecha: 16.02.2023 09:34:37 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por CASTILLO,
JEAN LUIS LUPE FAU
514347221 sop
alivir: Day V° B°
fecha: 15.03.2023 11:51:48 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por
JERRERO GONZALEZ ELIAS FAU
514347221 sop
alivir: Day V° B°
fecha: 13.03.2023 14:46:37 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por BRAYO
JERRERO GONZALEZ ELIAS FAU
514347221 sop
alivir: Day V° B°
fecha: 10.03.2023 14:55:16 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
"SOLANO DE LA ROSA" DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE SAN MARCO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
"SOLANO DE LA ROSA" DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE SAN MARCO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Celis
Reservante de Obra
CIP: 211541



5	<p>Plan COVID-19</p> <p>"Plan para vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" aprobado por el sector competente, debidamente registrado en el Sistema integrado para COVID-19 (SICOVID-19) adjuntando la constancia del sector competente, la constancia del registro en SICOVID-19, el correo de envío al MINSA, según corresponda en el marco de lo establecido por el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM; Decreto Supremo 110-22-PCM; Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA; la Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC/01, modificada por la Resolución Ministerial N° 0301-2020 MTC/01, sus modificatorias y demás normas que emita el sector correspondiente.</p>
---	--

2.2.8. Etapa de transporte y entrega de los bienes

El Área Usuaría realizará la notificación electrónica al Contratista, indicándole la aprobación de la documentación presentada según lo establecido en el numeral 2.2.7.4. Documentación para el Transporte de los bienes.

Con la aprobación de la Documentación para el transporte de los bienes, la entidad elaborará los documentos que acredite la entrega de los bienes, teniendo como plazo de 3 - 15 días calendario, los mismos que serán notificados por correo electrónico al contratista a fin de que se apersona a recogerlos en un plazo no mayor de 3 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de recibida la notificación.

El inicio del plazo de la etapa de transporte y entrega de los bienes a los destinos especificados en el numeral 2.2.1. LUGAR DE ENTREGA, es a partir del día calendario siguiente de la suscripción del Acta de Recepción Documentaria por el Contratista.

Para el cómputo del plazo de la fecha de culminación del transporte y entrega de los bienes, se considera la última fecha que figure en el(los) Documentos que Acredite Entrega de los Bienes de la Entidad, según lo establecido en el numeral 2.2.3. PLAZOS DE EJECUCIÓN.

El formato referencial del Acta de Recepción Documentaria se encuentra en el Anexo N° 06.

2.2.8.1. Transporte

El Contratista deberá realizar el transporte de los bienes a las Instituciones de destino, en cumplimiento con los requisitos solicitados en el numeral 2.2.7.4. Documentos sobre el Transporte de los bienes.

El Área Usuaría, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, realizará la notificación por correo electrónico al Contratista, a fin de que se apersona a recoger el(los) Documentos que Acredite Entrega de los Bienes de la Entidad, en el plazo establecido por la Entidad, caso contrario será penalizado según el numeral 2.2.11.2. Otras penalidades.

Al momento de la entrega del (de los) Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, se suscribirá el Acta de Recepción Documentaria por el Contratista.

En caso el destino de transporte sea una(s) Institución(es) Educativa(s), no se permite que vehículos pesados ingresen a los patios de ésta(s); en caso se evidencie de manera documentada esto, se aplicará lo estipulado en el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

Cada unidad deberá transportar sólo y exclusivamente los bienes objeto de la contratación; en caso se evidencie de manera documentada la ocurrencia del incumplimiento, se aplicará lo estipulado en el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

El transporte debe efectuarse con un vehículo cerrado a fin de garantizar la seguridad e integridad de los bienes, caso contrario se aplicará lo estipulado en el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

Todo vehículo de transporte que salga en ruta deberá acompañar la carga con el(los) Documentos que Acredite Entrega de los Bienes proporcionado(s) por la Entidad y la guía de remisión del transportista. En ambos casos deberá indicar el destino final y el detalle del material transportado en conformidad a las disposiciones legales vigentes.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.L.
COLECCIÓN "ING. STRAL" N° 12 (CÓDIGO DE LA U.L. DE AYACUCHO)
DE CORA CORA - PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 84718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE Bienes
DE CORA CORA

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Cora
CIP: 211541



PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Empleado digitalmente por ROSALES
NOC Tiberio Cayo FAU
114347221 scfi
otipo: Doy V° B°
fecha: 13.03.2023 09:34:47 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Empleado digitalmente por CASTILLO
LEFAN Rana Lupe FAU
0514347221 scfi
otipo: Doy V° B°
fecha: 13.03.2023 11:06:06 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Empleado digitalmente por
ORRILLA QUINTANA Florencio
NOC FAU 20514347221 scfi
otipo: Doy V° B°
fecha: 13.03.2023 14:45:24 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Empleado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
0514347221 scfi
otipo: Doy V° B°
fecha: 13.03.2023 14:35:29 -05:00

Asimismo, durante la etapa de transporte y entrega, deberán contar con unidades de contingencia o transporte alternativo de características similares o superiores a las unidades asignadas para el servicio. En caso se produzca una avería o desperfecto que inhabiliten alguna unidad registrada, se deberá reemplazar la unidad en un lapso no mayor a 48 horas (teniendo en cuenta el personal necesario y equipado para la tarea de transbordo de los materiales).

2.2.8.2. Entrega

Es de responsabilidad del Contratista la carga y descarga de los bienes en el lugar de embarque y destino, al igual que la entrega de los bienes en buen estado de las cantidades descritas en los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, a los destinos establecidos en el numeral 2.2.2. LUGAR DE ENTREGA, así como de la devolución de la documentación sustentadora de recepción, conforme a la cantidad de juegos de Documentos que Acredite Entrega de los Bienes entregados por la Entidad.

Un juego de Documentos que Acredite Entrega de los Bienes original, debidamente firmada en original se debe quedar con la persona firmante como representante de la Institución de destino.

Los bienes serán entregados en perfecto estado de conservación, adecuadamente armados y embalados hasta su destino final, sin ningún defecto de adquisición, ni otro como consecuencia de la estiba o desestiba o del transporte.

La entrega de los bienes a los lugares de destino será sustentada con la presentación de lo siguiente:

- Guía de Remisión del Transportista
- Documentos que Acredite Entrega de los Bienes: PECOSA, Acta de entrega de Bienes, etc
- El (Los) Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, representan la aceptación de los bienes por parte de los representantes de las Instituciones de destino, podrán ser suscritos por las siguientes autoridades:
- Representante designado y autorizado por la Entidad contratante.
- En caso la dotación se realice a una Institución Educativa, podrá suscribir un representante designado y autorizado por la UGEL y/o DRE correspondiente a la jurisprudencia de la Institución Educativa de destino.

La información que debe ser consignada en los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes es la siguiente:

- Firma legible
- Fecha de conformidad de los bienes
- Copia de DNI del firmante, donde se aprecie su firma.

En caso se realice la modificación del lugar de entrega por parte del Área Usaria, entonces el Documentos que Acredite Entrega de los Bienes podrá ser firmada por la dirección de dicha Área.

Los datos de la institución de destino y su personal para la recepción de los bienes y el firmado del Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, serán coordinados directamente por el Contratista.

Finalizada la Entrega de la totalidad de bienes, el Contratista deberá presentar al Área Usaria, por Mesa de Partes de la Entidad, una carta documentada que indique la culminación del transporte y entrega de la totalidad de los bienes en la(las) institución(es) de destino.

La carta deberá contener lo siguiente:

- Los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes originales establecida por la Entidad.
- Guías de remisión del transportista, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2. ENTREGA.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
AROC Tiberio Cayo FAU
5514347221.pdf
Dígitado: Day V° B°
Fecha: 19.03.2023 08:34:55 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
(RPA) María Luce FAU
5514347221.pdf
Dígitado: Day V° B°
Fecha: 19.03.2023 11:08:07 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
PERILLA CUINTANA Florencia
5514347221.pdf
Dígitado: Day V° B°
Fecha: 19.03.2023 14:48:46 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
5514347221.pdf
Dígitado: Day V° B°
Fecha: 19.03.2023 14:36:40 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA UGEL
CALLE 30 W° 12 INC. 5° CAL V° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE ZORA CORA DISTRITO
DE ZORA CORA PROVINCIA DE PUNTAUCOCHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA UGEL
CALLE 30 W° 12 INC. 5° CAL V° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE ZORA CORA DISTRITO
DE ZORA CORA PROVINCIA DE PUNTAUCOCHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Ing. Luis Escobar
Residente de Obra
CIP: 211541

- Copias del DNI del firmante, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2. ENTREGA.
- Certificados de Garantía de Adquisición de los bienes (véase el numeral 2.2.12. GARANTÍA COMERCIAL DE LOS BIENES)
- Informe Fotográfico de Entrega de Bienes donde se adjunten fotografías y/o videos de los bienes siendo entregados en la(s) dirección(es) que figure(n) en el numeral 2.2.2. LUGAR DE ENTREGA. Estas fotografías y/o videos servirán para acreditar la correcta entrega de los bienes, debiendo figurar como mínimo la siguiente información:
 - Fotografía y/o video del vehículo iniciando la descarga de los bienes, en la cual se muestre la placa del vehículo.
 - Fotografía y/o video mostrando las Instalaciones de la Institución de destino. Mínimo 1 fotografía y/o video de 10 segundos aproximados.
 - Fotografía del representante de la Institución de destino, en el momento de la recepción de los bienes. Mínimo 1 fotografía y/o video de 10 segundos aproximados.
 - Fotografías y/o videos mostrando el estado de los bienes, recepcionados mostrando el logotipo y rotulado de los bienes. Mínimo 2 fotografías y/o videos de 10 segundos aproximados.

2.2.8.3. Verificación documentaria

Finalizada la Entrega de la totalidad de bienes, el Contratista deberá presentar al Área Usuaria, por Mesa de Partes de la Entidad, una carta documentada que indique la culminación del transporte y entrega de la totalidad de los bienes en la(las) institución(es) de destino.

La documentación mencionada como parte de la carta de culminación del transporte y entrega de los bienes según lo estipulado en el numeral 2.2.8.2., será parte integral de la Verificación Documentaria que realizará el Área Usuaria.

De encontrarse alguna observación en el marco de la verificación documentaria ésta deberá ser remitida al Contratista de manera electrónica y/o física por el Área Usuaria; otorgando un plazo de entre 02 a 08 días calendario para subsanarlas.

El Contratista deberá remitir al Área Usuaria una carta por Mesa de Partes de la Entidad, indicando el levantamiento de observaciones, adjuntando la subsanación correspondiente.

La fecha de ingreso de dicha comunicación a la Entidad se tomará como fecha de fin de subsanación de las observaciones.

Si pese al plazo otorgado, el Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato total o parcialmente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades a que hubiera incurrido; y en el marco de la ley vigente.

De no encontrarse observación o de encontrarse las mismas subsanadas por el Área encargada de emitir los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, procederá a elaborar el Informe de Cumplimiento Documentario, el cual servirá para la elaboración de la Conformidad de la etapa de Transporte y Entrega de los bienes, la cual estará a cargo del Área Usuaria.

Asimismo, el Área Usuaria notificará de manera presencial y/o electrónica al Contratista para que proceda con el ingreso de la(s) Factura(s) y CCI correspondiente.

2.2.9. Conformidades

2.2.9.1. Conformidad por fabricación y embalaje

Una vez notificado el "Informe de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" por la Entidad, el Contratista deberá entregar los siguientes documentos:

- Factura

Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

firmado digitalmente por ROBLES
MDC Tello Cayo FAU
514347221.pdf
otivo: Day Vº Bº
fecha: 18.03.2023 09:35:03 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

firmado digitalmente por CASTILLO
KIPAN Maria Lupe FAU
514347221.pdf
otivo: Day Vº Bº
fecha: 18.03.2023 11:05:13 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

firmado digitalmente por
RILLALLA QUINTANA Florento
otivo: FAU 20814347021.pdf
otivo: Day Vº Bº
fecha: 19.03.2023 14:45:59 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

firmado digitalmente por BRAVO
JERRERO Gonzalo Eliza FAU
614347221.pdf
otivo: Day Vº Bº
fecha: 10.03.2023 14:35:50 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE MANEJO DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL ALCALDIA
CALLE SAN FRANCISCO 100, CANTON DE AYACUCHO
CAYO, PERU
Ing. Richard Wiver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
RCP: 98716

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE MANEJO DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL ALCALDIA
CALLE SAN FRANCISCO 100, CANTON DE AYACUCHO
CAYO, PERU
Ing. Luis Escobar
Residente de Obra
CIP: 211941

Los documentos necesarios para el pago de la conformidad de la etapa de Fabricación y Embalaje de los bienes son los siguientes:

- Informe de Verificación Cuantitativa (emitido por el Área designada por la Entidad)
- Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (emitido por el Área Usuaría)
- Factura (remitido por el Contratista)
- Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista (remitido por el Contratista).

Una vez que el Área Usuaría tenga la totalidad de los documentos antes señalados, se procederá a otorgar la "Conformidad por fabricación y embalaje de los bienes" por parte de la Entidad.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los 10 días calendario siguiente a la "Conformidad por fabricación y embalaje de los bienes", siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

2.2.9.2. Conformidad por transporte y entrega

Una vez notificado el "Informe de Cumplimiento Documentario" por la Entidad, el Contratista deberá entregar los siguientes documentos:

- Factura
 - Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista
- Los documentos necesarios para el pago de la conformidad de la etapa de Transporte y Entrega de los bienes son los siguientes:
- Informe de Cumplimiento Documentario (emitido por el Área de la Entidad que emita los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes)
 - Acta de Recepción Documentaria (suscrita por el Contratista)
 - Factura (remitido por el Contratista)
 - Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista (remitido por el Contratista)

Una vez ingresado los documentos antes señalados por parte del Contratista y realizada su verificación, se procederá a otorgar la "Conformidad por el transporte y entrega de los bienes" por parte de la Entidad.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los 10 días calendario siguiente a la "Conformidad por el transporte y entrega de los bienes", siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

2.2.10. Forma de pago

La Entidad emitirá los pagos según el siguiente detalle:

I. PAGO POR FABRICACIÓN Y EMBALAJE DE LOS BIENES	
Forma de Pago	Monto de Pago
Para el pago por fabricación y embalaje de los bienes, el Contratista deberá seguir el procedimiento detallado en el numeral 2.2.9.1 Conformidad por Fabricación y Embalaje)	El porcentaje y/o monto del pago será definido por la Entidad.
II. PAGO POR TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIENES	
Forma de Pago	Monto de Pago
Para el pago por transporte y entrega de los bienes, el Contratista deberá seguir el procedimiento detallado en el numeral 2.2.9.2 Conformidad por Transporte y Entrega).	El porcentaje y/o monto del pago será definido por la Entidad.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
DORRILLA QUINTANA Florencia
Identificación: FAU 20514347221 scB
Motivo: Day V B
Fecha: 13.03.2023 14:47:11 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
JERRERO Gonzalo Elias FAU
Identificación: FAU 20514347221 scB
Motivo: Day V B
Fecha: 13.03.2023 14:36:01 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
Identificación: FAU 20514347221 scB
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 11:09:22 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANQUE Tiberto Cayo FAU
Identificación: FAU 20514347221 scB
Motivo: Day V B
Fecha: 16.03.2023 09:35:19 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
COLEGIO VICTORINO SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE BAMBUCAY, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
COLEGIO VICTORINO SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE BAMBUCAY, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



2.2.11. Incumplimiento de contrato y penalidades

2.2.11.1. Penalidades

En caso que el contratista incumpliera de forma injustificada con los plazos descritos en la presente ficha de homologación, será indefectiblemente objeto de las penalidades correspondientes según las Normas Legales vigentes (Artículo N°162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones); por consiguiente, la Entidad cobrará a través de las deducciones correspondientes.

2.2.11.2. Otras Penalidades

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se determinan otras penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente y directamente relacionadas con los Bienes en el ANEXO N° 4.

La aplicación de la penalidad no exceptúa al Contratista de su responsabilidad, sobre los daños a las Instituciones de destino o terceros, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

Nota 06: La Entidad contratante podrá determinar el monto (M) dependiendo de las características del Requerimiento.

2.2.11.3. Resolución de contrato

Será motivo de la Resolución de Contrato: el incumplimiento parcial o total del Contrato, en el marco de la Ley de Contrataciones de Estado.

2.2.12. Garantía comercial de los bienes

CONSIDERACIONES DE LA GARANTIA	
Garantía de los Bienes	05 años
Aplicación de Garantía (Véase Nota 07)	Hasta 15 días calendario como máximo para brindar solución; contabilizado a partir del día calendario siguiente de notificada la solicitud de aplicación de garantías.

Nota 07: La Entidad contratante podrá determinar el tiempo adecuado según el requerimiento.

El Contratista es responsable por la garantía de los bienes. La garantía es por defectos de Fabricación / Adquisición y Embalaje y no por mal uso de los bienes por parte del usuario final.

El plazo de la garantía cuenta a partir del día siguiente calendario de firmado los Documentos que acredite Entrega de los Bienes por Representantes de cada Institución de destino según lo estipulado en el numeral 2.2.8.2. ENTREGA.

La garantía deberá estar acreditada por documentación del Contratista, esta documentación deberá estar firmada por su representante legal, referida a los bienes ofertados y su transporte y entrega realizada.

Se deberá entregar 01 Certificado de Garantía por cada Institución de destino, los mismos que serán remitidos a la Entidad para la elaboración de la conformidad de la prestación, estipulando claramente el inicio del plazo de garantía de los bienes, las descripciones y números de series de los mismos, de corresponder.

El Contratista garantizará la calidad de los bienes fabricados de acuerdo a los planos y demás documentos contractuales según las especificaciones técnicas del bien.

La Entidad notificará al Contratista de cualquier reclamo relacionado con la garantía de manera física y/o mediante correo electrónico, el Contratista al recibir esa notificación deberá tomar las acciones correspondientes para informar y/o reparar y/o reemplazar los bienes y/o componentes y/o instalaciones defectuosas en su totalidad o en parte según sea el caso, en las Instituciones de destino sin costo alguno para éstas, ni para la Entidad.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA URBANA DE CORA CORA PROVINCIA DE Tarma, REGION Tarma
Calle 30 M y 10 N 2, S/NAL 11 12 CRISTO REYES DE LA CALLE DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA PROVINCIA DE Tarma, REGION Tarma



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 211541

Si el Contratista después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del plazo indicado en el cuadro de consideraciones de garantía entonces la Entidad podrá tomar las medidas correctivas que sean necesarias, por su propia cuenta y riesgo y sin perjuicio de los demás derechos que la Entidad tenga ante el Contratista, en conformidad con la legislación vigente.

2.2.13. Responsabilidad por vicios ocultos

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo de 05 años.

Este plazo cuenta a partir del día siguiente de emitida la conformidad de la prestación por parte del área usuaria.

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

3.1 De la selección:

Documentos de presentación obligatoria por el postor:

- Relación de especies de madera a utilizar en el proceso de fabricación del bien especificado en la presente ficha de homologación. Dicha relación se presentará con el formato de Ficha de presentación de producto adjunta en el Anexo N° 07.

IV. ANEXOS

- Anexo N° 01: Formato del Lugar de destino
 - Dirección(es) de Institución(es) Educativa(s) de destino
- Anexo N° 02: Pruebas y/o ensayos para la verificación de calidad
- Anexo N° 03: Planimetría
- Anexo N° 04: Cuadro de Otras penalidades
- Anexo N° 05: Requisitos que presentar para la Suscripción del Contrato
- Anexo N° 06: Actas referenciales para el proceso de ejecución contractual
- Anexo N° 07: Ficha de presentación de producto

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUEPREO Gerardo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:38:27 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antena FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.03.2023 14:47:37 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lugo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 11:05:37 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANCO Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2023 09:36:33 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MONTE SINAL N° 12 COMITÉ REV. DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wliver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MONTE SINAL N° 12 COMITÉ REV. DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Ezequiel Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

ANEXO N° 01

FORMATO PARA INDICAR LUGAR DE DESTINO

- Dirección(es) de Institución(es) Educativa(s) de destino

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.09.2023 14:36:47 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Anterior FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.03.2023 14:47:52 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 11:05:42 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANCO Tibeno Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2023 09:36:11 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDEPENDENCIA N° 12 CAYO YANCO DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE BAMBACAY, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDEPENDENCIA N° 12 CAYO YANCO DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE BAMBACAY, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

DIRECCION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS								
Nº DE ORDEN	CÓDIGO MODULAR	CÓDIGO LOCAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	SUB TOTAL DE BIENES
1.								
2								
TOTAL GENERAL								

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft Motivo: Day V B Fecha: 18.03.2023 14:38:23 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZCERRILLA OLINTANA Flotencia Antonio FAU 00814347221 soft Motivo: Day V B Fecha: 18.03.2023 14:48:08 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU 20514347221 soft Motivo: Day V B Fecha: 18.03.2023 11:05:50 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANCO Tiberio Cayo FAU 22514347221 soft Motivo: Day V B Fecha: 18.03.2023 09:28:18 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO N° 19 INC. S° 12111 DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA - PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO N° 19 INC. S° 12111 DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA - PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

ANEXO N° 02

PRUEBAS Y/O ENSAYOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD

- Normas técnicas para la verificación de mobiliario
- Control de calidad

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day 1° B°
Fecha: 17.03.2023 14:38:54 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221.pdf
Motivo: Day 1° B°
Fecha: 13.03.2023 14:48:29 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day 1° B°
Fecha: 15.03.2023 11:05:55 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
VANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day 1° B°
Fecha: 15.03.2023 09:58:25 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO "EL DIAMANTE" DEL DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE
CORACORA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO "EL DIAMANTE" DEL DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE
CORACORA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

NORMAS TECNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE MOBILIARIO

El mobiliario a fabricar, al igual que la certificación de calidad se ceñirá a las siguientes normas y sus respectivas enmiendas y revisiones con actual vigencia, según corresponda por tipo de bien.

CUADRO N° 01: NORMAS TECNICAS QUE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL MOBILIARIO ESCOLAR	
CÓDIGO	TÍTULO DE LA NORMA
RVM N°019-2023-MINEDU	Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular
NTP 260.008:2019	MOBILIARIO ESCOLAR. Silla para nivel de educación secundaria. Requisitos. 4ª Edición
NTP 260.010:2019	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Clasificación y tipos. 4ª Edición
NTP 260.011:2017	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Definiciones. 3ª Edición
NTP 260.012:2017	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Embalaje. 3ª Edición
NTP 260.013:2017	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Rotulado. 3ª Edición
NTP 260.014:2021	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Muestreo. 4ª Edición
NTP 260.015:2021	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Requisitos. 5ª Edición

CUADRO N° 02: NORMAS TECNICAS QUE ESTABLECEN METODOS DE ENSAYO PARA LOS BIENES Y MATERIALES	
CÓDIGO	TÍTULO
NTP 260.026:2019	MUEBLES. Sillas para instituciones educativas. Requisitos de seguridad y determinación de la estabilidad, la resistencia y la durabilidad. 4ª Edición

GLOSARIO

- Fabricación y embalaje:** corresponde que el bien se encuentre acabado y embalado, preparado para ser utilizado en conformidad de la Entidad.
- Transporte, entrega:** corresponde que el bien sea entregado sin deterioro por el transporte y colocado en el ambiente designado por la autoridad de cada Entidad de destino. Deberá estar conforme con la Entidad.
- Defectos Críticos:** Defectos que imposibilita el uso del producto y/o que puede afectar la seguridad del usuario.
- Defectos Mayores:** Defectos que, sin llegar a ser críticos, en cierto plazo afectan el uso de las unidades.
- Defectos Menores:** Defectos que no afectan el uso de las unidades.
- Inspección por atributos:** Inspección mediante el cual se clasifica una unidad de producto como conforme o no conforme, o se cuenta el número de no conformidades en la unidad de producto, con respecto a un determinado requisito o conjunto de requisitos.
- Límite de Calidad Aceptable (LCA):** Es el nivel máximo permisible de unidades no conformes de la muestra de un lote.
- Lote:** Es el conjunto de muebles de un mismo modelo fabricados en un determinado período, bajo condiciones iguales



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: BPAUO,
QUERPERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 10.03.2023 14:40:04 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ZORRILLA GUINIANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 13.03.2023 14:40:18 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: CASTILLO
FARFAN María Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 11:06:02 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: ROBLES,
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 16.03.2023 09:36:32 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. "COLEGIO N° 12 CRISTÓBAL DE LA GUZMÁN DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
Ing. Wilver Cancho Vargas
Resistente a Obra
CIP: 215541

PLAN DE MUESTREO

Se precisa que las muestras se toman bajo el nivel de inspección S1 de la NTP 260.014.2017 vigente (incluyendo sus últimas revisiones).

CUADRO N°03: TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA MOBILIARIO									
Tamaño del Lote			Niveles de Inspección Especial				Niveles de Inspección General		
			S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2	a	8	A	A	A	A	A	A	B
9	a	15	A	A	A	A	A	B	C
16	a	25	A	A	B	B	B	C	D
26	a	50	A	B	B	C	C	D	E
51	a	90	B	B	C	C	C	E	F
91	a	150	B	B	C	D	D	F	G
151	a	280	B	C	D	E	E	G	H
281	a	500	B	C	D	E	F	H	J
501	a	1200	C	C	E	F	G	J	K
1201	a	3200	C	D	E	G	H	K	L
3201	a	10000	C	D	F	G	J	L	M
10001	a	35000	C	D	F	H	K	M	N
35001	a	150000	D	E	G	J	L	N	P
150061	a	500000	D	E	G	J	M	P	Q
500001	a	más	D	E	H	K	N	Q	R

↓ = Use el primer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el tamaño de la muestra es igual o excede el tamaño del lote lleve a cabo inspección 100%
 ↑ = Use el primer plan de muestreo arriba de la flecha
 Ac = Número de aceptación
 Re = Número de rechazo

En concordancia con las letras código según el tamaño del lote, se utilizará la siguiente tabla para determinar de la muestra y los LCA correspondientes:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUEPREDO Gerardo Elias FAU
20514347221.spl
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 14:41:06 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antón FAU 20514347221.spl
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 14:40:44 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221.spl
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 11:08:08 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANCO Tiberio Cayo FAU
20514347221.spl
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 02:35:48 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO MIXTO "SANTO N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

Lote Código de tamaño de muestra Total de		Límite de calidad aceptable (LCA) en porcentaje de items no conformes o no conformidades por 100 items (inspección normal)																																																						
		0,010		0,015		0,025		0,040		0,065		0,10		0,15		0,25		0,40		0,65		1,0		1,5		2,5		4,0		6,5		10		15		25		40		65		100		150		250		400		650		1000				
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re			
A	2																																																							
B	3																																																							
C	5																																																							
D	8																																																							
E	13																																																							
F	20																																																							
G	32																																																							
H	50																																																							
I	80																																																							
J	125																																																							
K	200																																																							
L	315																																																							
M	500																																																							
N	800																																																							
P	1250																																																							
Q	2000																																																							

- La selección de las muestras del lote, se debe tomar al azar y de manera tal que se obtengan unidades de todas las partes del lote.
- Si el número de unidades de producto no conformes encontrados en la muestra es igual o menor que el número de aceptación, el lote debería ser considerado aceptable. Si el número de unidades del producto no conformes es igual o mayor que el número de rechazo, el lote debería ser considerado no aceptable.
- El nivel de inspección determina la relación que existe entre el tamaño del lote y el tamaño de la muestra.
- La clasificación de Defectos para Mobiliario para Instituciones Educativas es la siguiente:

Defectos Críticos:

Falla de compresión paralela en elementos estructurales
Grano inclinado mayor al tolerado en elementos estructurales
Pudrición
Presencia de Insectos activos
Rotura
Rajaduras
Nudos muertos
Ensamble defectuoso

Defectos Mayores

Falla de compresión paralela en elementos no estructurales
Grano inclinado mayor al tolerado en elementos no estructurales
Perforaciones de insectos inactivos mayores a los permitidos
Grietas
Armado Asimétrico
Mezcla de especies
Juntas desiguales
Alabeos de piezas mayores a los tolerados
Nudos sanos no tolerados
Inestabilidad en un plano

Defectos Menores

Acabado defectuoso
Boleado irregular de aristas

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.03.2023 14:41:16 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: ZORRILLA QUINTANA Pierandrea
Ahorre FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.03.2023 14:49:44 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: CASTILLO FAREAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:06:16 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: ROBLES YANCO Tiberio David FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.03.2023 09:36:55 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO N° 900 "SOL Y ORO" DE LA COMUNA DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE AYACUCHO
DE CORACORA, PROVINCIA DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilber Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO N° 900 "SOL Y ORO" DE LA COMUNA DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE AYACUCHO
DE CORACORA, PROVINCIA DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

RELACION DE ENSAYOS:

DESCRIPCION	NORMA TECNICA PARA ENSAYOS	ENSAYOS
SILLA DE METAL Y MADERA DE 3° - 4° SECUNDARIA	NPT 260.026:2019 MUEBLES. Sillas para instituciones educativas. Requisitos de seguridad y determinación de la estabilidad, la resistencia y la durabilidad. 4ª Edición	ESTABILIDAD FRONTAL
		ESTABILIDAD LATERAL
		ESTABILIDAD TRASERA
		DURABILIDAD EN EL ASIENTO Y RESPALDAR (MAXIMO)
		CARGA ESTATICA POR COMPONENTE - ASIENTO Y RESPALDAR
		IMPACTO SOBRE ASIENTO
		IMPACTO SOBRE ESPALDAR
	Estudio sobre el contenido de humedad equilibrio de la madera en el Perú, elaborado por el CITE MADERA.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE CONTENIDO DE LA HUMEDAD EN LA MADERA DE ACUERDO AL LUGAR DE ENTREGA

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
CDE 14347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 19.03.2023 14:41:31 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Floriano Antonio FAU CDE14347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 19.03.2023 14:50:08 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO PARRA Maria Lupe FAU
CDE14347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 19.03.2023 11:08:22 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANCO Tiberio Cayo FAU
CDE 14347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 19.03.2023 09:57:08 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEGIO WINTU HUIZU DE LA URB. EL CARMEN DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEGIO WINTU HUIZU DE LA URB. EL CARMEN DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE MARISCAL DE LAZAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ANEXO N° 3 PLANIMETRÍA

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 sot
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:41:51 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 sot
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.03.2023 14:50:20 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lope FAU
20514347221 sot
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 11:06:28 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
TANCO Tiberio Cayo FAU
20514347221 sot
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2023 08:27:05 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE MARISCAL DE LAZAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PLANTA 1
ESCALA 1/8


CORTE A
ESCALA 1/8

PLANTA 1 (sin tableros)
ESCALA 1/8"

PLANTA 2
ESCALA 1/8

ELEVACIÓN E-01
ESCALA 1/8

ELEVACIÓN E-02
ESCALA 1/8

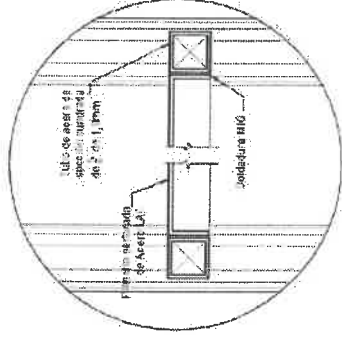

DETAILED GENERAL

1. TABLERO DE RESPALDO, MADERA, CON UNIONES MACHIMBRADAS O FINGER JOINT (UNIÓN ENCAJENADA) $\varnothing = 22-18\text{mm}$ ATORNILLADO A ESTRUCTURA METÁLICA CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA 4X15.
2. TUBO MECÁNICO ELECTROSOLDADO DE ACERO LAMINADO AL FRO DE SECCIÓN CIRCULAR $\varnothing = 1\frac{1}{2} \times e = 1,2\text{mm}$.
3. TABLERO DE ASENTO, MADERA, CON UNIONES MACHIMBRADAS O FINGER JOINT $\varnothing = 25-22\text{mm}$ ATORNILLADO A ESTRUCTURA METÁLICA CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA 4X20.
4. PLANCHA DE ACERO LAMINADO AL FRO DE ESPESOR 1,07 MM, CON PERFORACIONES DE 20 MM, CON ARREGLO A 90° Y CON MARCO PERIMETRAL EN L' SOLDADO A LA ESTRUCTURA.
5. ALETA DE SOLDACIÓN CON PERFORACIÓN TUBO CHINO, PLATINA DE ACERO ELECTROSOLDADO LAR 101 $e = 1,5\text{mm}$ SUELDADA A ESTRUCTURA METÁLICA.
6. REGATONES DE POLIPROPILENO DE 12mm (MINIMO) DE EMBONE EXTERIOR O INTERIOR, LOS REGATONES DEBEN TENER UNA DISTANCIA NO MENOR DE 5 MM DEL FISO A LA ESTRUCTURA METÁLICA.
7. LG SOTTOPIR INSTALACIONAL.
8. TUBO DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA DE $1\frac{1}{2} \times e = 1,0\text{mm}$.

UNIDADES: MILÍMETROS (mm)

SILLA DE METAL MADERA DE 3° A 4° DE SECUNDARIA

Version 02

CORTE C
ESCALA 1/2

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

INDICADA: SSM-06

Grubbs

PL-12

[illegible]

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA
DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

PROINFLAMMATORY










Richard Wilver Candell
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



Ministerio
de Educación

PERU

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.

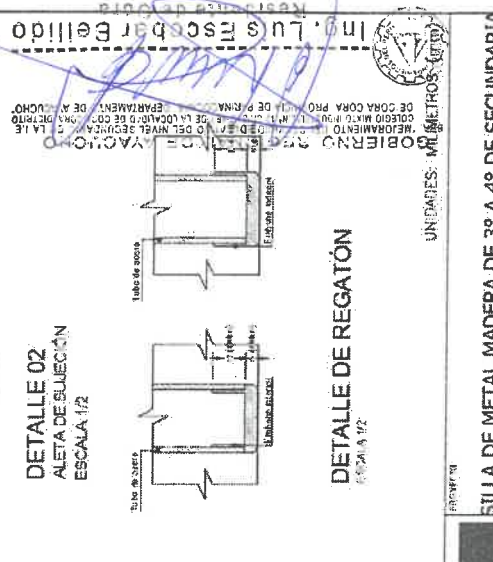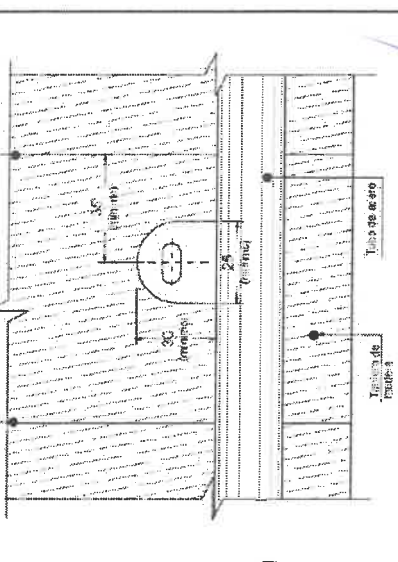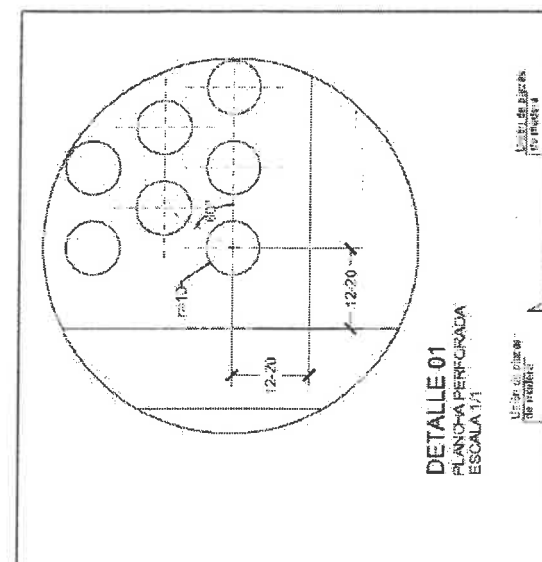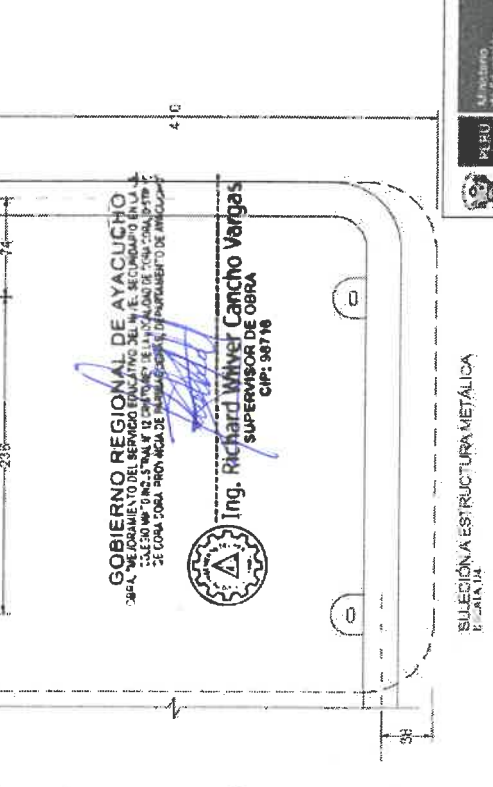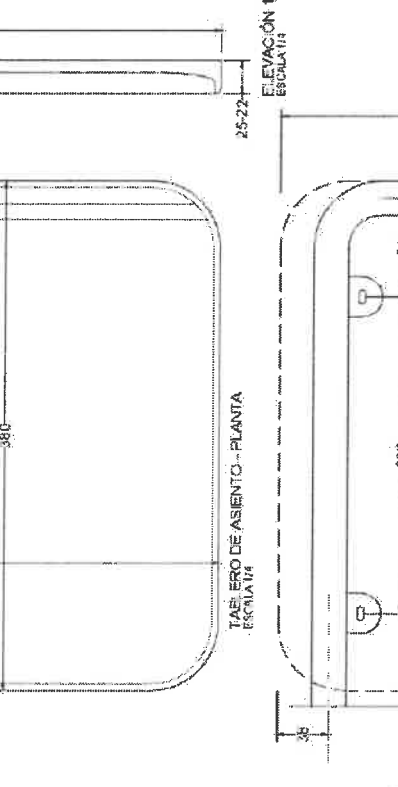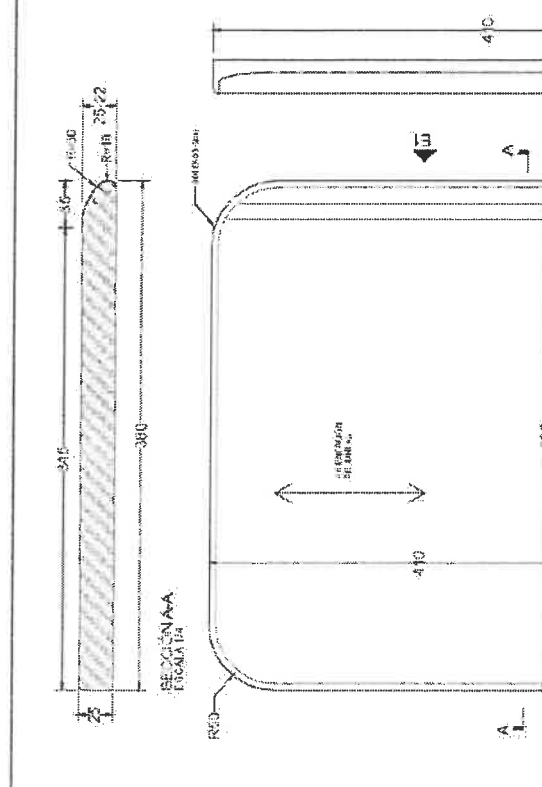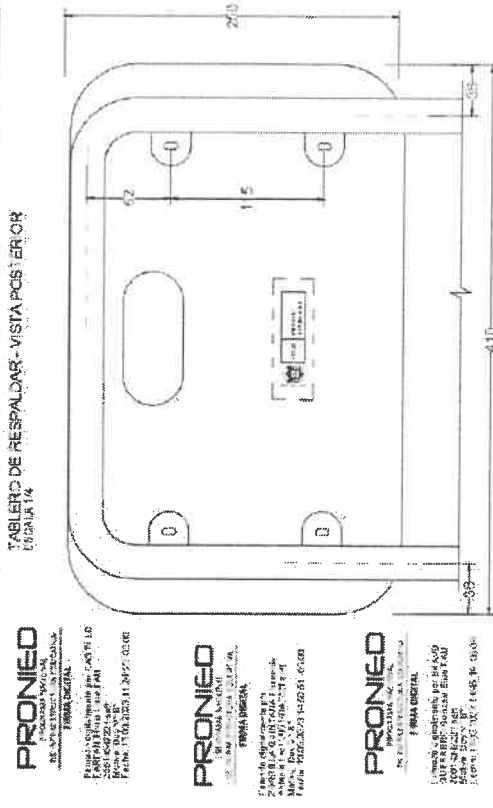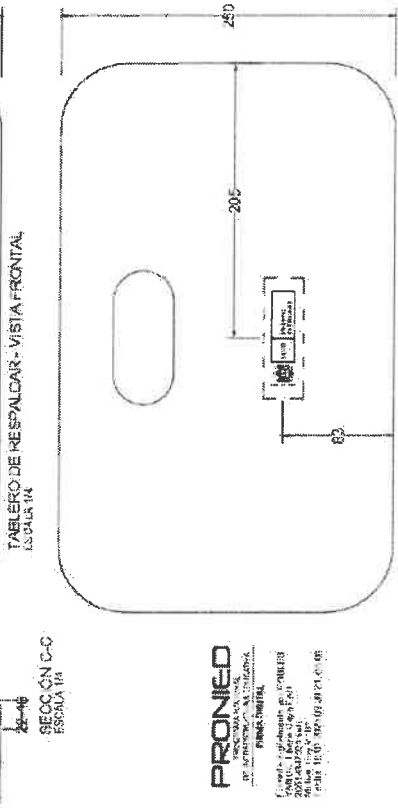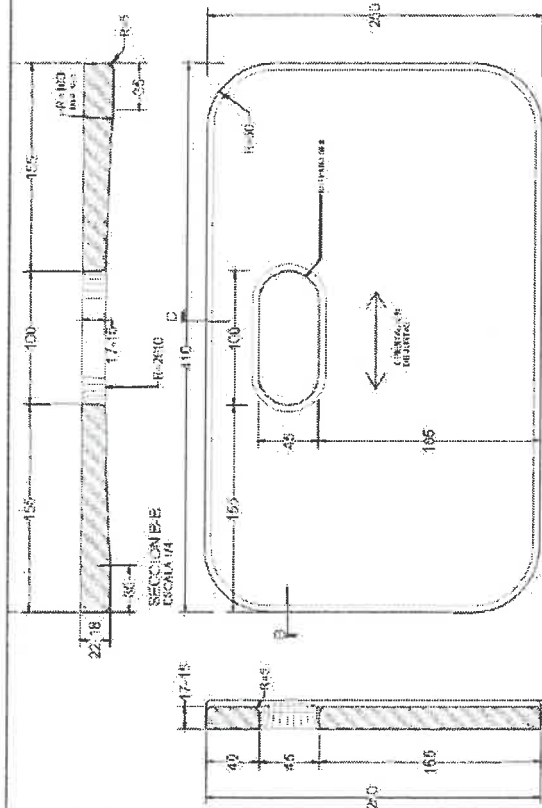

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


Proyecto de Inversión: Construcción de 100 Unidades de Asiento para el Aula.
Código: 2001-00000000-0000-0000-0000-000000000000
Fecha: 10/01/2017
Página: 10 de 10

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Proyecto de Inversión: Construcción de 100 Unidades de Asiento para el Aula.
Código: 2001-00000000-0000-0000-0000-000000000000
Fecha: 10/01/2017
Página: 10 de 10

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Proyecto de Inversión: Construcción de 100 Unidades de Asiento para el Aula.
Código: 2001-00000000-0000-0000-0000-000000000000
Fecha: 10/01/2017
Página: 10 de 10

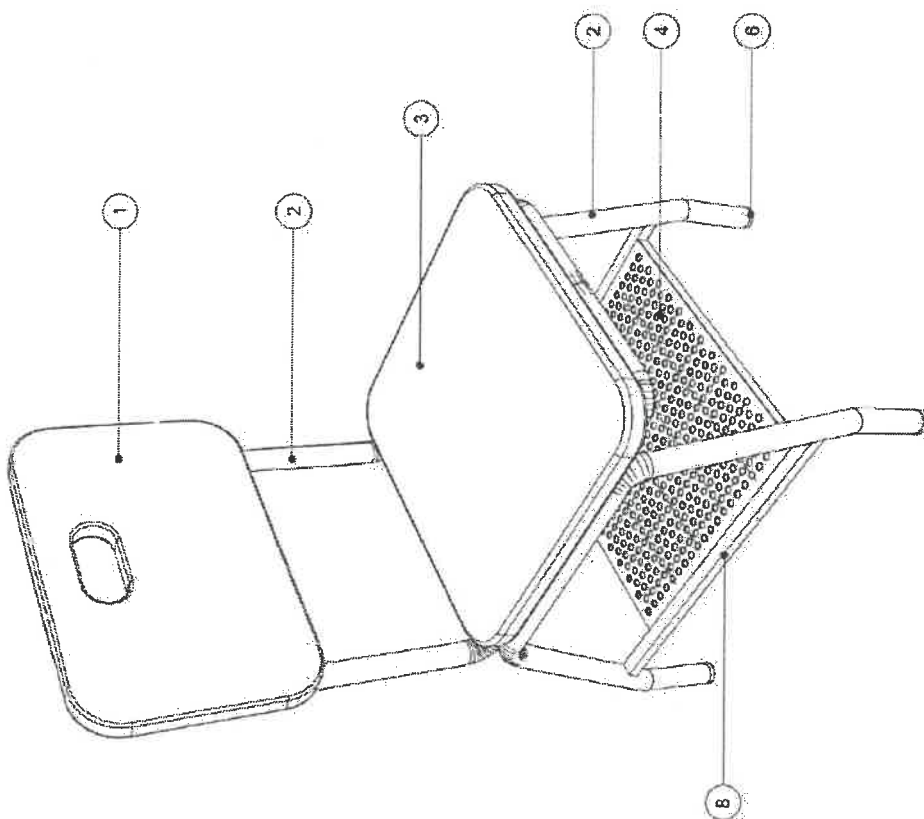

DETAILES GENERALES

PROVIDE

[illegible]

1947-1948

[illegible]

03/20/20

SEARCHED INDEXED
SERIALIZED FILED
APR 1968 FBI - MEMPHIS

Version 02

[illegible]

PROVIDED

...has 10 children, 14 of whom are ...
...the ...
...the ...

UNIDADES: MILIMETROS (mm)

2015-2016
 Summary

SILLA DE METAL MADERA DE 3° A 4° DE SECUNDARIA

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

[illegible]

Application

12B

ANEXO N° 04 CUADRO DE OTRAS PENALIDADES

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:48:04 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Fidenio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 14:51:26 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lube FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 11:25:10 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOS Tibeño Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 09:39:14 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
6ª. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO CUMBAPO EN LA U.E.
COLEGIO N° 1005, S. 1° y 2° GRADOS DE LA U.E. DE CURA CORA, DISTRITO
DE CURA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO CUMBAPO EN LA U.E.
COLEGIO N° 1005, S. 1° y 2° GRADOS DE LA U.E. DE CURA CORA, DISTRITO
DE CURA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211641

OTRAS PENALIDADES

Tipo	Supuestos de aplicación de Penalidad	Forma referencial de cálculo				Procedimiento
		1 a 100 bienes	100 a 1000 bienes	1000 a 5000 bienes	5000 a más bienes	
F1	No presentar la totalidad de la documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el transporte de los bienes a la Entidad, según las condiciones del numeral 2.2.7.4. Documentación para el Transporte de los bienes	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
F2	No levantar las observaciones realizadas por la Entidad a la documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el transporte de los bienes luego del plazo estipulado en el numeral 2.2.7.4. Documentación para el Transporte de los bienes	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F3	No recoger los Documentos que acredite Entrega de los Bienes ni suscribir el Acta de Entrega Documentaria según lo estipulado en el numeral 2.2.8.1 Transporte	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F4	No cumplir con el almacenaje adecuado (ambiente techado, sin goteras, sin filtraciones y con cobertura en óptimas condiciones), de acuerdo con el Numeral 2.2.5.1 Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 1$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 4$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F5	Ingresar con vehículos pesados a los patios de Instituciones Educativas para realizar la estiba y/o descarga de bienes según numeral 2.2.8.1 Transporte	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 1$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F6	No transportar exclusivamente los bienes objeto de la presente contratación en los vehículos del contratista,	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	



	de acuerdo con el numeral 2.2.8.1 Transporte					
F7	No realizar el Transporte de bienes con un vehículo cerrado de acuerdo con lo señalado en el numeral 2.2.8.1 Transporte	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 1$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 4$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 5$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	
F8	No presentar la solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad dentro del plazo establecido en numeral 2.2.7.1 Sobre la solicitud para la calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	
F9	No presentar a la Entidad los resultados de la aplicación de métodos de ensayos dentro del plazo ofertado por el Organismo de Evaluación de la Conformidad. En su propuesta técnica presentada para su designación.	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	
F10	No presentar el levantamiento de observaciones del "informe de ensayos" dentro del plazo otorgado por la Entidad Contrante.	$P = M \times Oc$ $M = 0.2$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	
F11	No presentar antes de la culminación de la etapa de Fabricación, la documentación requerida en el numeral 2.2.1 Procedencia de la madera.	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	
		Consideraciones: (*) UIT: Unidad Impositiva Tributaria, se aplicará el valor de referencia vigente, establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, en la fecha de la suscripción del contrato.				

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 14:43:33 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Luisa FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 11:26:28 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO LOCAL
SECRETARÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y EMPLEO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA
SECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD Y DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA GUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 14:42:01 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANCO Tiberto Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2023 09:41:29 -05:00



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

ANEXO N° 05 REQUISITOS A PRESENTAR PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:46:48 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORP LLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 14:52:20 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 11:25:38 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 09:41:36 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO MIXTO II "SANTO ROSARIO" DE LA ZONA URBANA DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARTIUCUCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



Ing. Luis Ezequiel Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

FORMATO N° 01

FORMATO N°01: CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES								
ACTIVIDADES	ETAPA: FABRICACION Y EMBALAJE DE LOS BIENES							
	MES 1				MES 2			
	día 1	día 2	día 3	día "n"	día 1	día 2	día 3	día "n"
BIEN "A"								
Actividad 1								
Actividad 2								
Actividad 3								
Actividad "n"								
BIEN "B"								
Actividad 1								
Actividad 2								
Actividad 3								
Actividad "n"								

FORMATO N° 02

FORMATO N°02: CRONOGRAMA DE ENTREGA DE BIENES								
ACTIVIDADES	ETAPA: TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIENES							
	MES 1				MES 2			
	día 1	día 2	día 3	día "n"	día 1	día 2	día 3	día "n"
INSTITUCIÓN DE DESTINO N°01								
TRANSPORTE								
ENTREGA								
INSTITUCIÓN DE DESTINO N°02								
TRANSPORTE								
ENTREGA								

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. "EL INNOVADOR" N° 12 CATEDRAL DE LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PAMPA OCCIDENTAL, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 98718

Notas:

- El cronograma de "Adquisición de bienes" servirá para la realización de visitas inopinadas por parte de la ENTIDAD.
- Asimismo, ambos formatos, deberán entregarse en programa MS PROJECT, MS EXCEL o similar.

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERPERO Gonzalo Elias FAJ
 20514347221 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 10.03.2023 14:47:52 -05:00

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CORRELLA QUINTANA Florencio Antonio FAU 20514347221 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 13.03.2023 14:52:30 -05:00

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU 20514347221 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 15.03.2023 11:25:45 -05:00

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tibiri o Cayo FAJ 20514347221 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 16.03.2023 09:41:44 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. "EL INNOVADOR" N° 12 CATEDRAL DE LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PAMPA OCCIDENTAL, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 Ing. Lina Sotelo Eslido
 Responsable de Gura
 CIP: 411541

FORMATO N° 03

FORMATO N°03: DESAGREGADO DE COSTOS

DESAGREGADO DE COSTOS DE BIENES A ENTREGAR A LA(S) INSTITUCION(ES) BENEFICIADA(S)

REGIÓN	INSTITUCIONES DE DESTINO	DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD	COSTO UNITARIO DE ADQUISICIÓN (FABRICACIÓN Y EMBALAJE)	COSTO UNITARIO DE ENTREGA (TRANSPORTE Y ENTREGA)	COSTO UNITARIO SUB TOTAL	COSTO DE BIENES
	(1)	(2)	(C)	(A)	(B)	(A+B)	[(A+B)*C]
"A"	Institución 01	Bien "A"		\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
		Bien "B"		\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
		Bien "n"		\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
	Institución 02			\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
				\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
"B"	Institución 01			\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
				\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
	Institución 02			\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
				\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
	Institución "n"			\$/.	\$/.	\$/.	\$/.
				\$/.	\$/.	\$/.	\$/.

RESUMEN DE COSTOS

COSTO TOTAL

\$/.

Consideraciones:

- (1) Se contabiliza según el número de orden del "Formato de Direcciones para la Entrega", del Anexo 01.
- (2) Según nomenclaturas del Cuadro N°01 de las presentes especificaciones técnicas.
- (A) Incluye costo del Control de Calidad, según el numeral 2.2.8.

Notas:

- Se precisa que todos los costos deben contener como máximo 02 decimales y las sumatorias deben coincidir con los totales a adjudicar.
- Asimismo, dicho formato debidamente llenado, deberá entregarse en archivo digital editable.
- Toda incompatibilidad, incluso a nivel de decimales u ordenamiento del formato distinto a lo estipulado, será tratada como observación.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:47:14 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencio Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.03.2023 14:52:43 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Ma. la Lope FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2023 11:25:53 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOS Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2023 09:41:51 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MARCO ANTONIO DE CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

FORMATO N° 04

FORMATO N°04: DIRECCIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN Y ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA

Nombre de contratista o de cada empresa que conforma el consorcio	Av., Jr., Calle, Pasaje, Mz. Lote, Etc.	N°	Urbanización, Sector, Etc.	Teléfono del Local y de Propietarios	Referencia	Distrito Provincia Región

Notas:

- Máximo declarar 04 instalaciones de almacenamiento y/o talleres.
- En caso se necesite modificar los datos de la(s) dirección(es) declaradas, el Contratista deberá notificar a la Entidad mediante una carta por mesa de partes de la ENTIDAD, como plazo máximo antes del ingreso de la Solicitud de Verificación de Cantidad por la culminación de la etapa de "Adquisición y Embalaje de la totalidad de los bienes".

FORMATO N° 05

FORMATO N°05: RESPONSABLE GENERAL DE OPERACIONES

Nombres y apellidos completos	N° DNI	Cargo	N° de celular	N° teléfono fijo	Correo electrónico Institucional

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.09.2023 14:47:41 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARRAN Maria Lupe FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.09.2023 11:28:01 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencia Anabella FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.09.2023 14:52:55 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROSLES AYCO Tiberio Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.09.2023 09:42:01 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEGIO N° 10 "SANTO N° 12 CRISTO REY" DE LA LOCALIDAD DE CORA-CORA, DISTRITO DE CORA-CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEGIO N° 10 "SANTO N° 12 CRISTO REY" DE LA LOCALIDAD DE CORA-CORA, DISTRITO DE CORA-CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

FORMATO N° 06

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Por medio de la suscripción del presente documento se autoriza a (Nombre de Entidad) a realizar la notificación electrónica de las observaciones realizadas por la Entidad durante el procedimiento para suscribir el contrato, así como, para los actos efectuados durante la ejecución del contrato.

La dirección de correo electrónico autorizada es:

Correo electrónico autorizado:

[illegible]

Repita el correo electrónico autorizado:

[illegible]

Quedan exceptuados de la presente autorización, aquellos actos cuya notificación revistan formalidades especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones pública.

La notificación electrónica se acredita con la impresión del correo electrónico enviado y la Cedula de Notificación, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmación de parte del contratista.

La notificación en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación electrónica efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado e legitimado por SPANIO
GUERREIRO Gonzalo Elias FAU
20514347221 sol
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 10 02 2023 14:46:06 -0500

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Flordelis
Antonia FAU 20514347221 soR
Motivo: Soy V° B°
Fecha: 13.03.2023 14:53:09 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
PARFAN Mare Lope FAU
20514347221.spR
Mare Lope vº Bº
Fecha: 15.03.2023 11:28:08 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soA
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2023 09:42:09 -05:00

(REPRESENTANTE LEGAL)
RUC:

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
ESCALA MUNICIPAL N° 17 CRISTÓBAL DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PAMPACONAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Gobierno Nacional de Acapulco
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL SECTOR EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA LOCALIDAD DE COACORRÁ, MUNICIPIO
DE CORAPUQUE PRINGHUELA DEPARTAMENTO DE ACACHUCA



Ing. Luis Escobar Eellido
Residente de Obra
CIP: 211541

ANEXO N° 06

MODELOS REFERENCIALES DE ACTAS PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 10.03.2023 14:48:20 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 10.03.2023 14:53:22 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 10.03.2023 11:28:15 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOG Tibero Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 10.03.2023 09:42:28 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO N° 003, S/NAL N° 12 CAYO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARMACONAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



Ing. Luis Oscar Bellico
Residente de Obra
CIP: 211541

ACTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	
CONTRATO:	
TIPO DE BIEN:	
UBICACIÓN:	
CONTRATISTA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
FECHA:	

Siendo las _____ horas del día ____ del mes _____ del año 20____, se reunieron en el local donde se realiza el proceso de fabricación y/o almacenaje de los bienes adquiridos mediante el procedimiento de selección arriba mencionado, sitio en la dirección antes indicada; de una parte, el Sr(a) _____ en representación de la ENTIDAD y de la otra parte el Sr(a) _____ en representación de la empresa Contratista _____ a fin de llevar a cabo la inspección de los trabajos materia de la adquisición, encontrándose lo siguiente:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

firmado digitalmente por ROBLES
RANCO Tiberio Cayo FAU
55143472021 soft
Rvo: Day V° B°
Ema: 15.03.2023 09:40:34 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

firmado digitalmente por CASTILLO
RPAÑ Maria Lupe FAU
514347221 soft
Rvo: Day V° B°
Ema: 15.03.2023 11:06:22 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

firmado digitalmente por
PRILLA QUINTANA Pierro FAU
514347221 soft
Rvo: Day V° B°
Ema: 15.03.2023 14:53:37 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEJO MOTOBO, S/NAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas se dio lectura a la presente Acta, y no habiendo objeciones a la misma, se procedió a suscribirla por parte de los presentes.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

firmado digitalmente por BRAVO
HERRERO Gonzalo Elias FAU
514347221 soft
Rvo: Day V° B°
Ema: 15.03.2023 14:43:34 -05:00

**LA ENTIDAD
REPRESENTANTE**

Nombre _____
Cargo _____
D.N.I. _____

**CONTRATISTA
REPRESENTANTE**

Nombre _____
D.N.I. _____

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEJO MOTOBO, S/NAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
Ing. Luis Escobar Bellico
Residente de Obra
CIP: 211541

ACTA DE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA

La firma de la presente acta da la conformidad de la recepción de documentos en original de los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA's) del Contrato N° _____, derivado del Procedimiento de selección para la _____.

Mediante la presente, se hace entrega de la cantidad de N° ____ PECOSA's en cuatro (04) juegos originales, para la entrega de los bienes correspondientes.

NOTA PARA SER CONSIDERADA

De conformidad con el numeral 2.8.9 ENTREGA DE LOS BIENES, de las Especificaciones técnicas de las Bases Integradas, se debe tener en consideración que los PECOSA, deberán ser suscritos (firmados y sellados) por el Encargado de la Institución de destino¹, dando fe de lo recibido, consignándose en cada documento: firma, post-firma, sello y fecha de recepción, copia de DNI del Encargado y documentación que acredite su cargo, debiendo recabar la entidad receptora un ejemplar original de los PECOSA, para sus efectos contables.

En caso de ausencia del Encargado de la Institución de destino², por motivos no imputables a la ENTIDAD o no contar con documentación que acredite su cargo, el PECOSA podrá ser firmado por un representante designado y autorizado por la ENTIDAD.

Los bienes serán entregados en perfecto estado de conservación, adecuadamente armados y embalados hasta su destino final, sin ningún defecto de ADQUISICIÓN / FABRICACIÓN, ni otro como consecuencia de la estiba o desestiba o del transporte.

Los datos de contacto en cada una de las Instituciones de destino para la recepción de los bienes y el firmado de los PECOSA, serán coordinados directamente por el CONTRATISTA.³

Atentamente;

NOMBRE :

DNI :

TELÉFONO / CELULAR:

EMPRESA :

FECHA :

HORA:

CORREO ELECTRONICO:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 18.03.2023 11:27:13 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 18.03.2023 09:42:53 -05:00

CONTRATISTA
REPRESENTANTE

LA ENTIDAD
REPRESENTANTE

¹ Si es una Institución Educativa, los PECOSA deberán ser suscritos por el Director o Sub-director administrativo en ausencia de aquel.

² En caso de ausencia del Director o Sub-director administrativo de una Institución Educativa, el PECOSA podrá ser firmado por un representante designado y autorizado por la UGEL correspondiente a la Institución, previa coordinación con la ENTIDAD.

³ Para una Institución Educativa el contacto será coordinado directamente por el CONTRATISTA con las UGELES respectivas.



CONTRATO N° _____
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN _____

1. _____ identificado con DNI N° _____ por parte de la **ENTIDAD**.
2. _____ representante de la Empresa Contratista identificado con DNI
N° _____

CUADRO N° 01: RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN ENCONTRADA	SUBSANADO	
			SÍ	NO
		1.		
		2.		
		1.		
		2.		
		3.		
		1.		

[illegible]

ACTA DE VISITA INOPINADA N°

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	
CONTRATO:	
TIPO DE BIEN:	
UBICACIÓN:	
CONTRATISTA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
FECHA:	

Siendo las _____ horas del día ____ del mes _____ del año 20____, se reunieron en el local donde se realiza el proceso de fabricación y/o almacenaje de los bienes adquiridos mediante el contrato arriba mencionado, sito en la ubicación antes señalada, de una parte, el Sr(a) _____ en representación de la **ENTIDAD**, y de la otra parte el Sr(a) _____ en representación de la empresa Contratista

Encontrándose lo siguiente:

[illegible]

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIE
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA LÓGICA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° S°
Fecha: 16-03-2023 09:43:18 -05

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas se dio lectura a la presente Acta, y no habiendo objeciones a la misma, procediendo a suscribirla los presentes en señal de conformidad.

PRONIE
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CAST
FARFALL Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day Vº B
Fecha: 15-03-2023 11:27:28-05

LA ENTIDAD REPRESENTANTE

Nombre

Cargo

D.N.I.

**CONTRATISTA
REPRESENTANTE**

Nombre

D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA CONECTA
FIRMA DIGITAL

Versión 02

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
Motivo: Soy Vº Bº
Fecha: 10.03.2023 14:59:04 -05:00

1

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA CUINTANA Florencia
Antonio: FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° E°
Fecha: 13/03/2023 14:54:32 -0500

Página 50 de 55

55

ACTA DE DEVOLUCIÓN DE BIENES

CONTRATO N° _____
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN _____

Siendo las _____ horas, del día _____ de _____ de 20____; se reunieron en el local de la empresa _____, el Supervisor de la ENTIDAD, _____, identificado con DNI N° _____, el representante de la empresa Contratista el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____ y el representante del Organismo de Evaluación de Conformidad _____ identificado con DNI N° _____, con la finalidad de realizar la devolución de los bienes ensayados como parte del control de calidad, en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de la _____.

ANOTACIONES:.....
.....
.....
.....

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas, en señal de conformidad con los términos de la presente acta, suscriben los intervinientes.

LA ENTIDAD REPRESENTANTE

Nombre

D.N.I.

EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN CERTIFICADORA DE CALIDAD REPRESENTANTE

Nombre

D.N.I.

CONTRATISTA REPRESENTANTE

Nombre

D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Genaro Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:58:48 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 11:27:34 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonia FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:54:54 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 09:43:25 -05:00



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO WILVER CANCHO VARGAS N° 12 CINTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANAL, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO WILVER CANCHO VARGAS N° 12 CINTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANAL, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS

CONTRATO N° _____
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN _____

Siendo las _____ horas, del día _____ de _____ de 20____; se reunieron en los Almacenes de la empresa Contratista _____, el Supervisor de la ENTIDAD, el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____, el representante de la empresa Contratista el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____ y el representante del Organismo de Evaluación de Conformidad, _____, el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____, con la finalidad de realizar la verificación técnica a través de ensayos de funcionalidad de los bienes materia del contrato antes citado, para tales efectos se procederá a tomar el número de muestras que pasarán por control de calidad, según lo establecido en el Anexo N° 02 de las Especificaciones Técnicas, tal como se detalla a continuación:

CUADRO N° 01: MUESTRAS Y ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD			
N° DE ORDEN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE MUESTRAS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL DE MUESTRAS			

ANOTACIONES:.....
.....
.....
.....

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas, en señal de conformidad con los términos de la presente acta, suscriben los intervinientes.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
ROD Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 09:42:35 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL N.º 11, SEGURIDAD EN LA EL
COLEJO VOTO INS. S.º 1º DE LA CALIDAD DE CORACORA, DISTR. N.º
DE CORACORA - PROV. NCA DE PADRE FLORES, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

LA ENTIDAD
REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN
CERTIFICADORA DE CALIDAD
REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

CONTRATISTA
REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 11:27:31 -05

Ing. Zorrilla Quintana
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonía FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 14:55:05 -05:00

SERVICIO :
MODALIDAD :
CONTRATO :
UBICACIÓN :
CONTRATISTA :

De la verificación realizada, se observan las siguientes cantidades:

[illegible]

CONCLUSIÓN:



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIE
PROGRAMA NACIONAL
DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA

Firmado digitalmente por ROBL
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514947221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 16.03.2023 09:43:44 -05

Siendo las _____ horas del día ____ de _____ del año 20____, se procedió a firmar el presente Acta por triplicado.



estado digitalmente por BRAVO
FERRERO Gonzalo Elias FAU
514347021 scfi
file: Doy V* B*
date: 10-03-2023 14:40:52 -05:00



Firmado digitalmente por CAST
FARFAT Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Activo: Doy V* B*
Fecha: 15.03.2023 11:27:47 -05

ÁREA DESIGNADA POR LA ENTIDAD REPRESENTANTE

ÁREA USUARIA
REPRESENTANTE

CONTRATISTA
REPRESENTANTE



Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
-Motor Boy V° B°

Ing. Luis Escobar Echeverri
Residente de Obra
titativa. CIP: 211541

¹ La Entidad define quien es el área competente de emitir la conformidad cuantitativa.

ANEXO N° 7

FICHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Genaro Elias FAU
23514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/03/2023 14:49:27 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florancio
FAU 23514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/03/2023 14:55:26 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARRAN Maria Luna FAU
23514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15/03/2023 11:27:54 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANCO Teodoro Cayo FAU
23514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16/03/2023 09:43:21 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO WILVER GANCHO Nº 12 CRISTO REY DE LA CALADILLA DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANALES, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Gancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO WILVER GANCHO Nº 12 CRISTO REY DE LA CALADILLA DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANALES, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

Anexo N° 07

Ficha de presentación del producto

El postor deberá completar los datos de la tabla siguiente:

Nombre del requerimiento		
N°	Especie(s) maderable(s) con la(s) que atenderá el requerimiento (véase Nota 1)	Nombre o Razón social del Postor
1		
2		
...		

Nota 01: El contratista podrá proponer una especie de madera similar o superior a las indicadas en el número 2.1 del numeral 2.1.1. Características y especificaciones, siempre y cuando esta cumpla con las propiedades físicas, mecánicas y de durabilidad.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221.scdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.03.2023 14:49:21 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Ricardo Antonio FAU 20514347221.scdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.03.2023 14:55:40 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Luce FAU 20514347221.scdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2023 11:23:01 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANCO Tadeo Cayo FAU 20514347221.scdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:44:18 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEJO MUYO Nº 2000, S/NAL Nº 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PAMPACONAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEJO MUYO Nº 2000, S/NAL Nº 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PAMPACONAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

FICHA DE HOMOLOGACIÓN

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

Código del CUBSO	: 56121505-00390355
Denominación del requerimiento	: Mesa de metal y madera para estudiante de 3° a 4° de secundaria.
Denominación técnica	: Mesa de estudiante de secundaria de metal y madera de 50 cm x 60 cm x 72 cm.
Unidad de medida	: Unidad.
Resumen	: Mesa de estructura de metal, tablero de madera y accesorios de fijación para 01 estudiante, con 720 mm de altura total, 500 mm de profundidad y 600 mm de ancho. Destinada a la población estudiantil de 3° a 4° del nivel secundaria de la Educación Básica Regular.

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

La mesa de metal y madera para estudiante de 3° a 4° del nivel secundaria, está conformado por los siguientes componentes:

- Estructura de Mesa
- Tablero de mesa
- Ensamblaje y accesorios

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:06:34 -05

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

2.1.1. Características y especificaciones del bien

Nº	Características	Especificación	Documento Técnico de Referencia
1. Estructura de mesa			
1.1	Material	Tubo mecánico electro soldado de acero laminado al frío	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.3.1.1
1.2	Resistencia a la tracción	≥ 45 ksi [310 MPa]	ASTM A513 Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing Tabla S5.1
	Límite de fluencia	≥ 32 ksi [221 MPa]	
1.4	Composición química	C máx. 0.15% Mn máx. 0.60% P máx. 0.035% S máx. 0.035%	ASTM A513 Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing Tabla 1 y Tabla 2

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
XANOG Tibeño Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:43:45 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEGIO WOT'D INO, S'RAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA AZÚCAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

1.5.	Sección de tubo: arriostre horizontal inferior	1" x 1"	Establecido por el Ministerio
1.6.	Sección de tubo: arriostre horizontal superior	1" x 2"	
1.7.	Espesor nominal de la pared del tubo estructura principal	1,5 mm calibre 16	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.3.1.1 Tabla 11
1.8.	Dimensiones estructurales	Véase Anexo N° 03 Lámina L-11	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Cuadro N°15
1.9.	Soldadura	<i>Metal Inner Gas (MIG)</i> de micro alambre que no dejará escoria, previamente decapada.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.3.1.1 apartado c)
		Todas las uniones soldadas entre elementos metálicos deberán tener un cordón de soldadura continuo en todo el perímetro de la unión. Las uniones deberán tener un acabado uniforme.	Establecido por el Ministerio
1.10.	Acabado	Preparación de la superficie: Los tubos deben recibir un baño de desengrase, de desoxidación (decapado), de reactivado, de fosfatizado y un baño para pasivado con el objeto de eliminar óxidos, escamas de óxido y grasas. Luego debe ser sometido a un proceso de secado para eliminar toda humedad interior y exterior.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.3.2
		Recubrimiento en polvo; recubrimiento en polvo termo convertible, de tipo epoxi o epoxi-poliéster. La película depositada será de 80 micrones mínimo, brillo semimate. Curado mediante horneado para que adquiera la apariencia adecuada, las propiedades mecánicas y químicas finales.	

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANG C Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 18:49:26 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI
FARFAN Mario Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:06:59 -05

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA LE
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CAYO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PAMPAHUELLOS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 09:00:36 -05:00



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORP LLA CUNTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:07:10 -05:00

1.11.	Color	RAL 5024	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Anexo N° 02
1.12.	Defectos no tolerables	Deformaciones, grietas, puntas o filos, salpicaduras y espacios vacíos entre o los elementos metálicos	Establecido por el Ministerio
2. Tablero Mesa			
2.1	Especies de madera (Véase Nota 01, Nota 02 y Nota 03)	AGUANOMASHA (<i>Machaerium inundatum</i>)	Establecido por el Ministerio
		CACHIMBO ROJO (<i>Cariniana domesticata</i>)	
		COPAIBA (<i>Copaifera officinalis</i>)	
		HUAYRURO (<i>Ormosia coccinea</i>)	
		MASHONASTE (<i>Clarisia racemosa</i>)	
		REQUIA (<i>Guarea kunthiana</i>)	
		ULCUMANO (<i>Podocarpus oleifolius</i>)	
		TORNILLO (<i>Cedrelinga cateniformis</i>)	
2.2	Densidad básica	0,45 g/cm ³ a 0,70 g/cm ³	<p>NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.1</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN COLEJO MANTO N° 12, PISO 12, OFICINA N° 12, LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO</p> <p>Ing. Luis Escobar Bellón Responsable de Obra CIP: 211541</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN COLEJO MANTO N° 12, PISO 12, OFICINA N° 12, LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO</p> <p>Ing. Richard Wilver Cancho Vargas SUPERVISOR DE OBRA CIP: 98718</p>
2.3	Flexión estática	MOR ≥ 501 kg/cm ²	
		MOE ≥ 90 t/cm ²	
2.4	Compresión perpendicular	ELP ≥ 41 kg/cm ²	
2.5	Cizallamiento	≥ 61 kg/cm ²	
2.6	Dureza en lados	≥ 301 kg/cm ²	
2.7	Tenacidad	≥ 1,8 kg-m	

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU: 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14/03/2023 09:02:47 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CORRILLA QUINTANA Florencia Ariana FAU: 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14/03/2023 12:07:59 -05:00



PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU: 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15/03/2023 09:09:07 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Cayo FAU: 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15/03/2023 16:49:33 -05:00

2.8	Contenido de humedad de la madera (Véase Nota 04)	Para establecer el CHE de la madera a ser utilizado en los diferentes usos, en función del lugar donde prestará servicio, se deberá tomar como referencia la información brindada en el aplicativo "Calculadora CHE Perú" disponible en el Play Store indicado en el siguiente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.itp.calculadorache&hl=es_PE&gl=US&fbclid=IwAR0pqkKVL TGOGJqP33eo6J9N6g1x_UelL0VjBI4OPDj4BLZV-IJmMCS7S7o	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.5.1
2.9	Preservación	La madera a emplearse debería resistir el ataque de insectos y hongos xilófagos, para lo cual, en previsión de posibles ataques de agentes biológicos que contribuyan a la degradación, es recomendable utilizar preservantes que garanticen la inocuidad para el uso del mobiliario.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.5.2
2.10	Juntas de tablero	Machihembrada o endentadas (Finger Joint) con listones de 50 mm de ancho como mínimo. Tener en cuenta el balance de los anillos de crecimiento de la madera para prevenir alabeos no tolerados.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.7.2
2.11	Dimensiones tablero (Véase Anexo N°03, Lámina L-11)		
2.11.1	Profundidad	500 mm	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Cuadro N°15
2.11.2	Ancho	600 mm	
2.12	Espesor	22-25 mm	Establecido por el Ministerio
2.13	Encolado	Colas PVA con 48% de sólidos como mínimo, no tener una antigüedad de fabricación mayor a 6 meses y de fraguado al ambiente. El adhesivo debe colocarse en la superficie de las dos piezas a encolar	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.8

2.14	Lijado	Lijado manual o mecánico. Grano mínimo de 150 grit.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Requisitos Numeral 5.1.9
		La superficie debe quedar totalmente lisa y suave al tacto, libre de astillas, irregularidades, cantos vivos y poros levantados; las aristas serán redondeadas.	
2.15	Acabado	Laca selladora mate o semi- mate translúcida o lacas catalizadas o un material de recubrimiento con dureza y durabilidad equivalente o superior a las consideraciones técnicas siguientes: - Base de nitrocelulosa, aditivos plásticos y metálicos - Sólidos en Volumen 27 ± 2 % - Espesor de Película Seca 2.0 – 3.0 mils por capa	NTP 260.006 2019 MOBILIARIO ESCOLAR. Mesa para nivel de educación secundaria. Requisitos. 4ª Edición Numeral 7.2.4
		Mínimo 3 capas, aplicado en la totalidad de las superficies.	
2.16	Defectos no tolerables en madera		
2.16.1	Perforaciones grandes	Mayor de 3 Agujeros con diámetro mayores a 6mm, por metro lineal y no alineados	<div>GOBIERNO REGIONAL OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA U.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL COLÓN DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO</div> <div>Ing. Luis Escobar Bellier Residente de Obra CIP: 21541</div> <div>NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.4</div> <div>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA U.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL COLÓN DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO</div> <div>Ing. Richard Wilver Cancho V. SUPERVISOR DE OBRA CIP: 98718</div>
2.16.2	Rajaduras y Grietas	Mayor a 20 mm de largo, 0,5 mm de ancho, y mayor a la tercera parte del espesor de la pieza.	
2.16.3	Inclinación del grano	Mayor a 10°	
2.16.4	Falla de compresión paralela	Máximo en dos lados consecutivos y no perjudiquen la solidez.	
2.16.5	Defectos de forma	Mayor al 0,3% de la longitud de la pieza	
2.16.6	Presencia de hongos de pudrición.	No se admiten	
2.16.7	Presencia de insectos activos	No se admiten	

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 04:03:05 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZOPRILLA GUINTANA Florentio Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:03:28 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARRAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:56:21 -05:00

2.16.8	Defectos por nudos	Mayor de 20 mm de diámetro y mayor a la cuarta parte del ancho del material	
2.16.9	Nudos muertos	No se admiten	
2.16.10	Mezcla de especies	No se admiten	
2.16.11	Presencia de médula y/o corteza	No se admiten	
2.16.12	Inestabilidad en un plano	No se admiten	NTP 260.014:2021 MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Muestreo. 4ª Edición Anexo A
2.16.13	Ensamblajes defectuosos	No se admiten	Establecido por el Ministerio
2.16.14	Acabado defectuoso	No se admiten	
2.17	Defectos tolerables		
2.17.1	Perforaciones pequeñas	Agujeros de 1 mm a 3 mm de diámetro, que sumados sus diámetros den un máximo de 6 mm en un área de 100 cm ² , no alineados ni pasantes	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.3
2.17.2	Mancha azul	No cuantificable mientras no afecte la resistencia de la madera	

3. Accesorios y piezas de ensamble

3.1	Regatones		
3.1.1	Material	Polipropileno (PP)	Establecido por el Ministerio
3.1.2	Dimensiones	12 mm (mínimo) de embone exterior o interior. Distancia no menor de 5 mm de separación entre el piso a la estructura metálica. (Véase Lámina L-11A)	Establecido por el Ministerio
3.1.3	Color	RAL 9005 (negro)	Establecido por el Ministerio
3.2	Platina de acero electrosoldado		
3.2.1	Material	Acero laminado	Establecido por el Ministerio

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. YANACO TIERRE CAYO FAU
DE CORA CORA PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIEC
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANACO TIERRE CAYO FAU
20514347221 soft
Módulo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 16:50:20 -05:00

PRONIEC
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Versión: 02
Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Módulo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 09:03:13 -05:00

PRONIEC
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Módulo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:08:32 -05:00

PRONIEC
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Módulo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:06:30 -05:00

3.2.2	Dimensiones mínimas	25mm x 30mm (Véase Lámina L-11A)	Establecido por el Ministerio
3.2.3	Tipo de perforación	"ojo chino"	Establecido por el Ministerio
3.2.4	Espesor	1,5 mm calibre 16	Establecido por el Ministerio
3.2.5	Soldadura	Metal Inner Gas (MIG) de micro alambre que no dejará escoria, previamente decapada.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.3.1.1 apartado c)
3.3	Tornillos		
3.3.1	Acabado	Tornillos de cabeza plana autorroscantes.	Establecido por el Ministerio
3.3.2	Dimensiones	4 mm x 20 mm	Establecido por el Ministerio

Nota 01: Los postores deberán presentar relación de especies de madera a utilizar en el proceso de fabricación, según lo estipulado en el numeral 3.1 De la Selección del capítulo III Información Complementaria.

Nota 02: El contratista podrá proponer una especie de madera similar o superior a las indicadas en el numeral 2.1, siempre y cuando esta cumpla con las características de la madera indicadas entre los numerales 2.2 al 2.9, para lo cual debe presentar la(s) ficha(s) técnica(s) de la especie(s) de madera, suscrita por el Contratista, especialista en el control de calidad de productos de madera o un laboratorio especializado en la investigación de la madera.

La propuesta deberá ser aprobada por la Entidad contratante, para esto, el contratista deberá presentar una solicitud a la Entidad contratante dentro de los 10 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, sin que se genere sobrecostos y modificaciones a los plazos contractuales establecidos por la Entidad.

Nota 03: Los listones de madera que componen cada uno de los elementos, asiento y respaldar de madera deberán ser de una misma especie maderable.

Nota 04: Se utilizará el Programa para determinar el Contenido de Humedad de Equilibrio (CHE) de la madera a nivel nacional. El aplicativo web "CHE Perú", se encuentra disponible en el siguiente enlace: <http://citemadera.itp.gob.pe/proyectos/che/>.

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: ROBLI
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221.pdf
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 18:50:30 -05

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: CAST
ZOPRILLA Quintana Florencio
20514347221.pdf
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 09:36:37 -05

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ZOPRILLA Quintana Florencio
Antonio FAU 20514347221.pdf
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 14.03.2023 12:08:50 -05

2.1.2. Marcado y/o rotulado

2.1.2.1. Logotipo institucional

Para identificar la procedencia institucional de la mesa de metal y madera para estudiante de 3° a 4° de secundaria, se colocará mediante técnica de pirograbado el logotipo institucional de la entidad contratante, en cada uno de los bienes a adquirir de acuerdo a lo señalado en la Lámina L-09.

El logo institucional tendrá las siguientes características:

Características	Especificación
Dimensiones	9 cm (ancho) x 3 cm (alto)
Grabado	Pirograbado
Fuente	Arial
Tamaño de letra	10 puntos mín.

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: BRAVO
JERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221.pdf
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 14.03.2023 09:03:23 -0600


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
DE CORA CORA PROVINCIA DE PARINAC DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



2.1.2.2. Identificación de fabricante

Para la identificación del fabricante de la mesa de metal y madera para estudiante de 3° a 4° de secundaria, se colocará una lámina autoadhesiva en cada uno de los bienes a adquirir. Este rotulado tendrá las siguientes características:

Características	Especificación
Dimensiones	8-12 cm (ancho) x 4-8 cm (alto)
Material	Autoadhesivo
Color	Verde
Fuente	Arial
Tamaño de letra	7 puntos mín.
Información a consignar	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de la entidad usuaria en el encabezado - Nombre del procedimiento de selección - Descripción de los bienes (código del bien y Nombre del bien) - Nombre del contratista, dirección y teléfono
Ubicación	Parte inferior del bien

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Empleado digitalmente por ROBLES
ANOC Tiberio Cayo FAU
0514347221 act
Firma: Day V. B.
Fecha: 15.03.2023 13:50:44 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Empleado digitalmente por CASTILLO
ARIFAN Rans Lupe FAU
0514347221 act
Firma: Day V. B.
Fecha: 15.03.2023 09:08:45 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Empleado digitalmente por
PRILLA QUISTANA Florencia
0514347221 act
Firma: Day V. B.
Fecha: 14.03.2023 12:09:03 -05:00

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN N°

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Código del bien, Nombre del Bien)

NOMBRE DEL CONTRATISTA (indicar el nombre de todas las empresas que conforman el consorcio de corresponder)

DIRECCIÓN

TELÉFONO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL COLÓN DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PERU, AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Cora
CIP: 211541

2.1.3. Embalaje

Los bienes deben de estar embalados en su totalidad, de forma que no se dañen o deterioren durante el transporte hasta el destino final, tomando en cuenta para la envoltura y embalaje, según lo indicado en la NTP 260.012:2017 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Embalaje. 3ª Edición.

2.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

2.2.1. Procedencia de la madera

El contratista debe garantizar el origen legal de la madera que utiliza como materia prima para la fabricación de mobiliarios de madera. Para ello, la madera que se adquiere debe estar sustentada con la Guía de Transporte Forestal (GTF), conforme a lo establecido en el Artículo 168 del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado mediante Decreto



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Empleado digitalmente por SPAYO
RRERO Genicio Elias FAU
14347221 act
Firma: Day V. B.
Fecha: 14.03.2023 09:03:14 -05:00

Supremo N° 018-2015-MINAGRI, en el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, según corresponda:

- Para los casos de madera de especies forestales nativas, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Transporte Forestal (GTF) que ampara la procedencia de la madera. En los casos de títulos habilitantes, en la GTF debe estar consignada la resolución de aprobación del plan de manejo forestal o resolución que aprueba el aprovechamiento forestal (reingresos, movilización de saldos, etc.).
- Para los casos de madera de especies forestales introducidas, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Remisión (GR) con la descripción de la especie que la identifique como introducida y el número de registro de la plantación.
- Para los casos de madera importada, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Remisión (GR) y los documentos de importación.

En el caso el contratista no pueda garantizar el origen legal de la madera, la Entidad contratante podrá notificar a las entidades sancionadoras, en el marco del Art. 215 del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.

2.2.2. Lugar de entrega

El lugar de entrega de los bienes será determinado por cada Entidad contratante, para lo cual brindará el detalle de la(s) dirección(es) respectiva(s). Para ello, podrá tomar en consideración el formato "Dirección(es) de Institución(es) de destino", adjunto en el Anexo N° 01.

Cualquier cambio respecto al lugar de entrega de los bienes dentro de la misma provincia, será comunicado al Contratista por la Entidad contratante, mediante correo electrónico hasta el inicio de la etapa de transporte y entrega de los bienes, sin que dicho cambio suponga una variación en plazos ni costos contractuales de ninguna índole.

En caso la Entidad contratante determine que la entrega de los bienes será en recintos de Instituciones Educativas Públicas, se podrá tomar en consideración el formato "Direcciones de Instituciones Educativas" adjunto en el Anexo N° 01. Asimismo, la Entidad contratante deberá realizar mediante correo electrónico, la notificación al Contratista, respecto de cualquier cambio sobre la asignación de los códigos modulares para la Institución Educativa, sin que dicho cambio suponga el incremento de costos o de tiempo de entrega, todo ello, antes de la elaboración de los Documentos que Acrediten la Entrega de los Bienes.

2.2.3. Etapas de la ejecución contractual

La ejecución se dará en 03 etapas:

1. Etapa de fabricación y embalaje de bienes
2. Etapa de Control de Calidad
3. Etapa de transporte y entrega de bienes

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gozsa o Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V.B.
Fecha: 15.03.2023 09:03:44 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARRAN Clara Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V.B.
Fecha: 15.03.2023 09:06:52 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antor o FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V.B.
Fecha: 15.03.2023 12:08:15 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V.B.
Fecha: 15.03.2023 18:50:54 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO WINTI HUIJUTIA N° 12 CRISTÓBAL COLÓN, DISTRITO DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO WINTI HUIJUTIA N° 12 CRISTÓBAL COLÓN, DISTRITO DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO
Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ETAPAS DE EJECUCIÓN		
N°	ETAPA	DESCRIPCIÓN
1)	Fabricación y embalaje de los bienes	El Contratista deberá llevar a cabo la fabricación de los bienes según lo establecido en la Sección Técnica de la presente ficha y sus respectivos anexos; y los numerales 2.2.6.1. Fabricación y 2.2.6.2. Embalaje.
2)	Control de Calidad	El contratista deberá llevar a cabo el control de calidad de los bienes, según lo establecido en el numeral 2.2.7.
3)	Transporte y entrega de los bienes	El Contratista deberá transportar y entregar la totalidad de los bienes, según lo establecido en los numerales 2.2.8.1. Transporte y 2.2.8.2. Entrega.

Consideraciones:

A partir de la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de los bienes, se ingresa a la etapa de control de calidad, dentro de dicho periodo se realizarán las siguientes actividades:

- Verificación Cuantitativa, a partir del día siguiente hábil del ingreso de la "Solicitud de verificación de cantidad por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes" (véase numeral 2.2.7.2)
- Verificación Técnica (véase numeral 2.2.7.3.), a partir del día hábil siguiente de emitido el Informe de Verificación Cuantitativa, contará con las siguientes subetapas:
 - Toma de muestras por parte del Organismo de Evaluación de la Conformidad (véase numeral 2.2.7.1.), a partir del día siguiente hábil de emitido el Informe de Verificación Cuantitativa.
 - Aplicación de métodos de ensayos de los bienes a cargo del Organismo de Evaluación de la Conformidad, a partir del día siguiente hábil de la suscripción del Acta de Toma de Muestras.
 - El Área Usuaria realizará las Inspecciones Técnicas a los bienes, las cuales físicamente se ejecutarán dentro del plazo máximo programado para la aplicación de métodos de ensayos antes mencionados.
- Verificación de la documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes, a partir del día siguiente hábil del ingreso de dicha documentación al Área Usuaria (véase numeral 2.2.7.4).
- Elaboración y notificación de los documentos que acredite entrega de los bienes, a partir del día siguiente hábil de realizada la notificación indicando la aprobación al sustento de las condiciones mínimas para el transporte de los bienes. Finaliza con la entrega de los documentos que acredite entrega de los bienes y la suscripción del Acta de Recepción Documentaria, entre la Entidad Contratante y el Contratista (véase numeral 2.2.8).

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEJO WILTON, STRAL V 12 CRISTO REY DE LA LUMBRAD, CAYO FAU, DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellón
 Residente de Obra
 CIP: 211541

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLE YANOC Tiberio Cayo FAU
 20514347221 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 15.03.2023 18:51:01 -05:00

2.2.4. Plazos de ejecución

El plazo de ejecución por cada etapa será determinado por la Entidad contratante de acuerdo con la cantidad de bienes a adquirir, la ubicación y accesibilidad al (a los) lugar(es) de destino, y cualquier otra consideración propia del requerimiento específico de la Entidad.

Considerar la información contenida en el siguiente cuadro, de forma referencial, para los plazos de la ejecución contractual.

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
 20514347221 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 14.03.2023 20:03:53 -05:00

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencia Antonio FAU 20514347221 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 14.03.2023 12:09:30 -05:00

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO PARRAN Merla Lupe FAU
 20514347221 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 15.03.2023 09:07:01 -05:00



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 98718

PLAZO DE EJECUCIÓN (días calendario)				
Cantidad de bienes a adquirir (Und.)	Etapas de fabricación y embalaje (días)	Etapas de control de calidad (días)	Etapas de transporte y entrega (días)	Plazo total de ejecución (días)
1-1,000	10-80	70-75	5-10	85-165
1,000-5,000	40-100	75-80	10-30	125-210
5,000 – 10,000	60-130	75-80	30-50	165-260
10,000 – más	Más de 130	Más de 80	Más de 50	Más de 260

En el siguiente cuadro se detalla el inicio y fin de los plazos respectivos por cada etapa:

PLAZO DE EJECUCIÓN			
Nº	ETAPA	PLAZO	
1)	Fabricación y embalaje de los bienes	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día siguiente de suscrito el contrato. (véase numeral 2.2.5.1 Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de fabricación y embalaje, por parte del contratista, se tomará en cuenta el día del ingreso de la Solicitud de verificación de cantidad. (véase numeral 2.2.6.1 Fabricación)
2)	Control de Calidad	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día siguiente del ingreso de la "Solicitud de verificación de cantidad por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes" (véase numeral 2.2.7.2)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de control de calidad, por parte del contratista, se tomará en cuenta la entrega de los Documentos que acrediten la entrega de bienes y la suscripción del ACTA DE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA, entre el Área usuaria y el CONTRATISTA. (véase numeral 2.2.8.2)
3)	Transporte y entrega de los bienes	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día calendario siguiente de suscrita el Acta de Recepción Documentaria, referida a las "Actas de Entrega de Bienes" entregadas por la Entidad al Contratista. (véase numeral 2.2.8.1 Transporte)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de transporte y entrega, por parte del contratista, deberá ingresar una carta en la cual deberá comunicar el término del Transporte y Entrega de los bienes, y se tomará en cuenta la fecha máxima de recepción consignada en los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes. (véase numeral 2.2.8.2 Entrega)
Nota 04: La propuesta del Contratista deberá considerar las previsiones necesarias para realizar la entrega en las instituciones beneficiadas, según las condiciones climáticas imperantes en la zona.			

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE INFRACSTRUCTURA EDUCATIVA
 Ing. Luis Escobar Bellón
 Residente de Obra
 CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE INFRACSTRUCTURA EDUCATIVA
 Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 98718

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRACSTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
 20514347221 soft
 Motivo: Day V B
 Fecha: 14.03.2023 09:04:03 -05:00

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRACSTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencio Antonio FAU 20514347221 soft
 Motivo: Day V B
 Fecha: 14.03.2023 12:02:44 -05:00

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRACSTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Mona Lupe FAU
 20514347221 soft
 Motivo: Day V B
 Fecha: 15.03.2023 09:07:00 -05:00

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRACSTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANCO Tibeno Osyo FAU
 20514347221 soft
 Motivo: Day V B
 Fecha: 15.03.2023 18:51:09 -05:00

2.2.5. Consideraciones generales

2.2.5.1. Requisitos a presentar para la suscripción del contrato

Para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar los siguientes documentos:

Documentación a presentar:

- Cronograma de ejecución del contrato.
- Detalle de los precios unitarios del precio ofertado.
- Presentación de talleres de producción y almacenes.
- Presentación de responsable general de operaciones.
- Declaración Jurada de Almacenaje de los Bienes.
- Plan Covid-19

En el siguiente cuadro se detallan los documentos antes mencionados:

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		
#	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
a)	Cronograma de ejecución del contrato	<p>Deberá incluir fechas y plazos programados para todas las etapas del contrato establecidos en el numeral 2.2.4. PLAZOS DE EJECUCIÓN.</p> <p>El Contratista deberá presentar un Cronograma Gantt en archivo nativo (formato editable) en programa MS Project, MS Excel o similar. Para ello, deberá ceñirse a los FORMATO N° 01 y FORMATO N° 02, adjuntos en el Anexo N° 05.</p>
b)	Detalle de los precios unitarios del precio ofertado	<p>El cuadro de "Detalle de los precios unitarios del precio ofertado" deberá ser desagregado por Institución de destino, y deberá detallar los costos de adquisición y entrega según la región donde se ubiquen las Instituciones de destino.</p> <p>Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N°03, adjunto en el Anexo N° 05.</p>
c)	Presentación de las ubicaciones de los talleres de producción y almacenes	<p>Se deberá presentar la(s) dirección(es) de su(s) instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes (máximo 04 instalaciones de almacenamiento y/o talleres de fabricación) y los datos del personal técnico de contacto.</p> <p>Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N° 04, adjunto en el Anexo N°05.</p>
d)	Presentación de responsable general de operaciones	<p>Se deberá presentar un formato donde se deberá designar un responsable, el que deberá contar con capacidad de decisión frente a cualquier contingencia que se presente y quien será la persona autorizada para coordinar directamente con la Entidad contratante aspectos relacionados con las prestaciones.</p> <p>Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N° 05, adjunto en el Anexo N° 05.</p>
e)	Declaración Jurada de Almacenaje de los Bienes	<p>El postor ganador deberá remitir una Declaración Jurada donde se compromete a realizar el almacenaje de los bienes en ambientes techados, sin goteras, sin filtraciones, a fin de garantizar la calidad e integridad de los bienes fabricados y/o almacenados.</p> <p>En caso de incumplimiento se aplicarán las penalidades estipuladas en el numeral 2.2.11.2. OTRAS PENALIDADES.</p>

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
COLECCIÓN DE DOCUMENTOS
DE CORA CORA PROVINCIA DE BARRANCA
Ing. Luis Escobar Bello
Residente de Bienes
P: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
/ANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:51:16 -05:00
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
COLECCIÓN DE DOCUMENTOS
DE CORA CORA PROVINCIA DE BARRANCA
REPARAMIENTO DE AYACUCHO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gocale Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 09:04:12 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORPILLA QUINTANA Fabiano
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:10:06 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Mana Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 09:07:16 -05:00



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

- Todos los documentos indicados en el presente numeral deberán ser presentados de forma digital e impresa, con la firma del representante legal, en idioma castellano.
- Toda la documentación a ser entregada por el Contratista se remitirá por Mesa de Partes de la Entidad contratante y/o el canal determinado por dicha Entidad.
- La Entidad contratante se encargará de revisar el "Cronograma de ejecución del contrato" y el "Detalle de los precios unitarios del precio ofertado" de la propuesta económica, para garantizar que se cumpla con el plazo de ejecución establecido. Luego de la revisión se emitirá la conformidad respectiva o se plantearán las observaciones que deben ser subsanadas por el postor dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- La presentación del cronograma no significa que existirá una variación del plazo de ejecución contractual con el que cuenta el Contratista para la ejecución de sus prestaciones, los cuales se indicarán según lo estipulado en el numeral 2.2.3. PLAZOS DE EJECUCIÓN.

El pago del adelanto se hará en la moneda establecida por la Entidad contratante.

El Área Usuaría de cada Entidad contratante determinará el correo electrónico a través del cual se realizarán todas las comunicaciones que emita durante la ejecución del contrato, lo cual será comunicado después de su suscripción.

En el caso que el Área Usuaría realice alguna modificación (ya sea un cambio y/o la adición de una nueva dirección electrónica para la comunicación) a la presente dirección, esta será notificada al Contratista vía correo electrónico durante la ejecución contractual.

La Entidad comunicará a la(s) Institución(es) de destino el contenido de las bases del presente procedimiento de selección con la finalidad que se tome conocimiento de la documentación y procedimientos que se seguirán en la entrega de los bienes.

El Contratista deberá llevar a cabo la fabricación y embalaje de los bienes según lo establecido en las presentes especificaciones técnicas y sus respectivos anexos.

El Contratista deberá presentar a través de una comunicación por Mesa de Partes de la Entidad, dirigida al Área Usaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, su Solicitud de Calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad adjuntando la información sustentatoria respecto a los Requisitos Mínimos para la selección de los Organismos de Evaluación de la Conformidad, dentro de los 10 días calendario contabilizados a partir del día calendario siguiente de suscrito el contrato, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.3.

Las muestras fabricadas por el Contratista no están incluidas en las cantidades propuestas a ser entregadas en las Instituciones beneficiadas; sin embargo, las muestras sí se contabilizan para la Verificación Cuantitativa.

A partir de la fecha de ingreso de la carta del Contratista donde comunica la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de los bienes, se llevará a cabo el proceso de control de calidad

El Contratista deberá ingresar, a través de Mesa de Partes, una carta dirigida a la Entidad, con copia al Área Usuaria, Área de logística, **GOBIERNO REGIONAL DE CASHUA** y Contrataciones o

el que haga sus veces, su Solicitud de Calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad, en la cual deberá comunicar la culminación de la fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes.

La carta deberá contener la siguiente documentación:

- Solicitud de verificación de cantidades por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes.
- Documentación sobre la Procedencia de la Madera indicado en el numeral 2.2.1. PROCEDENCIA DE LA MADERA.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procederá a aplicar la(s) penalidad(es) correspondiente(s), según lo establecido en el numeral 2.2.11. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2.6.2. Proceso de embalaje

Los bienes deben de estar embalados en su totalidad, de forma que no se dañen o deterioren durante el transporte y almacenamiento hasta el destino final, tomando en cuenta para la envoltura y embalaje, lo indicado en el numeral 2.1.3 Embalaje.

2.2.6.3. Inspecciones inopinadas

La Entidad podrá realizar inspecciones inopinadas a las instalaciones de la fábrica y/o almacenes para verificar o supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, procesos productivos, en aras de velar por el cumplimiento de los plazos de ejecución de la etapa de Fabricación y Embalaje, sin que ello perjudique el desarrollo del proceso de adquisición.

En las Inspecciones Inopinadas realizadas durante el proceso de fabricación de los bienes, la Entidad podrá tomar muestras de los bienes que se encuentren terminados hasta ese momento para analizarlos con equipos de medición para determinar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Los análisis de las muestras obtenidas dentro del plazo de adquisición no representan una paralización en los tiempos de ejecución contractual de los bienes contratados.

Asimismo, la Entidad verificará los procesos de fabricación y el apilado, tanto de la materia prima como de los bienes conforme al avance hasta el momento de realizada la inspección inopinada.

Al finalizar las Inspecciones Inopinadas, se deberá suscribir el Acta de visita inopinada, por el representante del Contratista y la Entidad.

Las inspecciones inopinadas serán programadas dentro del horario establecido por la Entidad.

El formato referencial del Acta de Visita Inopinada se encuentra en el Anexo N° 06.

2.2.7. Control de calidad

Durante el periodo del proceso de control de calidad se realizarán actividades para la emisión de la conformidad de la etapa de fabricación, y posteriormente, el informe de cumplimiento de especificaciones técnicas a verificación de la documentación referida al sustento de las condiciones mínimas previo al inicio de la etapa de transporte.

El control de calidad inicia con la Verificación Cuantitativa y culmina con la emisión del Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

El control de calidad involucra la participación del Contratista, la Entidad, el Área Usaria, el Área designada para el conteo de bienes y el Organismo de Evaluación de la Conformidad en las siguientes actividades:

- Verificación Cuantitativa por parte del Área designada por la Entidad.
- Verificación Técnica: Elección del organismo de evaluación de la conformidad, Toma de Muestras y aplicación de los métodos de ensayos por el Organismo de Evaluación de la Conformidad, y las Inspecciones Técnicas por la Entidad.

Los empaques de los bienes y los costos que se generen producto de la Verificación Cuantitativa y de la Verificación Técnica serán realizados y asumidos por el Contratista.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE MANEJO DEL SERVICIO DE
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE
CÓDIGO DE CORA CORA
Ing. Luis Escobar Bellido
Resolución de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE MANEJO DEL SERVICIO DE
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE
CÓDIGO DE CORA CORA
Ing. Richard Wilver Lancha Vergas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221.pdf
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 18:51:38 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221.pdf
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 14.03.2023 06:04:00 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTERO Florencio
Antonio FAU 20514347221.pdf
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 14.03.2023 19:40:00 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221.pdf
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 14.03.2023 06:07:00 -05:00

Posteriormente se procede a la verificación de la documentación referida al sustento de las condiciones mínimas para el transporte presentado por el contratista, previo al inicio de la etapa de transporte. Presentación de la documentación referida al Transporte de Bienes por parte del Contratista.

2.2.7.1. Sobre la solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad

El Contratista deberá ingresar la "Solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad", consignando mínimo de 02 y un máximo 03 propuestas, las cuales serán calificadas por el Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, con la finalidad de que cumplan con los requisitos mínimos para realizar la Verificación Técnica a través de métodos de ensayo (según lo especificado en el Anexo N° 02). El Organismo de Evaluación de la Conformidad deberá cumplir con los siguientes Requisitos Mínimos:

1. Deberá acreditar experiencia específica en la realización de los métodos de ensayos descritos en el ANEXO 02. Dicha experiencia deberá ser acreditada mediante copia simple de contratos u órdenes de servicio, con una antigüedad no mayor de 5 años, y su respectiva conformidad o constancia de prestación efectuada; y/o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite fehacientemente con voucher de depósito y/o reporte de estado de cuenta o cancelación en el documento; y/o otros documentos que acrediten fehacientemente la elaboración del informe.
2. La propuesta sobre el plazo de ejecución del servicio no deberá superar los 40 días calendarios como máximo.

El Contratista deberá presentar a través de una comunicación por Mesa de Partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, su Solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad adjuntando la información sustentatoria respecto a los Requisitos Mínimos para la selección de los Organismos de Evaluación de Conformidad, dentro de los 10 días calendario contabilizados a partir del día calendario siguiente de suscrito el contrato.

El Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, notificará al Contratista respecto a la calificación de las propuestas del Organismo de Evaluación de la Conformidad, dentro de los 05 días hábiles siguientes a la recepción de dichas propuestas.

De existir observaciones a las propuestas para la calificación, el Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, notificará de manera electrónica al Contratista sobre las mismas, indicándole un plazo de subsanación de 02 a 08 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente calendario de la mencionada notificación hasta el ingreso de la subsanación correspondiente, por Mesa de partes de la Entidad.

Dentro del plazo establecido para levantar las observaciones, el contratista deberá entregar una carta por mesa de partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, adjuntando la documentación completa y necesaria para dichos fines.

De no encontrarse observaciones, o encontrarse las mismas subsanadas, el Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, notificará electrónicamente al Contratista que cuenta con la aprobación de la documentación requerida sustentatoria para su elección del Organismo de Evaluación de la Conformidad y adjuntará la calificación de las propuestas presentadas con la finalidad de que el contratista pueda elegir al Organismo de Evaluación de la Conformidad.

2.2.7.2. Verificación cuantitativa

Una vez que el Contratista ingresa su carta de culminación de la fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes, la Entidad contratante designará al Área encargada de realizar la verificación cuantitativa, en presencia de un especialista del Área Usuaria.

El Área designada por la Entidad, procederá con la verificación de las cantidades de los bienes en su totalidad (por unidad de bien, no piezas). Cabe señalar, que los bienes deben

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD
COLEGIO MATEO A. GARCIA
DE CORA CORP. PRODUCTORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Ing. Luis Escobar Bellino
Residente en Ayacucho
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD
COLEGIO MATEO A. GARCIA
DE CORA CORP. PRODUCTORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
LUIS GARCIA Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 15/03/2023 10:51:43 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 15/03/2023 09:58:48 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORPILLA QUINTANA Florencio
ANTONIO FAU 20514347221 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 15/03/2023 10:40:20 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 15/03/2023 09:07:33 -05:00

estar empaquetados y embalados en el momento de la verificación, según lo establecido en el numeral 2.2.6.2. Embalaje.

La Verificación Cuantitativa deberá efectuarse en el(los) almacén(es) consignado(s) por el Contratista, en el plazo establecido por la Entidad, para lo cual la Entidad programará la fecha y hora, previa comunicación con el Contratista.

De no contar con el 100% de los bienes fabricados y embalados, incluyendo la totalidad de las muestras, se considerará como incumplimiento por parte del Contratista, no representa una observación y la Entidad procederá a aplicar las penalidades que corresponda de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se tendrá que reiniciar la verificación cuantitativa una vez que el Contratista lo solicite nuevamente al ingresar una segunda carta de Solicitud de Verificación de cantidad por la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes, por Mesa de Partes de la Entidad, con copia al Área Usuaria, para proceder con la Verificación Cuantitativa según lo anteriormente descrito. (Véase Nota 05)

Al término de la verificación cuantitativa, se deberá suscribir el Acta de Verificación Cuantitativa de bienes por ambas partes (Contratista y representantes de la Entidad), en la que se consignará el cumplimiento de la obligación del Contratista.

La verificación cuantitativa finaliza con la emisión del "Informe de Verificación Cuantitativa" de parte del Área designada, donde se comunicará al Área Usuaria, el resultado del trabajo de verificación cuantitativa, en el cual se deberá adjuntar el Acta de Verificación Cuantitativa.

El formato referencial para el Acta de Verificación Cuantitativa se encuentra en el Anexo N° 06.

Nota 05: El proceso de control de calidad inicia a partir del ingreso de la "Solicitud de verificación de cantidad por la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes" por parte del Contratista, vía Mesa de Partes de la Entidad contratante.

2.2.7.3. Verificación técnica

Después de emitido el "Informe de Verificación Cuantitativa", la Entidad y un Organismo de Evaluación de la Conformidad realizarán la Verificación Técnica.

La Verificación Técnica inicia con la toma de muestras de los bienes fabricados, continúa con la aplicación de métodos de ensayos a las muestras, así como con las Inspecciones técnicas por parte del Área Usuaria y culmina con la emisión del "Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" del Área Usuaria.

La calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad será realizada por el Área Usuaria, remitiendo el resultado de la calificación de las propuestas al contratista, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.1.

La elección del Organismo de Evaluación de la Conformidad será realizada por el contratista, tomando en cuenta la calificación realizada por el Área Usuaria de la Entidad contratante.

Los costos de las pruebas y/o aplicación de métodos de ensayos para las muestras, así como los gastos generados para la presencia del personal de laboratorio y la toma de muestras por la contratación del Organismo de Evaluación de la Conformidad deberán ser asumidos por el Contratista, incluyendo volver a aplicar los métodos de ensayos en caso los bienes se encuentren observados.

2.2.7.3.1. Sobre las muestras y la aplicación de métodos de ensayo.

El contratista debe proveer las muestras para cada tipo de bien según corresponda, de acuerdo con lo señalado en el Anexo N°02.

Se precisa que el Organismo de Evaluación de la Conformidad realizará la aplicación de métodos de ensayos y pruebas a las muestras tomadas de los bienes según lo estipulado en el Anexo N° 02.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ZONA URBANA DE LA COMUNA DE TURA COMA TURA"
C/O. AREA DE INGENIERIA DE OBRA
Ing. Luis Soccar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211341

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ZONA URBANA DE LA COMUNA DE TURA COMA TURA"
C/O. AREA DE INGENIERIA DE OBRA
Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLE YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:51:53 -05

El número de muestras para los ensayos y/o pruebas para la certificación serán fabricadas por el Contratista, de acuerdo con la NTP 260.014.2021. Las muestras fabricadas por el contratista no están incluidas en las cantidades propuestas a ser entregadas en las Instituciones de destino; sin embargo, las muestras sí se contabilizan para la Verificación Cuantitativa según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2.

2.2.7.3.2. Toma de muestras

A partir del día siguiente hábil de recibido el Informe de Verificación Cuantitativa en el Área Usuaría, indicando la conformidad de la misma, el Área Usuaría y el Contratista coordinarán la fecha para la Toma de Muestras.

La toma de muestras para la aplicación de métodos de ensayos se deberá realizar en uno de los almacenes del Contratista en presencia de un representante de la Entidad. La(s) dirección(es) del (de los) almacén(es) debe coincidir con la información presentada para la suscripción del contrato o, de corresponder, con la información modificada mediante el procedimiento establecido en el numeral 2.2.5.1. Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato.

Se precisa que las muestras se toman bajo el nivel de inspección S1 de la NTP 260.014.2021 vigente.

El Organismo de Evaluación de la Conformidad tomará la cantidad de muestras del tipo de mobiliario, realizando una selección de manera aleatoria, en presencia de un representante del Contratista y del Área Usuaría, procediendo a llevarlos a sus instalaciones para la evaluación y/o procedimientos correspondientes, según lo estipulado en la NTP 260.014.2021. En este momento se suscribirá el Acta de Toma de Muestras entre la Entidad, el Contratista y el Organismo de Evaluación de la Conformidad.

Es de responsabilidad del Contratista programar la fecha de toma de muestras para la aplicación de métodos de ensayos y cumplir con entregar la documentación requerida en los plazos establecidos.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procederá a aplicar la(s) penalidad(es) correspondiente, según lo establecido en el numeral 2.2.11. Incumplimiento de Contrato y Penalidades.

El formato referencial del Acta de Toma de Muestras se encuentra en el Anexo N° 06.

2.2.7.3.3. Métodos de ensayo

El Contratista deberá entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, el "Informe de ensayos" en el plazo establecido por la Entidad, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del "Acta de Toma de Muestras", según lo estipulado en el Anexo N° 02.

El "Informe de ensayos" deberá incluir los Informes técnicos de las pruebas y/o métodos de ensayos realizados a las muestras, los cuales serán acreditados por el Organismo de Evaluación de la Conformidad seleccionado por la Entidad, según lo establecido en el numeral 2.2.6.1.

El Área Usuaría revisará el "Informe de Ensayos" en un plazo de 3 a 7 días calendario.

De encontrarse alguna(s) observación(es) en el informe de ensayos elaborado por el Organismo de Evaluación de la Conformidad, será(n) consignada(s) en el Informe de Especialista según lo descrito en el numeral 2.2.7.3.4. y se le otorgará un plazo definido por la Entidad contratante de acuerdo a la complejidad de la observación, para el levantamiento de las observaciones correspondientes.

El Contratista deberá ingresar una carta por Mesa de Partes de la Entidad y dirigida al Área Usuaría, dentro del plazo que se le otorgue, donde comunicará el levantamiento de observaciones, a fin de proceder con la verificación correspondiente. En caso el contratista

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tibero-Cayo FAU
20514347221 soft
Módulo: Doc V° B°
Fecha: 16.03.2023 12:51:59 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por GASTI
PARFAY Maria-Luise FAU
20514347221 soft
Módulo: Doc V° B°
Fecha: 16.03.2023 13:00:47 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE ASesorIA TECNICA Y LOGISTICA
DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO
Ing. Luis Federico
Presidente de Obra
CIP: 211541



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE ASesorIA TECNICA Y LOGISTICA
DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO

Ing. Richard Wilmar Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 38718



PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
IPRILLA QUINTANA FERNANDEZ
Cayo FAU
20514347221 soft
Módulo: Doc V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:10:35 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
HERRERO Gonzalo Elias FAU
514347221 soft
Módulo: Doc V° B°
Fecha: 14.03.2023 09:06:29 -05:00

incumpla con la presentación de levantamiento de observaciones en el plazo establecido, la Entidad procederá a aplicar la(s) penalidad(es) correspondiente(s), según lo establecido en el numeral 2.2.11.2 OTRAS PENALIDADES.

Comunicada la subsanación, la Entidad procederá a realizar la verificación del Levantamiento de Observaciones en presencia del Organismo de Evaluación de la Conformidad, a fin de que se proceda con la nueva Toma de Muestras del lote observado (en caso las observaciones contemplen de nuevo la aplicación de métodos de ensayos); y en caso las observaciones no requieran de realizar nuevamente ensayos al lote a través de muestreo, el especialista de la Entidad podrá realizar la verificación correspondiente.

El Contratista deberá contar con la totalidad del lote y adicionalmente el total de las muestras para subsanación de observaciones, de lo contrario se considerará como incumplimiento en el levantamiento de observaciones, pudiendo la Entidad aplicar las penalidades y/o acciones correspondientes según el numeral 2.2.11. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

Si pese al plazo de subsanación otorgado, el Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato total o parcialmente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades en las que hubiera incurrido.

Si los bienes manifiestamente no cumplen con las características y condiciones ofrecidas, la Entidad no efectuará la recepción de los mismos, debiendo considerarse como no ejecutada la etapa, aplicándose las penalidades que correspondan de acuerdo a Ley.

2.2.7.3.4. Inspecciones técnicas

El Área Usuaría podrá realizar inspecciones técnicas a los bienes en paralelo a la aplicación de métodos de ensayos realizados por el Organismo de Evaluación de la Conformidad durante el periodo de Verificación Técnica, donde el Contratista y la Entidad suscribirán el(las) Acta(s) de Verificación Técnica.

De encontrarse alguna observación en la(s) inspección(es) técnica(s) realizadas por el Área Usuaría, serán consignadas en un Informe de Especialista, y de corresponder, complementarán a las observaciones realizadas por el Organismo de Evaluación de la Conformidad. Estas observaciones serán notificadas al Contratista mediante un documento elaborado por el Área Usuaría, donde se detallen las observaciones realizadas por el Organismo de Evaluación de la Conformidad y las observaciones realizadas por el Especialista de la Entidad.

El Contratista deberá absolver las observaciones en un plazo no menor de 02 días ni mayor de 08 días calendario, contados a partir del día siguiente de realizada la notificación presencial y/o electrónica, para lo cual deberá ingresar una carta por Mesa de Partes de la Entidad y dirigida al Área Usuaría, donde comunicará el levantamiento de observaciones, a fin de que el Área Usuaría proceda a realizar la verificación de la subsanación de observaciones, dejando constancia de ello mediante la suscripción del Acta de Verificación Técnica por parte del Contratista y la Entidad.

La Entidad puede complementar las Acta(s) de Verificación Técnica con registro de evidencias filmicas y/o fotográficas de la situación encontrada en la(s) revisión(es) técnica(s).

De no encontrarse observación o de encontrarse las mismas subsanadas, el Área Usuaría elaborará el Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de la etapa de Fabricación y Embalaje.

Los formatos referenciales del Acta de Verificación Técnica y del Acta de Verificación de Levantamiento de Observaciones se encuentran en el Anexo N° 06.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE AYACUCHO
Ing. Luis E. Cordero Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE AYACUCHO
Ing. Richard Wiver Lancha Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 18:52:09 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Versión: 02

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 12:41:26 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
CORBILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 12:41:26 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 18.03.2023 12:41:26 -05:00

Página 18 de 52

2.2.7.4. Documentación para el transporte de los bienes

A fin de garantizar que el transporte de los bienes se mantenga dentro de los niveles de calidad y seguridad, el Contratista deberá presentar al Área Usuaria, a través de Mesa de Partes de la Entidad, los documentos sobre el transporte de los bienes, en el plazo establecido por la Entidad, contabilizado a partir del día siguiente de la notificación por correo electrónico realizada por el Área Usuaria.

De no presentar la documentación completa y en el plazo estipulado por la Entidad, el Contratista será penalizado de acuerdo con el numeral 2.2.11.2. OTRAS PENALIDADES.

El Área Usuaria deberá revisar y verificar que el Contratista cumpla con las condiciones mínimas antes del inicio de la etapa de Transporte y Entrega de los bienes hasta los lugares de destino.

De existir observaciones, el Área Usuaria podrá notificar de manera electrónica al Contratista sobre las mismas, indicándole un plazo de subsanación de 02 a 08 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente calendario de la mencionada notificación.

Para la subsanación de las observaciones, el Contratista deberá ingresar una carta por Mesa de Partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, adjuntando la documentación completa y necesaria para dichos fines. La fecha de ingreso de la carta por Mesa de Partes se contabilizará como fecha fin del plazo para la subsanación de observaciones.

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el Área Usuaria notificará electrónicamente al Contratista indicándole que cuenta con la aprobación de la Documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes, sin perjuicio de las condiciones operativas y/o de vigencia documentaria que se deben mantener para la totalidad de la documentación solicitada.

La documentación requerida se detalla a continuación:

Documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes	
Nº	Documentación Requerida
1	<p>Póliza de Seguro de transporte terrestre nacional</p> <p>El transporte de los bienes deberá contar con la póliza de seguro a nivel nacional.</p> <p>VALOR MÍNIMO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL será el 100% del valor del monto adjudicado.</p> <p>Adicionalmente la póliza deberá hacer referencia al procedimiento de selección y/o al número de contrato, pudiendo realizarse mediante un anexo a la póliza o cualquier documento adicional emitido por la aseguradora.</p> <p>Todo esto por la reposición de los bienes transportados en caso de siniestro, esta póliza deberá ser efectiva antes del inicio de la etapa de transporte y entrega de los bienes.</p>
2	<p>SCTR</p> <p>SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para el personal del contratista asignado para la realización del servicio de transporte y entrega de los bienes.</p>
3	<p>Flota de Vehículos</p> <p>Relación completa de los vehículos a utilizar especificando como mínimo: modelo, placa, tarjeta de propiedad, tarjeta de Habilitación vehicular para el transporte de mercancías, tipo de vehículo, capacidad máxima de carga de vehículo expresado en kilogramos y en pesos cúbicos, copia simple de la Tarjeta de Propiedad, SOAT vigente de cada una de las unidades, REVISIÓN TÉCNICA vehicular aprobada y vigente de acuerdo con ley.</p> <p>La antigüedad máxima de los vehículos será de 10 años, contabilizados a partir del año siguiente de fabricación de estos.</p>

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO
 In. Luis Escobar Bellido
 Residente de Cora
 CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO
 Ing. Richard Uribe Cancho Vargas
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 98718

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL



4	<p>Autorización para prestar Servicio de Transporte de Mercancías en General:</p> <p>Otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (acreditado mediante copia simple y/o copia simple de la página web del MTC donde figure la inscripción en el citado registro); asimismo cabe precisar que, respecto al Transporte de los bienes, este deberá cumplir con ser un vehículo cerrado a fin de garantizar la seguridad e integridad de los bienes y su distribución vía terrestre.</p> <p>En caso el contratista opte por subcontratar el servicio de transporte, deberá presentar la autorización de la empresa subcontratada.</p> <p>En caso de uso de otras vías de transporte (fluvial, marítima, etc.), el contratista deberá agregar propuesta de la ruta y tipos de vehículos a utilizar, adjuntando imagen referencial de vehículos.</p>
5	<p>Plan COVID-19</p> <p>"Plan para vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" aprobado por el sector competente, debidamente registrado en el Sistema integrado para COVID-19 (SICOVID-19) adjuntando la constancia del sector competente, la constancia del registro en SICOVID-19, el correo de envío al MINSA, según corresponda en el marco de lo establecido por el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM; Decreto Supremo 110-22-PCM; Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA; la Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC/01, modificada por la Resolución Ministerial N° 0301-2020 MTC/01, sus modificatorias y demás normas que emita el sector correspondiente.</p>

2.2.8. Etapa de transporte y entrega de los bienes

El Área Usaria realizará la notificación electrónica al Contratista, indicándole la aprobación de la documentación presentada según lo establecido en el numeral 2.2.7.4. Documentación para el Transporte de los bienes.

Con la aprobación de la Documentación para el transporte de los bienes, la entidad elaborará los documentos que acredite la entrega de los bienes, teniendo como plazo de 3 - 15 días calendario, los mismos que serán notificados por correo electrónico al contratista a fin de que se apersona a recogerlos en un plazo no mayor de 3 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de recibida la notificación.

El inicio del plazo de la etapa de transporte y entrega de los bienes a los destinos especificados en el numeral 2.2.1. LUGAR DE ENTREGA, es a partir del día calendario siguiente de la suscripción del Acta de Recepción Documentaria por el Contratista. Para el cómputo del plazo de la fecha de culminación del transporte y entrega de los bienes, se considera la última fecha que figure en el(los) Documentos que Acredite Entrega de los Bienes de la Entidad, según lo establecido en el numeral 2.2.3. PLAZOS DE EJECUCIÓN.

El formato referencial del Acta de Recepción Documentaria se encuentra en el Anexo N° 06.

2.2.8.1. Transporte

El Contratista deberá realizar el transporte de los bienes a las Instituciones de destino, en cumplimiento con los requisitos solicitados en el numeral 2.2.7.4. Documentos sobre el Transporte de los bienes.

El Área Usaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, realizará la notificación por correo electrónico al Contratista, a fin de que se apersona a recoger el(los) Documentos que Acredite Entrega de los Bienes de la Entidad, en el plazo establecido por la Entidad, caso contrario será penalizado según el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

Al momento de la entrega del (de los) Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, se suscribirá el Acta de Recepción Documentaria por el Contratista.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA DE COPIA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO
Ing. Luis Esobar Bellio
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA DE COPIA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO
Ing. Richard Winer Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROSLES
YANOC Tibeño Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.02.2023 18:52:24 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.02.2023 11:12:25 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.02.2023 12:12:19 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.02.2023 09:08:03 -05:00

Los datos de la institución de destino y su personal para la recepción de los bienes y el firmado del Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, serán coordinados directamente por el Contratista.

Finalizada la Entrega de la totalidad de bienes, el Contratista deberá presentar al Área Usuaría, por Mesa de Partes de la Entidad, una carta documentada que indique la culminación del transporte y entrega de la totalidad de los bienes en la(las) institución(es) de destino.

La carta deberá contener lo siguiente:

- Los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes originales establecida por la Entidad.
- Guías de remisión del transportista, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2. ENTREGA.
- Copias del DNI del firmante, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2. ENTREGA.
- Certificados de Garantía de Adquisición de los bienes (véase el numeral 2.2.12. GARANTÍA COMERCIAL DE LOS BIENES)
- Informe Fotográfico de Entrega de Bienes donde se adjunten fotografías y/o videos de los bienes siendo entregados en la(s) dirección(es) que figure(n) en el numeral 2.2.2. LUGAR DE ENTREGA. Estas fotografías y/o videos servirán para acreditar la correcta entrega de los bienes, debiendo figurar como mínimo la siguiente información:

- Fotografía y/o video del vehículo iniciando la descarga de los bienes, en la cual se muestre la placa del vehículo.
- Fotografía y/o video mostrando las Instalaciones de la Institución de destino. Mínimo 1 fotografía y/o video de 10 segundos aproximados.
- Fotografía del representante de la Institución de destino, en el momento de la recepción de los bienes. Mínimo 1 fotografía y/o video de 10 segundos aproximados.
- Fotografías y/o videos mostrando el estado de los bienes, recepcionados mostrando el logotipo y rotulado de los bienes. Mínimo 2 fotografías y/o videos de 10 segundos aproximados.

2.2.8.3. Verificación documentaria

Finalizada la Entrega de la totalidad de bienes, el Contratista deberá presentar al Área Usuaría, por Mesa de Partes de la Entidad, una carta documentada que indique la culminación del transporte y entrega de la totalidad de los bienes en la(las) institución(es) de destino.

La documentación mencionada como parte de la carta de culminación del transporte y entrega de los bienes según lo estipulado en el numeral 2.2.8.2., será parte integral de la Verificación Documentaria que realizará el Área Usuaría.

De encontrarse alguna observación en el marco de la verificación documentaria ésta deberá ser remitida al Contratista de manera electrónica y/o física por el Área Usuaría; otorgando un plazo de entre 02 a 08 días calendario para subsanarlas.

El Contratista deberá remitir al Área Usuaría una carta por Mesa de Partes de la Entidad, indicando el levantamiento de observaciones, adjuntando la subsanación correspondiente.

La fecha de ingreso de dicha comunicación a la Entidad se tomará como fecha de fin de subsanación de las observaciones.

Si pese al plazo otorgado, el Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato total o parcialmente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades a que hubiera incurrido; y en el marco de la ley vigente.

De no encontrarse observación o de encontrarse las mismas subsanadas por el Área encargada de emitir los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, procederá a

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
COLEGIO MIXTO "SANTO CRISTO RE" DE LA ZONA DE CORA CORA, PROVINCIA DE
DE CORA CORA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar B. 
Representante de Obra
CIP: 211541

PRONIEC
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20614347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 18:52:19 -05:00

PRONIEC
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI
FARFAN María Lupe FAU
20614347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 09:05:19 -05:00

PRONIEC
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ERRERO Gonzalo Elias FAU
20614347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 14.03.2023 12:19:22 -05:00

PRONIEC
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
ERRERO Gonzalo Elias FAU
20614347221 soft
Fecha: 14.03.2023 11:14:06 -05:00



elaborar el Informe de Cumplimiento Documentario, el cual servirá para la elaboración de la Conformidad de la etapa de Transporte y Entrega de los bienes, la cual estará a cargo del Área Usuaria.

Asimismo, el Área Usuaria notificará de manera presencial y/o electrónica al Contratista para que proceda con el ingreso de la(s) Factura(s) y CCI correspondiente.

2.2.9. Conformidades

2.2.9.1. Conformidad por fabricación y embalaje

Una vez notificado el "Informe de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" por la Entidad, el Contratista deberá entregar los siguientes documentos:

- Factura

Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista. Los documentos necesarios para el pago de la conformidad de la etapa de Fabricación y Embalaje de los bienes son los siguientes:

- Informe de Verificación Cuantitativa (emitido por el Área designada por la Entidad)
- Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (emitido por el Área Usuaria)
- Factura (remitido por el Contratista)
- Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista (remitido por el Contratista).

Una vez que el Área Usuaria tenga la totalidad de los documentos antes señalados, se procederá a otorgar la "Conformidad por fabricación y embalaje de los bienes" por parte de la Entidad.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los 10 días calendario siguientes a la "Conformidad por fabricación y embalaje de los bienes", siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

2.2.9.2. Conformidad por transporte y entrega

Una vez notificado el "Informe de Cumplimiento Documentario" por la Entidad, el Contratista deberá entregar los siguientes documentos:

- Factura

Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista. Los documentos necesarios para el pago de la conformidad de la etapa de Transporte y Entrega de los bienes son los siguientes:

- Informe de Cumplimiento Documentario (emitido por el Área de la Entidad que emita los Documentos que acredite Entrega de los Bienes)
- Acta de Recepción Documentaria (suscrita por el Contratista)
- Factura (remitido por el Contratista)
- Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista (remitido por el Contratista)

Una vez ingresado los documentos antes señalados por parte del Contratista y realizada su verificación, se procederá a otorgar la "Conformidad por el transporte y entrega de los bienes" por parte de la Entidad.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los 10 días calendario siguientes a la "Conformidad por el transporte y entrega de los bienes", siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

2.2.10. Forma de pago

La Entidad emitirá los pagos según el siguiente detalle:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GLERPERO Gonzalo E. as FAU
20514347221 scf
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 14.03.2023 11:11:47 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA CUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 scf
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 14.03.2023 12:13:36 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARRAN Maria Lupe FAU
20514347221 scf
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 09:06:28 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
ANCO Tiberio Cayo FAU
20514347221 scf
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 18:52:55 -05:00

I. PAGO POR FABRICACIÓN Y EMBALAJE DE LOS BIENES	
Forma de Pago	Monto de Pago
Para el pago por fabricación y embalaje de los bienes, el Contratista deberá seguir el procedimiento detallado en el numeral 2.2.9.1 Conformidad por Fabricación y Embalaje)	El porcentaje y/o monto del pago será definido por la Entidad.
II. PAGO POR TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIENES	
Forma de Pago	Monto de Pago
Para el pago por transporte y entrega de los bienes, el Contratista deberá seguir el procedimiento detallado en el numeral 2.2.9.2 Conformidad por Transporte y Entrega).	El porcentaje y/o monto del pago será definido por la Entidad.

2.2.11. Incumplimiento de contrato y penalidades

2.2.11.1. Penalidades

En caso que el contratista incumpliera de forma injustificada con los plazos descritos en la presente ficha de homologación, será indefectiblemente objeto de las penalidades correspondientes según las Normas Legales vigentes (Artículo N°162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones); por consiguiente, la Entidad cobrará a través de las deducciones correspondientes.

2.2.11.2. Otras penalidades

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se determinan otras penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente y directamente relacionadas con los Bienes en el ANEXO N° 4.

La aplicación de la penalidad no exceptúa al Contratista de su responsabilidad, sobre los daños a las Instituciones de destino o terceros, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

Nota 06: La Entidad contratante podrá determinar el monto (M) dependiendo de las características del Requerimiento.

2.2.11.3. Resolución de contrato

Será motivo de la Resolución de Contrato: el incumplimiento parcial o total del Contrato, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.2.12. Garantía comercial de los bienes

CONSIDERACIONES DE LA GARANTÍA	
Garantía de los Bienes	05 años
Aplicación de Garantía (Véase Nota 07)	Hasta 15 días calendario como máximo para brindar solución; contabilizado a partir del día calendario siguiente de notificada la solicitud de aplicación de garantías.

Nota 07: La Entidad contratante podrá determinar el tiempo adecuado según el requerimiento.

El Contratista es responsable por la garantía de los bienes. La garantía es por defectos de Fabricación / Adquisición y Embalaje y no por mal uso de los bienes por parte del usuario final.

El plazo de la garantía cuenta a partir del día siguiente calendario de firmado los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes por Representantes de cada Institución de destino según lo estipulado en el numeral 2.2.6.

La garantía deberá estar acreditada por documentación del Contratista, esta documentación deberá estar firmada por su representante legal, referida a los bienes ofertados y su transporte y entrega realizada.

Se deberá entregar 01 Certificado de Garantía por cada Institución de destino, los mismos que serán remitidos a la Entidad para la elaboración de la conformidad de la prestación, estipulando claramente el inicio del plazo de garantía de los bienes, las descripciones y números de series de los mismos, de corresponder.

El Contratista garantizará la calidad de los bienes fabricados de acuerdo a los planos y demás documentos contractuales según las especificaciones técnicas del bien.

La Entidad notificará al Contratista de cualquier reclamo relacionado con la garantía de manera física y/o mediante correo electrónico, el Contratista al recibir esa notificación deberá tomar las acciones correspondientes para informar y/o reparar y/o reemplazar los bienes y/o componentes y/o instalaciones defectuosas en su totalidad o en parte según sea el caso, en las Instituciones de destino sin costo alguno para éstas, ni para la Entidad.

Si el Contratista después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del plazo indicado en el cuadro de consideraciones de garantía entonces la Entidad podrá tomar las medidas correctivas que sean necesarias, por su propia cuenta y riesgo y sin perjuicio de los demás derechos que la Entidad tenga ante el Contratista, en conformidad con la legislación vigente.

2.2.13. Responsabilidad por vicios ocultos

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo de 05 años.

Este plazo cuenta a partir del día siguiente de emitida la conformidad de la prestación por parte del área usuaria.

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

3.1 De la selección:

Documentos de presentación obligatoria por el postor:

- Relación de especies de madera a utilizar en el proceso de fabricación del bien especificado en la presente ficha de homologación. Dicha relación se presentará con el formato de Ficha de presentación de producto adjunta en el Anexo N° 07.

IV. ANEXOS

- Anexo N° 01: Formato del Lugar de destino
 - Dirección(es) de Institución(es) Educativa(s) de destino
- Anexo N° 02: Pruebas y/o ensayos para la verificación de calidad
- Anexo N° 03: Planimetría
- Anexo N° 04: Cuadro de Otras penalidades
- Anexo N° 05: Requisitos que presentar para la Suscripción del Contrato
- Anexo N° 06: Actas referenciales para el proceso de ejecución contractual
- Anexo N° 07: Ficha de presentación de producto

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514247221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 11:10:22 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencia Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:14:30 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:08:49 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANCO Tiberio Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 13:53:11 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO "DINOCENTRAL" 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PAMPAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Cora
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO "DINOCENTRAL" 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PAMPAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 02713

ANEXO N° 01 FORMATO PARA INDICAR LUGAR DE DESTINO

- Dirección(es) de Institución(es) Educativa(s) de destino

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 11:10:09 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORPILLA QUINTANA Florancio
Artorio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:14:49 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:08:58 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:53:18 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
COLEGIO VICTORINO STROGAL N° 11 CRISTÓBAL DE LA OCAVAL DE CORA CORA DISTRITO
DE CORA CORA PROVINCIA DE PARACUTINI DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

DIRECCION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS								
Nº DE ORDEN	CÓDIGO MODULAR	CÓDIGO LOCAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	SUB TOTAL DE BIENES
1								
2								
TOTAL GENERAL								

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221.scf
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 14.03.2023 11:08:55 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florentino
Antonio FAU 20514347221.scf
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 14.03.2023 12:16:12 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221.scf
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 16.03.2023 09:06:12 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANCO Tobar Cayo FAU
20514347221.scf
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 16.03.2023 16:53:33 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO N° 12 CRISTÓBAL COLÓN DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Beilhon
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL COLÓN DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ANEXO N° 02

PRUEBAS Y/O ENSAYOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD

- Normas técnicas para la verificación de mobiliario
- Control de calidad

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 11:09:37 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Flereido
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:15:28 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:09:20 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:53:42 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE AYACUCHO" DE AYACUCHO
DE CORA CORA PROVINCIA DE PARINÁ, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

 Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE AYACUCHO" DE AYACUCHO
DE CORA CORA PROVINCIA DE PARINÁ, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

 Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

NORMAS TECNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE MOBILIARIO

El mobiliario a fabricar, al igual que la certificación de calidad se ceñirá a las siguientes normas y sus respectivas enmiendas y revisiones con actual vigencia, según corresponda por tipo de bien.

CUADRO N° 01: NORMAS TECNICAS QUE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL MOBILIARIO ESCOLAR	
CÓDIGO	TÍTULO DE LA NORMA
RV N°019-2023-MINEDU	Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular
NTP 260.006:2019	MOBILIARIO ESCOLAR. Mesa para nivel de Educación secundaria. Requisitos. 4ª Edición.
NTP 260.010:2019	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Clasificación y tipos. 4ª Edición.
NTP 260.011:2017	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Definiciones. 3ª Edición
NTP 260.012:2017	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Embalaje. 3ª Edición
NTP 260.013:2017	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Rotulado. 3ª Edición
NTP 260.014:2021	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Muestreo. 4ª Edición
NTP 260.015:2021	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Requisitos. 5ª Edición

CUADRO N° 02: NORMAS TECNICAS QUE ESTABLECEN METODOS DE ENSAYO PARA LOS BIENES Y MATERIALES	
CÓDIGO	TÍTULO
NTP 260.025:2019	MOBILIARIO. Mesas para instituciones educativas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 4ª Edición

GLOSARIO

- Fabricación y embalaje:** corresponde que el bien se encuentre acabado y embalado, preparado para ser utilizado en conformidad de la Entidad.
- Transporte, entrega:** corresponde que el bien sea entregado sin deterioro por el transporte y colocado en el ambiente designado por la autoridad de cada Entidad de destino. Deberá estar conforme con la Entidad.
- Defectos Críticos:** Defectos que imposibilita el uso del producto y/o que puede afectar la seguridad del usuario.
- Defectos Mayores:** Defectos que, sin llegar a ser críticos, en cierto plazo afectan el uso de las unidades.
- Defectos Menores:** Defectos que no afectan el uso de las unidades.
- Inspección por atributos:** Inspección mediante el cual se clasifica una unidad de producto como conforme o no conforme, o se cuenta el número de no conformidades en la unidad de producto, con respecto a un determinado requisito o conjunto de requisitos.
- Límite de Calidad Aceptable (LCA):** Es el nivel máximo permisible de unidades no conformes de la muestra de un lote.
- Lote:** Es el conjunto de muebles de un mismo modelo fabricados en un determinado período, bajo condiciones iguales.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 11:39:18 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Figránpio Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:15:48 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 06:09:28 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:53:50 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GOBIERNO DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REI DE LA SIERRA DE AYACUCHO
DE CORA CORA PROVINCIA DE PÁNCOSI DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PLAN DE MUESTREO

Se precisa que las muestras se toman bajo el nivel de inspección S1 de la NTP 260.014.2017 vigente (incluyendo sus últimas revisiones).

CUADRO N°03: TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA MOBILIARIO									
Tamaño del Lote			Niveles de Inspección Especial				Niveles de Inspección General		
			S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2	a	8	A	A	A	A	A	A	B
9	a	15	A	A	A	A	A	B	C
16	a	25	A	A	B	B	B	C	D
26	a	50	A	B	B	C	C	D	E
51	a	90	B	B	C	C	C	E	F
91	a	150	B	B	C	D	D	F	G
151	a	280	B	C	D	E	E	G	H
281	a	500	B	C	D	E	F	H	J
501	a	1200	C	C	E	F	G	J	K
1201	a	3200	C	D	E	G	H	K	L
3201	a	10000	C	D	F	G	J	L	M
10001	a	35000	C	D	F	H	K	M	N
35001	a	150000	D	E	G	J	L	N	P
150061	a	500000	D	E	G	J	M	P	Q
500001	a	más	D	E	H	K	N	Q	R

↓ = Use el primer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el tamaño de la muestra es igual o excede el tamaño del lote lleve a cabo inspección 100%
 ↑ = Use el primer plan de muestreo arriba de la flecha
 Ac = Número de aceptación
 Re = Número de rechazo
 En concordancia con las letras código según el tamaño del lote, se utilizará la siguiente tabla para determinar el tamaño de la muestra y los LCA correspondientes:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERPERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 11:08:52 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CORRILLA JUNTANA Florencia
Anexo FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:16:11 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:39:35 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES VARGAS Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:54:00 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MATEO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PAINACCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Nivel de inspección		Límite de calidad aceptable LAC, en porcentaje de ítemes no conformes o no conformidades por 100 ítemes, inspección normal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		0,010		0,015		0,025		0,040		0,065		0,10		0,15		0,25		0,40		0,65		1,0		1,5		2,5		4,0		6,5		10		15		25		40		65		100		150		250		400		650		1 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac

- La selección de las muestras del lote, se debe tomar al azar y de manera tal que se obtengan unidades de todas las partes del lote.
- Si el número de unidades de producto no conformes encontrados en la muestra es igual o menor que el número de aceptación, el lote debería ser considerado aceptable. Si el número de unidades del producto no conformes es igual o mayor que el número de rechazo, el lote debería ser considerado no aceptable.
- El nivel de inspección determina la relación que existe entre el tamaño del lote y el tamaño de la muestra.
- La clasificación de Defectos para Mobiliario para Instituciones Educativas es la siguiente:

Defectos Críticos:

Falla de compresión paralela en elementos estructurales
Grano inclinado mayor al tolerado en elementos estructurales
Putridión
Presencia de Insectos activos
Rotura
Rajaduras
Nudos muertos
Ensamble defectuoso

Defectos Mayores

Falla de compresión paralela en elementos no estructurales
Grano inclinado mayor al tolerado en elementos no estructurales
Perforaciones de insectos inactivos mayores a los permitidos
Grietas
Armado Asimétrico
Mezcla de especies
Juntas desiguales
Alabeos de piezas mayores a los tolerados
Nudos sanos no tolerados
Inestabilidad en un plano
Inestabilidad en un plano

Defectos Menores

Acabado defectuoso
Boleado irregular de aristas

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MARÍA INGLÉS N° 12 PUNTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PAKIACHOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 21154

RELACION DE ENSAYOS:

DESCRIPCION	NORMA Y/O DOCUMENTO TÉCNICO PARA ENSAYOS Y/O PROCEDIMIENTOS	ENSAYOS
MESA METAL MADERA DE 3° A 4° DE SECUNDARIA	NTP 260.025:2019 MOBILIARIO. Mesas para instituciones educativas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 4ª Edición	ESTABILIDAD CON CARGA VERTICAL EN MESAS
		DURABILIDAD HORIZONTAL
		DURABILIDAD VERTICAL
		CARGA ESTÁTICA VERTICAL
		CARGA ESTÁTICA HORIZONTAL
	Estudio sobre el contenido de humedad equilibrio de la madera en el Perú, elaborado por el CITE MADERA.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE CONTENIDO DE LA HUMEDAD EN LA MADERA DE ACUERDO AL LUGAR DE ENTREGA.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Empleado digitalmente por ROBLES ANCO
0514247221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 18:54:09 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MARÍA INGLÉS N° 12 PUNTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PAKIACHOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Página 31 de 52
Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ANEXO N° 3 PLANIMETRÍA

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 11:08:27 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA GUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:22:17 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN María Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:09:56 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:54:17 -05:00


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.L.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL COLÓN DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO




Ing. Luis Escobar Bellón
Residente de Obra
CIP: 211541




Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

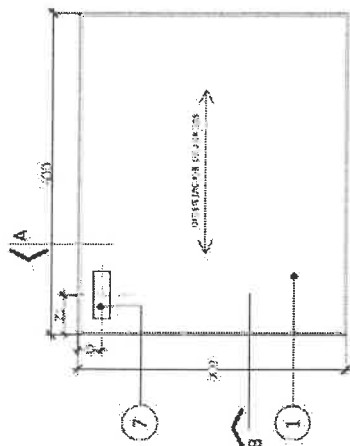


PLANTA 1
ESCALA 1/10

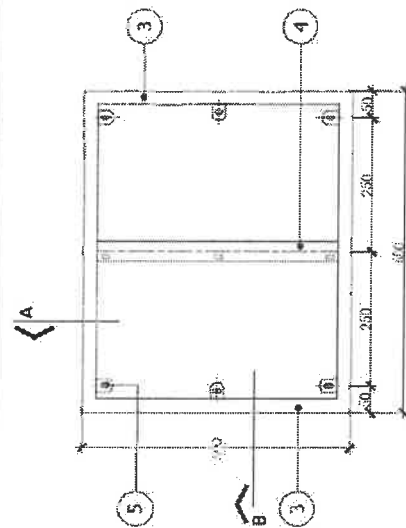


PLANTA 1 (sin tablero)
ESCALA 1/10

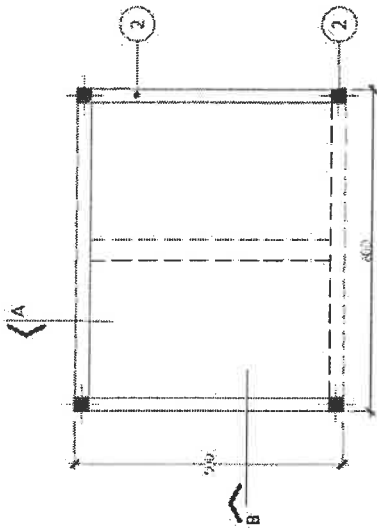


PLANTA 2
ESCALA 1/10

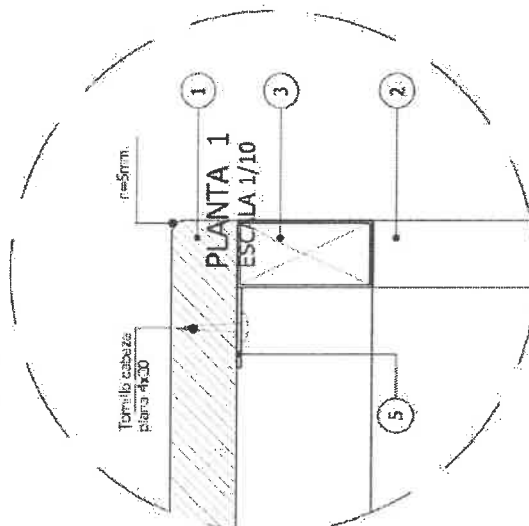

DETALLE D-01
ESCALA 1/2

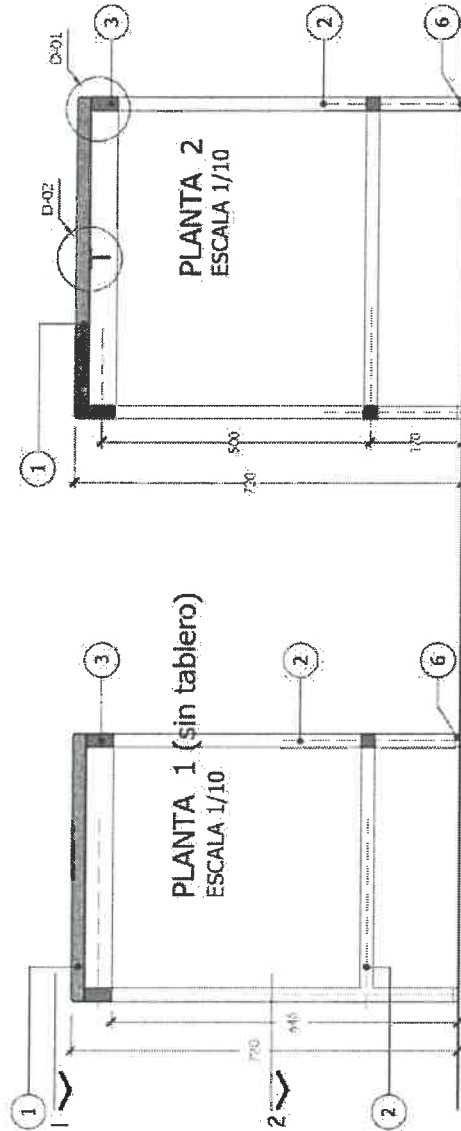

CORTE A
ESCALA 1/10

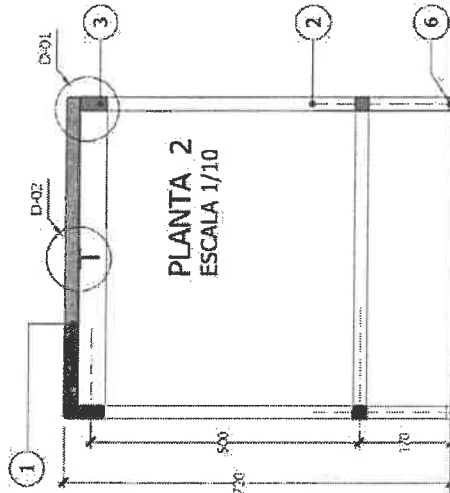

CORTE B
ESCALA 1/10

PRONIED
INSTITUCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

3 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el área de la construcción.

PRONIED
INSTITUCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

3 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el área de la construcción.

PRONIED
INSTITUCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

3 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el área de la construcción.



Ing. Richard Wilber Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TABlero DE MADERA CON UNIONES MACHIEMBRADAS O FINGER JOINT (UNIÓN ENDENTADA) 6"
- 25-22mm ATORNILLADO A ESTRUCTURA DE ACERO CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA 4X20.
- TUBO MECÁNICO DE ACERO ELECTROSOLDADO LAMINADO AL FRÍO 1" x 1" CALIBRE 16 (1,5 mm)
- TUBO MECÁNICO DE ACERO ELECTROSOLDADO LAMINADO AL FRÍO 1" x 2" CALIBRE 16 (1,5 mm)
- PERFIL DE ACERO 1" DE 1 1/2" x 1 1/2" DE 2,5MM (MÍNIMO) DE ESPESOR, PERFORADO PARA SUJECIÓN DE TABLERO.
- PUNTOS DE SUJECIÓN DE ACERO CON PERFORACIÓN TIPO "OJO CHINO" - CALIBRE 16 (1,5mm)
- REGATONES DE POLIPROPILENO DE 12 MM (MÍNIMO) DE EMBONE EXTERIOR O INTERIOR. LOS REGATONES PERMITIRÁN TENER UNA DISTANCIA NO MENOR DE 5 MM DEL PISO A LA ESTRUCTURA METÁLICA.
- LOGOTIPO INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DPA - DISTRITO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO
DE ZORA DORA PROVINCIA DE AYACUCHO



PRONIED
INSTITUCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Residente de Obra
CIP: 211341


PRONIED
INSTITUCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

3 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el área de la construcción.


UNIDADES: MILÍMETROS (mm)

<p>PRONIED</p>	<p>MSM-36</p>
<p>MESA DE METAL MADERA 3° A 4° SECUNDARIA</p>	<p>INDICADA</p>

11

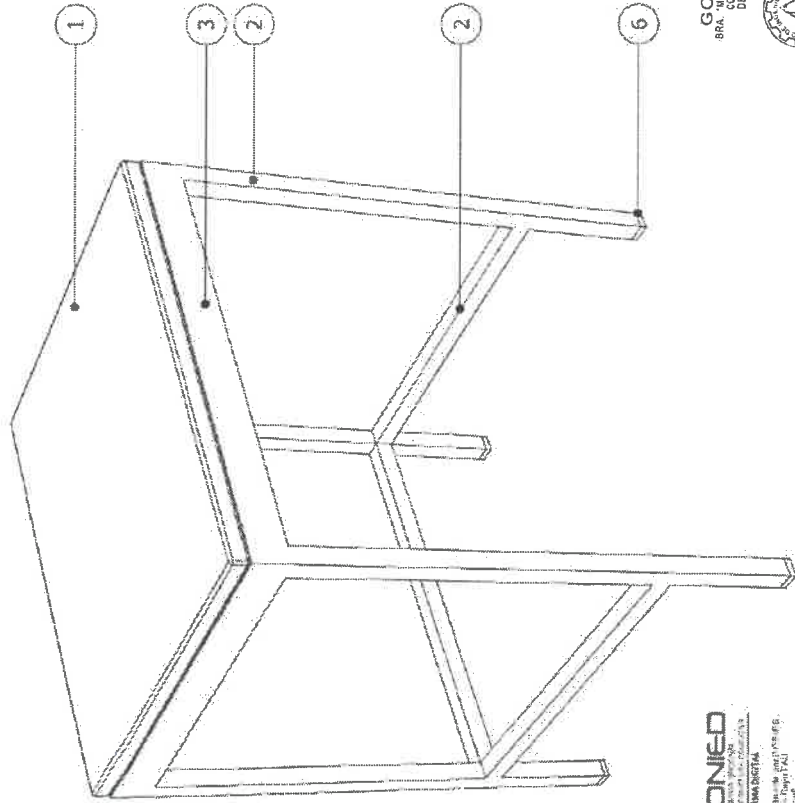

PERSPECTIVA

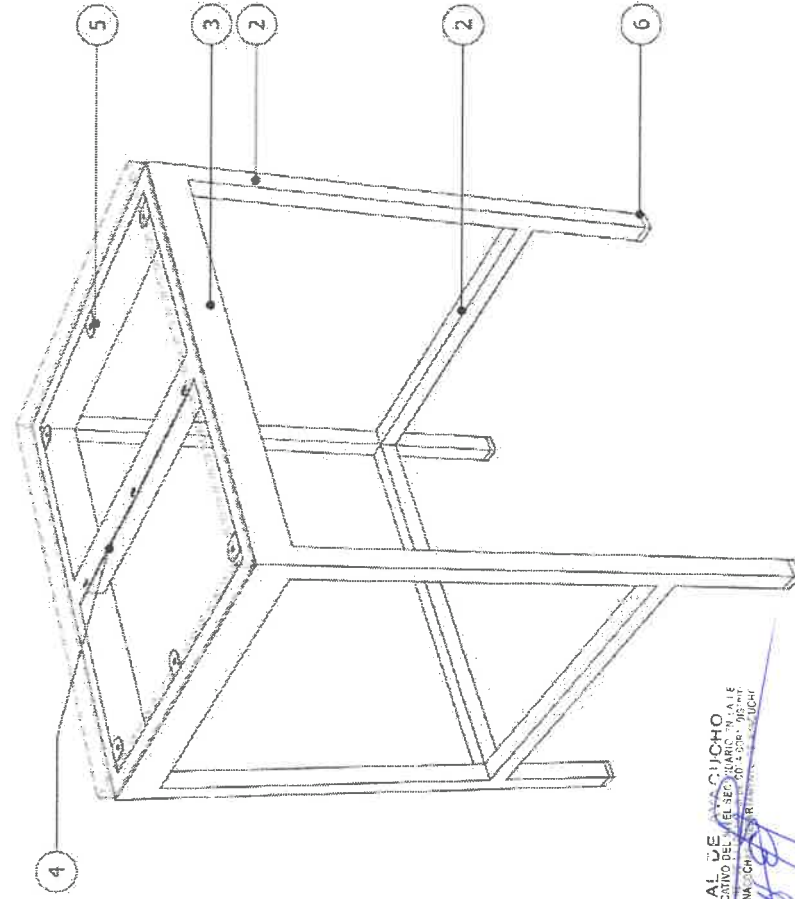

PERSPECTIVA
(sin tablero)

PRONIED
INSTITUTO NACIONAL DE AYACUCHO
CALLE 1020 N° 1000
P.O. BOX 1000
P.O. BOX 1000


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INSTITUTO NACIONAL DE AYACUCHO
CALLE 1020 N° 1000
P.O. BOX 1000
P.O. BOX 1000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


1. TABLERO DE MADERA CON UNIONES MACHIHEMBRADES O FINGER JOINT (UNIÓN EN DENTADA) - $\phi = 25-22\text{mm}$ ATORNILLADO A ESTRUCTURA DE ACERO CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA 4X20.
2. TUBO MECÁNICO DE ACERO ELECTROSOLDADO LAMINADO AL FRIO $1" \times 1"$ CALIBRE 16 (1.5mm).
3. TUBO MECÁNICO DE ACERO ELECTROSOLDADO LAMINADO AL FRIO $1" \times 2"$ CALIBRE 16 (1.5mm).
4. PERFIL DE ACERO "T" DE $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ DE 2.5MM (MÍNIMO) DE ESPESOR. PERFORADO PARA SUJECIÓN DE TABLERO.
5. PUNTOS DE SUJECIÓN DE ACERO CON PERFORACIÓN TIPO "OJO CHINO" - CALIBRE 16 (1.5mm).
6. REGATONES DE POLIPROPILENO DE 12MM (MÍNIMO) DE EMBONE EXTERIOR O INTERIOR. LOS REGATONES PERMITIRÁN TENER UNA DISTANCIA NO MENOR DE 5MM DEL PISO A LA ESTRUCTURA METÁLICA.
7. LOGOTIPO INSTITUCIONAL.

PRONIED
INSTITUTO NACIONAL DE AYACUCHO
CALLE 1020 N° 1000
P.O. BOX 1000
P.O. BOX 1000

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INSTITUTO NACIONAL DE AYACUCHO
CALLE 1020 N° 1000
P.O. BOX 1000
P.O. BOX 1000

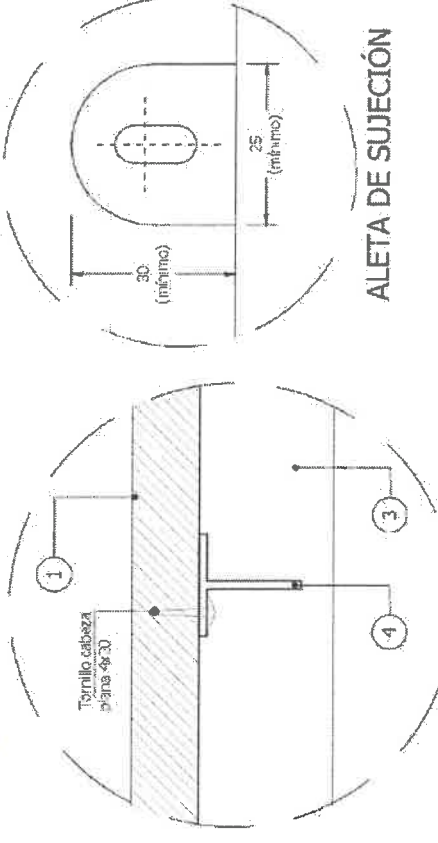

DETALLE D-02
ESCALA 1/2



DETALLE DE REGATON
ESCALA 1/2

PRONIED
INSTITUTO NACIONAL DE AYACUCHO
CALLE 1020 N° 1000
P.O. BOX 1000
P.O. BOX 1000

UNIDADES: MILIMETROS. (mm)

PROYECTO		MESA DE METAL MADERA 3° A 4° SECUNDARIA	
CORRECCIÓN	PROYECTO	INDICADA	
	REVISIÓN	L-11A	

ANEXO N° 04 CUADRO DE OTRAS PENALIDADES

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 11:03:21 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:23:14 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:10:12 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 16:54:41 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.L.
COLEGIO MARCO INOSTI N° 12 CRISTO REY, LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNAJA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.L.
COLEGIO MARCO INOSTI N° 12 CRISTO REY, LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNAJA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

OTRAS PENALIDADES

Tipo	Supuestos de aplicación de Penalidad	Forma referencial de cálculo				Procedimiento
		1 a 100 bienes	100 a 1000 bienes	1000 a 5000 bienes	5000 a más bienes	
F1	No presentar la totalidad de la documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el transporte de los bienes a la Entidad, según las condiciones del numeral 2.2.7.4. Documentación para el Transporte de los bienes	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
F2	No levantar las observaciones realizadas por la Entidad a la documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el transporte de los bienes luego del plazo estipulado en el numeral 2.2.7.4. Documentación para el Transporte de los bienes	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F3	No recoger los Documentos que acredite Entrega de los Bienes ni suscribir el Acta de Entrega Documentaria según lo estipulado en el numeral 2.2.8.1 Transporte	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F4	No cumplir con el almacenaje adecuado (ambiente techado, sin goteras, sin filtraciones y con cobertura en óptimas condiciones), de acuerdo con el Numeral 2.2.5.1 Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 1$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 4$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F5	Ingresar con vehículos pesados a los patios de Instituciones Educativas para realizar la estiba y/o descarga de bienes según numeral 2.2.8.1 Transporte	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 1$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F6	No transportar exclusivamente los bienes objeto de la presente contratación en los vehículos del contratista,	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LALE
CALLE 1000, PUNTO DE VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, COMUNA DISTRITO
DE CORACORA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 2111541



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LALE
CALLE 1000, PUNTO DE VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, COMUNA DISTRITO
DE CORACORA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Richard Wilver Lancha Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718



PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

	de acuerdo con el numeral 2.2.8.1 Transporte					
F7	No realizar el Transporte de bienes con un vehículo cerrado de acuerdo con lo señalado en el numeral 2.2.8.1 Transporte	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 1$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 4$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 5$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	
F8	No presentar la solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad dentro del plazo establecido en numeral 2.2.7.1 Sobre la solicitud para la calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	
F9	No presentar a la Entidad los resultados de la aplicación de métodos de ensayos dentro del plazo ofertado por el Organismo de Evaluación de la Conformidad. En su propuesta técnica presentada para su designación.	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	
F10	No presentar el levantamiento de observaciones del "informe de ensayos" dentro del plazo otorgado por la Entidad Contrante.	$P = M \times Oc$ $M = 0.2$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	
F11	No presentar antes de la culminación de la etapa de Fabricación, la documentación requerida en el numeral 2.2.1 Procedencia de la madera.	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	
<p>Consideraciones:</p> <p>(*) UIT: Unidad Impositiva Tributaria, se aplicará el valor de referencia vigente, establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, en la fecha de la suscripción del contrato.</p>						

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO NITO INDUSTRIAL, N° 12 CRISTÓBAL MENDOZA, PROVINCIA DE CORA, DISTRITO DE CORA, CORA, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: BRAYO
PARRERA María Lupe FAL
20514347221 soft
Motivo: Day V. B.
Fecha: 14.03.2023 11:02:54 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: CASTILLO
PARRERA María Lupe FAL
20514347221 soft
Motivo: Day V. B.
Fecha: 15.03.2023 09:10:20 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: ROBLES
QUINTANA Florencia
20514347221 soft
Motivo: Day V. B.
Fecha: 14.03.2023 12:24:11 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: ROBLES
QUINTANA Florencia
20514347221 soft
Motivo: Day V. B.
Fecha: 15.03.2023 16:54:58 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO NITO INDUSTRIAL, N° 12 CRISTÓBAL MENDOZA, PROVINCIA DE CORA, DISTRITO DE CORA, CORA, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ANEXO N° 05 REQUISITOS A PRESENTAR PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 11:02:41 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:24:30 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:10:38 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
CANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2023 18:55:09 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 DISTRITO REPUCALLOCAJANA DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 DISTRITO REPUCALLOCAJANA DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Llancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

FORMATO N° 01

FORMATO N°01: CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES								
ACTIVIDADES	ETAPA: FABRICACION Y EMBALAJE DE LOS BIENES							
	MES 1				MES 2			
	día 1	día 2	día 3	día "n"	día 1	día 2	día 3	día "n"
BIEN "A"								
Actividad 1								
Actividad 2								
Actividad 3								
Actividad "n"								
BIEN "B"								
Actividad 1								
Actividad 2								
Actividad 3								
Actividad "n"								

FORMATO N° 02

FORMATO N°02: CRONOGRAMA DE ENTREGA DE BIENES								
ACTIVIDADES	ETAPA: TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIENES							
	MES 1				MES 2			
	día 1	día 2	día 3	día "n"	día 1	día 2	día 3	día "n"
INSTITUCIÓN DE DESTINO N°01								
TRANSPORTE								
ENTREGA								
INSTITUCIÓN DE DESTINO N°02								
TRANSPORTE								
ENTREGA								

Notas:

- El cronograma de "Adquisición de bienes" servirá para la realización de visitas inopinadas por parte de la ENTIDAD.
- Asimismo, ambos formatos, deberán entregarse en programa MS PROJECT, MS EXCEL o similar.



Firmado digitalmente por BRAVO:
3LEPPERO Gonzalo Elias FAU
20614347221 soft
Notario Day V B
Fecha: 14.02.2023 11:02:26 -06:00



Firmado digitalmente por
- GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - CASTILLO
OSRA, ME, DOCUMENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ANS, SECUNDARIA EN LA I.E.
Febrero 08, 2019, 12:02 PM, DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA DE PUNAHUAYAN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Firmado digitalmente por
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO CASTILLO
OSRA, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL ANGE SECUNDARIO EN LA I.E.
Febrero 08, 2017 12:02 PM
Firma de CORA CORP PROVINCIA DE PUNAJUAYANAL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Firmado digitalmente por ROBLES,
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 16-03-2023 18:55:17 -05:00




 Ing. **Richard Wilver Cancho Vargas**
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 98718



Version 02

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

FORMATO N° 03

FORMATO N°03: DESAGREGADO DE COSTOS

DESAGREGADO DE COSTOS DE BIENES A ENTREGAR A LA(S) INSTITUCION(ES) BENEFICIADA(S)

REGIÓN	INSTITUCIONES DE DESTINO	DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD	COSTO UNITARIO DE ADQUISICIÓN (FABRICACIÓN Y EMBALAJE)	COSTO UNITARIO DE ENTREGA (TRANSPORTE Y ENTREGA)	COSTO UNITARIO SUB TOTAL	COSTO DE BIENES
	(1)	(2)	(C)	(A)	(B)	(A+B)	[(A+B)*C]
"A"	Institución 01	Bien "A"		SI.	SI.	SI.	SI.
		Bien "B"		SI.	SI.	SI.	SI.
		Bien "n"		SI.	SI.	SI.	SI.
	Institución 02			SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
"B"	Institución 01			SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
	Institución 02			SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
	Institución "n"			SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.

RESUMEN DE COSTOS

COSTO TOTAL

SI.

Consideraciones:

- (1) Se contabiliza según el número de orden del "Formato de Direcciones para la Entrega", del Anexo 01.
- (2) Según nomenclaturas del Cuadro N°01 de las presentes especificaciones técnicas.
- (A) Incluye costo del Control de Calidad, según el numeral 2.2.8.

Notas:

- Se precisa que todos los costos deben contener como máximo 02 decimales y las sumatorias deben coincidir con los totales a adjudicar.
- Asimismo, dicho formato debidamente llenado, deberá entregarse en archivo digital editable.
- Toda incompatibilidad, incluso a nivel de decimales u ordenamiento del formato distinto a lo estipulado, será tratada como observación.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERFERO Gonzalo Elias FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 11:02:14 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florenbio
Antonio FAU 20514347221.pdf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:09:50 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:10:59 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221.pdf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:55:41 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 COSTO B° DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

FORMATO N° 04

FORMATO N°04: DIRECCIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN Y ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA

Nombre de contratista o de cada empresa que conforma el consorcio	Av., Jr., Calle, Pasaje, Mz. Lote, Etc.	N°	Urbanización, Sector, Etc.	Teléfono del Local y de Propietarios	Referencia	Distrito Provincia Región

Notas:

- Máximo declarar 04 instalaciones de almacenamiento y/o talleres.
- En caso se necesite modificar los datos de la(s) dirección(es) declaradas, el Contratista deberá notificar a la Entidad mediante una carta por mesa de partes de la ENTIDAD, como plazo máximo antes del ingreso de la Solicitud de Verificación de Cantidad por la culminación de la etapa de "Adquisición y Embalaje de la totalidad de los bienes".

FORMATO N° 05

FORMATO N°05: RESPONSABLE GENERAL DE OPERACIONES

Nombres y apellidos completos	N° DNI	Cargo	N° de celular	N° teléfono fijo	Correo electrónico Institucional

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO, Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14-03-2023 11:02:02 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN, Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15-03-2023 09:11:08 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA, Florencia Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14-03-2023 12:29:03 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC, Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15-03-2023 16:55:48 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO - NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



Ing. Richard Wlter Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

FORMATO N° 06

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Por medio de la suscripción del presente documento se autoriza a (Nombre de Entidad) a realizar la notificación electrónica de las observaciones realizadas por la Entidad durante el procedimiento para suscribir el contrato, así como, para los actos efectuados durante la ejecución del contrato.

La dirección de correo electrónico autorizada es:

Correo electrónico autorizado:

[illegible]

Repita el correo electrónico autorizado:

[illegible]


Quedan exceptuados de la presente autorización, aquellos actos cuya notificación revistan formalidades especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones pública.

La notificación electrónica se acredita con la impresión del correo electrónico enviado y la Cedula de Notificación, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmación de parte del contratista.

La notificación en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación electrónica efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

(REPRESENTANTE LEGAL)

RUC:



Bethesda

Escobar Beltrán
Presidente de Obis
CIP: 211641



Firmado digitalmente por SRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20614347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 14.03.2023 11:01:50 -05:00



Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Anterior: FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 14/03/2023 12:26:37 -05:00



Firmado digitalmente por ROBLES
YANCO Tiberio Cayo FAJ
20614347221 sof
Móvil: 099 57 87
Fecha: 15/03/2023 18:55:56 -05:00



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ANEXO N° 06

MODELOS REFERENCIALES DE ACTAS PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 14.03.2023 10:35:36 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Ferencio
Antorcha FAU 20514347221 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 14.03.2023 12:28:52 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 09:11:22 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
ANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 18:55:13 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ACTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	
CONTRATO:	
TIPO DE BIEN:	
UBICACIÓN:	
CONTRATISTA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
FECHA:	

Siendo las _____ horas del día ____ del mes _____ del año 20____, se reunieron en el local donde se realiza el proceso de fabricación y/o almacenaje de los bienes adquiridos mediante el procedimiento de selección arriba mencionado, sitio en la dirección antes indicada; de una parte, el Sr(a) _____ en representación de la **ENTIDAD** y de la otra parte el Sr(a) _____ en representación de la empresa Contratista _____ a fin de llevar a cabo la inspección de los trabajos materia de la adquisición, encontrándose lo siguiente:

[illegible]

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

14347221 soft
 no: Joy V 6*
 ca: 15.03.2023 18:58:50 -0500

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas se dio lectura a la presente Acta, y no habiendo objeciones a la misma, se procedió a suscribirla por parte de los presentes.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

firmado digitalmente por CASTILLO
ARFAN Maria Lupa FAU
0514347221 ser
otivo: Day V B*
Fecha: 16.03.2003 09:11:33 -0500

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I. E.
 DOSSO MUTO, U.S. ITALIA, CANTON DE MUTO, DISTRITO
 DE CORA CORA, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido

Ing. Luis Escobar Bellido
 Residente de Obra
 CIP: 211541

LA ENTIDAD REPRESENTANTE

Nombre

Cargo

D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 sof
Motivo: Dey V* B¹
Fecha: 14.03.2023 10:35:24 -0500

**CONTRATISTA
REPRESENTANTE**

Nombre

D.N.I.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

PRONIER
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 14.03.2023 15:27:12 -ES

ACTA DE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA

La firma de la presente acta da la conformidad de la recepción de documentos en original de los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA's) del Contrato N° _____, derivado del Procedimiento de selección para la _____.

Mediante la presente, se hace entrega de la cantidad de N° ____ PECOSA's en cuatro (04) juegos originales, para la entrega de los bienes correspondientes.

NOTA PARA SER CONSIDERADA

De conformidad con el numeral 2.8.9 ENTREGA DE LOS BIENES, de las Especificaciones técnicas de las Bases Integradas, se debe tener en consideración que los PECOSA, deberán ser suscritos (firmados y sellados) por el Encargado de la Institución de destino¹, dando fe de lo recibido, consignándose en cada documento: firma, post-firma, sello y fecha de recepción, copia de DNI del Encargado y documentación que acredite su cargo, debiendo recabar la entidad receptora un ejemplar original de los PECOSA, para sus efectos contables.

En caso de ausencia del Encargado de la Institución de destino², por motivos no imputables a la ENTIDAD o no contar con documentación que acredite su cargo, el PECOSA podrá ser firmado por un representante designado y autorizado por la ENTIDAD.

Los bienes serán entregados en perfecto estado de conservación, adecuadamente armados y embalados hasta su destino final, sin ningún defecto de ADQUISICIÓN / FABRICACIÓN, ni otro como consecuencia de la estiba o desestiba o del transporte.

Los datos de contacto en cada una de las Instituciones de destino para la recepción de los bienes y el firmado de los PECOSA, serán coordinados directamente por el CONTRATISTA.³

Atentamente;

NOMBRE :

DNI :

TELÉFONO / CELULAR:

EMPRESA :

FECHA :

HORA:

CORREO ELECTRONICO:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLE
YAHOC Tiberio Caye FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:56:37 -05:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Ferenci
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:27:28 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
ARFAN Maria Lene FAU
0514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:11:41 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 10:35:09 -05:00

**CONTRATISTA
REPRESENTANTE**

**LA ENTIDAD
REPRESENTANTE**

¹ Si es una Institución Educativa, los PECOSA deberán ser suscritos por el Director o Sub-director administrativo en ausencia de aquel.

² En caso de ausencia del Director o Sub-director administrativo de una Institución Educativa, el PECOSA podrá ser firmado por un representante designado y autorizado por la UGEL correspondiente a la Institución, previa coordinación con la ENTIDAD.

³ Para una Institución Educativa el contacto será coordinado directamente por el CONTRATISTA con las UGELES respectivas.



ACTA DE VERIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

CONTRATO N° _____
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN _____

Por medio del presente documento, se deja constancia que el especialista de la ENTIDAD procedió con la verificación del levantamiento de observaciones en presencia del representante de la empresa Contratista el Sr(a) _____, en el marco del contrato N° _____.

1. _____ identificado con DNI N° _____ por parte de la ENTIDAD.
2. _____ representante de la Empresa Contratista identificado con DNI N° _____.

La verificación se realizó en los ____ (n°) almacenes declarados por el contratista, durante las siguientes fechas:

DIRECCIÓN LOCAL 01:

Fecha de verificación en Local 01:

DIRECCIÓN LOCAL 02:

Fecha de verificación en Local 01:

Durante la verificación se encontró lo siguiente:

CUADRO N° 01: RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN ENCONTRADA	SUBSANADO	
			SÍ	NO
		1.		
		2.		
		1.		
		2.		
		3.		
		1.		

ANOTACIONES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANOC Tiberio Cayo FAU
20814347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:57:08 -05

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas, del día _____, en señal de conformidad con los términos de la presente acta suscriben los intervinientes.

LA ENTIDAD
REPRESENTANTE

CONTRATISTA
REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211841

Firmado digitalmente por BRAVO
FERRERO Gonzalo Elías FAU
20814347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 10:34:55 -05:00

Nombre
D.N.I.

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antesio FAU 20814347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:27:57 -05:00



Página 46 de 52
Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ACTA DE VISITA INÓPINADA N°

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	
CONTRATO:	
TIPO DE BIEN:	
UBICACIÓN:	
CONTRATISTA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
FECHA:	

Siendo las _____ horas del día ____ del mes _____ del año 20____, se reunieron en el local donde se realiza el proceso de fabricación y/o almacenaje de los bienes adquiridos mediante el contrato arriba mencionado, sito en la ubicación antes señalada, de una parte, el Sr(a) _____ en representación de la **ENTIDAD**, y de la otra parte el Sr(a) _____ en representación de la empresa Contratista _____.

Encontrándose lo siguiente:

[illegible]

PRONIEI
PROGRAMA NAȚIONAL
DE INFRASTRUCTURĂ COMUNITARĂ
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 18:57:15 -05

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas se dio lectura a la presente Acta, y no habiendo objeciones a la misma, procediendo a suscribirla los presentes en señal de conformidad.

PRONIEI
PROGRAMA NAȚIONAL
DE INFRASTRUCTURĂ ECONOMICE
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CAST
FARFAN Maria Lupe FAJ
2D514347221 soft
Motivo: Dey Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 09:11:56 -05

LA ENTIDAD REPRESENTANTE

Nombre

Cargo

D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Soy Vº Bº
Fecha: 14.03.2023 10:34:41 -05:00

**CONTRATISTA
REPRESENTANTE**

Nombre

D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:28:44 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 OFICINA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA C.E.
 COLEGIO VICTORINO STRAL N° 12 CRISTÓBAL COLÓN DE CORA CORA DISTRITO
 DE CORA CORA PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ACTA DE DEVOLUCIÓN DE BIENES

CONTRATO N° _____
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN _____

Siendo las _____ horas, del día _____ de _____ de 20____; se reunieron en el local de la empresa _____, el Supervisor de la ENTIDAD, _____, identificado con DNI N° _____, el representante de la empresa Contratista el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____ y el representante del Organismo de Evaluación de Conformidad _____ identificado con DNI N° _____, con la finalidad de realizar la devolución de los bienes ensayados como parte del control de calidad, en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de la _____.

ANOTACIONES:.....
.....
.....
.....

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas, en señal de conformidad con los términos de la presente acta, suscriben los intervinientes.

**LA ENTIDAD
REPRESENTANTE**

Nombre
D.N.I.

**EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN
CERTIFICADORA DE CALIDAD
REPRESENTANTE**

Nombre
D.N.I.

**CONTRATISTA
REPRESENTANTE**

Nombre
D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 10:34:20 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:12:03 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Anteño FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:29:18 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tz'eno Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:57:23 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
COLEGIO VICTORIO STRAL Y CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PAHUACCHAN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Beltrido
Residente de Obra
CIP: 211841

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
COLEGIO VICTORIO STRAL Y CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PAHUACCHAN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS

CONTRATO N° _____
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN _____

Siendo las _____ horas, del día _____ de _____ de 20____; se reunieron en los Almacenes de la empresa Contratista _____, el Supervisor de la ENTIDAD, el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____, el representante de la empresa Contratista el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____ y el representante del Organismo de Evaluación de Conformidad, _____, el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____, con la finalidad de realizar la verificación técnica a través de ensayos de funcionalidad de los bienes materia del contrato antes citado, para tales efectos se procederá a tomar el número de muestras que pasarán por control de calidad, según lo establecido en el Anexo N° 02 de las Especificaciones Técnicas, tal como se detalla a continuación:

CUADRO N° 01: MUESTRAS Y ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD			
N° DE ORDEN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE MUESTRAS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL DE MUESTRAS			

ANOTACIONES:.....
.....
.....
.....

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas, en señal de conformidad con los términos de la presente acta, suscriben los intervinientes.

LA ENTIDAD REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: GRAYO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 10:34:14 -05:00

EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN CERTIFICADORA DE CALIDAD REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 10:34:14 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: CASTI
YANCO Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:12:10 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: ROBLES
YANCO Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:57:48 -05:00



ACTA DE VERIFICACIÓN CUANTITATIVA N°

SERVICIO :
MODALIDAD :
CONTRATO :
UBICACIÓN :
CONTRATISTA :

Siendo las _____ horas, del día _____ de _____ de 20____; estando en las instalaciones de la empresa Contratista _____, se reunieron: de una parte, el(la) Sr(a) _____, identificado con DNI N° _____, en representación de la empresa contratista _____; otra parte el Sr(a) _____, identificado con DNI N° _____, quien actúa en representación del área¹ _____; y el Sr(a) _____, identificado con DNI N° _____, en representación del área usuaria, para realizar la verificación cuantitativa del Contrato N° _____; derivado de la _____ de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, a fin de realizar la verificación cuantitativa de los bienes.

De la verificación realizada, se observan las siguientes cantidades:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD VERIFICADA

CONCLUSIÓN:.....

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V* B*
Fecha: 15.03.2023 18:57:55 -05

Siendo las _____ horas del día _____ de _____ del año 20____, se procedió a firmar el presente Acta por triplicado.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI
FARFAN María Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V* B*
Fecha: 15.03.2023 09:12:18 -05

ÁREA DESIGNADA POR LA
ENTIDAD
REPRESENTANTE

ÁREA USUARIA
REPRESENTANTE

CONTRATISTA
REPRESENTANTE

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Floren
Antonia FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V* B*
Fecha: 14.03.2023 12:30:07 -05

¹ La Entidad define quien es el área competente de emitir la conformidad cuantitativa.

versión 02

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Página 50 de 52

ANEXO N° 7 FICHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
CUERPERO Gonzalo Elías FAU
20514347221 soñ
Motivo: Day V° 8°
Fecha: 14.03.2023 10:30:48 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soñ
Motivo: Day V° 8°
Fecha: 14.03.2023 12:35:41 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Mena Lupe FAU
20514347221 soñ
Motivo: Day V° 8°
Fecha: 15.03.2023 09:12:25 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANCOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soñ
Motivo: Day V° 8°
Fecha: 15.03.2023 18:52:03 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PAHUASJUNYAN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Versión 02



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PAHUASJUNYAN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Anexo N° 07

Ficha de presentación del producto

El postor deberá completar los datos de la tabla siguiente:

Nombre del requerimiento		
N°	Especie(s) maderable(s) con la(s) que atenderá el requerimiento (véase Nota 1)	Nombre o Razón social del Postor
1		
2		
...		

Nota 01: El contratista podrá proponer una especie de madera similar o superior a las indicadas en el número 2.1 del numeral 2.1.1. Características y especificaciones, siempre y cuando esta cumpla con las propiedades físicas, mecánicas y de durabilidad.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20614947221.pdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 10:39:36 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
CORRILLA QUINTANA Placencia
Antonio FAU 20614947221.pdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 12:32:54 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lube FAU
20614947221.pdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:12:31 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANCO TIBENO Dayo FAU
20614947221.pdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:53:13 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.L.
COLEGIO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE AYACUCHO DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.L.
COLEGIO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE AYACUCHO DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

FICHA DE HOMOLOGACIÓN

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

Código del CUBSO	: 56121502-00390345
Denominación del requerimiento	: Silla de metal y madera para estudiante de 1° - 2° de secundaria.
Denominación técnica	: Silla de estudiante de secundaria fija de metal y madera de 38 cm x 46 cm x 79 cm.
Unidad de medida	: Unidad.
Resumen	: Silla de estructura de metal, asiento y respaldo de tablero de madera y accesorios de fijación, para 01 estudiante, con 790 mm de altura total, 380 mm de ancho y 460 mm de profundidad total. Destinada a la población estudiantil de 1° a 2° del nivel secundaria de la Educación Básica Regular.

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

La silla de metal y madera para estudiante de 1° - 2° de secundaria, está conformado por los siguientes componentes:

- Estructura de silla
- Tableros de madera de silla
- Ensamblaje y accesorios

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221.sob
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:23:14 -05

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

2.1.1. Características y especificaciones del bien

N°	Características	Especificación	Documento Técnico de Referencia
1. Estructura de silla			
1.1	Material	Tubo mecánico electro soldado de acero laminado al frío	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.3.1.1
1.2	Resistencia a la tracción	≥ 45 ksi [310 MPa]	ASTM A513 Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing Tabla S5.1
1.3	Límite de fluencia	≥ 32 ksi [221 MPa]	
1.4	Composición química	C máx. 0.15% Mn máx. 0.60% P máx. 0.035% S máx. 0.035%	ASTM A513 Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing Tabla S5.1

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211164

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

1.5	Patás y respaldar		
1.5.1	Sección de tubo: estructural	Circular Ø 1"	Establecido por el Ministerio
1.5.2	Espesor nominal de la pared del tubo estructura principal	1,2 mm calibre 18	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.3.1.1 Tabla 11
1.5.3	Dimensiones estructurales	Véase Anexo N° 03 Lámina L-10	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Cuadro N°5
1.6	Arriostre inferior		
1.6.1	Sección de tubo: estructural	Cuadrado 5/8"	Establecido por el Ministerio
1.6.2	Espesor nominal de la pared del tubo	1,0 mm	Establecido por el Ministerio
1.6.3	Dimensiones estructurales	Véase Anexo N° 03 Lámina L-10	Establecido por el Ministerio
1.7	Plancha perforada		
1.7.1	Límite de fluencia (véase Nota 01)	$20[140] \leq \text{Ksi [Mpa]} \leq 40[275]$	ASTM A1008/A1008M Standard Specification for Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy and High-Strength Low-Alloy with improved Formability. CS Tipo B Tabla 3
1.7.2	Composición química (véase Nota 01)	C máx. 0.15% Mn máx. 0.60% P máx. 0.030% S máx. 0.035%	ASTM A1008/A1008M Standard Specification for Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy and High-Strength Low-Alloy with improved Formability. CS Tipo B Tabla 1
1.7.3	Dimensiones	Véase Anexo N°03 Lámina L-10	Establecido por el Ministerio
1.7.4	Espesor	1,0 mm	Establecido por el Ministerio
1.7.5	Arreglo de perforación	60°	Establecido por el Ministerio

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE ORDENAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA ZONA URBANA DE AYACUCHO
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE ORDENAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA ZONA URBANA DE AYACUCHO
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Richard Wiver Janccho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANOC Tiberto Cayo FAU
20514347221 scf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.05.2023 18:23:21 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 scf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.05.2023 11:47:28 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florinda
Antonia FAU 20514347221 scf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.05.2023 11:47:28 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 scf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.05.2023 11:47:28 -05:00

1.7.6	Diámetro de perforación	10 mm	Establecido por el Ministerio
1.7	Soldadura	<i>Metal Inner Gas (MIG)</i> de micro alambre que no dejará escoria, previamente decapada.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.3.1.1 apartado c)
		Todas las uniones soldadas entre elementos metálicos deberán tener un cordón de soldadura continuo en todo el perímetro de la unión. Las uniones deberán tener un acabado uniforme.	Establecido por el Ministerio
1.8	Acabado	Preparación de la superficie: Los tubos deben recibir un baño de desengrase, de desoxidación (decapado), de reactivado, de fosfatizado y un baño para pasivado con el objeto de eliminar óxidos, escamas de óxido y grasas. Luego debe ser sometido a un proceso de secado para eliminar toda humedad interior y exterior.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.3.2
		Recubrimiento en polvo; recubrimiento en polvo termo convertible, de tipo epoxi o epoxi-poliéster. La película depositada será de 80 micrones mínimo, brillo semimate. Curado mediante horneado para que adquiera la apariencia adecuada, las propiedades mecánicas y químicas finales.	
1.9	Color	RAL 6019	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Anexo N° 02
1.10	Defectos no tolerables	Deformaciones, grietas, puntas o filos, salpicaduras y espacios vacíos entre o los elementos metálicos	Establecido por el Ministerio

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CORPORACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
COLEGIO WITWER CANCHO VARGAS
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PADUNCOCHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CORPORACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
COLEGIO WITWER CANCHO VARGAS
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PADUNCOCHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Richard Witwer Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98716

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

2. Tableros de madera de silla

2.1	Especies de madera (Véase Nota 01, Nota 02 y Nota 03)	AGUANOMASHA (<i>Machaerium inundatum</i>)	Establecido por el Ministerio
		CACHIMBO ROJO (<i>Cariniana domesticata</i>)	
		COPAIBA (<i>Copaifera paupera</i>)	
		HUAYRURO (<i>Ormosia coccinea</i>)	
		MASHONASTE (<i>Clarisia racemosa</i>)	
		REQUIA (<i>Guarea kunthiana</i>)	
		ULCUMANO (<i>Podocarpus oleifolius</i>)	
		TORNILLO (<i>Cedrelinga cateniformis</i>)	
2.2	Densidad básica	0,45 g/cm³ a 0,70 g/cm³	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.1
2.3	Flexión estática	MOR ≥ 501 kg/cm²	
		MOE ≥ 90 t/cm²	
2.4	Compresión perpendicular	ELP ≥ 41 kg/cm²	
2.5	Cizallamiento	≥ 61 kg/cm²	
2.6	Dureza en lados	≥ 301 kg/cm²	
2.7	Tenacidad	≥ 1,8 kg-m	
2.8	Contenido de humedad de la madera (Véase Nota 04)	Para establecer el CHE de la madera a ser utilizado en los diferentes usos, en función del lugar donde prestará servicio, se deberá tomar como referencia la información brindada en el aplicativo "Calculadora CHE Perú" disponible en el Play Store indicado en el siguiente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.itp.calculadorache&hl=es_PE&gl=US&fbclid=IwAR0pqkKVL TGOGJqP33eo6J9N6g1x_UeIL0VjBI4OPDj4BLZV-IJmMCS7S7o	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.5.1

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL CIUDADANO DEL NIVEL SECUNDARIO EN EL
 COLEGIO ARTES INDUSTRIAL N° 1" C/STO. VÍCTOR ALICALLO DE CONCEPCION, DISTRITO
 DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE FOMENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIÑO SECUNDARIO EN LA
CALLE VINTIQUINTOSIM Y CATORCE DE MAYO N.º 1000
DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIE
PROGRAMA NAȚIONAL
DE INFRASTRUCTURĂ EDUCATIVĂ
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBL
 YA OC Tiberio Cayo FAJ
 205 4347221 soft
 Motivo: Doy V. E*
 Fecha: 15/03/2023 19:23:37 -05

PRONIED
PROGRAMA NAȚIONAL
DE INFRASTRUCTURĂ EDUCATIVĂ
FORMA DIGITALĂ

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL:

Version 02

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Blas EAU
25614347221 soft
Motivo: Soy Vº Sº
Fecha: 10/03/2022 17:02:13 -05:00

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Arturo FAU 20614347221 sc...

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Llupe FAU
20514347221 soft
McGraw-Hill
Fecha: 15-02-2022 09:54:00 -05:00

2.9	Preservación	La madera a emplearse debería resistir el ataque de insectos y hongos xilófagos, para lo cual, en previsión de posibles ataques de agentes biológicos que contribuyan a la degradación, es recomendable utilizar preservantes que garanticen la inocuidad para el uso del mobiliario.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.5.2
2.10	Juntas de tablero	Machihembrada o endentadas (Finger Joint) con listones de 50 mm de ancho como mínimo.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.7.2
		Tener en cuenta el balance de los anillos de crecimiento de la madera para prevenir alabeos no tolerados.	
2.11	Dimensiones de tableros (Véase Anexo N°03, Lámina L-10A)		
2.11.1	Asiento		
2.11.1.1	Profundidad	360 mm	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Cuadro N°5
2.11.1.2	Ancho	380 mm	
2.11.1.3	Espesor	22-25 mm	Establecido por el Ministerio
2.11.2	Respaldo		
2.11.2.1	Altura	250 mm	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Cuadro N°5
2.11.2.2	Ancho	380 mm	
2.11.2.3	Espesor	Véase Anexo N° 3 Plano L-10A	Establecido por el Ministerio
2.12	Encolado	Colas PVA con 48% de sólidos como mínimo, no tener una antigüedad de fabricación mayor a 6 meses y de fraguado al ambiente. El adhesivo debe colocarse en la superficie de las dos piezas a encolar	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.8

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LALE,
CALLE MARCO INCA Nº 150, PUNTA DE LA CAJA, DISTRITO DE CORACOR, PROVINCIA DE PUNACUYA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LALE,
CALLE MARCO INCA Nº 150, PUNTA DE LA CAJA, DISTRITO DE CORACOR, PROVINCIA DE PUNACUYA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilber Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANGCO Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Módulo: Dey V 1 B
Fecha: 15.10.2023 19:23:44 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

2.13.	Lijado	Lijado manual o mecánico. Grano mínimo de 150 grit.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.9
		La superficie debe quedar totalmente lisa y suave al tacto, libre de astillas, irregularidades, cantos vivos y poros levantados; las aristas serán redondeadas.	
2.14	Acabado	Laca selladora mate o semi- mate translúcida o lacas catalizadas o un material de recubrimiento con dureza y durabilidad equivalente o superior a las consideraciones técnicas siguientes: - Base de nitrocelulosa, aditivos plásticos y metálicos - Sólidos en Volumen 27 ± 2 % - Espesor de Película Seca 2.0 – 3.0 mils por capa	NTP 260.008:2019 MOBILIARIO ESCOLAR. Silla para nivel de educación secundaria. Requisitos. 4ª Edición Numeral 7.2.5
		Mínimo 3 capas, aplicado en la totalidad de las superficies.	
2.15	Defectos no tolerables en madera.		
2.15.1	Perforaciones grandes	Mayor de 3 Agujeros con diámetro mayores a 6mm, por metro lineal y no alineados	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.4
2.15.2	Rajaduras y Grietas	Mayor a 20 mm de largo, 0,5 mm de ancho, y mayor a la tercera parte del espesor de la pieza.	
2.15.3	Inclinación del grano	Mayor a 10º	
2.15.4	Falla de compresión paralela	Máximo en dos lados consecutivos y no perjudiquen la solidez.	
2.15.5	Defectos de forma	Mayor al 0,3% de la longitud de la pieza	
2.15.6	Presencia de hongos de pudrición	No se admiten	
2.15.7	Presencia de insectos activos	No se admiten	

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Luis Eduardo Beiliao
Residente de Obra
CIP: 414544

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Richard Wilber Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: ROBLI
CANO Tiberto Cayo FAU
20514347221 soft
Fecha: 16.03.2023 19:23:52 -05

2.15.8	Defectos por nudos	Mayor de 20 mm de diámetro y mayor a la cuarta parte del ancho del material	
2.15.9	Nudos muertos	No se admiten	
2.15.10	Mezcla de especies	No se admiten	
2.15.11	Presencia de médula y/o corteza	No se admiten	
2.15.12	Inestabilidad en un plano	No se admiten	NTP 260.014:2021 MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Muestreo. 4ª Edición Anexo A
2.15.13	Ensamblajes defectuosos	No se admiten	Establecido por el Ministerio
2.15.14	Acabado defectuoso	No se admiten	
2.16	Defectos tolerables		
2.16.1	Perforaciones pequeñas	Agujeros de 1 mm a 3 mm de diámetro, que sumados sus diámetros den un máximo de 6 mm en un área de 100 cm2, no alineados ni pasantes	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.1.3
2.16.2	Mancha azul	No cuantificable mientras no afecte la resistencia de la madera	
3. Accesorios y piezas de ensamble			
3.1	Regatones		
3.1.1	Material	Polipropileno (PP)	Establecido por el Ministerio
3.1.2	Dimensiones	12 mm (mínimo) de embone exterior o interior a la estructura metálica. Distancia no menor de 5 mm de separación entre el piso y la estructura metálica. (Véase Lámina L-10A)	Establecido por el Ministerio
3.1.3	Color	RAL 9005 (negro)	Establecido por el Ministerio
3.2	Platina de acero electrosoldado		
3.2.1	Material	Acero laminado	Establecido por el Ministerio
3.2.2	Dimensiones mínimas	25mm x 30mm (Véase Lámina L-10A)	Establecido por el Ministerio

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AYACUCHO
COLEGIO MITO INDUSTRIAL N°12 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
DE CORA CORA, PROYECTO DE MANACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AYACUCHO
COLEGIO MITO INDUSTRIAL N°12 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
DE CORA CORA, PROYECTO DE MANACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Ricardo Winaldiano Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANCO Tiberio Cayo FAU:
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.05.2023 19:28:59 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BPAVC
GUERRERO Gonzalo Elias FAU:
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.05.2023 17:02:53 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
CORRILLA QUINTERA Florando
Antonio FAU: 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.05.2023 11:48:24 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU:
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.05.2023 16:00:00 -05:00

3.2.3	Tipo de perforación	"ojo chino"	Establecido por el Ministerio
3.2.4	Espesor	1,5 mm calibre 16	Establecido por el Ministerio
3.2.5	Soldadura	Metal Inner Gas (MIG) de micro alambre que no dejara escoria, previamente decapada.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos. 5ª Edición Numeral 5.3.1.1 apartado c)
3.3	Tornillos		
3.3.1	Tipo	Tornillos de cabeza plana autorroscantes.	Establecido por el Ministerio
3.3.2	Dimensión tornillo para asiento	4 mm x 20 mm	Establecido por el Ministerio
3.3.3	Dimensión tornillo para respaldar	4 mm x 15 mm	Establecido por el Ministerio

Nota 01: Los postores deberán presentar relación de especies de madera a utilizar en el proceso de fabricación, según lo estipulado en el numeral 3.1 De la Selección del capítulo III Información Complementaria.

Nota 02: El contratista podrá proponer una especie de madera similar o superior a las indicadas en el numeral 2.1, siempre y cuando esta cumpla con las características de la madera indicadas entre los numerales 2.2 al 2.9, para lo cual debe presentar la(s) ficha(s) técnica(s) de la especie(s) de madera, suscrita por el Contratista, especialista en el control de calidad de productos de madera o un laboratorio especializado en la investigación de la madera.

La propuesta deberá ser aprobada por la Entidad contratante, para esto, el contratista deberá presentar una solicitud a la Entidad contratante dentro de los 10 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, sin que se genere sobrecostos y modificaciones a los plazos contractuales establecidos por la Entidad.

Nota 03: Los listones de madera que componen cada uno de los elementos, asiento y respaldar de madera deberán ser de una misma especie maderable.

Nota 04: Se utilizará el Programa para determinar el Contenido de Humedad de Equilibrio (CHE) de la madera a nivel nacional. El aplicativo web "CHE Perú", se encuentra disponible en el siguiente enlace: <http://citemadera.itp.gob.pe/proyectos/che/>.

2.1.2. Marcado y/o rotulado

2.1.2.1. Logotipo institucional

Para identificar la procedencia institucional de la silla de metal y madera para estudiante de 1° - 2° de secundaria, se colocará mediante técnica de pirograbado el logotipo institucional de la entidad contratante, en cada uno de los bienes a adquirir de acuerdo a lo señalado en la Lámina L-10A.

El logo institucional tendrá las siguientes características:

Características	Especificación
Dimensiones	9 cm (ancho) x 3 cm (alto)
Grabado	Pirograbado
Fuente	Arial
Tamaño de letra	7 puntos mín.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Dayo FAU
20514347221 scs
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:24:10 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL


Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 scs
Motivo: Doy V° B°

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florinda
Arriola FAU 20514347221 scs
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 14:48:37 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 scs
Motivo: Doy V° B°



2.1.2.2. Identificación de fabricante

Para la identificación del fabricante de la silla de metal y madera para estudiante de 1° - 2° de secundaria, se colocará una lámina autoadhesiva en cada uno de los bienes a adquirir. Este rotulado tendrá las siguientes características:

Características	Especificación
Dimensiones	8-12 cm (ancho) x 4-8 cm (alto)
Material	Autoadhesivo
Color	Rojo
Fuente	Arial
Tamaño de letra	7 puntos mín.
Información a consignar	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de la entidad usuaria en el encabezado - Nombre del procedimiento de selección - Descripción de los bienes (código del bien y nombre del bien) - Nombre del contratista, dirección y teléfono
Ubicación	Parte inferior del bien

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN N°

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Código del bien, Nombre del Bien)

NOMBRE DEL CONTRATISTA (indicar el nombre de todas las empresas que conforman el consorcio de corresponder)

DIRECCIÓN

TELÉFONO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por POBLI
YANOC Tiberio Cayo FAU
20614347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 19.03.2023 19:24:18 -05

2.1.3. Embalaje

Los bienes deben de estar embalados en su totalidad, de forma que no se dañen o deterioren durante el transporte hasta el destino final, tomando en cuenta para la envoltura y embalaje, según lo indicado en la NTP 260.012:2017 MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Embalaje. 3ª Edición.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI
FARFAN Maria Lucre FAU
20614347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 19.03.2023 10:06:50 -05

2.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

2.2.1. Procedencia de la madera

El contratista debe garantizar el origen legal de la madera que utiliza como materia prima para la fabricación de mobiliarios de madera. Para ello, la madera que se adquiere debe estar sustentada en la Guía de Transporte Forestal (GTF), conforme a lo establecido en el Artículo 10 del Decreto Supremo N° 001-2019-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29571, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de la Fauna, y el Reglamento de la Ley N° 29571, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de la Fauna.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
CORRILLA QUINTANA Florentino
Antonio FAU 20614347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 19.03.2023 11:46:54 -05



Supremo N° 018-2015-MINAGRI, en el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, según corresponda:

- Para los casos de madera de especies forestales nativas, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Transporte Forestal (GTF) que ampara la procedencia de la madera. En los casos de títulos habilitantes, en la GTF debe estar consignada la resolución de aprobación del plan de manejo forestal o resolución que aprueba el aprovechamiento forestal (reingresos, movilización de saldos, etc.).
- Para los casos de madera de especies forestales introducidas, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Remisión (GR) con la descripción de la especie que la identifique como introducida y el número de registro de la plantación.
- Para los casos de madera importada, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Remisión (GR) y los documentos de importación.

En el caso el contratista no pueda garantizar el origen legal de la madera, la Entidad contratante podrá notificar a las entidades sancionadoras, en el marco del Art. 215 del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.

2.2.2. Lugar de entrega

El lugar de entrega de los bienes será determinado por cada Entidad contratante, para lo cual brindará el detalle de la(s) dirección(es) respectiva(s). Para ello, podrá tomar en consideración el formato "Dirección(es) de Institución(es) de destino", adjunto en el Anexo N° 01.

Cualquier cambio respecto al lugar de entrega de los bienes dentro de la misma provincia, será comunicado al Contratista por la Entidad contratante, mediante correo electrónico hasta el inicio de la etapa de transporte y entrega de los bienes, sin que dicho cambio suponga una variación en plazos ni costos contractuales de ninguna índole.

En caso la Entidad contratante determine que la entrega de los bienes será en recintos de Instituciones Educativas Públicas, se podrá tomar en consideración el formato "Direcciones de Instituciones Educativas" adjunto en el Anexo N° 01. Asimismo, la Entidad contratante deberá realizar mediante correo electrónico, la notificación al Contratista, respecto de cualquier cambio sobre la asignación de los códigos modulares para la Institución Educativa, sin que dicho cambio suponga el incremento de costos o de tiempo de entrega, todo ello, antes de la elaboración de los Documentos que Acrediten la Entrega de los Bienes.

2.2.3. Etapas de la ejecución contractual

La ejecución se dará en 03 etapas:

1. Etapa de fabricación y embalaje de bienes
2. Etapa de Control de Calidad
3. Etapa de transporte y entrega de bienes

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.03.2023 17:03:03 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.03.2023 11:49:16 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:08:08 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:24:25 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA CRUZ DE CORACORA, DISTRITO
DE CORACORA, PROVINCIA DE PAMPACON, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Belido
Residente de Obra
CIP: 211541



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ETAPAS DE EJECUCIÓN

N°	ETAPA	DESCRIPCIÓN
1)	Fabricación y embalaje de los bienes	El Contratista deberá llevar a cabo la fabricación de los bienes según lo establecido en la Sección Técnica de la presente ficha y sus respectivos anexos; y los numerales 2.2.6.1. Fabricación y 2.2.6.2. Embalaje.
2)	Control de Calidad	El contratista deberá llevar a cabo el control de calidad de los bienes, según lo establecido en el numeral 2.2.7.
3)	Transporte y entrega de los bienes	El Contratista deberá transportar y entregar la totalidad de los bienes, según lo establecido en los numerales 2.2.8.1. Transporte y 2.2.8.2. Entrega.

Consideraciones:

A partir de la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de los bienes, se ingresa a la etapa de control de calidad, dentro de dicho periodo se realizarán las siguientes actividades:

- Verificación Cuantitativa, a partir del día siguiente hábil del ingreso de la "Solicitud de verificación de cantidad por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes" (véase numeral 2.2.7.2)
- Verificación Técnica (véase numeral 2.2.7.3.), a partir del día hábil siguiente de emitido el Informe de Verificación Cuantitativa, contará con las siguientes subetapas:
 - Toma de muestras por parte del Organismo de Evaluación de la Conformidad (véase numeral 2.2.7.1.), a partir del día siguiente hábil de emitido el Informe de Verificación Cuantitativa.
 - Aplicación de métodos de ensayos de los bienes a cargo del Organismo de Evaluación de la Conformidad, a partir del día siguiente hábil de la suscripción del Acta de Toma de Muestras.
 - El Área Usuaría realizará las Inspecciones Técnicas a los bienes, las cuales físicamente se ejecutarán dentro del plazo máximo programado para la aplicación de métodos de ensayos antes mencionados.
- Verificación de la documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes, a partir del día siguiente hábil del ingreso de dicha documentación al Área Usuaría (véase numeral 2.2.7.4).
- Elaboración y notificación de los documentos que acredite entrega de los bienes, a partir del día siguiente hábil de realizada la notificación indicando la aprobación al sustento de las condiciones mínimas para el transporte de los bienes. Finaliza con la entrega de los documentos que acredite entrega de los bienes y la suscripción del Acta de Recepción Documentaria, entre la Entidad Contratante y el Contratista (véase numeral 2.2.8).

Plazos de ejecución:

El plazo de ejecución por cada etapa será determinado por la Entidad contratante de acuerdo con la cantidad de bienes a adquirir, la ubicación y accesibilidad al (a los) lugar(es) de destino, y cualquier otra consideración propia del requerimiento específico de la Entidad.

Considerar la información contenida en el siguiente cuadro, de forma referencial, para los plazos de la ejecución contractual.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:24:33 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL N.º E. SECUNDARIO EN LA
COLEGIO INDUSTRIAL N.º 11 CRISTÓBAL DE LA J. ALBAZ CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Beltrán
Residente de Obra
CIP: 11549

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gerardo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 17:03:13 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:49:24 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:09:17 -05:00



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PLAZO DE EJECUCIÓN (días calendario)				
Cantidad de bienes a adquirir (Und.)	Etapas de fabricación y embalaje (días)	Etapas de control de calidad (días)	Etapas de transporte y entrega (días)	Plazo total de ejecución (días)
1-1,000	10-80	70-75	5-10	85-165
1,000-5,000	40-100	75-80	10-30	125-210
5,000 – 10,000	60-130	75-80	30-50	165-260
10,000 – más	Más de 130	Más de 80	Más de 50	Más de 260

En el siguiente cuadro se detalla el inicio y fin de los plazos respectivos por cada etapa:

PLAZO DE EJECUCIÓN			
Nº	ETAPA	PLAZO	
1)	Fabricación y embalaje de los bienes	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día siguiente de suscrito el contrato. (véase numeral 2.2.5.1 Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de fabricación y embalaje, por parte del contratista, se tomará en cuenta el día del ingreso de la Solicitud de verificación de cantidad. (véase numeral 2.2.6.1 Fabricación)
2)	Control de Calidad	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día siguiente del ingreso de la "Solicitud de verificación de cantidad por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes" (véase numeral 2.2.7.2)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de control de calidad, por parte del contratista, se tomará en cuenta la entrega de los Documentos que acrediten la entrega de bienes y la suscripción del ACTA DE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA, entre el Área usuaria y el CONTRATISTA. (véase numeral 2.2.8.2)
3)	Transporte y entrega de los bienes	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día calendario siguiente de suscrita el Acta de Recepción Documentaria, referida a las "Actas de Entrega de Bienes" entregadas por la Entidad al Contratista. (véase numeral 2.2.8.1 Transporte)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de transporte y entrega, por parte del contratista, deberá ingresar una carta en la cual deberá comunicar el término del Transporte y Entrega de los bienes, y se tomará en cuenta la fecha máxima de recepción consignada en los Documentos que acredite Entrega de los Bienes. (véase numeral 2.2.8.2 Entrega)

04: La propuesta del Contratista deberá considerar las previsiones necesarias para realizar la entrega en las instituciones beneficiadas, según las condiciones climáticas imperantes en la zona.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Belido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 17:03:21 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA GUINER Florencia
Antônio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:49:46 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:09:23 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANZO Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO
Ing. Ricardo Arango Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

2.2.5. Consideraciones generales

2.2.5.1. Requisitos a presentar para la suscripción del contrato

Para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar los siguientes documentos:

Documentación a presentar:

- Cronograma de ejecución del contrato.
- Detalle de los precios unitarios del precio ofertado.
- Presentación de talleres de producción y almacenes.
- Presentación de responsable general de operaciones.
- Declaración Jurada de Almacenaje de los Bienes.
- Plan Covid-19

En el siguiente cuadro se detallan los documentos antes mencionados:

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		
#	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
a)	Cronograma de ejecución del contrato	Deberá incluir fechas y plazos programados para todas las etapas del contrato establecidos en el numeral 2.2.4. PLAZOS DE EJECUCIÓN. El Contratista deberá presentar un Cronograma Ganntt en archivo nativo (formato editable) en programa MS Project, MS Excel o similar. Para ello, deberá ceñirse a los FORMATO N° 01 y FORMATO N° 02, adjuntos en el Anexo N° 05.
b)	Detalle de los precios unitarios del precio ofertado	El cuadro de "Detalle de los precios unitarios del precio ofertado" deberá ser desagregado por Institución de destino, y deberá detallar los costos de adquisición y entrega según la región donde se ubiquen las Instituciones de destino. Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N°03, adjunto en el Anexo N° 05.
c)	Presentación de las ubicaciones de los talleres de producción y almacenes	Se deberá presentar la(s) dirección(es) de su(s) instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes (máximo 04 instalaciones de almacenamiento y/o talleres de fabricación) y los datos del personal técnico de contacto. Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N° 04, adjunto en el Anexo N°05.
d)	Presentación de responsable general de operaciones	Se deberá presentar un formato donde se deberá designar un responsable, el que deberá contar con capacidad de decisión frente a cualquier contingencia que se presente y quien será la persona autorizada para coordinar directamente con la Entidad contratante aspectos relacionados con las prestaciones. Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N° 05, adjunto en el Anexo N° 05.
	Declaración Jurada de Almacenaje de los Bienes	El postor ganador deberá remitir una Declaración Jurada donde se compromete a realizar el almacenaje de los bienes en ambientes techados, sin goteras, sin filtraciones, a fin de garantizar la calidad e integridad de los bienes fabricados y/o almacenados. En caso de incumplimiento se aplicarán las penalidades estipuladas en el numeral 2.2.11.2. OTRAS PENALIDADES.

Consideraciones:

- Todos los documentos indicados en el presente numeral deberán ser presentados de forma digital e impresa, con la firma del representante legal, en idioma castellano.
- Toda la documentación a ser entregada por el Contratista se remitirá por Mesa de Partes de la Entidad contratante y/o el canal determinado por dicha Entidad.
- La Entidad contratante se encargará de revisar el "Cronograma de ejecución del contrato" y el "Detalle de los precios unitarios del precio ofertado" de la propuesta económica, para garantizar que se cumpla con el plazo de ejecución establecido. Luego de la revisión se emitirá la conformidad respectiva o se plantearán las observaciones que deben ser subsanadas por el postor dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- La presentación del cronograma no significa que existirá una variación del plazo de ejecución contractual con el que cuenta el Contratista para la ejecución de sus prestaciones, los cuales se indicarán según lo estipulado en el numeral 2.2.3. PLAZOS DE EJECUCIÓN.

2.2.5.2. Entrega de adelanto

La Entidad contratante determina si se otorga adelanto de pago al contratista. De ser el caso, el contratista podrá solicitar dentro del plazo establecido por la Entidad contratante la entrega del adelanto del 30% del monto del contrato, a partir del día siguiente de suscrito el Contrato, según lo dispuesto en el Artículo N° 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Entidad contratante establecerá el plazo de entrega del adelanto a favor del Contratista.

El pago del adelanto se hará en la moneda establecida por la Entidad contratante.

2.2.5.3 Sobre las comunicaciones electrónicas emitidas por la entidad

El Área Usuaria de cada Entidad contratante determinará el correo electrónico a través del cual se realizarán todas las comunicaciones que emita durante la ejecución del contrato, lo cual será comunicado después de su suscripción.

En el caso que el Área Usuaria realice alguna modificación (ya sea un cambio y/o la adición de una nueva dirección electrónica para la comunicación) a la presente dirección, esta será notificada al Contratista vía correo electrónico durante la ejecución contractual.

La Entidad comunicará a la(s) Institución(es) de destino el contenido de las bases del presente procedimiento de selección con la finalidad que se tome conocimiento de la documentación y procedimientos que se seguirán en la entrega de los bienes.

2.2.6. Etapa de fabricación y embalaje de bienes

El Contratista deberá llevar a cabo la fabricación y embalaje de los bienes según lo establecido en las presentes especificaciones técnicas y sus respectivos anexos.

El Contratista deberá presentar a través de una comunicación por Mesa de Partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, su Solicitud de Calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad adjuntando la información sustentatoria respecto a los Requisitos Mínimos para la selección de los Organismos de Evaluación de la Conformidad, dentro de los 10 días calendario contabilizados a partir del día calendario siguiente de suscrito el contrato, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.3.

Las muestras fabricadas por el Contratista no están incluidas en las cantidades propuestas a ser entregadas en las Instituciones beneficiadas; sin embargo, las muestras sí se contabilizan para la Verificación Cuantitativa.

A partir de la fecha de ingreso de la carta del Contratista donde comunica la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de los bienes, se llevará a cabo el proceso de control de calidad.



2.2.6.1. Finalización de la etapa de fabricación

El Contratista deberá ingresar, a través de Mesa de Partes, una carta dirigida a la Entidad, con copia al Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, su Solicitud de Calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad, en la cual deberá comunicar la culminación de la fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes.

La carta deberá contener la siguiente documentación:

- Solicitud de verificación de cantidades por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes.
- Documentación sobre la Procedencia de la Madera indicado en el numeral 2.2.1. PROCEDENCIA DE LA MADERA.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procederá a aplicar la(s) penalidad(es) correspondiente(s), según lo establecido en el numeral 2.2.11. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2.6.2. Proceso de embalaje

Los bienes deben de estar embalados en su totalidad, de forma que no se dañen o deterioren durante el transporte y almacenamiento hasta el destino final, tomando en cuenta para la envoltura y embalaje, lo indicado en el numeral 2.1.3 Embalaje.

2.2.6.3. Inspecciones inopinadas

La Entidad podrá realizar inspecciones inopinadas a las instalaciones de la fábrica y/o almacenes para verificar o supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, procesos productivos, en aras de velar por el cumplimiento de los plazos de ejecución de la etapa de Fabricación y Embalaje, sin que ello perjudique el desarrollo del proceso de adquisición.

En las Inspecciones Inopinadas realizadas durante el proceso de fabricación de los bienes, la Entidad podrá tomar muestras de los bienes que se encuentren terminados hasta ese momento para analizarlos con equipos de medición para determinar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Los análisis de las muestras obtenidas dentro del plazo de adquisición no representan una paralización en los tiempos de ejecución contractual de los bienes contratados.

Asimismo, la Entidad verificará los procesos de fabricación y el apilado, tanto de la materia prima como de los bienes conforme al avance hasta el momento de realizada la inspección inopinada.

Al finalizar las Inspecciones Inopinadas, se deberá suscribir el Acta de visita inopinada, por el representante del Contratista y la Entidad.

Las inspecciones inopinadas serán programadas dentro del horario establecido por Entidad.

El formato referencial del Acta de Visita Inopinada se encuentra en el Anexo N° 06.

2.2.7. Control de calidad

Durante el periodo del proceso de control de calidad se realizarán actividades para la emisión de la conformidad de la etapa de fabricación, y posteriormente, el informe de cumplimiento de especificaciones técnicas a verificación de la documentación referida al sustento de las condiciones mínimas previo al inicio de la etapa de transporte.

El control de calidad inicia con la Verificación Cuantitativa y culmina con la emisión del Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

El control de calidad involucra la participación del Contratista, la Entidad, el Área Usuaria, el Área designada para el conteo de bienes y el Organismo de Evaluación de la Conformidad en las siguientes actividades:

- Verificación Cuantitativa por parte del Área designada por la Entidad.
- Verificación Técnica: Elección del organismo de evaluación de la conformidad; Toma de Muestras y aplicación de los métodos de ensayos por el Organismo de Evaluación de la Conformidad y las Inspecciones Técnicas por la Entidad.



Los empaques de los bienes y los costos que se generen producto de la Verificación Cuantitativa y de la Verificación Técnica serán realizados y asumidos por el Contratista.

Posteriormente se procede a la verificación de la documentación referida al sustento de las condiciones mínimas para el transporte presentado por el contratista, previo al inicio de la etapa de transporte. Presentación de la documentación referida al Transporte de Bienes por parte del Contratista.

2.2.7.1. Sobre la solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad

El Contratista deberá ingresar la "Solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad", consignando mínimo de 02 y un máximo 03 propuestas, las cuales serán calificadas por el Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, con la finalidad de que cumplan con los requisitos mínimos para realizar la Verificación Técnica a través de métodos de ensayo (según lo especificado en el Anexo N° 02). El Organismo de Evaluación de la Conformidad deberá cumplir con los siguientes Requisitos Mínimos:

1. Deberá acreditar experiencia específica en la realización de los métodos de ensayos descritos en el ANEXO 02. Dicha experiencia deberá ser acreditada mediante copia simple de contratos u órdenes de servicio, con una antigüedad no mayor de 5 años, y su respectiva conformidad o constancia de prestación efectuada; y/o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite fehacientemente con voucher de depósito y/o reporte de estado de cuenta o cancelación en el documento; y/o otros documentos que acrediten fehacientemente la elaboración del informe.
2. La propuesta sobre el plazo de ejecución del servicio no deberá superar los 40 días calendarios como máximo.

El contratista deberá presentar a través de una comunicación por Mesa de Partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, su Solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad adjuntando la información sustentatoria respecto a los Requisitos Mínimos para la selección de los Organismos de Evaluación de Conformidad, dentro de los 10 días calendario contabilizados a partir del día calendario siguiente de suscrito el contrato.

El Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, notificará al Contratista respecto a la calificación de las propuestas del Organismo de Evaluación de la Conformidad, dentro de los 05 días hábiles siguientes a la recepción de dichas propuestas.

De existir observaciones a las propuestas para la calificación, el Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, notificará de manera electrónica al Contratista sobre las mismas, indicándole un plazo de subsanación de 02 a 08 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente calendario de la mencionada notificación hasta el ingreso de la subsanación correspondiente, por Mesa de partes de la Entidad.

Dentro del plazo establecido para levantar las observaciones, el contratista deberá entregar una carta por mesa de partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, adjuntando la documentación completa y necesaria para dichos fines.

De no encontrarse observaciones, o encontrarse las mismas subsanadas, el Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, notificará electrónicamente al Contratista que cuenta con la aprobación de la documentación requerida sustentatoria para su elección del Organismo de Evaluación de la Conformidad y adjuntará la calificación de las propuestas presentadas con la finalidad de que el contratista pueda elegir al Organismo de Evaluación de la Conformidad.

2.2.7.2. Verificación cuantitativa

Una vez que el Contratista ingresa su carta de culminación de la fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes, la Entidad contratante designará al Área encargada de realizar la verificación cuantitativa, en presencia de un especialista del Área Usuaria.



El Área designada por la Entidad, procederá con la verificación de las cantidades de los bienes en su totalidad (por unidad de bien, no piezas). Cabe señalar, que los bienes deben estar empaquetados y embalados en el momento de la verificación, según lo establecido en el numeral 2.2.6.2. Embalaje.

La Verificación Cuantitativa deberá efectuarse en el(los) almacén(es) consignado(s) por el Contratista, en el plazo establecido por la Entidad, para lo cual la Entidad programará la fecha y hora, previa comunicación con el Contratista.

De no contar con el 100% de los bienes fabricados y embalados, incluyendo la totalidad de las muestras, se considerará como incumplimiento por parte del Contratista, no representa una observación y la Entidad procederá a aplicar las penalidades que corresponda de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se tendrá que reiniciar la verificación cuantitativa una vez que el Contratista lo solicite nuevamente al ingresar una segunda carta de Solicitud de Verificación de cantidad por la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes, por Mesa de Partes de la Entidad, con copia al Área Usuaria, para proceder con la Verificación Cuantitativa según lo anteriormente descrito. (Véase Nota 05)

Al término de la verificación cuantitativa, se deberá suscribir el Acta de Verificación Cuantitativa de bienes por ambas partes (Contratista y representantes de la Entidad), en la que se consignará el cumplimiento de la obligación del Contratista.

La verificación cuantitativa finaliza con la emisión del "Informe de Verificación Cuantitativa" de parte del Área designada, donde se comunicará al Área Usuaria, el resultado del trabajo de verificación cuantitativa, en el cual se deberá adjuntar el Acta de Verificación Cuantitativa.

El formato referencial para el Acta de Verificación Cuantitativa se encuentra en el Anexo N° 06.

Nota 05: El proceso de control de calidad inicia a partir del ingreso de la "Solicitud de verificación de cantidad por la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes" por parte del Contratista, vía Mesa de Partes de la Entidad contratante.

2.2.7.3. Verificación técnica

Después de emitido el "Informe de Verificación Cuantitativa", la Entidad y un Organismo de Evaluación de la Conformidad realizarán la Verificación Técnica.

La Verificación Técnica inicia con la toma de muestras de los bienes fabricados, continúa con la aplicación de métodos de ensayos a las muestras, así como con las Inspecciones técnicas por parte del Área Usuaria y culmina con la emisión del "Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" del Área Usuaria.

La calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad será realizada por el Área Usuaria, remitiendo el resultado de la calificación de las propuestas al contratista, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.1.

La elección del Organismo de Evaluación de la Conformidad será realizada por el contratista, tomando en cuenta la calificación realizada por el Área Usuaria de la Entidad contratante.

Los costos de las pruebas y/o aplicación de métodos de ensayos para las muestras, así como los gastos generados para la presencia del personal de laboratorio y la toma de muestras por la contratación del Organismo de Evaluación de la Conformidad deberán ser asumidos por el Contratista, incluyendo volver a aplicar los métodos de ensayos en caso los bienes se encuentren observados.

2.7. Sobre las muestras y la aplicación de métodos de ensayo.

El contratista debe proveer las muestras para cada tipo de bien según corresponda, de acuerdo con lo señalado en el Anexo N°02.

Se precisa que el Organismo de Evaluación de la Conformidad realizará la aplicación de métodos de ensayos y pruebas a las muestras tomadas de los bienes según lo estipulado en el Anexo N° 02.

El número de muestras para los ensayos y/o pruebas para la certificación serán fabricadas por el Contratista, de acuerdo con la NTP 260.014.2021. Las muestras fabricadas por el contratista no están incluidas en las cantidades propuestas a ser entregadas en las Instituciones de destino; sin embargo, las muestras sí se contabilizan para la Verificación Cuantitativa según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2.

2.2.7.3.2. Toma de muestras

A partir del día siguiente hábil de recibido el Informe de Verificación Cuantitativa en el Área Usuaría, indicando la conformidad de la misma, el Área Usuaría y el Contratista coordinarán la fecha para la Toma de Muestras.

La toma de muestras para la aplicación de métodos de ensayos se deberá realizar en uno de los almacenes del Contratista en presencia de un representante de la Entidad. La(s) dirección(es) del (de los) almacén(es) debe coincidir con la información presentada para la suscripción del contrato o, de corresponder, con la información modificada mediante el procedimiento establecido en el numeral 2.2.5.1. Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato.

Se precisa que las muestras se toman bajo el nivel de inspección S1 de la NTP 260.014.2021 vigente.

El Organismo de Evaluación de la Conformidad tomará la cantidad de muestras del tipo de mobiliario, realizando una selección de manera aleatoria, en presencia de un representante del Contratista y del Área Usuaría, procediendo a llevarlos a sus instalaciones para la evaluación y/o procedimientos correspondientes, según lo estipulado en la NTP 260.014.2021. En este momento se suscribirá el Acta de Toma de Muestras entre la Entidad, el Contratista y el Organismo de Evaluación de la Conformidad.

Es de responsabilidad del Contratista programar la fecha de toma de muestras para la aplicación de métodos de ensayos y cumplir con entregar la documentación requerida en los plazos establecidos.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procederá a aplicar la(s) penalidad(es) correspondiente, según lo establecido en el numeral 2.2.11. Incumplimiento de Contrato y Penalidades.

El formato referencial del Acta de Toma de Muestras se encuentra en el Anexo N° 06.

2.2.7.3.3. Métodos de ensayo

El Contratista deberá entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, el "Informe de ensayos" en el plazo establecido por la Entidad, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del "Acta de Toma de Muestras", según lo estipulado en el Anexo N° 02.

El "Informe de ensayos" deberá incluir los Informes técnicos de las pruebas y/o métodos de ensayos realizados a las muestras, los cuales serán acreditados por el Organismo de Evaluación de la Conformidad seleccionado por la Entidad, según lo establecido en el numeral 2.2.6.1.

El Área Usuaría revisará el "Informe de Ensayos" en un plazo de 3 a 7 días calendario.

De encontrarse alguna(s) observación(es) en el informe de ensayos elaborado por el Organismo de Evaluación de la Conformidad, será(n) consignada(s) en el Informe de Especialista según lo descrito en el numeral 2.2.7.3.4. y se le otorgará un plazo definido el Entidad representante de acuerdo a la complejidad de la observación, para el levantamiento

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
6PA, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO VICTORINO LARREA DE CORACORA PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA

El Contratista deberá ingresar una carta por Mesa de Partes de la Entidad y dirigida al Área Usuaria, dentro del plazo que se le otorgue, donde comunicará el levantamiento de observaciones, a fin de proceder con la verificación correspondiente. En caso el contratista incumpla con la presentación de levantamiento de observaciones en el plazo establecido, la Entidad procederá a aplicar la(s) penalidad(es) correspondiente(s), según lo establecido en el numeral 2.2.11.2 OTRAS PENALIDADES.

Comunicada la subsanación, la Entidad procederá a realizar la verificación del Levantamiento de Observaciones en presencia del Organismo de Evaluación de la Conformidad, a fin de que se proceda con la nueva Toma de Muestras del lote observado (en caso las observaciones contemplen de nuevo la aplicación de métodos de ensayos); y en caso las observaciones no requieran de realizar nuevamente ensayos al lote a través de muestreo, el especialista de la Entidad podrá realizar la verificación correspondiente.

El Contratista deberá contar con la totalidad del lote y adicionalmente el total de las muestras para subsanación de observaciones, de lo contrario se considerará como incumplimiento en el levantamiento de observaciones, pudiendo la Entidad aplicar las penalidades y/o acciones correspondientes según el numeral 2.2.11. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

Si pese al plazo de subsanación otorgado, el Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato total o parcialmente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades en las que hubiera incurrido.

Si los bienes manifiestamente no cumplen con las características y condiciones ofrecidas, la Entidad no efectuará la recepción de los mismos, debiendo considerarse como no ejecutada la etapa, aplicándose las penalidades que correspondan de acuerdo a Ley.

2.2.7.3.4. Inspecciones técnicas

El Área Usuaria podrá realizar inspecciones técnicas a los bienes en paralelo a la aplicación de métodos de ensayos realizados por el Organismo de Evaluación de la Conformidad durante el periodo de Verificación Técnica, donde el Contratista y la Entidad suscribirán el(las) Acta(s) de Verificación Técnica.

De encontrarse alguna observación en la(s) inspección(es) técnica(s) realizadas por el Área Usuaria, serán consignadas en un Informe de Especialista, y de corresponder, complementarán a las observaciones realizadas por el Organismo de Evaluación de la Conformidad. Estas observaciones serán notificadas al Contratista mediante un documento elaborado por el Área Usuaria, donde se detallen las observaciones realizadas por el Organismo de Evaluación de la Conformidad y las observaciones realizadas por el Especialista de la Entidad.

El Contratista deberá absolver las observaciones en un plazo no menor de 02 días ni mayor de 08 días calendario, contados a partir del día siguiente de realizada la notificación presencial y/o electrónica, para lo cual deberá ingresar una carta por Mesa de Partes de la Entidad y dirigida al Área Usuaria, donde comunicará el levantamiento de observaciones, a fin de que el Área Usuaria proceda a realizar la verificación de la subsanación de observaciones, dejando constancia de ello mediante la suscripción del Acta de Verificación Técnica por parte del Contratista y la Entidad.

La Entidad puede complementar las Acta(s) de Verificación Técnica con registro de evidencias filmicas y/o fotográficas de la situación encontrada en la(s) revisión(es) técnica(s).

De no encontrarse observación o de encontrarse las mismas subsanadas, el Área Usuaria elaborará el Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de la etapa de Fabricación y Embalaje.

Los formatos referenciales del Acta de Verificación Técnica y del Acta de Verificación de Levantamiento de Observaciones se encuentran en el Anexo N° 06.



2.2.7.4. Documentación para el transporte de los bienes

A fin de garantizar que el transporte de los bienes se mantenga dentro de los niveles de calidad y seguridad, el Contratista deberá presentar al Área Usuaria, a través de Mesa de Partes de la Entidad, los documentos sobre el transporte de los bienes, en el plazo establecido por la Entidad, contabilizado a partir del día siguiente de la notificación por correo electrónico realizada por el Área Usuaria.

De no presentar la documentación completa y en el plazo estipulado por la Entidad, el Contratista será penalizado de acuerdo con el numeral 2.2.11.2. OTRAS PENALIDADES.

El Área Usuaria deberá revisar y verificar que el Contratista cumpla con las condiciones mínimas antes del inicio de la etapa de Transporte y Entrega de los bienes hasta los lugares de destino.

De existir observaciones, el Área Usuaria podrá notificar de manera electrónica al Contratista sobre las mismas, indicándole un plazo de subsanación de 02 a 08 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente calendario de la mencionada notificación.

Para la subsanación de las observaciones, el Contratista deberá ingresar una carta por Mesa de Partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, adjuntando la documentación completa y necesaria para dichos fines. La fecha de ingreso de la carta por Mesa de Partes se contabilizará como fecha fin del plazo para la subsanación de observaciones.

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el Área Usuaria notificará electrónicamente al Contratista indicándole que cuenta con la aprobación de la Documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes, sin perjuicio de las condiciones operativas y/o de vigencia documentaria que se deben mantener para la totalidad de la documentación solicitada.

La documentación requerida se detalla a continuación:

Documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes	
Nº	Documentación Requerida
1	<p>Póliza de Seguro de transporte terrestre nacional</p> <p>El transporte de los bienes deberá contar con la póliza de seguro a nivel nacional.</p> <p>VALOR MÍNIMO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL será el 100% del valor del monto adjudicado.</p> <p>Adicionalmente la póliza deberá hacer referencia al procedimiento de selección y/o al número de contrato, pudiendo realizarse mediante un anexo a la póliza o cualquier documento adicional emitido por la aseguradora.</p> <p>Todo esto por la reposición de los bienes transportados en caso de siniestro, esta póliza deberá ser efectiva antes del inicio de la etapa de transporte y entrega de los bienes.</p>
2	<p>SCTR</p> <p>SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para el personal del contratista asignado para la realización del servicio de transporte y entrega de los bienes.</p>
	<p>Flota de Vehículos</p> <p>Relación completa de los vehículos a utilizar especificando como mínimo: modelo, placa, tarjeta de propiedad, tarjeta de Habilitación vehicular para el transporte de mercancías, tipo de vehículo, capacidad máxima de carga de vehículo expresado en kilogramos y en pesos cúbicos, copia simple de la Tarjeta de Propiedad, SOAT vigente de cada una de las unidades, REVISIÓN TÉCNICA vehicular aprobada y vigente de acuerdo con ley.</p> <p>La antigüedad máxima de los vehículos será de 10 años, contabilizados a partir del año siguiente de fabricación de estos.</p>

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
DELEGACIÓN DE AYACUCHO, PUNTO DE VENTA DE LA COMISIÓN DE AYACUCHO
DE CORA CORA PROVINCIA DE PARACUTIN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Versión: 02

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Móvil: Dey V. B.
Email: 15.03.2023 10:25:44 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florentino
FAU 20514347221 soft
Móvil: Dey V. B.
Email: 15.03.2023 10:25:44 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARRAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Móvil: Dey V. B.
Email: 15.03.2023 10:25:44 -05:00



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
DELEGACIÓN DE AYACUCHO, PUNTO DE VENTA DE LA COMISIÓN DE AYACUCHO
DE CORA CORA PROVINCIA DE PARACUTIN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Página 20 de 50
Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROSLES
YANOC Tibério Cayo FAU
20514347221 soft
Móvil: Dey V. B.
Fecha: 15.03.2023 10:25:44 -05:00

4	<p>Autorización para prestar Servicio de Transporte de Mercancías en General:</p> <p>Otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (acreditado mediante copia simple y/o copia simple de la página web del MTC donde figure la inscripción en el citado registro); asimismo cabe precisar que, respecto al Transporte de los bienes, este deberá cumplir con ser un vehículo cerrado a fin de garantizar la seguridad e integridad de los bienes y su distribución vía terrestre.</p> <p>En caso el contratista opte por subcontratar el servicio de transporte, deberá presentar la autorización de la empresa subcontratada.</p> <p>En caso de uso de otras vías de transporte (fluvial, marítima, etc.), el contratista deberá agregar propuesta de la ruta y tipos de vehículos a utilizar, adjuntando imagen referencial de vehículos.</p>
5	<p>Plan COVID-19</p> <p>"Plan para vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" aprobado por el sector competente, debidamente registrado en el Sistema integrado para COVID-19 (SICOVID-19) adjuntando la constancia del sector competente, la constancia del registro en SICOVID-19, el correo de envío al MINSA, según corresponda en el marco de lo establecido por el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM; Decreto Supremo 110-22-PCM; Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA; la Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC/01, modificada por la Resolución Ministerial N° 0301-2020 MTC/01, sus modificatorias y demás normas que emita el sector correspondiente.</p>

2.2.8. Etapa de transporte y entrega de los Bienes

El Área Usuaria realizará la notificación electrónica al Contratista, indicándole la aprobación de la documentación presentada según lo establecido en el numeral 2.2.7.4. Documentación para el Transporte de los bienes.

Con la aprobación de la Documentación para el transporte de los bienes, la entidad elaborará los documentos que acredite la entrega de los bienes, teniendo como plazo de 3 - 15 días calendario, los mismos que serán notificados por correo electrónico al contratista a fin de que se apersona a recogerlos en un plazo no mayor de 3 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de recibida la notificación.

El inicio del plazo de la etapa de transporte y entrega de los bienes a los destinos especificados en el numeral 2.2.1. LUGAR DE ENTREGA, es a partir del día calendario siguiente de la suscripción del Acta de Recepción Documentaria por el Contratista.

Para el cómputo del plazo de la fecha de culminación del transporte y entrega de los bienes, se considera la última fecha que figure en el(los) Documentos que Acredite Entrega de los Bienes de la Entidad, según lo establecido en el numeral 2.2.3. PLAZOS DE EJECUCIÓN.

El formato referencial del Acta de Recepción Documentaria se encuentra en el Anexo N° 06.

2.2.8.1. Transporte

El Contratista deberá realizar el transporte de los bienes a las Instituciones de destino, en cumplimiento con los requisitos solicitados en el numeral 2.2.7.4. Documentos sobre el Transporte de los bienes.

El Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, realizará la notificación por correo electrónico al Contratista, a fin de que se apersona a recoger el(los) Documentos que Acredite Entrega de los Bienes de la Entidad, en el plazo establecido por la Entidad, caso contrario será penalizado según el numeral 2.11.2. Otras Penalidades.

En el momento de la entrega del (de los) Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, se suscribirá el Acta de Recepción Documentaria por el Contratista.

En caso el destino de transporte sea una(s) Institución(es) Educativa(s), no se permite que vehículos pesados ingresen a los patios de ésta(s); en caso se evidencie de manera documentada esto, se aplicará lo estipulado en el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

Cada unidad deberá transportar sólo y exclusivamente los bienes objeto de la contratación; en caso se evidencie de manera documentada la ocurrencia del incumplimiento, se aplicará lo estipulado en el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

El transporte debe efectuarse con un vehículo cerrado a fin de garantizar la seguridad e integridad de los bienes, caso contrario se aplicará lo estipulado en el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

Todo vehículo de transporte que salga en ruta deberá acompañar la carga con el(los) Documentos que acredite Entrega de los Bienes proporcionado(s) por la Entidad y la guía de remisión del transportista. En ambos casos deberá indicar el destino final y el detalle del material transportado en conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Asimismo, durante la etapa de transporte y entrega, deberán contar con unidades de contingencia o transporte alternativo de características similares o superiores a las unidades asignadas para el servicio. En caso se produzca una avería o desperfecto que inhabiliten alguna unidad registrada, se deberá reemplazar la unidad en un lapso no mayor a 48 horas (teniendo en cuenta el personal necesario y equipado para la tarea de transbordo de los materiales).

2.2.8.2. Entrega

Es de responsabilidad del Contratista la carga y descarga de los bienes en el lugar de embarque y destino, al igual que la entrega de los bienes en buen estado de las cantidades descritas en los Documentos que acredite Entrega de los Bienes, a los destinos establecidos en el numeral 2.2.2. LUGAR DE ENTREGA, así como de la devolución de la documentación sustentadora de recepción, conforme a la cantidad de juegos de Documentos que acredite Entrega de los Bienes entregados por la Entidad.

Un juego de Documentos que acredite Entrega de los Bienes original, debidamente firmada en original se debe quedar con la persona firmante como representante de la Institución de destino.

Los bienes serán entregados en perfecto estado de conservación, adecuadamente armados y embalados hasta su destino final, sin ningún defecto de adquisición, ni otro como consecuencia de la estiba o desestiba o del transporte.

La entrega de los bienes a los lugares de destino será sustentada con la presentación de lo siguiente:

- Guía de Remisión del Transportista
- Documentos que acredite Entrega de los Bienes: PECOSA, Acta de entrega de Bienes, etc
- El (Los) Documentos que acredite Entrega de los Bienes, representan la aceptación de los bienes por parte de los representantes de las Instituciones de destino, podrán ser suscritos por las siguientes autoridades:
- Representante designado y autorizado por la Entidad contratante.
- En caso la dotación se realice a una Institución Educativa, podrá suscribir un representante designado y autorizado por la UGEL y/o DRE correspondiente a la jurisdicción de la Institución Educativa de destino.

La información que debe ser consignada en los Documentos que acredite Entrega de los Bienes es la siguiente:

- Firma legible
- Fecha de conformidad de los bienes
- Copia de DNI del firmante, donde se aprecie su firma.

En caso se realice la modificación del lugar de entrega por parte del Área Usuaria, entonces el Documentos que acredite Entrega de los Bienes podrá ser firmada por la dirección de dicha Área.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
FARFAN, Tiberio Cayo FAUJ
20514347221 soft
Módulo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2023 19:26:02 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI
FARFAN, María Lupe FAUJ
20514347221 soft
Módulo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 13:10:46 -05

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE PLANEAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
CORA CORA PROVINCIA DE Tarma DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residencia de Obra
CIP: 211541



Versión 02

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO, Gonzalo Eneas FAUJ
20514347221 soft
Módulo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2023 17:08:07 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA, Quintana, Florencia
Arispe FAUJ 20514347221 soft
Módulo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 11:57:58 -05:00



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
Pagina 2 de 65 SOBRA
CIP: 98718

Los datos de la institución de destino y su personal para la recepción de los bienes y el firmado del Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, serán coordinados directamente por el Contratista.

Finalizada la Entrega de la totalidad de bienes, el Contratista deberá presentar al Área Usuaría, por Mesa de Partes de la Entidad, una carta documentada que indique la culminación del transporte y entrega de la totalidad de los bienes en la(las) institución(es) de destino.

La carta deberá contener lo siguiente:

- Los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes originales establecida por la Entidad.
- Guías de remisión del transportista, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2. ENTREGA.
- Copias del DNI del firmante, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2. ENTREGA.
- Certificados de Garantía de Adquisición de los bienes (véase el numeral 2.2.12. GARANTÍA COMERCIAL DE LOS BIENES)
- Informe Fotográfico de Entrega de Bienes donde se adjunten fotografías y/o videos de los bienes siendo entregados en la(s) dirección(es) que figure(n) en el numeral 2.2.2. LUGAR DE ENTREGA. Estas fotografías y/o videos servirán para acreditar la correcta entrega de los bienes, debiendo figurar como mínimo la siguiente información:
 - Fotografía y/o video del vehículo iniciando la descarga de los bienes, en la cual se muestre la placa del vehículo.
 - Fotografía y/o video mostrando las Instalaciones de la Institución de destino. Mínimo 1 fotografía y/o video de 10 segundos aproximados.
 - Fotografía del representante de la Institución de destino, en el momento de la recepción de los bienes. Mínimo 1 fotografía y/o video de 10 segundos aproximados.
 - Fotografías y/o videos mostrando el estado de los bienes, recepcionados mostrando el logotipo y rotulado de los bienes. Mínimo 2 fotografías y/o videos de 10 segundos aproximados.

2.2.8.3. Verificación documentaria

Finalizada la Entrega de la totalidad de bienes, el Contratista deberá presentar al Área Usuaría, por Mesa de Partes de la Entidad, una carta documentada que indique la culminación del transporte y entrega de la totalidad de los bienes en la(las) institución(es) de destino.

La documentación mencionada como parte de la carta de culminación del transporte y entrega de los bienes según lo estipulado en el numeral 2.2.8.2., será parte integral de la Verificación Documentaria que realizará el Área Usuaría.

De encontrarse alguna observación en el marco de la verificación documentaria ésta deberá ser remitida al Contratista de manera electrónica y/o física por el Área Usuaría; otorgando un plazo de entre 02 a 08 días calendario para subsanarlas.

El Contratista deberá remitir al Área Usuaría una carta por Mesa de Partes de la Entidad, indicando el levantamiento de observaciones, adjuntando la subsanación correspondiente.

La fecha de ingreso de dicha comunicación a la Entidad se tomará como fecha de fin de subsanación de las observaciones.

Si pese al plazo otorgado, el Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato total o parcialmente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades a que hubiera incurrido; y en el marco de la ley vigente.

De no encontrarse las mismas subsanadas por el Área encargada de la Verificación Documentaria que Acredite Entrega de los Bienes, procederá a



Asimismo, el Área Usuaria notificará de manera presencial y/o electrónica al Contratista para que proceda con el ingreso de la(s) Factura(s) y CCI correspondiente.

2.2.9. Conformidades

2.2.9.1. Conformidad por fabricación y embalaje

Una vez notificado el "Informe de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" por la Entidad, el Contratista deberá entregar los siguientes documentos:

- Factura

Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista
Los documentos necesarios para el pago de la conformidad de la etapa de Fabricación y Embalaje de los bienes son los siguientes:

- Informe de Verificación Cuantitativa (emitido por el Área designada por la Entidad)
- Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (emitido por el Área Usuaría)
- Factura (remitido por el Contratista)
- Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista (remitido por el Contratista).

Una vez que el Área Usuaria tenga la totalidad de los documentos antes señalados, se procederá a otorgar la "Conformidad por fabricación y embalaje de los bienes" por parte de la Entidad.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los 10 días calendario siguiente a la "Conformidad por fabricación y embalaje de los bienes", siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

2.2.9.2. Conformidad por transporte y entrega

Una vez notificado el "Informe de Cumplimiento Documentario" por la Entidad, el Contratista deberá entregar los siguientes documentos:

- Factura

Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista
Los documentos necesarios para el pago de la conformidad de la etapa de Transporte y
Entrega de los bienes son los siguientes:

- Informe de Cumplimiento Documentario (emitido por el Área de la Entidad que emita los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes)
- Acta de Recepción Documentaria (suscrita por el Contratista)
- Factura (remitido por el Contratista)
- Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del Contratista (remitido por el Contratista)

Una vez ingresado los documentos antes señalados por parte del Contratista y realizada su verificación, se procederá a otorgar la "Conformidad por el transporte y entrega de los bienes" por parte de la Entidad.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los 10 días calendario siguiente a la "Conformidad por el transporte y entrega de los bienes", siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

Forma de pago

La Entidad emitirá los pagos según el siguiente detalle:

I. PAGO POR FABRICACIÓN Y EMBALAJE DE LOS BIENES	
Forma de Pago	Monto de Pago
Para el pago por fabricación y embalaje de los bienes, el Contratista deberá seguir el procedimiento detallado en el numeral 2.2.9.1 Conformidad por Fabricación y Embalaje)	El porcentaje y/o monto del pago será definido por la Entidad.
II. PAGO POR TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIENES	
Forma de Pago	Monto de Pago
Para el pago por transporte y entrega de los bienes, el Contratista deberá seguir el procedimiento detallado en el numeral 2.2.9.2 Conformidad por Transporte y Entrega).	El porcentaje y/o monto del pago será definido por la Entidad.

2.2.11. Incumplimiento de contrato y penalidades

2.2.11.1. Penalidades

En caso que el contratista incumpliera de forma injustificada con los plazos descritos en la presente ficha de homologación, será indefectiblemente objeto de las penalidades correspondientes según las Normas Legales vigentes (Artículo N°162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones); por consiguiente, la Entidad cobrará a través de las deducciones correspondientes.

2.2.11.2. Otras penalidades

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se determinan otras penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente y directamente relacionadas con los Bienes en el ANEXO N° 4.

La aplicación de la penalidad no exceptúa al Contratista de su responsabilidad, sobre los daños a las Instituciones de destino o terceros, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

Nota 06: La Entidad contratante podrá determinar el monto (M) dependiendo de las características del Requerimiento.

2.2.11.3. Resolución de contrato

Será motivo de la Resolución de Contrato: el incumplimiento parcial o total del Contrato, en el marco de la Ley de Contrataciones de Estado.

2.2.12. Garantía comercial de los bienes:

CONSIDERACIONES DE LA GARANTIA	
Garantía de los Bienes	05 años
Aplicación de Garantía (Véase Nota 07)	Hasta 15 días calendario como máximo para brindar solución; contabilizado a partir del día calendario siguiente de notificada la solicitud de aplicación de garantías.

Nota 07: La Entidad contratante podrá determinar el tiempo adecuado según el requerimiento.

El Contratista es responsable por la garantía de los bienes. La garantía es por defectos de Fabricación / Adquisición y Embalaje y no por mal uso de los bienes por parte del usuario final.

El plazo de la garantía cuenta a partir del día siguiente calendario de firmado los Documentos que acredite Entrega de los Bienes por Representantes de cada Institución de destino según lo estipulado en el numeral 2.2.8.2. ENTREGA.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA LE
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA FUENTE DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA LE
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA FUENTE DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
(ANOG Tiberio Cayo FAU)
20514347221-sof
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 19:26:25 -05

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI
FARFAN María Lupe FAU
20514347221-sof
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 10:11:11 -05

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAUD
WERRERO Gonzalo Eliza FAU
20514347221-sof
Motivo: Day V B
Fecha: 10.03.2023 17:37:13 -0500

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonia FAU 20514347221-sof
Motivo: Day V B
Fecha: 13.03.2023 11:54:01 -05 0

La garantía deberá estar acreditada por documentación del Contratista, esta documentación deberá estar firmada por su representante legal, referida a los bienes ofertados y su transporte y entrega realizada.

Se deberá entregar 01 Certificado de Garantía por cada Institución de destino, los mismos que serán remitidos a la Entidad para la elaboración de la conformidad de la prestación, estipulando claramente el inicio del plazo de garantía de los bienes, las descripciones y números de series de los mismos, de corresponder.

El Contratista garantizará la calidad de los bienes fabricados de acuerdo a los planos y demás documentos contractuales según las especificaciones técnicas del bien.

La Entidad notificará al Contratista de cualquier reclamo relacionado con la garantía de manera física y/o mediante correo electrónico, el Contratista al recibir esa notificación deberá tomar las acciones correspondientes para informar y/o reparar y/o reemplazar los bienes y/o componentes y/o instalaciones defectuosas en su totalidad o en parte según sea el caso, en las Instituciones de destino sin costo alguno para éstas, ni para la Entidad.

Si el Contratista después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del plazo indicado en el cuadro de consideraciones de garantía entonces la Entidad podrá tomar las medidas correctivas que sean necesarias, por su propia cuenta y riesgo y sin perjuicio de los demás derechos que la Entidad tenga ante el Contratista, en conformidad con la legislación vigente.

2.2.13. Responsabilidad por vicios ocultos:

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo de 05 años.

Este plazo cuenta a partir del día siguiente de emitida la conformidad de la prestación por parte del área usuaria.

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

3.1 De la selección:

Documentos de presentación obligatoria por el postor:

- Relación de especies de madera a utilizar en el proceso de fabricación del bien especificado en la presente ficha de homologación. Dicha relación se presentará con el formato de Ficha de presentación de producto adjunta en el Anexo N° 07.

IV. ANEXOS

- Anexo N° 01: Formato del Lugar de destino
 - Dirección(es) de Institución(es) Educativa(s) de destino
- Anexo N° 02: Pruebas y/o ensayos para la verificación de calidad
- Anexo N° 03: Planimetría
- Anexo N° 04: Cuadro de Otras penalidades
- Anexo N° 05: Requisitos que presentar para la Suscripción del Contrato
- Anexo N° 06: Actas referenciales para el proceso de ejecución contractual
- Anexo N° 07: Ficha de presentación de producto

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 17:07:26 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencio Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 11:54:17 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lirio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 10:11:17 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROSALES YANOC Tibeno Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 18:28:35 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACACHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Versión:



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ANEXO N° 01

FORMATO PARA INDICAR LUGAR DE DESTINO

- Dirección(es) de Institución(es) Educativa(s) de destino

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 17:07:35 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:58:12 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:11:24 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 19:06:43 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO WILTON INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA POSESIÓN DE CORA CORA DISTRITO
DE CORA CORA - PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO WILTON INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA POSESIÓN DE CORA CORA DISTRITO
DE CORA CORA - PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

DIRECCION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS								
Nº DE ORDEN	CÓDIGO MODULAR	CÓDIGO LOCAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	SUB TOTAL DE BIENES
1								
2								
TOTAL GENERAL								

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20614347221 soft
Motivo: Dey Vº Bº
Fecha: 10.03.2023 17:14:39 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20614347221 soft
Motivo: Dey Vº Bº
Fecha: 13.03.2023 11:55:50 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARRAN Maria Lupe FAU
20614347221 soft
Motivo: Dey Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 10:11:31 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por POBLES
YANCO, Edano Cayo FAU
20614347221 soft
Motivo: Dey Vº Bº
Fecha: 16.03.2023 19:26:52 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MILITARIO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DEL ALCALDIO DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MILITARIO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DEL ALCALDIO DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTA CANCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98716

ANEXO N° 02

PRUEBAS Y/O ENSAYOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD

- Normas técnicas para la verificación de mobiliario
- Control de calidad

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 17:16:07 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:55:48 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:11:38 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANUC Tizano Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 19:26:59 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA ALFONSO DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA ALFONSO DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

El mobiliario a fabricar, al igual que la certificación de calidad se ceñirá a las siguientes normas y sus respectivas enmiendas y revisiones con actual vigencia, según corresponda por tipo de bien.

CUADRO N° 01: NORMAS TÉCNICAS QUE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL MOBILIARIO ESCOLAR	
CÓDIGO	TÍTULO DE LA NORMA
RVM N°019-2023-MINEDU	Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular
NTP 260.008:2019	MOBILIARIO ESCOLAR. Silla para nivel de educación secundaria. Requisitos. 4ª Edición
NTP 260.010:2019	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Clasificación y tipos. 4ª Edición
NTP 260.011:2017	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Definiciones. 3ª Edición
NTP 260.012:2017	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Embalaje. 3ª Edición
NTP 260.013:2017	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Rotulado. 3ª Edición
NTP 260.014:2021	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Muestreo. 4ª Edición
NTP 260.015:2021	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Requisitos. 5ª Edición

CUADRO N° 02: NORMAS TECNICAS QUE ESTABLECEN METODOS DE ENSAYO PARA LOS BIENES Y MATERIALES	
CÓDIGO	TÍTULO
NTP 260.026:2019	MUEBLES. Sillas para instituciones educativas. Requisitos de seguridad y determinación de la estabilidad, la resistencia y la durabilidad. 4ª Edición

- **Fabricación y embalaje:** corresponde que el bien se encuentre acabado y embalado, preparado para ser utilizado en conformidad de la Entidad.
- **Transporte, entrega:** corresponde que el bien sea entregado sin deterioro por el transporte y colocado en el ambiente designado por la autoridad de cada Entidad de destino. Deberá estar conforme con la Entidad.
- **Defectos Críticos:** Defectos que imposibilita el uso del producto y/o que puede afectar la seguridad del usuario.
- **Defectos Mayores:** Defectos que, sin llegar a ser críticos, en cierto plazo afectan el uso de las unidades.
- **Defectos Menores:** Defectos que no afectan el uso de las unidades.
- **Inspección por atributos:** Inspección mediante el cual se clasifica una unidad de producto como conforme o no conforme, o se cuenta el número de no conformidades en la unidad de producto, con respecto a un determinado requisito o conjunto de requisitos.
- **Límite de Calidad Aceptable (LCA):** Es el nivel máximo permisible de unidades no conformes de la muestra de un lote.
- **Lote:** Es el conjunto de muebles de un mismo modelo fabricados en un determinado período, bajo condiciones iguales.



Version 02



Firmado digitalmente por BRAVO
 GUERRERO Gonzalo Elias FAU
 20514347221 gov
 Motivo: Doy Vº Eº
 Fecha: 10.03.2023 17:18:19 -05:00



Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221.sc9
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:58:22 -05:00



Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V-B
Fecha: 15.03.2023 10:11:49 -05:00



Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tibiana Cayo FAU
20614347221 sof
Módulo: Day Vº 9º
Fecha: 15/03/2023 19:27:06 -05:00

ng. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CID: 08718



PLAN DE MUESTREO

Se precisa que las muestras se toman bajo el nivel de inspección S1 de la NTP 260.014.2017 vigente (incluyendo sus últimas revisiones).

CUADRO N°03: TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA MOBILIARIO									
Tamaño del Lote			Niveles de Inspección Especial				Niveles de Inspección General		
			S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2	a	8	A	A	A	A	A	A	B
9	a	15	A	A	A	A	A	B	C
16	a	25	A	A	B	B	B	C	D
26	a	50	A	B	B	C	C	D	E
51	a	90	B	B	C	C	C	E	F
91	a	150	B	B	C	D	D	F	G
151	a	280	B	C	D	E	E	G	H
281	a	500	B	C	D	E	F	H	J
501	a	1200	C	C	E	F	G	J	K
1201	a	3200	C	D	E	G	H	K	L
3201	a	10000	C	D	F	G	J	L	M
10001	a	35000	C	D	F	H	K	M	N
35001	a	150000	D	E	G	J	L	N	P
150061	a	500000	D	E	G	J	M	P	Q
500001	a	más	D	E	H	K	N	Q	R

↓ = Use el primer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el tamaño de la muestra es igual o excede el tamaño del lote lleve a cabo inspección 100%
 ↑ = Use el primer plan de muestreo arriba de la flecha
 Ac = Número de aceptación
 Re = Número de rechazo

En concordancia con las letras código según el tamaño del lote, se utilizará la siguiente tabla para determinar de la muestra y los LCA correspondientes:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 17:15:32-05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 11:57:24-05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: CASTILLO PARRAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:12:00-05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: ROBLES YANCO Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 19:27:14-05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOMA DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOMA DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

		Límite de calidad aceptable, LDA, en porcentaje de ítems no conformes o no conformidades por 100 ítems (inspección normal)																											
Lote	Código de lote	Tamaño de muestra	Límite de calidad aceptable, LDA, en porcentaje de ítems no conformes o no conformidades por 100 ítems (inspección normal)																										
			0.00	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30
A	2	2	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac
B	3	3	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac
C	5	5	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac
D	8	8	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac
E	13	13	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac
F	20	20	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac
G	32	32	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac
H	50	50	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac
I	80	80	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac
J	125	125	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac
K	200	200	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac
L	315	315	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac
M	500	500	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac
N	800	800	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac
O	1250	1250	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac
P	2000	2000	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac

- La selección de las muestras del lote, se debe tomar al azar y de manera tal que se obtengan unidades de todas las partes del lote.
- Si el número de unidades de producto no conformes encontrados en la muestra es igual o menor que el número de aceptación, el lote debería ser considerado aceptable. Si el número de unidades del producto no conformes es igual o mayor que el número de rechazo, el lote debería ser considerado no aceptable.
- El nivel de inspección determina la relación que existe entre el tamaño del lote y el tamaño de la muestra.
- La clasificación de Defectos para Mobiliario para Instituciones Educativas es la siguiente:

Defectos Críticos:

Falla de compresión paralela en elementos estructurales
Grano inclinado mayor al tolerado en elementos estructurales
Pudrición
Presencia de Insectos activos
Rotura
Rajaduras
Nudos muertos
Ensamble defectuoso

Defectos Mayores

Falla de compresión paralela en elementos no estructurales
Grano inclinado mayor al tolerado en elementos no estructurales
Perforaciones de insectos inactivos mayores a los permitidos
Grietas
Armado Asimétrico
Mezcla de especies
Juntas desiguales
Alabeos de piezas mayores a los tolerados
Nudos sanos no tolerados
Inestabilidad en un plano

Defectos Menores

Acabado defectuoso
Boleado irregular de aristas

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERPERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soñ
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 17:16:46 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CORRIJILLA GUINZANA Florentino
Anillo FAU 20514347221 soñ
Motivo: Day V° B°
Fecha: 12.03.2023 11:57:37 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN María Lope FAU
20514347221 soñ
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:12:06 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANCO Tiberio Cayo FAU
20514347221 soñ
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 16:27:22 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO RITO INDUSTRIAL N° 12 (DISTRITO REY DE LA CALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO)



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO RITO INDUSTRIAL N° 12 (DISTRITO REY DE LA CALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO)

Ing. Ricardo Wilber Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

RELACION DE ENSAYOS:

DESCRIPCION	NORMA TECNICA PARA ENSAYOS	ENSAYOS
SILLA DE METAL Y MADERA DE 1º - 2º SECUNDARIA	NPT 260.026:2019 MUEBLES. Sillas para instituciones educativas. Requisitos de seguridad y determinación de la estabilidad, la resistencia y la durabilidad. 4ª Edición	ESTABILIDAD FRONTAL
		ESTABILIDAD LATERAL
		ESTABILIDAD TRASERA
		DURABILIDAD EN EL ASIENTO Y RESPALDAR (MAXIMO)
		CARGA ESTATICA POR COMPONENTE - ASIENTO Y RESPALDAR
		IMPACTO SOBRE ASIENTO
		IMPACTO SOBRE ESPALDAR
	Estudio sobre el contenido de humedad equilibrio de la madera en el Perú, elaborado por el CITE MADERA.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE CONTENIDO DE LA HUMEDAD EN LA MADERA DE ACUERDO AL LUGAR DE ENTREGA

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU.
20514347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 10.03.2023 17:16:58 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Fernando Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 10.03.2023 11:57:49 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupa FAU.
20514347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 10:12:13 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANCO T. Boris Cayo FAU.
20514347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 18:27:52 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA URBANA DE CORA CORA PROVINCIA DE PUNAJOCCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA URBANA DE CORA CORA PROVINCIA DE PUNAJOCCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ANEXO N° 3 PLANIMETRÍA

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gontalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 17:18:08 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:58:03 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL



Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:12:19 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Toledo Ceyo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.02.2023 18:27:09 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.A.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.A.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

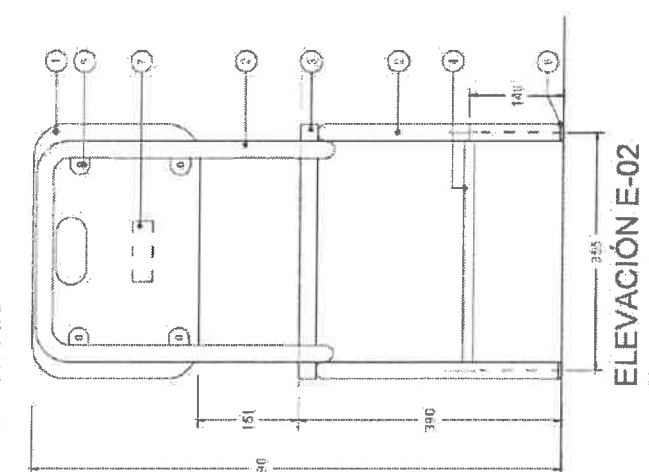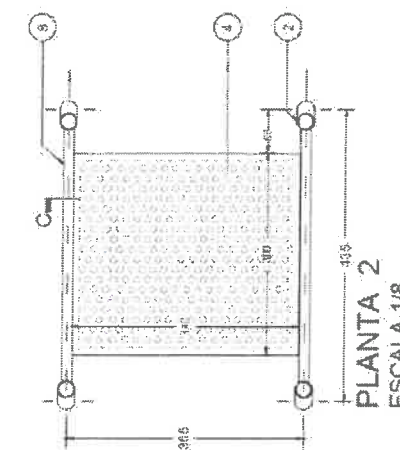

Tubo de acero de sección cuadrada de 125 x 125 mm

Soldadura HFG

Placa de acero de 12 mm

10 NÚCLEO 500-10

[illegible]


ROADS. KILMERS. (m)

SILLA DE METAL MADERA DE 1º A 2º DE SECUNDARIA

PRONIED INSTITUTIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Códigos SSM-05	Códigos INDICIA	Códigos L ¹⁰

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
C.I.D. 08748

Version 02

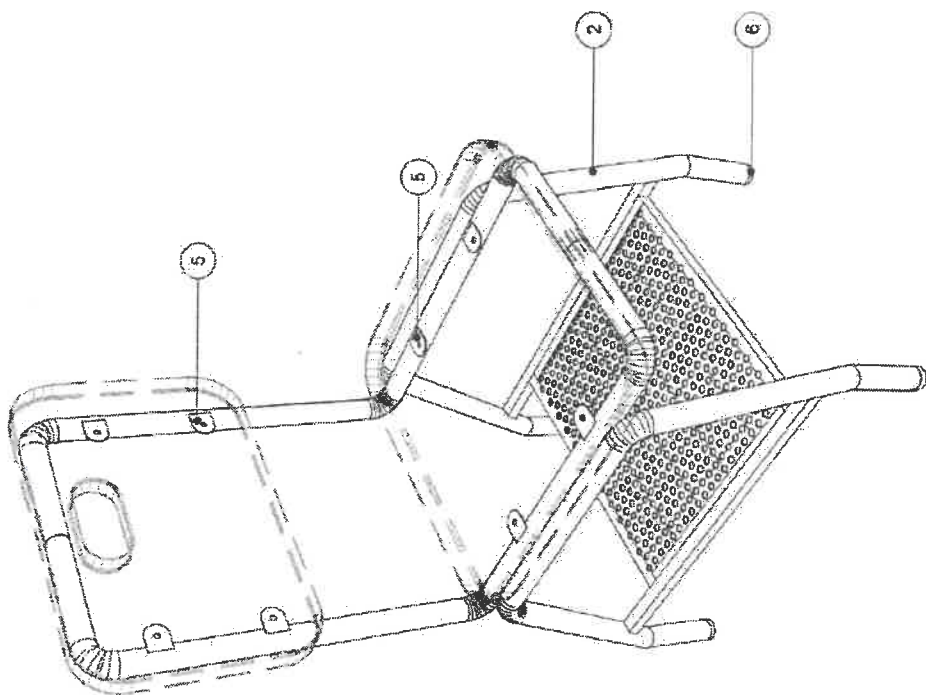

FULLTIME

[illegible]

BABA DENTAL

1. TABLERO DE RESPALDAR MADERA CON UNIONES MACHIHENBRADAS O FINGER JOINT (UNIÓN ENDENTADA) 25-10*16*17 ATORNILLADO A ESTRUCTURA METÁLICA CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA X 16.
2. TIPO MECÁNICO ELÉCTRICOLADO DE ACERO LAMINADO AL FRÍO DE SECCIÓN CIRCULAR Ø = 1" y e=1.2 mm.
3. ATORNILLADO DE ASIENTO, MADERA CON UNIONES MACHIHENBRADAS O FINGER JOINT e= 25-22mm
4. PLANCHA DE ACERO LAMINADO AL FRÍO DE ESPESOR 1.00 MM CON PERFORACIONES DE Ø10MM CON ANGULO A 60° Y CON MARCO PERIMETRAL EN "L" SOLDADO A LA ESTRUCTURA.
5. ALETA DE SUCCIÓN CON PERFORACIÓN TIPO "OJÓ CHINO", PLATINA DE ACERO ELÉCTRICOLADO, LAF 1/8" MINIMO SOLDADA A ESTRUCTURA METÁLICA.
6. REGATONES DE POLIURETANO DE 12cm (MÍNIMO) DE EMBOHE EN EXTERIOR O INTERIOR. LOS REGATONES PERMITIRÁN TENER UNA DISTANCIA NO MENOR DE 5 MM DEL PISO A LA ESTRUCTURA METÁLICA.
7. LOGOTIPO INSTITUCIONAL.

CO. 87-0691-A & 270-6301-1
 (for a full list of all)
 CO. 87-0691-A & 270-6301-1

May 20

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE EXAMENES DE INGRESA

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Version: 02

 Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra

Versión C2

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Version: 02

 Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra

Versión C2

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ANEXO N° 04 CUADRO DE OTRAS PENALIDADES

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221.scf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 17:17:07 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORPILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221.scf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 11:56:36 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221.scf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:12:40 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANCO Tiberio Cayo FAU
20514347221.scf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 19:28:30 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CORA CORA PROVINCIA DE PARINACORCA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Esteban Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CORA CORA PROVINCIA DE PARINACORCA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

OTRAS PENALIDADES						
Tipo	Supuestos de aplicación de Penalidad	Forma referencial de cálculo				Procedimiento
		1 a 100 bienes	100 a 1000 bienes	1000 a 5000 bienes	5000 a más bienes	
F1	No presentar la totalidad de la documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el transporte de los bienes a la Entidad, según las condiciones del numeral 2.2.7.4. Documentación para el Transporte de los bienes	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
F2	No levantar las observaciones realizadas por la Entidad a la documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el transporte de los bienes luego del plazo estipulado en el numeral 2.2.7.4. Documentación para el Transporte de los bienes	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F3	No recoger los Documentos que acredite Entrega de los Bienes ni suscribir el Acta de Entrega Documentaria según lo estipulado en el numeral 2.2.8.1 Transporte	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F4	No cumplir con el almacenaje adecuado (ambiente techado, sin goteras, sin filtraciones y con cobertura en óptimas condiciones), de acuerdo con el Numeral 2.2.5.1 Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 1$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 4$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F5	Ingresar con vehículos pesados a los patios de Instituciones Educativas para realizar la estiba y/o descarga de bienes según numeral 2.2.8.1 Transporte	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 1$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*) (**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	

F6	No transportar exclusivamente los bienes objeto de la presente contratación en los vehículos del contratista, de acuerdo con el numeral 2.2.8.1 Transporte	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia
F7	No realizar el Transporte de bienes con un vehículo cerrado de acuerdo con lo señalado en el numeral 2.2.8.1 Transporte	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 1$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 4$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 5$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia
F8	No presentar la solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad dentro del plazo establecido en numeral 2.2.7.1 Sobre la solicitud para la calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia
F9	No presentar a la Entidad los resultados de la aplicación de métodos de ensayos dentro del plazo ofertado por el Organismo de Evaluación de la Conformidad. En su propuesta técnica presentada para su designación.	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia
F10	No presentar el levantamiento de observaciones del "informe de ensayos" dentro del plazo otorgado por la Entidad Contrante.	$P = M \times Oc$ $M = 0.2$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia
F11	No presentar antes de la culminación de la etapa de Fabricación, la documentación requerida en el numeral 2.2.1 Procedencia de la madera.	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*) (**) $Oc = n^o$ Ocurrencia
<p>Consideraciones:</p> <p>(*) UIT: Unidad Impositiva Tributaria, se aplicará el valor de referencia vigente, establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, en la fecha de la suscripción del contrato.</p>					

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 13.03.2023 17:18:34 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencia Antonia FAU 20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 13.03.2023 12:00:22 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU 20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 13.03.2023 10:13:02 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES VANDOC Tiana Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 15.03.2023 19:26:30 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.L. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA CALADILLA DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra



Ing. Richard Wilver Lancha Varga
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ANEXO N° 05 REQUISITOS A PRESENTAR PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GLERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 10.03.2023 17:19:03 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 13.03.2023 12:00:35 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 16.03.2023 10:13:08 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNACUCHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROSLES
YANOC Tiberto Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:29:44 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNACUCHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Gancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

FORMATO N° 01

FORMATO N°01: CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES								
ACTIVIDADES	ETAPA: FABRICACION Y EMBALAJE DE LOS BIENES							
	MES 1				MES 2			
	día 1	día 2	día 3	día "n"	día 1	día 2	día 3	día "n"
BIEN "A"								
Actividad 1								
Actividad 2								
Actividad 3								
Actividad "n"								
BIEN "B"								
Actividad 1								
Actividad 2								
Actividad 3								
Actividad "n"								

FORMATO N° 02

FORMATO N°02: CRONOGRAMA DE ENTREGA DE BIENES								
ACTIVIDADES	ETAPA: TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIENES							
	MES 1				MES 2			
	día 1	día 2	día 3	día "n"	día 1	día 2	día 3	día "n"
INSTITUCIÓN DE DESTINO N°01								
TRANSPORTE								
ENTREGA								
INSTITUCIÓN DE DESTINO N°02								
TRANSPORTE								
ENTREGA								

Notas:

El cronograma de "Adquisición de bienes" servirá para la realización de visitas inopinadas por parte de la ENTIDAD. Asimismo, ambos formatos, deberán entregarse en programa MS PROJECT, MS EXCEL o similar.

FORMATO N° 03

FORMATO N°03: DESAGREGADO DE COSTOS

DESAGREGADO DE COSTOS DE BIENES A ENTREGAR A LA(S) INSTITUCION(ES) BENEFICIADA(S)

REGIÓN	INSTITUCIONES DE DESTINO	DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD	COSTO UNITARIO DE ADQUISICIÓN (FABRICACIÓN Y EMBALAJE)	COSTO UNITARIO DE ENTREGA (TRANSPORTE Y ENTREGA)	COSTO UNITARIO SUB TOTAL	COSTO DE BIENES
	(1)	(2)	(C)	(A)	(B)	(A+B)	[(A+B)*C]
"A"	Institución 01	Bien "A"		SI.	SI.	SI.	SI.
		Bien "B"		SI.	SI.	SI.	SI.
		Bien "n"		SI.	SI.	SI.	SI.
	Institución 02			SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
"B"	Institución 01			SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
	Institución 02			SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
	Institución "n"			SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.

RESUMEN DE COSTOS

COSTO TOTAL

SI.

Consideraciones:

- (1) Se contabiliza según el número de orden del "Formato de Direcciones para la Entrega", del Anexo 01.
- (2) Según nomenclaturas del Cuadro N°01 de las presentes especificaciones técnicas.
- (A) Incluye costo del Control de Calidad, según el numeral 2.2.8.

Notas:

- Se precisa que todos los costos deben contener como máximo 02 decimales y las sumatorias deben coincidir con los totales a adjudicar.
- Asimismo, dicho formato debidamente llenado, deberá entregarse en archivo digital editable.
- Toda incompatibilidad, incluso a nivel de decimales u ordenamiento del formato distinto a lo estipulado, será tratada como observación.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO, Santo Elias FAU 20514347221 soft
Motivo: Day v° B°
Fecha: 13.03.2023 17:16:35-05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencio Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day v° B°
Fecha: 13.03.2023 12:01:01-05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU 20514347221 soft
Motivo: Day v° B°
Fecha: 15.03.2023 10:13:21-05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROSLES YANOC Tiberio Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Day v° B°
Fecha: 15.03.2023 15:30:16-05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA LE COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA CIUDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROV. DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



Ing. Richard Wilver Cancho Varga
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

FORMATO N° 04

FORMATO N°04: DIRECCIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN Y ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA

Nombre de contratista o de cada empresa que conforma el consorcio	Av., Jr., Calle, Pasaje, Mz. Lote, Etc.	N°	Urbanización, Sector, Etc.	Teléfono del Local y de Propietarios	Referencia	Distrito Provincia Región

Notas:

- Máximo declarar 04 instalaciones de almacenamiento y/o talleres.
- En caso se necesite modificar los datos de la(s) dirección(es) declaradas, el Contratista deberá notificar a la Entidad mediante una carta por mesa de partes de la ENTIDAD, como plazo máximo antes del ingreso de la Solicitud de Verificación de Cantidad por la culminación de la etapa de "Adquisición y Embalaje de la totalidad de los bienes".

FORMATO N° 05

FORMATO N°05: RESPONSABLE GENERAL DE OPERACIONES

Nombres y apellidos completos	N° DNI	Cargo	N° de celular	N° teléfono fijo	Correo electrónico Institucional

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
QUERREÑO Gonzalo Elias FAU.
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.03.2023 17:19:49 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU.
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 10:13:28 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
CORPILLA GUINTANA Florencio
Ante FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.03.2023 12:01:20 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANCOC Tiberio Cayo FAU.
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.02.2023 16:30:11 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA COMUNIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNAJA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

FORMATO N° 06

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Por medio de la suscripción del presente documento se autoriza a (Nombre de Entidad) a realizar la notificación electrónica de las observaciones realizadas por la Entidad durante el procedimiento para suscribir el contrato, así como, para los actos efectuados durante la ejecución del contrato.

La dirección de correo electrónico autorizada es:

Correo electrónico autorizado:

[illegible]

Repita el correo electrónico autorizado:

[illegible]

Quedan exceptuados de la presente autorización, aquellos actos cuya notificación revistan formalidades especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones pública.

La notificación electrónica se acredita con la impresión del correo electrónico enviado y la Cedula de Notificación, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmación de parte del contratista.

La notificación en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación electrónica efectuada con anticipación y por los medios indicados; computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

(REPRESENTANTE LEGAL)
RUC:

PRONIED
PROGRAMA NAȚIONAL
DE INFRASTRUCTURĂ EDUCATIVĂ
CIRCUIT DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN, Maria Lilia FAU
2025.10.22 12:01:02, sof
Nombre: Doy V. S.
Fecha: 15.03.2023 12:13:25.05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
 GUERRERO Gonzalo Elías FAU
 20514347221.soft
 Fecha: 10/03/2023 17:21:55 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO
DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211641

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Anterior: FAJ 20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 13.03.2023 12:01:41 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROSLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15/03/2023 19:35:21 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
COMITÉ DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
ELEGIMIENTOS INDUSTRIAL N° 1, CRISTÓBAL MELA, LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO
CORACORA, PROVINCIA DE PARACAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ANEXO N° 06

MODELOS REFERENCIALES DE ACTAS PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16-03-2023 17:22:07 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Fierrehélio
Antônio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13-03-2023 12:02:03 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
PAPFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16-03-2023 10:13:42 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACACHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15-03-2023 19:30:30 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACACHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ACTA DE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA

La firma de la presente acta da la conformidad de la recepción de documentos en original de los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA's) del Contrato N° _____, derivado del Procedimiento de selección para la _____.

Mediante la presente, se hace entrega de la cantidad de N° ____ PECOSA's en cuatro (04) juegos originales, para la entrega de los bienes correspondientes.

NOTA PARA SER CONSIDERADA

De conformidad con el numeral 2.8.9 ENTREGA DE LOS BIENES, de las Especificaciones técnicas de las Bases Integradas, se debe tener en consideración que los PECOSA, deberán ser suscritos (firmados y sellados) por el Encargado de la Institución de destino¹, dando fe de lo recibido, consignándose en cada documento: firma, post-firma, sello y fecha de recepción, copia de DNI del Encargado y documentación que acredite su cargo, debiendo recabar la entidad receptora un ejemplar original de los PECOSA, para sus efectos contables.

En caso de ausencia del Encargado de la Institución de destino², por motivos no imputables a la ENTIDAD o no contar con documentación que acredite su cargo, el PECOSA podrá ser firmado por un representante designado y autorizado por la ENTIDAD.

Los bienes serán entregados en perfecto estado de conservación, adecuadamente armados y embalados hasta su destino final, sin ningún defecto de ADQUISICIÓN / FABRICACIÓN, ni otro como consecuencia de la estiba o desestiba o del transporte.

Los datos de contacto en cada una de las Instituciones de destino para la recepción de los bienes y el firmado de los PECOSA, serán coordinados directamente por el CONTRATISTA.³

Atentamente;

NOMBRE :

DNI :

TELEFONO / CELULAR:

EMPRESA :

FECHA :

HORA:

CORREO ELECTRONICO:

CONTRATISTA
REPRESENTANTE

LA ENTIDAD
REPRESENTANTE

¹ Si es una Institución Educativa, los PECOSA deberán ser suscritos por el Director o Sub-director administrativo en ausencia de aquel.

² En caso de ausencia del Director o Sub-director administrativo de una Institución Educativa, el PECOSA podrá ser firmado por un representante designado y autorizado por la UGEL correspondiente a la Institución, previa coordinación con la ENTIDAD.

³ Para una Institución Educativa el contacto será coordinado directamente por el CONTRATISTA con las UGELES respectivas.



CONTRATO N° _____
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1. _____ identificado con DNI N° _____ por parte de la **ENTIDAD**.
2. _____ representante de la Empresa Contratista identificado con DNI
N° _____

ACTA DE VISITA INOPINADA N°

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	
CONTRATO:	
TIPO DE BIEN:	
UBICACIÓN:	
CONTRATISTA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
FECHA:	

Siendo las _____ horas del día ____ del mes _____ del año 20____, se reunieron en el local donde se realiza el proceso de fabricación y/o almacenaje de los bienes adquiridos mediante el contrato arriba mencionado, sito en la ubicación antes señalada, de una parte, el Sr(a) _____ en representación de la **ENTIDAD**, y de la otra parte el Sr(a) _____ en representación de la empresa Contratista

Encontrándose lo siguiente:

PRONIE
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBL
YANCC Tiberio Cayo FAU
20614347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:31:30 -05

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas se dio lectura a la presente Acta, y no habiendo objeciones a la misma, procediendo a suscribirla los presentes en señal de conformidad.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTIL
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V* B*
Fecha: 15.03.2023 10:18:21 -05:00

LA ENTIDAD REPRESENTANTE

Nombre

Cargo

D.N.I.

**CONTRATISTA
REPRESENTANTE**

Nombre

D.N.I.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN EL
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE AYACUCHO DE CORA CORA, DISTRITO DE
CORACORA, PROVINCIA DE PAMPACHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Filme digitalmente por BRAVO
 INTERERO Gonzalo Elias FAU
 2019 7221 soft
 Motivo: Day V B*
 Fecha: 10-03-2023 17:23:11 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Anterior: FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 13-03-2023 12:04:08 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
 COLECCIÓN INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE ALVALA DE CORACORA DISTRITO
 DE CORACORA PROVINCIA DE PARTIURA DE AYACUCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
Página 50 de 55
CIP-98718

ACTA DE DEVOLUCIÓN DE BIENES

CONTRATO N° _____
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN _____

Siendo las _____ horas, del día _____ de _____ de 20____; se reunieron en el local de la empresa _____, el Supervisor de la ENTIDAD, _____, identificado con DNI N° _____, el representante de la empresa Contratista el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____ y el representante del Organismo de Evaluación de Conformidad _____ identificado con DNI N° _____, con la finalidad de realizar la devolución de los bienes ensayados como parte del control de calidad, en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de la _____.

ANOTACIONES:.....
.....
.....
.....

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas, en señal de conformidad con los términos de la presente acta, suscriben los intervinientes.

LA ENTIDAD REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN CERTIFICADORA DE CALIDAD REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

CONTRATISTA REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 10:16:56 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 17:23:24 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA JUNGLA DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOTAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 13.03.2023 12:04:22 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 16.03.2023 19:31:39 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA JUNGLA DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOTAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS

CONTRATO N° _____
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN _____

Siendo las _____ horas, del día _____ de _____ de 20____; se reunieron en los Almacenes de la empresa Contratista _____, el Supervisor de la ENTIDAD, el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____, el representante de la empresa Contratista el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____ y el representante del Organismo de Evaluación de Conformidad, _____, el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____, con la finalidad de realizar la verificación técnica a través de ensayos de funcionalidad de los bienes materia del contrato antes citado, para tales efectos se procederá a tomar el número de muestras que pasarán por control de calidad, según lo establecido en el Anexo N° 02 de las Especificaciones Técnicas, tal como se detalla a continuación:

CUADRO N° 01: MUESTRAS Y ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD			
N° DE ORDEN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE MUESTRAS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL DE MUESTRAS			

ANOTACIONES:.....
.....
.....
.....

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas, en señal de conformidad con los términos de la presente acta, suscriben los intervinientes.

LA ENTIDAD
REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN
CERTIFICADORA DE CALIDAD
REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.03.2023 17:23:37 -05:00

CONTRATISTA
REPRESENTANTE

Nombre
D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINZANES
Antonio FAU 29514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.03.2023 12:04:58

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FARFAN Niza Lupe FAU
20514347221 soft

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DE AYACUCHO
ING. Luis Escobar Beltrido
Residente de Obra
CIP: 211541



ACTA DE VERIFICACIÓN CUANTITATIVA N°

SERVICIO :
MODALIDAD :
CONTRATO :
UBICACIÓN :
CONTRATISTA :

Siendo las _____ horas, del día _____ de _____ de 20____; estando en las instalaciones de la empresa Contratista _____, se reunieron: de una parte, el(la) Sr(a) _____, identificado con DNI N° _____, en representación de la empresa contratista _____; otra parte el Sr(a) _____, identificado con DNI N° _____, quien actúa en representación del área¹ _____; y el Sr(a) _____, identificado con DNI N° _____, en representación del área usuaria, para realizar la verificación cuantitativa del Contrato N° _____; derivado de la _____ de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, a fin de realizar la verificación cuantitativa de los bienes.

De la verificación realizada, se observan las siguientes cantidades:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD VERIFICADA

CONCLUSIÓN:.....
.....
.....
.....

Siendo las _____ horas del día _____ de _____ del año 20____, se procedió a firmar el presente Acta por triplicado.

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLI
YANG C Tiberto Cayo FAU
20514347221 soft
Móvil: Day V^a B^a
Fecha: 15.03.2023 10:34:17 -05

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTI
FARRAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Móvil: Day V^a B^a
Fecha: 15.03.2023 10:17:10 -05

ÁREA DESIGNADA POR LA
ENTIDAD
REPRESENTANTE

ÁREA USUARIA
REPRESENTANTE

CONTRATISTA

REPRESENTANTE

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
CALLESIÓN N° 12 CRISTO REYES LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO
DE CORACORA, PROVINCIA DE PARIKUTI, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIEI
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antes FAU 20514347221 soft
Móvil: Day V^a B^a
Fecha: 13.03.2023 12:34:47 -05

¹ La Entidad define quien es el área competente de emitir la conformidad cuantitativa.
Versión 02

ANEXO N° 7 FICHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAYO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 10.03.2023 17:28:57 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA CUINTANA Erenio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 12.03.2023 12:04:56 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
PARFAN Maria Lupa FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 16:17:16 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROSLES
MANOC Tibero Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 16:24:24 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARIMACOGNAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARIMACOGNAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

Anexo N° 07

Ficha de presentación del producto

El postor deberá completar los datos de la tabla siguiente:

Nombre del requerimiento		
N°	Especie(s) maderable(s) con la(s) que atenderá el requerimiento (véase Nota 1)	Nombre o Razón social del Postor
1		
2		
...		

Nota 01: El contratista podrá proponer una especie de madera similar o superior a las indicadas en el número 2.1 del numeral 2.1.1. Características y especificaciones, siempre y cuando esta cumpla con las propiedades físicas, mecánicas y de durabilidad.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUSEPHERO, Danielo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 10.03.2023 17:26:31 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZEPEDA OLIVIANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 10.03.2023 10:05:05 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARRAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 10.03.2023 10:17:23 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por RGBLES
YAGOC Tiberio Celso FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 10.03.2023 16:34:35 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 11 CRISTO REY DE LA LUCHA DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 11 CRISTO REY DE LA LUCHA DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

FICHA DE HOMOLOGACIÓN

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

Código del CUBSO	:	56121505-00390354
Denominación del requerimiento	:	Mesa de metal y madera para estudiante de 1° a 2° de secundaria.
Denominación técnica	:	Mesa de estudiante de secundaria de metal y madera de 50 cm x 60 cm x 69 cm
Unidad de medida	:	Unidad.
Resumen	:	Mesa de estructura de metal, tablero de madera y accesorios de fijación para 01 estudiante, con 690 mm de altura total, 500 mm de profundidad y 600 mm de ancho. Destinada a la población estudiantil de 1° a 2° del nivel secundaria de la Educación Básica Regular.

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

La mesa de metal y madera para estudiante de 1° a 2° del nivel secundaria, está conformado por los siguientes componentes:

- Estructura de Mesa
- Tablero de mesa
- Ensamblaje y accesorios

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

2.1.1. Características y especificaciones del bien

N°	Características	Especificación	Documento Técnico de Referencia
1. Estructura de mesa			
1.1	Material	Tubo mecánico electro soldado de acero laminado al frío	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.3.1.1
1.2	Resistencia a la tracción	≥ 45 ksi [310 MPa]	ASTM A513 Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing Tabla S5.1
1.3	Límite de fluencia	≥ 32 ksi [221 MPa]	
1.4	Composición química	C máx. 0.15% Mn máx. 0.60% P máx. 0.035% S máx. 0.035%	ASTM A513 Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing Tabla 1 y Tabla 2

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE N.º E. SECUNDARIO EN LA I. E. COLEJO MONTAÑAS, STRAL N.º 12 CRISTO RE, OCAS, TUPACAMAYO, DE AYACUCHO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Caya FAU
20514347221 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 10:29:25 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 12:01:32 -05:00

1.5.	Sección de tubo: arriostre horizontal inferior	1" x 1"	Establecido por el Ministerio
1.6.	Sección de tubo: arriostre horizontal superior	1" x 2"	
1.7.	Espesor nominal de la pared del tubo estructura principal	1,5 mm calibre 16	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.3.1.1 Tabla 11
1.8.	Dimensiones estructurales	Véase Anexo N° 03 Lámina L-09	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Cuadro N°15
1.9.	Soldadura	<i>Metal Inner Gas (MIG)</i> de micro alambre que no dejará escoria, previamente decapada.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.3.1.1 apartado c)
		Todas las uniones soldadas entre elementos metálicos deberán tener un cordón de soldadura continuo en todo el perímetro de la unión. Las uniones deberán tener un acabado uniforme.	Establecido por el Ministerio
1.10.	Acabado	Preparación de la superficie: Los tubos deben recibir un baño de desengrase, de desoxidación (decapado), de reactivado, de fosfatizado y un baño para pasivado con el objeto de eliminar óxidos, escamas de óxido y grasas. Luego debe ser sometido a un proceso de secado para eliminar toda humedad interior y exterior.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.3.2
		Recubrimiento en polvo; recubrimiento en polvo termo convertible, de tipo epoxi o epoxi-poliéster. La película depositada será de 80 micrones mínimo, brillo semimate. Curado mediante hornado para que adquiera la apariencia adecuada, las propiedades mecánicas y químicas finales.	

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Molivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 16:20:28 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por POSLES
FANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Molivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:29:32 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE CORA CORA PROVINCIA DE PAUCARPATA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Molivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:40:46 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE CORA CORA PROVINCIA DE PAUCARPATA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Firmado digitalmente por
Antonio FAU 20514347221 soft
Molivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 06:27:33 -05:00

1.11.	Color	RAL 6019	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Anexo N° 02
1.12.	Defectos no tolerables	Deformaciones, grietas, puntas o filos, salpicaduras y espacios vacíos entre o los elementos metálicos	Establecido por el Ministerio
2. Tablero Mesa			
2.1	Especies de madera (Véase Nota 01, Nota 02 y Nota 03)	AGUANOMASHA (<i>Machaerium inundatum</i>)	Establecido por el Ministerio
		CACHIMBO ROJO (<i>Cariniana domesticata</i>)	
		COPAIBA (<i>Copaifera officinalis</i>)	
		HUAYRURO (<i>Ormosia coccinea</i>)	
		MASHONASTE (<i>Clarisia racemosa</i>)	
		REQUIA (<i>Guarea kunthiana</i>)	
		ULCUMANO (<i>Podocarpus oleifolius</i>)	
		TORNILLO (<i>Cedrelinga cateniformis</i>)	
2.2	Densidad básica	0,45 g/cm³ a 0,70 g/cm³	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.1
2.3	Flexión estática	MOR ≥ 501 kg/cm²	
		MOE ≥ 90 t/cm²	
2.4	Compresión perpendicular	ELP ≥ 41 kg/cm²	
2.5	Cizallamiento	≥ 61 kg/cm²	
2.6	Dureza en lados	≥ 301 kg/cm²	
2.7	Tenacidad	≥ 1,8 kg-m	

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Llancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:20:40 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO GONZALO ERAS FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:48:54 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA GUANTANA Flavianessa
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:27:48 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 16:20:36 -05:00

2.8	Contenido de humedad de la madera (Véase Nota 04)	Para establecer el CHE de la madera a ser utilizado en los diferentes usos, en función del lugar donde prestará servicio, se deberá tomar como referencia la información brindada en el aplicativo "Calculadora CHE Perú" disponible en el Play Store indicado en el siguiente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.itp.calculadorache&hl=es_PE&gl=US&fbclid=IwAR0pqkKVLGTGOGJqP33eo6J9N6g1x_UeLL0VjBI4OPDj4BLZV-IJmMCS7S7o	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.5.1
2.9	Preservación	La madera a emplearse debería resistir el ataque de insectos y hongos xilófagos, para lo cual, en previsión de posibles ataques de agentes biológicos que contribuyan a la degradación, es recomendable utilizar preservantes que garanticen la inocuidad para el uso del mobiliario.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.5.2
2.10	Juntas de tablero	Machihembrada o endentadas (Finger Joint) con listones de 50 mm de ancho como mínimo. Tener en cuenta el balance de los anillos de crecimiento de la madera para prevenir alabeos no tolerados.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.7.2
2.11	Dimensiones tablero (Véase Anexo N°03, Lámina L-09)		
2.11.1	Profundidad	500 mm	RVM N° 019-2023-MINEDU "Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular" Cuadro N°15
2.11.2	Ancho	600 mm	
2.12	Espesor	22-25 mm	Establecido por el Ministerio



Ing. Luis Escobar Bellio
Residente de Obra
CIP: 211541



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

2.13	Encolado	Colas PVA con 48% de sólidos como mínimo, no tener una antigüedad de fabricación mayor a 6 meses y de fraguado al ambiente. El adhesivo debe colocarse en la superficie de las dos piezas a encolar	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.8
2.14	Lijado	Lijado manual o mecánico. Grano mínimo de 150 grit. La superficie debe quedar totalmente lisa y suave al tacto, libre de astillas, irregularidades, cantos vivos y poros levantados; las aristas serán redondeadas.	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Requisitos Numeral 5.1.9
2.15	Acabado	Laca selladora mate o semi-mate translúcida o lacas catalizadas o un material de recubrimiento con dureza y durabilidad equivalente o superior a las consideraciones técnicas siguientes: - Base de nitrocelulosa, aditivos plásticos y metálicos - Sólidos en Volumen $27 \pm 2\%$ - Espesor de Película Seca 2.0 – 3.0 mils por capa	NTP 260.006 2019 MOBILIARIO ESCOLAR. Mesa para nivel de educación secundaria. Requisitos. 4ª Edición Numeral 7.2.4
		Mínimo 3 capas, aplicado en la totalidad de las superficies.	Establecido por el Ministerio
2.16	Defectos no tolerables en madera		
2.16.1	Perforaciones grandes	Mayor de 3 Agujeros con diámetro mayores a 6mm, por metro lineal y no alineados	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.4
2.16.2	Rajaduras y Grietas	Mayor a 20 mm de largo, 0,5 mm de ancho, y mayor a la tercera parte del espesor de la pieza.	
2.16.3	Inclinación del grano	Mayor a 10°	
2.16.4	Falla de compresión paralela	Máximo en dos lados consecutivos y no perjudiquen la solidez.	
2.16.5	Defectos de forma	Mayor al 0,3% de la longitud de la pieza	

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Versión 02

Firmado digitalmente por:
ZORRILLA GUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Opy v° B°
Fecha: 15.03.2023 09:30:12 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Opy v° B°
Fecha: 14.03.2023 23:50:08 -05:00



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 11, PUNTO REY DE ALTO, DISTRITO DE CORA CORA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Opy v° B°
Fecha: 15.03.2023 18:29:57 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupa FAU
20514347221 soft
Motivo: Opy v° B°
Fecha: 15.03.2023 09:30:12 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY, PUNTO REY DE ALTO, DISTRITO DE CORA CORA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

2.16.6	Presencia de hongos de pudrición	No se admiten	
2.16.7	Presencia de insectos activos	No se admiten	
2.16.8	Defectos por nudos	Mayor de 20 mm de diámetro y mayor a la cuarta parte del ancho del material	
2.16.9	Nudos muertos	No se admiten	
2.16.10	Mezcla de especies	No se admiten	
2.16.11	Presencia de médula y/o corteza	No se admiten	
2.16.12	Inestabilidad en un plano	No se admiten	NTP 260.014:2021 MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Muestreo. 4ª Edición Anexo A
2.16.13	Ensamblajes defectuosos	No se admiten	Establecido por el Ministerio
2.16.14	Acabado defectuoso	No se admiten	
2.17	Defectos tolerables		
2.17.1	Perforaciones pequeñas	Agujeros de 1 mm a 3 mm de diámetro, que sumados sus diámetros den un máximo de 6 mm en un área de 100 cm ² , no alineados ni pasantes	NTP 260.015:2021 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Requisitos Numeral 5.1.3
2.17.2	Mancha azul	No cuantificable mientras no afecte la resistencia de la madera	
3. Accesorios y piezas de ensamble			
3.1	Regatones		
3.1.1	Material	Polipropileno (PP)	Establecido por el Ministerio
3.1.2	Dimensiones	12 mm (mínimo) de embone exterior o interior. Distancia no menor de 5 mm de separación entre el piso a la estructura metálica. (Véase Lámina L-09A)	Establecido por el Ministerio

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellico
Presidente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES

YANOS Tiberio Cayo FAU

20514347221 soft

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Página 6 de 52

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 14.12.2023 23:50:16 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL


Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 09:30:28 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 10:21:04 -05:00

El logo institucional tendrá las siguientes características:

Características	Especificación
Dimensiones	9 cm (ancho) x 3 cm (alto)
Grabado	Pirograbado
Fuente	Arial
Tamaño de letra	7 puntos mín.



2.1.2.2. Identificación de fabricante

Para la identificación del fabricante de la mesa de metal y madera para estudiante de 1° a 2° de secundaria, se colocará una lámina autoadhesiva en cada uno de los bienes a adquirir. Este rotulado tendrá las siguientes características:

Características	Especificación
Dimensiones	8-12 cm (ancho) x 4-8 cm (alto)
Material	Autoadhesivo
Color	Rojo
Fuente	Arial
Tamaño de letra	7 puntos mín.
Información a consignar	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de la entidad usuaria en el encabezado - Nombre del procedimiento de selección - Descripción de los bienes (código del bien y Nombre del bien) - Nombre del contratista, dirección y teléfono
Ubicación	Parte inferior del bien

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN N°

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Código del bien, Nombre del Bien)

NOMBRE DEL CONTRATISTA (indicar el nombre de todas las empresas que conforman el consorcio de corresponder)

DIRECCIÓN

TELÉFONO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL N.º 12 CRISTO REY DE LA LINDA, PROVINCIA DE PARINACOCHE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL N.º 12 CRISTO REY DE LA LINDA, PROVINCIA DE PARINACOCHE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANICO Tiesis Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 16:30:21 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:50:31 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
APONDO FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:31:04 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FAIRFAX Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 16:21:21 -05:00

2.1.3. Embalaje

Los bienes deben de estar embalados en su totalidad, de forma que no se dañen o deterioren durante el transporte hasta el destino final, tomando en cuenta para la envoltura y embalaje, según lo indicado en la NTP 260.012:2017 MUEBLES. Mobiliario para Instituciones Educativas. Embalaje. 3ª Edición.

2.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

2.2.1. Procedencia de la madera

El contratista debe garantizar el origen legal de la madera que utiliza como materia prima para la fabricación de mobiliarios de madera. Para ello, la madera que se adquiere debe estar sustentada con la Guía de Transporte Forestal (GTF), conforme a lo establecido en el Artículo 168 del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, en el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, según corresponda:

- Para los casos de madera de especies forestales nativas, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Transporte Forestal (GTF) que ampara la procedencia de la madera. En los casos de títulos habilitantes, en la GTF debe estar consignada la resolución de aprobación del plan de manejo forestal o resolución que aprueba el aprovechamiento forestal (reingresos, movilización de saldos, etc.).
- Para los casos de madera de especies forestales introducidas, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Remisión (GR) con la descripción de la especie que la identifique como introducida y el número de registro de la plantación.
- Para los casos de madera importada, los contratistas deberán presentar la respectiva Guía de Remisión (GR) y los documentos de importación.

En el caso el contratista no pueda garantizar el origen legal de la madera, la Entidad contratante podrá notificar a las entidades sancionadoras, en el marco del Art. 215 del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.

2.2.2. Lugar de entrega

El lugar de entrega de los bienes será determinado por cada Entidad contratante, para lo cual brindará el detalle de la(s) dirección(es) respectiva(s). Para ello, podrá tomar en consideración el formato "Dirección(es) de Institución(es) de destino", adjunto en el Anexo N° 01.

Cualquier cambio respecto al lugar de entrega de los bienes dentro de la misma provincia, será comunicado al Contratista por la Entidad contratante, mediante correo electrónico hasta el inicio de la etapa de transporte y entrega de los bienes, sin que dicho cambio suponga una variación en plazos ni costos contractuales de ninguna índole.

En caso la Entidad contratante determine que la entrega de los bienes será en recintos de Instituciones Educativas Públicas, se podrá tomar en consideración el formato "Direcciones de Instituciones Educativas" adjunto en el Anexo N° 01. Asimismo, la Entidad contratante deberá realizar mediante correo electrónico, la notificación al Contratista, respecto de cualquier cambio sobre la asignación de los códigos modulares para la Institución Educativa, sin que dicho cambio suponga el incremento de costos o de tiempo de entrega, todo ello, antes de la elaboración de los Documentos que Acrediten la Entrega de los Bienes.

2.2.3. Etapas de la ejecución contractual

La ejecución se dará en 03 etapas:

1. Etapa de fabricación y embalaje de bienes
2. Etapa de Control de Calidad
3. Etapa de transporte y entrega de bienes

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:59:41 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antes FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:31:29 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 16:21:32 -05:00

ETAPAS DE EJECUCIÓN		
Nº	ETAPA	DESCRIPCIÓN
1)	Fabricación y embalaje de los bienes	El Contratista deberá llevar a cabo la fabricación de los bienes según lo establecido en la Sección Técnica de la presente ficha y sus respectivos anexos; y los numerales 2.2.6.1. Fabricación y 2.2.6.2. Embalaje.
2)	Control de Calidad	El contratista deberá llevar a cabo el control de calidad de los bienes, según lo establecido en el numeral 2.2.7.
3)	Transporte y entrega de los bienes	El Contratista deberá transportar y entregar la totalidad de los bienes, según lo establecido en los numerales 2.2.8.1. Transporte y 2.2.8.2. Entrega.

Consideraciones:

A partir de la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de los bienes, se ingresa a la etapa de control de calidad, dentro de dicho periodo se realizarán las siguientes actividades:

- Verificación Cuantitativa, a partir del día siguiente hábil del ingreso de la "Solicitud de verificación de cantidad por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes" (véase numeral 2.2.7.2)
- Verificación Técnica (véase numeral 2.2.7.3.), a partir del día hábil siguiente de emitido el Informe de Verificación Cuantitativa, contará con las siguientes subetapas:
 - Toma de muestras por parte del Organismo de Evaluación de la Conformidad (véase numeral 2.2.7.1.), a partir del día siguiente hábil de emitido el Informe de Verificación Cuantitativa.
 - Aplicación de métodos de ensayos de los bienes a cargo del Organismo de Evaluación de la Conformidad, a partir del día siguiente hábil de la suscripción del Acta de Toma de Muestras.
 - El Área Usuaría realizará las Inspecciones Técnicas a los bienes, las cuales físicamente se ejecutarán dentro del plazo máximo programado para la aplicación de métodos de ensayos antes mencionados.
- Verificación de la documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes, a partir del día siguiente hábil del ingreso de dicha documentación al Área Usuaría (véase numeral 2.2.7.4).
- Elaboración y notificación de los documentos que acredite entrega de los bienes, a partir del día siguiente hábil de realizada la notificación indicando la aprobación al sustento de las condiciones mínimas para el transporte de los bienes. Finaliza con la entrega de los documentos que acredite entrega de los bienes y la suscripción del Acta de Recepción Documentaria, entre la Entidad Contratante y el Contratista (véase numeral 2.2.8).

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:31:07 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARRAN María Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 15:21:41 -05:00

2.2.4. Plazos de ejecución

El plazo de ejecución por cada etapa será determinado por la Entidad contratante de acuerdo con la cantidad de bienes a adquirir, la ubicación y accesibilidad al (a los) lugar(es) de destino, y cualquier otra consideración propia del requerimiento específico de la Entidad.

Considerar la información contenida en el siguiente cuadro, de forma referencial para los plazos de la ejecución contractual.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
"OPERA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA DE CORA CORA DISTRITO DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO"

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL



Ing. Richard Wilver Cancho Varga
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:50:48 -05:00

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:31:44 -05:00

PLAZO DE EJECUCIÓN (días calendario)				
Cantidad de bienes a adquirir (Und.)	Etapas de fabricación y embalaje (días)	Etapas de control de calidad (días)	Etapas de transporte y entrega (días)	Plazo total de ejecución (días)
1-1,000	10-80	70-75	5-10	85-165
1,000-5,000	40-100	75-80	10-30	125-210
5,000 – 10,000	60-130	75-80	30-50	165-260
10,000 – más	Más de 130	Más de 80	Más de 50	Más de 260

En el siguiente cuadro se detalla el inicio y fin de los plazos respectivos por cada etapa:

PLAZO DE EJECUCIÓN			
Nº	ETAPA	PLAZO	
1)	Fabricación y embalaje de los bienes	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día siguiente de suscrito el contrato. (véase numeral 2.2.5.1 Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de fabricación y embalaje, por parte del contratista, se tomará en cuenta el día del ingreso de la Solicitud de verificación de cantidad. (véase numeral 2.2.6.1 Fabricación)
2)	Control de Calidad	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día siguiente del ingreso de la "Solicitud de verificación de cantidad por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes" (véase numeral 2.2.7.2)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de control de calidad, por parte del contratista, se tomará en cuenta la entrega de los Documentos que acrediten la entrega de bienes y la suscripción del ACTA DE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA, entre el Área usuaria y el CONTRATISTA. (véase numeral 2.2.8.2)
3)	Transporte y entrega de los bienes	Inicio	El plazo será contabilizado en días calendario, a partir del día calendario siguiente de suscrita el Acta de Recepción Documentaria, referida a las "Actas de Entrega de Bienes" entregadas por la Entidad al Contratista. (véase numeral 2.2.8.1 Transporte)
		Fin	Para efectos de evidenciar la finalización de la etapa de transporte y entrega, por parte del contratista, deberá ingresar una carta en la cual deberá comunicar el término del Transporte y Entrega de los bienes, y se tomará en cuenta la fecha máxima de recepción consignada en los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes. (véase numeral 2.2.8.2 Entrega)

Nota 04: La propuesta del Contratista deberá considerar las previsiones necesarias para realizar la entrega en las instituciones beneficiadas, según las condiciones climáticas imperantes en la zona.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellio
Residente de Obra
CIP: 211541



PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANICO T. Rocio Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 16:31:18 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Versión 02

Firmado digitalmente por ORTIZ GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 14.03.2023 23:50:58 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencio Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 08:31:59 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFÁN Maria Lupe FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15.03.2023 16:21:50 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO



Página 41 de 52

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

2.2.5. Consideraciones generales

2.2.5.1. Requisitos a presentar para la suscripción del contrato

Para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar los siguientes documentos:

Documentación a presentar:

- Cronograma de ejecución del contrato.
- Detalle de los precios unitarios del precio ofertado.
- Presentación de talleres de producción y almacenes.
- Presentación de responsable general de operaciones.
- Declaración Jurada de Almacenaje de los Bienes.
- Plan Covid-19

En el siguiente cuadro se detallan los documentos antes mencionados:

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		
#	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
a)	Cronograma de ejecución del contrato	<p>Deberá incluir fechas y plazos programados para todas las etapas del contrato establecidos en el numeral 2.2.4. PLAZOS DE EJECUCIÓN.</p> <p>El Contratista deberá presentar un Cronograma Ganntt en archivo nativo (formato editable) en programa MS Project, MS Excel o similar. Para ello, deberá ceñirse a los FORMATO N° 01 y FORMATO N° 02, adjuntos en el Anexo N° 05.</p>
b)	Detalle de los precios unitarios del precio ofertado	<p>El cuadro de "Detalle de los precios unitarios del precio ofertado" deberá ser desagregado por Institución de destino, y deberá detallar los costos de adquisición y entrega según la región donde se ubiquen las Instituciones de destino.</p> <p>Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N°03, adjunto en el Anexo N° 05.</p>
c)	Presentación de las ubicaciones de los talleres de producción y almacenes	<p>Se deberá presentar la(s) dirección(es) de su(s) instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes (máximo 04 instalaciones de almacenamiento y/o talleres de fabricación) y los datos del personal técnico de contacto.</p> <p>Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N° 04, adjunto en el Anexo N°05.</p>
d)	Presentación de responsable general de operaciones	<p>Se deberá presentar un formato donde se deberá designar un responsable, el que deberá contar con capacidad de decisión frente a cualquier contingencia que se presente y quien será la persona autorizada para coordinar directamente con la Entidad contratante aspectos relacionados con las prestaciones.</p> <p>Para efectos de entrega, el Contratista deberá ceñirse al FORMATO N° 05, adjunto en el Anexo N° 05.</p>
e)	Declaración Jurada de Almacenaje de los Bienes	<p>El postor ganador deberá remitir una Declaración Jurada donde se compromete a realizar el almacenaje de los bienes en ambientes techados, sin goteras, sin filtraciones, a fin de garantizar la calidad e integridad de los bienes fabricados y/o almacenados.</p> <p>En caso de incumplimiento se aplicarán las penalidades estipuladas en el numeral 2.2.11.2. OTRAS PENALIDADES.</p>

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. "LA LIE
 COLECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE AYACUCHO
 DE AYACUCHO, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 Ing. Luis Escobar Bellido
 Residente de Obra
 CIP: 211541

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
 YANOC Tibeno Cayo FAU
 20514347221 soft

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. "LA LIE
 COLECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE AYACUCHO
 DE AYACUCHO, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. R. Cancho Vargas
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 98718

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
 GUERRERO Gonzalo Elias FAU
 20514347221 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 14.03.2023 23:55:36 -05:00

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
 ZORRILLA QUINTANA Florencio
 Antonio FAU 20514347221 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 15.03.2023 08:32:18 -05:00

PRONIED
 PROGRAMA NACIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
 FARFAN Mado Lupe FAU
 20514347221 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 15.03.2023 12:01:39 -05:00

Consideraciones:

- Todos los documentos indicados en el presente numeral deberán ser presentados de forma digital e impresa, con la firma del representante legal, en idioma castellano.
- Toda la documentación a ser entregada por el Contratista se remitirá por Mesa de Partes de la Entidad contratante y/o el canal determinado por dicha Entidad.
- La Entidad contratante se encargará de revisar el "Cronograma de ejecución del contrato" y el "Detalle de los precios unitarios del precio ofertado" de la propuesta económica, para garantizar que se cumpla con el plazo de ejecución establecido. Luego de la revisión se emitirá la conformidad respectiva o se plantearán las observaciones que deben ser subsanadas por el postor dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- La presentación del cronograma no significa que existirá una variación del plazo de ejecución contractual con el que cuenta el Contratista para la ejecución de sus prestaciones, los cuales se indicarán según lo estipulado en el numeral 2.2.3. PLAZOS DE EJECUCIÓN.

2.2.5.2. Entrega de adelanto

La Entidad contratante determina si se otorga adelanto de pago al contratista. De ser el caso, el contratista podrá solicitar dentro del plazo establecido por la Entidad contratante la entrega del adelanto del 30% del monto del contrato, a partir del día siguiente de suscrito el Contrato, según lo dispuesto en el Artículo N° 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Entidad contratante establecerá el plazo de entrega del adelanto a favor del Contratista.

El pago del adelanto se hará en la moneda establecida por la Entidad contratante.

2.2.5.3 Sobre las comunicaciones electrónicas emitidas por la Entidad

El Área Usuaria de cada Entidad contratante determinará el correo electrónico a través del cual se realizarán todas las comunicaciones que emita durante la ejecución del contrato, lo cual será comunicado después de su suscripción.

En el caso que el Área Usuaria realice alguna modificación (ya sea un cambio y/o la adición de una nueva dirección electrónica para la comunicación) a la presente dirección, esta será notificada al Contratista vía correo electrónico durante la ejecución contractual.

La Entidad comunicará a la(s) Institución(es) de destino el contenido de las bases del presente procedimiento de selección con la finalidad que se tome conocimiento de la documentación y procedimientos que se seguirán en la entrega de los bienes.

2.2.6. Etapa de fabricación y embalaje de bienes

El Contratista deberá llevar a cabo la fabricación y embalaje de los bienes según lo establecido en las presentes especificaciones técnicas y sus respectivos anexos.

El Contratista deberá presentar a través de una comunicación por Mesa de Partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, su Solicitud de Calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad adjuntando la información sustentatoria respecto a los Requisitos Mínimos para la selección de los Organismos de Evaluación de la Conformidad, dentro de los 10 días calendario contabilizados a partir del día calendario siguiente de suscrito el contrato, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.3.

Las muestras fabricadas por el Contratista no están incluidas en las cantidades propuestas a ser entregadas en las Instituciones beneficiadas; sin embargo, las muestras sí se contabilizan para la Verificación Cuantitativa.

A partir de la fecha de ingreso de la carta del Contratista donde comunica la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de los bienes, se llevará a cabo el proceso de control de calidad

2.2.6.1. Finalización de la etapa de fabricación

El Contratista deberá ingresar, a través de Mesa de Partes, una carta dirigida a la Entidad, con copia al Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACACHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
Ing. Luis Escobar Belluco
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupa FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:01:45 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 16:32:00 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
CORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:32:34 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:59:27 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACACHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas

el que haga sus veces, su Solicitud de Calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad, en la cual deberá comunicar la culminación de la fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes.

La carta deberá contener la siguiente documentación:

- Solicitud de verificación de cantidades por la culminación de la etapa de Fabricación y Embalaje de la totalidad de los bienes.
- Documentación sobre la Procedencia de la Madera indicado en el numeral 2.2.1. PROCEDENCIA DE LA MADERA.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procederá a aplicar la(s) penalidad(es) correspondiente(s), según lo establecido en el numeral 2.2.11. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

2.2.6.2. Proceso de embalaje

Los bienes deben de estar embalados en su totalidad, de forma que no se dañen o deterioren durante el transporte y almacenamiento hasta el destino final, tomando en cuenta para la envoltura y embalaje, lo indicado en el numeral 2.1.3 Embalaje.

2.2.6.3. Inspecciones inopinadas

La Entidad podrá realizar inspecciones inopinadas a las instalaciones de la fábrica y/o almacenes para verificar o supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, procesos productivos, en aras de velar por el cumplimiento de los plazos de ejecución de la etapa de Fabricación y Embalaje, sin que ello perjudique el desarrollo del proceso de adquisición.

En las Inspecciones Inopinadas realizadas durante el proceso de fabricación de los bienes, la Entidad podrá tomar muestras de los bienes que se encuentren terminados hasta ese momento para analizarlos con equipos de medición para determinar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Los análisis de las muestras obtenidas dentro del plazo de adquisición no representan una paralización en los tiempos de ejecución contractual de los bienes contratados.

Asimismo, la Entidad verificará los procesos de fabricación y el apilado, tanto de la materia prima como de los bienes conforme al avance hasta el momento de realizada la inspección inopinada.

Al finalizar las Inspecciones Inopinadas, se deberá suscribir el Acta de visita inopinada, por el representante del Contratista y la Entidad.

Las inspecciones inopinadas serán programadas dentro del horario establecido por la Entidad.

El formato referencial del Acta de Visita Inopinada se encuentra en el Anexo N° 06.

2.2.7. Control de calidad

Durante el periodo del proceso de control de calidad se realizará actividades para la emisión de la conformidad de la etapa de fabricación, y posteriormente, el informe de cumplimiento de especificaciones técnicas a verificación de la documentación referida al sustento de las condiciones mínimas previo al inicio de la etapa de transporte.

El control de calidad inicia con la Verificación Cuantitativa y culmina con la emisión del Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

El control de calidad involucra la participación del Contratista, la Entidad, el Área Usaria, el Área designada para el conteo de bienes y el Organismo de Evaluación de la Conformidad en las siguientes actividades:

- Verificación Cuantitativa por parte del Área designada por la Entidad.
- Verificación Técnica: Elección del organismo de evaluación de la conformidad, Toma de Muestras y aplicación de los métodos de ensayos por el Organismo de Evaluación de la Conformidad, y las Inspecciones Técnicas por la Entidad.

Los empaques de los bienes y los costos que se generen producto de la Verificación Cuantitativa y de la Verificación Técnica serán realizados y asumidos por el Contratista.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA URBANA DE CASHA CASHA, DISTRITO DE CASHA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CIP: 211541
Ing. Luis Escobar Bellio
Residente de Obra

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
*ANDC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 18:32:07 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Eneas FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 14.03.2023 23:55:20 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 08:32:52 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 12:01:50 -05:00



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ZONA URBANA DE CASHA CASHA, DISTRITO DE CASHA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Posteriormente se procede a la verificación de la documentación referida al sustento de las condiciones mínimas para el transporte presentado por el contratista, previo al inicio de la etapa de transporte. Presentación de la documentación referida al Transporte de Bienes por parte del Contratista.

2.2.7.1. Sobre la solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad

El Contratista deberá ingresar la "Solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad", consignando mínimo de 02 y un máximo 03 propuestas, las cuales serán calificadas por el Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, con la finalidad de que cumplan con los requisitos mínimos para realizar la Verificación Técnica a través de métodos de ensayo (según lo especificado en el Anexo N° 02). El Organismo de Evaluación de la Conformidad deberá cumplir con los siguientes Requisitos Mínimos:

1. Deberá acreditar experiencia específica en la realización de los métodos de ensayos descritos en el ANEXO 02. Dicha experiencia deberá ser acreditada mediante copia simple de contratos u órdenes de servicio, con una antigüedad no mayor de 5 años, y su respectiva conformidad o constancia de prestación efectuada; y/o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite fehacientemente con voucher de depósito y/o reporte de estado de cuenta o cancelación en el documento; y/o otros documentos que acrediten fehacientemente la elaboración del informe.
2. La propuesta sobre el plazo de ejecución del servicio no deberá superar los 40 días calendarios como máximo.

El Contratista deberá presentar a través de una comunicación por Mesa de Partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, su Solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad adjuntando la información sustentatoria respecto a los Requisitos Mínimos para la selección de los Organismos de Evaluación de Conformidad, dentro de los 10 días calendario contabilizados a partir del día calendario siguiente de suscrito el contrato.

El Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, notificará al Contratista respecto a la calificación de las propuestas del Organismo de Evaluación de la Conformidad, dentro de los 05 días hábiles siguientes a la recepción de dichas propuestas.

De existir observaciones a las propuestas para la calificación, el Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, notificará de manera electrónica al Contratista sobre las mismas, indicándole un plazo de subsanación de 02 a 08 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente calendario de la mencionada notificación hasta el ingreso de la subsanación correspondiente, por Mesa de partes de la Entidad.

Dentro del plazo establecido para levantar las observaciones, el contratista deberá entregar una carta por mesa de partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, adjuntando la documentación completa y necesaria para dichos fines.

De no encontrarse observaciones, o encontrarse las mismas subsanadas, el Área Usuaria, Área de logística, Órgano Encargado de las Contrataciones o el que haga sus veces, notificará electrónicamente al Contratista que cuenta con la aprobación de la documentación requerida sustentatoria para su elección del Organismo de Evaluación de la Conformidad y adjuntará la calificación de las propuestas presentadas con la finalidad de que el contratista pueda elegir al Organismo de Evaluación de la Conformidad.

2.2.7.2. Verificación cuantitativa

Una vez que el Contratista ingresa su carta de culminación de la fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes, la Entidad contratante designará al Área encargada de realizar la verificación cuantitativa, en presencia de un especialista del Área Usuaria.

El Área designada por la Entidad, procederá con la verificación de las cantidades de los bienes en su totalidad (por unidad de bien, no piezas). Cabe señalar, que los bienes deben

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
VANDOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 19:32:16 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:01:56 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
CORRILLA GUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:33:07 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
CORRILLA GUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:55:13 -05:00



estar empaquetados y embalados en el momento de la verificación, según lo establecido en el numeral 2.2.6.2. Embalaje.

La Verificación Cuantitativa deberá efectuarse en el(los) almacén(es) consignado(s) por el Contratista, en el plazo establecido por la Entidad, para lo cual la Entidad programará la fecha y hora, previa comunicación con el Contratista.

De no contar con el 100% de los bienes fabricados y embalados, incluyendo la totalidad de las muestras, se considerará como incumplimiento por parte del Contratista, no representa una observación y la Entidad procederá a aplicar las penalidades que corresponda de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se tendrá que reiniciar la verificación cuantitativa una vez que el Contratista lo solicite nuevamente al ingresar una segunda carta de Solicitud de Verificación de cantidad por la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes, por Mesa de Partes de la Entidad, con copia al Área Usuaria, para proceder con la Verificación Cuantitativa según lo anteriormente descrito. (Véase Nota 05)

Al término de la verificación cuantitativa, se deberá suscribir el Acta de Verificación Cuantitativa de bienes por ambas partes (Contratista y representantes de la Entidad), en la que se consignará el cumplimiento de la obligación del Contratista.

La verificación cuantitativa finaliza con la emisión del "Informe de Verificación Cuantitativa" de parte del Área designada, donde se comunicará al Área Usuaria, el resultado del trabajo de verificación cuantitativa, en el cual se deberá adjuntar el Acta de Verificación Cuantitativa.

El formato referencial para el Acta de Verificación Cuantitativa se encuentra en el Anexo N° 06.

Nota 05: El proceso de control de calidad inicia a partir del ingreso de la "Solicitud de verificación de cantidad por la culminación de la etapa de fabricación y embalaje de la totalidad de los bienes" por parte del Contratista, vía Mesa de Partes de la Entidad contratante.

2.2.7.3. Verificación técnica

Después de emitido el "Informe de Verificación Cuantitativa", la Entidad y un Organismo de Evaluación de la Conformidad realizarán la Verificación Técnica.

La Verificación Técnica inicia con la toma de muestras de los bienes fabricados, continúa con la aplicación de métodos de ensayos a las muestras, así como con las Inspecciones técnicas por parte del Área Usuaria y culmina con la emisión del "Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" del Área Usuaria.

La calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad será realizada por el Área Usuaria, remitiendo el resultado de la calificación de las propuestas al contratista, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.1.

La elección del Organismo de Evaluación de la Conformidad será realizada por el contratista, tomando en cuenta la calificación realizada por el Área Usuaria de la Entidad contratante.

Los costos de las pruebas y/o aplicación de métodos de ensayos para las muestras, así como los gastos generados para la presencia del personal de laboratorio y la toma de muestras por la contratación del Organismo de Evaluación de la Conformidad deberán ser asumidos por el Contratista, incluyendo volver a aplicar los métodos de ensayos en caso los bienes se encuentren observados.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE INFRACSTRUCTURA EDUCATIVA
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

2.2.7.3.1. Sobre las muestras y la aplicación de métodos de ensayo.

El contratista debe proveer las muestras para cada tipo de bien según corresponda, de acuerdo con lo señalado en el Anexo N°02.

Se precisa que el Organismo de Evaluación de la Conformidad realizará la aplicación de métodos de ensayos y pruebas a las muestras tomadas de los bienes según lo establecido en el Anexo N° 02.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLEY
YANOC Tibald Cayo FAU
20514347221 soft
Móvil: 099 123 456 789
Fecha: 15.03.2023 18:32:23 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE INFRACSTRUCTURA EDUCATIVA
Ing. Richard Wilver Cancho Varg
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Móvil: 099 123 456 789
Fecha: 14.03.2023 23:55:06 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antes FAU 20514347221 soft
Móvil: 099 123 456 789
Fecha: 15.03.2023 08:33:23 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Móvil: 099 123 456 789
Fecha: 15.03.2023 12:02:02 -05:00



El número de muestras para los ensayos y/o pruebas para la certificación serán fabricadas por el Contratista, de acuerdo con la NTP 260.014.2021. Las muestras fabricadas por el contratista no están incluidas en las cantidades propuestas a ser entregadas en las Instituciones de destino; sin embargo, las muestras sí se contabilizan para la Verificación Cuantitativa según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2.

2.2.7.3.2. Toma de muestras

A partir del día siguiente hábil de recibido el Informe de Verificación Cuantitativa en el Área Usuaria, indicando la conformidad de la misma, el Área Usuaria y el Contratista coordinarán la fecha para la Toma de Muestras.

La toma de muestras para la aplicación de métodos de ensayos se deberá realizar en uno de los almacenes del Contratista en presencia de un representante de la Entidad. La(s) dirección(es) del (de los) almacén(es) debe coincidir con la información presentada para la suscripción del contrato o, de corresponder, con la información modificada mediante el procedimiento establecido en el numeral 2.2.5.1. Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato.

Se precisa que las muestras se toman bajo el nivel de inspección S1 de la NTP 260.014.2021 vigente.

El Organismo de Evaluación de la Conformidad tomará la cantidad de muestras del tipo de mobiliario, realizando una selección de manera aleatoria, en presencia de un representante del Contratista y del Área Usuaria, procediendo a llevarlos a sus instalaciones para la evaluación y/o procedimientos correspondientes, según lo estipulado en la NTP 260.014.2021. En este momento se suscribirá el Acta de Toma de Muestras entre la Entidad, el Contratista y el Organismo de Evaluación de la Conformidad.

Es de responsabilidad del Contratista programar la fecha de toma de muestras para la aplicación de métodos de ensayos y cumplir con entregar la documentación requerida en los plazos establecidos.

En caso el Contratista incurra en incumplimiento(s), la Entidad procederá a aplicar la(s) penalidad(es) correspondiente, según lo establecido en el numeral 2.2.11. Incumplimiento de Contrato y Penalidades.

El formato referencial del Acta de Toma de Muestras se encuentra en el Anexo N° 06.

2.2.7.3.3. Métodos de ensayo

El Contratista deberá entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, el "Informe de ensayos" en el plazo establecido por la Entidad, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del "Acta de Toma de Muestras", según lo estipulado en el Anexo N° 02.

El "Informe de ensayos" deberá incluir los Informes técnicos de las pruebas y/o métodos de ensayos realizados a las muestras, los cuales serán acreditados por el Organismo de Evaluación de la Conformidad seleccionado por la Entidad, según lo establecido en el numeral 2.2.6.1.

El Área Usuaria revisará el "Informe de Ensayos" en un plazo de 3 a 7 días calendario.

De encontrarse alguna(s) observación(es) en el informe de ensayos elaborado por el Organismo de Evaluación de la Conformidad, será(n) consignada(s) en el Informe de Especialista según lo descrito en el numeral 2.2.7.3.4. y se le otorgará un plazo definido por la Entidad contratante de acuerdo a la complejidad de la observación, para el levantamiento de las observaciones correspondientes.

El Contratista deberá ingresar una carta por Mesa de Partes de la Entidad y dirigida al Área Usuaria, dentro del plazo que se le otorgue, donde comunicará el levantamiento de observaciones, a fin de proceder con la verificación correspondiente. En caso el contratista

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Dayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:32:31 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Luisa FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:02:08 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:33:53 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:54:54 -05:00



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA L.
SUCESORIO MUNICIPAL N° 11, CRISTÓBAL COLÓN DE CORA CORA, PROVINCIA DE CORA CORA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Beilao
Residente de Obra
CIP: 211541

incumpla con la presentación de levantamiento de observaciones en el plazo establecido, la Entidad procederá a aplicar la(s) penalidad(es) correspondiente(s), según lo establecido en el numeral 2.2.11.2 OTRAS PENALIDADES.

Comunicada la subsanación, la Entidad procederá a realizar la verificación del Levantamiento de Observaciones en presencia del Organismo de Evaluación de la Conformidad, a fin de que se proceda con la nueva Toma de Muestras del lote observado (en caso las observaciones contemplen de nuevo la aplicación de métodos de ensayos); y en caso las observaciones no requieran de realizar nuevamente ensayos al lote a través de muestreo, el especialista de la Entidad podrá realizar la verificación correspondiente.

El Contratista deberá contar con la totalidad del lote y adicionalmente el total de las muestras para subsanación de observaciones, de lo contrario se considerará como incumplimiento en el levantamiento de observaciones, pudiendo la Entidad aplicar las penalidades y/o acciones correspondientes según el numeral 2.2.11. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.

Si pese al plazo de subsanación otorgado, el Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato total o parcialmente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades en las que hubiera incurrido.

Si los bienes manifiestamente no cumplen con las características y condiciones ofrecidas, la Entidad no efectuará la recepción de los mismos, debiendo considerarse como no ejecutada la etapa, aplicándose las penalidades que correspondan de acuerdo a Ley.

2.2.7.3.4. Inspecciones técnicas

El Área Usaria podrá realizar inspecciones técnicas a los bienes en paralelo a la aplicación de métodos de ensayos realizados por el Organismo de Evaluación de la Conformidad durante el periodo de Verificación Técnica, donde el Contratista y la Entidad suscribirán el(las) Acta(s) de Verificación Técnica.

De encontrarse alguna observación en la(s) inspección(es) técnica(s) realizadas por el Área Usaria, serán consignadas en un Informe de Especialista, y de corresponder, complementarán a las observaciones realizadas por el Organismo de Evaluación de la Conformidad. Estas observaciones serán notificadas al Contratista mediante un documento elaborado por el Área Usaria, donde se detallen las observaciones realizadas por el Organismo de Evaluación de la Conformidad y las observaciones realizadas por el Especialista de la Entidad.

El Contratista deberá absolver las observaciones en un plazo no menor de 02 días ni mayor de 08 días calendario, contados a partir del día siguiente de realizada la notificación presencial y/o electrónica, para lo cual deberá ingresar una carta por Mesa de Partes de la Entidad y dirigida al Área Usaria, donde comunicará el levantamiento de observaciones, a fin de que el Área Usaria proceda a realizar la verificación de la subsanación de observaciones, dejando constancia de ello mediante la suscripción del Acta de Verificación Técnica por parte del Contratista y la Entidad.

La Entidad puede complementar las Acta(s) de Verificación Técnica con registro de evidencias filmicas y/o fotográficas de la situación encontrada en la(s) revisión(es) técnica(s).

De no encontrarse observación o de encontrarse las mismas subsanadas, el Área Usaria elaborará el Informe de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de la etapa de Fabricación y Embalaje.

Los formatos referenciales del Acta de Verificación Técnica y del Acta de Verificación de Levantamiento de Observaciones se encuentran en el Anexo N° 06.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221.ssf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:54:47 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Asesor FAU 80614347221.ssf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:34:28 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Mana Lupe FAU
80614347221.ssf
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:02:15 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COLEGIO N° 100101 DE LA COMUNA DE AYACUCHO
DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221.ssf
Motivo: Day V° B°

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COLEGIO N° 100101 DE LA COMUNA DE AYACUCHO
DE AYACUCHO
Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
Página 18 de 52



2.2.7.4. Documentación para el transporte de los bienes

A fin de garantizar que el transporte de los bienes se mantenga dentro de los niveles de calidad y seguridad, el Contratista deberá presentar al Área Usuaria, a través de Mesa de Partes de la Entidad, los documentos sobre el transporte de los bienes, en el plazo establecido por la Entidad, contabilizado a partir del día siguiente de la notificación por correo electrónico realizada por el Área Usuaria.

De no presentar la documentación completa y en el plazo estipulado por la Entidad, el Contratista será penalizado de acuerdo con el numeral 2.2.11.2. OTRAS PENALIDADES.

El Área Usuaria deberá revisar y verificar que el Contratista cumpla con las condiciones mínimas antes del inicio de la etapa de Transporte y Entrega de los bienes hasta los lugares de destino.

De existir observaciones, el Área Usuaria podrá notificar de manera electrónica al Contratista sobre las mismas, indicándole un plazo de subsanación de 02 a 08 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente calendario de la mencionada notificación.

Para la subsanación de las observaciones, el Contratista deberá ingresar una carta por Mesa de Partes de la Entidad, dirigida al Área Usuaria, adjuntando la documentación completa y necesaria para dichos fines. La fecha de ingreso de la carta por Mesa de Partes se contabilizará como fecha fin del plazo para la subsanación de observaciones.

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el Área Usuaria notificará electrónicamente al Contratista indicándole que cuenta con la aprobación de la Documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes, sin perjuicio de las condiciones operativas y/o de vigencia documentaria que se deben mantener para la totalidad de la documentación solicitada.

La documentación requerida se detalla a continuación:

Documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el Transporte de los bienes	
Nº	Documentación Requerida
1	<p>Póliza de Seguro de transporte terrestre nacional</p> <p>El transporte de los bienes deberá contar con la póliza de seguro a nivel nacional.</p> <p>VALOR MÍNIMO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL será el 100% del valor del monto adjudicado.</p> <p>Adicionalmente la póliza deberá hacer referencia al procedimiento de selección y/o al número de contrato, pudiendo realizarse mediante un anexo a la póliza o cualquier documento adicional emitido por la aseguradora.</p> <p>Todo esto por la reposición de los bienes transportados en caso de siniestro, esta póliza deberá ser efectiva antes del inicio de la etapa de transporte y entrega de los bienes.</p>
2	<p>SCTR</p> <p>SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para el personal del contratista asignado para la realización del servicio de transporte y entrega de los bienes.</p>
3	<p>Flota de Vehículos</p> <p>Relación completa de los vehículos a utilizar especificando como mínimo: modelo, placa, tarjeta de propiedad, tarjeta de Habilitación vehicular para el transporte de mercancías, tipo de vehículo, capacidad máxima de carga de vehículo expresado en kilogramos y en pesos cúbicos, copia simple de la Tarjeta de Propiedad, SOAT vigente de cada una de las unidades, REVISIÓN TÉCNICA vehicular aprobada y vigente de acuerdo con ley.</p> <p>La antigüedad máxima de los vehículos será de 10 años, contabilizados a partir del año siguiente de fabricación de estos.</p>

En caso el destino de transporte sea una(s) Institución(es) Educativa(s), no se permite que vehículos pesados ingresen a los patios de ésta(s); en caso se evidencie de manera documentada esto, se aplicará lo estipulado en el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

Cada unidad deberá transportar sólo y exclusivamente los bienes objeto de la contratación; en caso se evidencie de manera documentada la ocurrencia del incumplimiento, se aplicará lo estipulado en el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

El transporte debe efectuarse con un vehículo cerrado a fin de garantizar la seguridad e integridad de los bienes, caso contrario se aplicará lo estipulado en el numeral 2.2.11.2. Otras Penalidades.

Todo vehículo de transporte que salga en ruta deberá acompañar la carga con el(los) Documentos que acredite Entrega de los Bienes proporcionado(s) por la Entidad y la guía de remisión del transportista. En ambos casos deberá indicar el destino final y el detalle del material transportado en conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Asimismo, durante la etapa de transporte y entrega, deberán contar con unidades de contingencia o transporte alternativo de características similares o superiores a las unidades asignadas para el servicio. En caso se produzca una avería o desperfecto que inhabiliten alguna unidad registrada, se deberá reemplazar la unidad en un lapso no mayor a 48 horas (teniendo en cuenta el personal necesario y equipado para la tarea de transbordo de los materiales).

2.2.8.2. Entrega

Es de responsabilidad del Contratista la carga y descarga de los bienes en el lugar de embarque y destino, al igual que la entrega de los bienes en buen estado de las cantidades descritas en los Documentos que acredite Entrega de los Bienes, a los destinos establecidos en el numeral 2.2.2. LUGAR DE ENTREGA, así como de la devolución de la documentación sustentadora de recepción, conforme a la cantidad de juegos de Documentos que acredite Entrega de los Bienes entregados por la Entidad.

Un juego de Documentos que acredite Entrega de los Bienes original, debidamente firmada en original se debe quedar con la persona firmante como representante de la Institución de destino.

Los bienes serán entregados en perfecto estado de conservación, adecuadamente armados y embalados hasta su destino final, sin ningún defecto de adquisición, ni otro como consecuencia de la estiba o desestiba o del transporte.

La entrega de los bienes a los lugares de destino será sustentada con la presentación de lo siguiente:

- Guía de Remisión del Transportista
- Documentos que acredite Entrega de los Bienes: PECOSA, Acta de entrega de Bienes, etc
- El (Los) Documentos que acredite Entrega de los Bienes, representan la aceptación de los bienes por parte de los representantes de las Instituciones de destino, podrán ser suscritos por las siguientes autoridades:
- Representante designado y autorizado por la Entidad contratante.
- En caso la dotación se realice a una Institución Educativa, podrá suscribir un representante designado y autorizado por la UGEL y/o DRE correspondiente a la jurisprudencia de la Institución Educativa de destino.

La información que debe ser consignada en los Documentos que acredite Entrega de los Bienes es la siguiente:

- Firma legible
- Fecha de conformidad de los bienes
- Copia de DNI del firmante, donde se aprecie su firma.

En caso se realice la modificación del lugar de entrega por parte del Área Usaria, entonces el Documentos que acredite Entrega de los Bienes podrá ser firmada por la dirección de dicha Área.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL N.º 35 UNIDAD EN LA C.A. 1
CALLE VIO' DINO, STRAL VIO' DINO, C.A. 1 DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tibeno Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 15/03/2023 12:33:20 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 15/03/2023 12:02:36 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 14/03/2023 23:54:26 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 15/03/2023 08:35:06 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL N.º 35 UNIDAD EN LA C.A. 1
CALLE VIO' DINO, STRAL VIO' DINO, C.A. 1 DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilber Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Los datos de la institución de destino y su personal para la recepción de los bienes y el firmado del Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, serán coordinados directamente por el Contratista.

Finalizada la Entrega de la totalidad de bienes, el Contratista deberá presentar al Área Usuaría, por Mesa de Partes de la Entidad, una carta documentada que indique la culminación del transporte y entrega de la totalidad de los bienes en la(las) institución(es) de destino.

La carta deberá contener lo siguiente:

- Los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes originales establecida por la Entidad.
- Guías de remisión del transportista, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2. ENTREGA.
- Copias del DNI del firmante, según lo estipulado en el numeral 2.2.7.2. ENTREGA.
- Certificados de Garantía de Adquisición de los bienes (véase el numeral 2.2.12. GARANTÍA COMERCIAL DE LOS BIENES)
- Informe Fotográfico de Entrega de Bienes donde se adjunten fotografías y/o videos de los bienes siendo entregados en la(s) dirección(es) que figure(n) en el numeral 2.2.2. LUGAR DE ENTREGA. Estas fotografías y/o videos servirán para acreditar la correcta entrega de los bienes, debiendo figurar como mínimo la siguiente información:
 - Fotografía y/o video del vehículo iniciando la descarga de los bienes, en la cual se muestre la placa del vehículo.
 - Fotografía y/o video mostrando las Instalaciones de la Institución de destino. Mínimo 1 fotografía y/o video de 10 segundos aproximados.
 - Fotografía del representante de la Institución de destino, en el momento de la recepción de los bienes. Mínimo 1 fotografía y/o video de 10 segundos aproximados.
 - Fotografías y/o videos mostrando el estado de los bienes, recepcionados mostrando el logotipo y rotulado de los bienes. Mínimo 2 fotografías y/o videos de 10 segundos aproximados.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
/ANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 18:33:28 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
PARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 12:02:43 -05:00

2.2.8.3. Verificación documentaria

Finalizada la Entrega de la totalidad de bienes, el Contratista deberá presentar al Área Usuaría, por Mesa de Partes de la Entidad, una carta documentada que indique la culminación del transporte y entrega de la totalidad de los bienes en la(las) institución(es) de destino.

La documentación mencionada como parte de la carta de culminación del transporte y entrega de los bienes según lo estipulado en el numeral 2.2.8.2., será parte integral de la Verificación Documentaria que realizará el Área Usuaría.

De encontrarse alguna observación en el marco de la verificación documentaria ésta deberá ser remitida al Contratista de manera electrónica y/o física por el Área Usuaría; otorgando un plazo de entre 02 a 08 días calendario para subsanarlas.

El Contratista deberá remitir al Área Usuaría una carta por Mesa de Partes de la Entidad, indicando el levantamiento de observaciones, adjuntando la subsanación correspondiente.

La fecha de ingreso de dicha comunicación a la Entidad se tomará como fecha de fin de subsanación de las observaciones.

Si pese al plazo otorgado, el Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato total o parcialmente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades a que hubiera incurrido; y en el marco de la ley vigente.


De no encontrarse observación o de encontrarse las mismas subsanadas por el Área encargada de emitir los Documentos que Acredite Entrega de los Bienes, procederá a

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencia
Antonia FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 15.03.2023 08:35:24 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 14.03.2023 23:54:18 -05:00



Asimismo, el Área Usuaria notificará de manera presencial y/o electrónica al Contratista para que proceda con el ingreso de la(s) Factura(s) y CCI correspondiente.

2.2.10. Forma de pago

La Entidad emitirá los pagos según el siguiente detalle:

I. PAGO POR FABRICACIÓN Y EMBALAJE DE LOS BIENES	
Forma de Pago	Monto de Pago
Para el pago por fabricación y embalaje de los bienes, el Contratista deberá seguir el procedimiento detallado en el numeral 2.2.9.1 Conformidad por Fabricación y Embalaje)	El porcentaje y/o monto del pago será definido por la Entidad.
II. PAGO POR TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIENES	
Forma de Pago	Monto de Pago
Para el pago por transporte y entrega de los bienes, el Contratista deberá seguir el procedimiento detallado en el numeral 2.2.9.2 Conformidad por Transporte y Entrega).	El porcentaje y/o monto del pago será definido por la Entidad.

2.2.11. Incumplimiento de contrato y penalidades

2.2.11.1. Penalidades

En caso que el contratista incumpliera de forma injustificada con los plazos descritos en la presente ficha de homologación, será indefectiblemente objeto de las penalidades correspondientes según las Normas Legales vigentes (Artículo N°162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones); por consiguiente, la Entidad cobrará a través de las deducciones correspondientes.

2.2.11.2. Otras penalidades

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se determinan otras penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente y directamente relacionadas con los Bienes en el ANEXO N° 4.

La aplicación de la penalidad no exceptúa al Contratista de su responsabilidad, sobre los daños a las Instituciones de destino o terceros, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

Nota 06: La Entidad contratante podrá determinar el monto (M) dependiendo de las características del Requerimiento.

2.2.11.3. Resolución de contrato

Será motivo de la Resolución de Contrato: el incumplimiento parcial o total del Contrato, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.2.12. Garantía comercial de los bienes

CONSIDERACIONES DE LA GARANTÍA	
Garantía de los Bienes	05 años
Aplicación de Garantía (Véase Nota 07)	Hasta 15 días calendario como máximo para brindar solución; contabilizado a partir del día calendario siguiente de notificada la solicitud de aplicación de garantías.

Nota 07: La Entidad contratante podrá determinar el tiempo adecuado según el requerimiento.

El Contratista es responsable por la garantía de los bienes. La garantía es por defectos de Fabricación / Adquisición y Embalaje y no por mal uso de los bienes por parte del usuario final.

El plazo de la garantía cuenta a partir del día siguiente calendario de firmado los Documentos que acredite Entrega de los Bienes por Representantes de cada Institución de destino según lo estipulado en el numeral 2.2.8.2. ENTREGA.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN María Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:02:58 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514247221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:33:58 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUIATANA Florencia
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:35:54 -05:00



La garantía deberá estar acreditada por documentación del Contratista, esta documentación deberá estar firmada por su representante legal, referida a los bienes ofertados y su transporte y entrega realizada.

Se deberá entregar 01 Certificado de Garantía por cada Institución de destino, los mismos que serán remitidos a la Entidad para la elaboración de la conformidad de la prestación, estipulando claramente el inicio del plazo de garantía de los bienes, las descripciones y números de series de los mismos, de corresponder.

El Contratista garantizará la calidad de los bienes fabricados de acuerdo a los planos y demás documentos contractuales según las especificaciones técnicas del bien.

La Entidad notificará al Contratista de cualquier reclamo relacionado con la garantía de manera física y/o mediante correo electrónico, el Contratista al recibir esa notificación deberá tomar las acciones correspondientes para informar y/o reparar y/o reemplazar los bienes y/o componentes y/o instalaciones defectuosas en su totalidad o en parte según sea el caso, en las Instituciones de destino sin costo alguno para éstas, ni para la Entidad.

Si el Contratista después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del plazo indicado en el cuadro de consideraciones de garantía entonces la Entidad podrá tomar las medidas correctivas que sean necesarias, por su propia cuenta y riesgo y sin perjuicio de los demás derechos que la Entidad tenga ante el Contratista, en conformidad con la legislación vigente.

2.2.13. Responsabilidad por vicios ocultos

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo de 05 años.

Este plazo cuenta a partir del día siguiente de emitida la conformidad de la prestación por parte del área usuaria.

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

3.1 De la selección:

Documentos de presentación obligatoria por el postor:

- Relación de especies de madera a utilizar en el proceso de fabricación del bien especificado en la presente ficha de homologación. Dicha relación se presentará con el formato de Ficha de presentación de producto adjunta en el Anexo N° 07.

IV. ANEXOS

- Anexo N° 01: Formato del Lugar de destino
 - Dirección(es) de Institución(es) Educativa(s) de destino
- Anexo N° 02: Pruebas y/o ensayos para la verificación de calidad
- Anexo N° 03: Planimetría
- Anexo N° 04: Cuadro de Otras penalidades
- Anexo N° 05: Requisitos que presentar para la Suscripción del Contrato
- Anexo N° 06: Actas referenciales para el proceso de ejecución contractual
- Anexo N° 07: Ficha de presentación de producto

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Ebas FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:53:20 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA
QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:36:07 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Jupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:03:04 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tibiso Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:33:58 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL N.º 1 SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL N.º 1 SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Richard Wilber Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO N° 01

FORMATO PARA INDICAR LUGAR DE DESTINO

Dirección(es) de Institución(es) Educativa(s) de destino

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:53:22 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antepio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:39:23 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lope FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:03:13 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:34:11 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO N° 20000, S/N° 11, CRISTO REY, CALA, LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTO VENTURA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Beilido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO N° 20000, S/N° 11, CRISTO REY, CALA, LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PUNTO VENTURA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Witver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

DIRECCION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS								
Nº DE ORDEN	CÓDIGO MODULAR	CÓDIGO LOCAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	SUB TOTAL DE BIENES
1								
2								
TOTAL GENERAL								

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:53:16 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
CORRELA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:36:44 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN María Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:03:21 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
VANDC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 16:34:18 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 11 CRISTÓBAL COLÓN LOCALIDAD DE CORACORA DISTRITO
DE CORACORA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 11 CRISTÓBAL COLÓN LOCALIDAD DE CORACORA DISTRITO
DE CORACORA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ANEXO N° 02

PRUEBAS Y/O ENSAYOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD

- Normas técnicas para la verificación de mobiliario
- Control de calidad

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° S°
Fecha: 14.03.2023 23:53:08 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° S°
Fecha: 15.03.2023 08:36:59 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° S°
Fecha: 15.03.2023 12:03:27 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANUC Tibeño Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° S°
Fecha: 15.03.2023 18:34:33 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARIACUTI, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARIACUTI, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

NORMAS TECNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE MOBILIARIO

El mobiliario a fabricar, al igual que la certificación de calidad se ceñirá a las siguientes normas y sus respectivas enmiendas y revisiones con actual vigencia, según corresponda por tipo de bien.

CUADRO N° 01: NORMAS TECNICAS QUE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL MOBILIARIO ESCOLAR	
CÓDIGO	TÍTULO DE LA NORMA
RV N°019-2023-MINEDU	Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular
NTP 260.006:2019	MOBILIARIO ESCOLAR. Mesa para nivel de Educación secundaria. Requisitos. 4ª Edición.
NTP 260.010:2019	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Clasificación y tipos. 4ª Edición.
NTP 260.011:2017	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Definiciones. 3ª Edición
NTP 260.012:2017	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Embalaje. 3ª Edición
NTP 260.013:2017	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Rotulado. 3ª Edición
NTP 260.014:2021	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Muestreo. 4ª Edición
NTP 260.015:2021	MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Requisitos. 5ª Edición

CUADRO N° 02: NORMAS TECNICAS QUE ESTABLECEN METODOS DE ENSAYO PARA LOS BIENES Y MATERIALES	
CÓDIGO	TÍTULO
NTP 260.025:2019	MOBILIARIO. Mesas para instituciones educativas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 4ª Edición

GLOSARIO

- **Fabricación y embalaje:** corresponde que el bien se encuentre acabado y embalado, preparado para ser utilizado en conformidad de la Entidad.
- **Transporte, entrega:** corresponde que el bien sea entregado sin deterioro por el transporte y colocado en el ambiente designado por la autoridad de cada Entidad de destino. Deberá estar conforme con la Entidad.
- **Defectos Críticos:** Defectos que imposibilita el uso del producto y/o que puede afectar la seguridad del usuario.
- **Defectos Mayores:** Defectos que, sin llegar a ser críticos, en cierto plazo afectan el uso de las unidades.
- **Defectos Menores:** Defectos que no afectan el uso de las unidades.
- **Inspección por atributos:** Inspección mediante el cual se clasifica una unidad de producto como conforme o no conforme, o se cuenta el número de no conformidades en la unidad de producto, con respecto a un determinado requisito o conjunto de requisitos.
- **Límite de Calidad Aceptable (LCA):** Es el nivel máximo permisible de unidades no conformes de la muestra de un lote.
- **Lote:** Es el conjunto de muebles de un mismo modelo fabricados en un determinado período, bajo condiciones iguales.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:53:00 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA GUANTANA Florentino
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:37:18 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
PARFAN Maria Lucre FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:03:34 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROSLES
YANOC Tibeno Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:34:41 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO N° 20000 "TRIAL Y CRISTÓBAL COLÓN" DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

Versión 02

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO N° 20000 "TRIAL Y CRISTÓBAL COLÓN" DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Página 29 de 52

PLAN DE MUESTREO

Se precisa que las muestras se toman bajo el nivel de inspección S1 de la NTP 260.014.2017 vigente (incluyendo sus últimas revisiones).

CUADRO N°03: TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA MOBILIARIO										
Tamaño del Lote			Niveles de Inspección Especial				Niveles de Inspección General			
			S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III	
2	a	8	A	A	A	A	A	A	B	
9	a	15	A	A	A	A	A	B	C	
16	a	25	A	A	B	B	B	C	D	
26	a	50	A	B	B	C	C	D	E	
51	a	90	B	B	C	C	C	E	F	
91	a	150	B	B	C	D	D	F	G	
151	a	280	B	C	D	E	E	G	H	
281	a	500	B	C	D	E	F	H	J	
501	a	1200	C	C	E	F	G	J	K	
1201	a	3200	C	D	E	G	H	K	L	
3201	a	10000	C	D	F	G	J	L	M	
10001	a	35000	C	D	F	H	K	M	N	
35001	a	150000	D	E	G	J	L	N	P	
150061	a	500000	D	E	G	J	M	P	Q	
500001	a	más	D	E	H	K	N	Q	R	

↓ = Use el primer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el tamaño de la muestra es igual o excede el tamaño del lote lleve a cabo inspección 100%

↑ = Use el primer plan de muestreo arriba de la flecha

Ac = Número de aceptación

Re = Número de rechazo

En concordancia con las letras código según el tamaño del lote, se utilizará la siguiente tabla para determinar el tamaño de la muestra y los LCA correspondientes:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:52:54 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:37:40 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:03:46 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cajo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:34:48 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL COLÓN DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Versión 02

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL COLÓN DE CORA CORA, DISTRITO
DE CORA CORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Tamaño de muestra		Límite de calidad aceptable LAC, en porcentaje de ítemes no conformes o no conformidades por 100 ítemes (inspección normal)																											
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	160	250	400	650	1.000		
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	
A	2																												
B	3																												
C	5																												
D	8																												
E	13																												
F	20																												
G	30																												
H	50																												
I	80																												
J	125																												
K	200																												
L	315																												
M	500																												
N	800																												
O	1.250																												
P	2.000																												

- La selección de las muestras del lote, se debe tomar al azar y de manera tal que se obtengan unidades de todas las partes del lote.
- Si el número de unidades de producto no conformes encontrados en la muestra es igual o menor que el número de aceptación, el lote debería ser considerado aceptable. Si el número de unidades del producto no conformes es igual o mayor que el número de rechazo, el lote debería ser considerado no aceptable.
- El nivel de inspección determina la relación que existe entre el tamaño del lote y el tamaño de la muestra.
- La clasificación de Defectos para Mobiliario para Instituciones Educativas es la siguiente:

Defectos Críticos:

Falla de compresión paralela en elementos estructurales
Grano inclinado mayor al tolerado en elementos estructurales
Pudrición
Presencia de Insectos activos
Rotura
Rajaduras
Nudos muertos
Ensamble defectuoso

Defectos Mayores

Falla de compresión paralela en elementos no estructurales
Grano inclinado mayor al tolerado en elementos no estructurales
Perforaciones de insectos inactivos mayores a los permitidos
Grietas
Armado Asimétrico
Mezcla de especies
Juntas desiguales
Alabeos de piezas mayores a los tolerados
Nudos sanos no tolerados
Inestabilidad en un plano

Defectos Menores

Acabado defectuoso
Boleado irregular de aristas

RELACION DE ENSAYOS:

DESCRIPCION	NORMA Y/O DOCUMENTO TÉCNICO PARA ENSAYOS Y/O PROCEDIMIENTOS	ENSAYOS
MESA METAL MADERA DE 1° A 2° DE SECUNDARIA	NTP 260.025:2019 MOBILIARIO. Mesas para instituciones educativas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 4ª Edición	ESTABILIDAD CON CARGA VERTICAL EN MESAS
		DURABILIDAD HORIZONTAL
		DURABILIDAD VERTICAL
		CARGA ESTÁTICA VERTICAL
	Estudio sobre el contenido de humedad equilibrio de la madera en el Perú, elaborado por el CITE MADERA.	CARGA ESTÁTICA HORIZONTAL
		VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE CONTENIDO DE LA HUMEDAD EN LA MADERA DE ACUERDO AL LUGAR DE ENTREGA

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:34:58 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.02.2023 23:02:47 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencio Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:42:16 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARRAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:03:53 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA REGIÓN DE AYACUCHO
COLEGIO N° 1000 "S. RAFAEL N° 1000" DE AYACUCHO
DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO
FIRMA DIGITAL



Página 02 de 02
Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA REGIÓN DE AYACUCHO
COLEGIO N° 1000 "S. RAFAEL N° 1000" DE AYACUCHO
DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO
FIRMA DIGITAL
Ing. Luis Escobar Bellico
Responsible de Obra
CIP: 211541

ANEXO N° 3 PLANIMETRÍA

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:52:41 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Ricardo
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:42:31 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
CARFAN Mansa Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:03:58 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROSLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 19:35:08 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.I.
COLEGIO MATEO ANDINO N° 1 CRISTÓBAL COLÓN DE CORA CORA DISTRITO
DE CORA CORA PROVINCIA DE PARACAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO




Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 411541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.I.
COLEGIO MATEO ANDINO N° 1 CRISTÓBAL COLÓN DE CORA CORA DISTRITO
DE CORA CORA PROVINCIA DE PARACAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO




Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

60-1

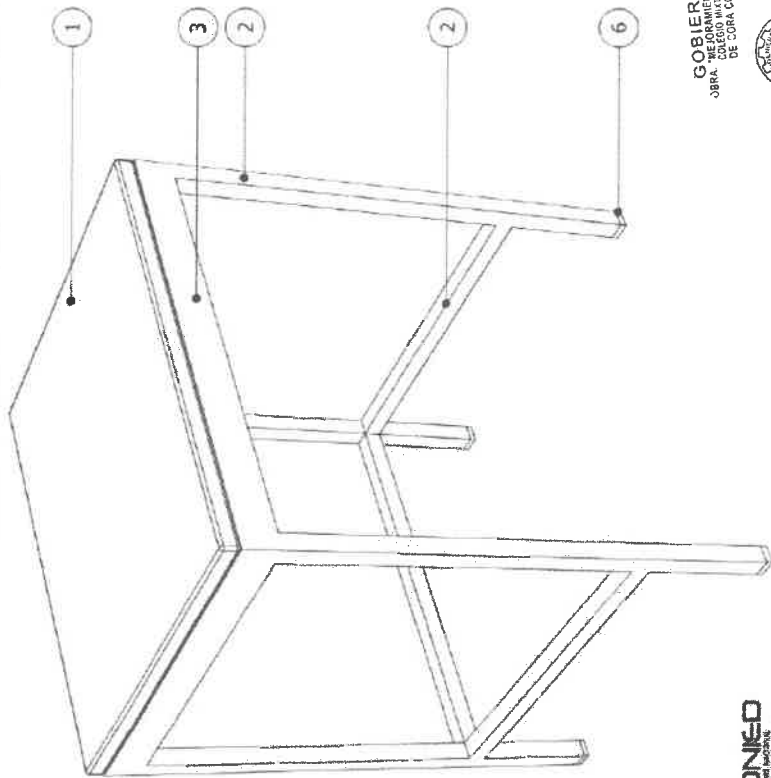

PERSPECTIVA

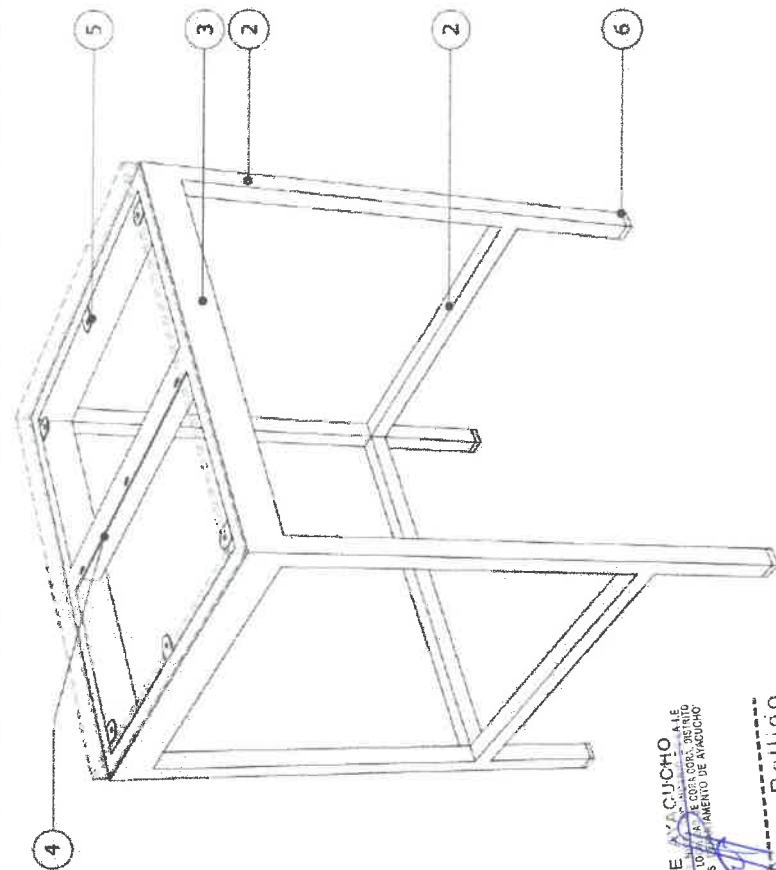

PERSPECTIVA
(sin tablero)

PRONIED
INSTITUCIÓN VENEZOLANA
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

SECTOR: EDUCACIÓN
PROYECTO: MESA DE METAL
DISEÑO: 2014-02-27
AUTOR: LUIS ESCOBAR BELLIDO
VERSIÓN: 1.0

PROYECTO: MESA DE METAL
DISEÑO: 2014-02-27
AUTOR: LUIS ESCOBAR BELLIDO
VERSIÓN: 1.0


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
OBRA: COLEGIO MATEO INDEPENDENCIA Y PARINACÓ
DE CORA CORA




Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


1. TABLERO DE MADERA CON UNIONES MACHIHEMBREADAS O FINGER JOINT (UNIÓN ENDENTADA) $e=25-22mm$ ATORNILLADO A ESTRUCTURA DE ACERO CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA 4X20.
2. TUBO MECÁNICO DE ACERO ELECTROSOLDADO LAMINADO AL FRÍO $1" \times 1"$ CALIBRE 16 (1.5mm)
3. TUBO MECÁNICO DE ACERO ELECTROSOLDADO LAMINADO AL FRÍO $1" \times 2"$ CALIBRE 16 (1.5mm)
4. PERFIL DE ACERO "T" DE $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ DE 2.5MM (MÍNIMO) DE ESPESOR, PERFORADO PARA SUJECIÓN DE TABLERO.
5. PUNTOS DE SUJECIÓN DE ACERO CON PERFORACIÓN TIPO "OJO CHINO" - CALIBRE 18 (1.5mm)
6. REGATONES DE POLIPROPILENO DE 12 MM (MÍNIMO) DE EMBONE EXTERIOR O INTERIOR. LOS REGATONES PERMITIRÁN TENER UNA DISTANCIA NO MENOR DE 5 MM DEL PISO A LA ESTRUCTURA METÁLICA.
7. LOGOTIPO INSTITUCIONAL

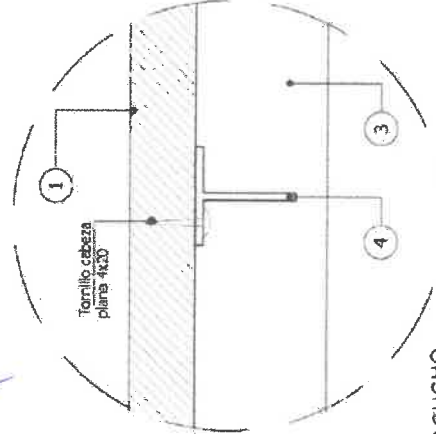

DETALLE D-02
ESCALA 1/2

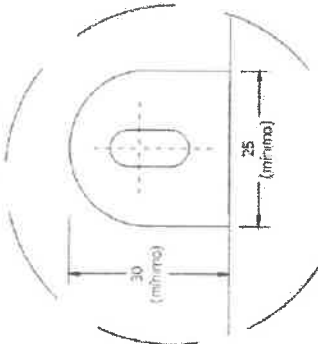

ALETA DE SUJECIÓN



DETALLE DE REGATÓN
ESCALA 1/2

PRONIED
INSTITUCIÓN VENEZOLANA
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

SECTOR: EDUCACIÓN
PROYECTO: MESA DE METAL
DISEÑO: 2014-02-27
AUTOR: LUIS ESCOBAR BELLIDO
VERSIÓN: 1.0

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
OBRA: COLEGIO MATEO INDEPENDENCIA Y PARINACÓ
DE CORA CORA



Ing. Richard Wilmar Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

PRONIED
INSTITUCIÓN VENEZOLANA
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

SECTOR: EDUCACIÓN
PROYECTO: MESA DE METAL
DISEÑO: 2014-02-27
AUTOR: LUIS ESCOBAR BELLIDO
VERSIÓN: 1.0

PRONIED
INSTITUCIÓN VENEZOLANA
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

SECTOR: EDUCACIÓN
PROYECTO: MESA DE METAL
DISEÑO: 2014-02-27
AUTOR: LUIS ESCOBAR BELLIDO
VERSIÓN: 1.0

UNIDADES: MÍMETROS (mm)

PROTECTOR: MESA DE METAL MADERA 1º A 2º SECUNDARIA

CODIGO: MSM-05

INDICADA

PRONIED
INSTITUCIÓN VENEZOLANA
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

CODIGO: MSM-05

INDICADA

L-09A

ANEXO N° 04 CUADRO DE OTRAS PENALIDADES

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:52:10 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA OLINTANA Florenzo
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:43:29 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:04:28 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Ceyo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:35:30 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA TORRE, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTÓBAL DE LA TORRE, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

OTRAS PENALIDADES

Tipo	Supuestos de aplicación de Penalidad	Forma referencial de cálculo				Procedimiento
		1 a 100 bienes	100 a 1000 bienes	1000 a 5000 bienes	5000 a más bienes	
F1	No presentar la totalidad de la documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el transporte de los bienes a la Entidad, según las condiciones del numeral 2.2.7.4. Documentación para el Transporte de los bienes	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
F2	No levantar las observaciones realizadas por la Entidad a la documentación requerida para sustento de las condiciones mínimas para el transporte de los bienes luego del plazo estipulado en el numeral 2.2.7.4. Documentación para el Transporte de los bienes	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F3	No recoger los Documentos que acredite Entrega de los Bienes ni suscribir el Acta de Entrega Documentaria según lo estipulado en el numeral 2.2.8.1 Transporte	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F4	No cumplir con el almacenaje adecuado (ambiente techado, sin goteras, sin filtraciones y con cobertura en óptimas condiciones), de acuerdo con el Numeral 2.2.5.1 Requisitos a presentar para la suscripción del Contrato	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 1$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 4$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F5	Ingresar con vehículos pesados a los patios de Instituciones Educativas para realizar la estiba y/o descarga de bienes según numeral 2.2.8.1 Transporte	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 1$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	
F6	No transportar exclusivamente los bienes objeto de la presente contratación en los vehículos del contratista	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 2$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 8$ UIT (*)(**) $Oc = n^\circ$ Ocurrencia	



	de acuerdo con el numeral 2.2.8.1 Transporte					
F7	No realizar el Transporte de bienes con un vehículo cerrado de acuerdo con lo señalado en el numeral 2.2.8.1 Transporte	$P = M \times Oc$ $M = 0.05$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 1$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 4$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 5$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	
F8	No presentar la solicitud de calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad dentro del plazo establecido en numeral 2.2.7.1 Sobre la solicitud para la calificación del Organismo de Evaluación de la Conformidad	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	
F9	No presentar a la Entidad los resultados de la aplicación de métodos de ensayos dentro del plazo ofertado por el Organismo de Evaluación de la Conformidad. En su propuesta técnica presentada para su designación.	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	
F10	No presentar el levantamiento de observaciones del "informe de ensayos" dentro del plazo otorgado por la Entidad Contrante.	$P = M \times Oc$ $M = 0.2$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	
F11	No presentar antes de la culminación de la etapa de Fabricación, la documentación requerida en el numeral 2.2.1 Procedencia de la madera.	$P = M \times Oc$ $M = 0.1$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 0.5$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	$P = M \times Oc$ $M = 3$ UIT (*)(**) $Oc = n^{\circ}$ Ocurrencia	
<p>Consideraciones:</p> <p>(*) UIT: Unidad Impositiva Tributaria, se aplicará el valor de referencia vigente, establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, en la fecha de la suscripción del contrato.</p>						

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Esos FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:56:05 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARRÁN María Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:04:55 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO "MIGUEL HUS" DE LA ZONA URBANA DE AYACUCHO, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencio Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:44:25 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tibeno Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:35:40 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO "MIGUEL HUS" DE LA ZONA URBANA DE AYACUCHO, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98713

ANEXO N° 05 REQUISITOS A PRESENTAR PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:56:13 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:44:40 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:05:02 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:36:02 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO MATEO INDUSTRIAL N°17 DISTRITO REYES, CANTON, DISTRITO
DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN
COLEGIO MATEO INDUSTRIAL N°12 CANTON REYES, CANTON DE CORA CORA D.
DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Varg
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

FORMATO N° 01

FORMATO N°01: CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES								
ACTIVIDADES	ETAPA: FABRICACION Y EMBALAJE DE LOS BIENES							
	MES 1				MES 2			
	día 1	día 2	día 3	día "n"	día 1	día 2	día 3	día "n"
BIEN "A"								
Actividad 1								
Actividad 2								
Actividad 3								
Actividad "n"								
BIEN "B"								
Actividad 1								
Actividad 2								
Actividad 3								
Actividad "n"								

FORMATO N° 02

FORMATO N°02: CRONOGRAMA DE ENTREGA DE BIENES								
ACTIVIDADES	ETAPA: TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIENES							
	MES 1				MES 2			
	día 1	día 2	día 3	día "n"	día 1	día 2	día 3	día "n"
INSTITUCIÓN DE DESTINO N°01								
TRANSPORTE								
ENTREGA								
INSTITUCIÓN DE DESTINO N°02								
TRANSPORTE								
ENTREGA								

Notas:

- El cronograma de "Adquisición de bienes" servirá para la realización de visitas inopinadas por parte de la ENTIDAD.
- Asimismo, ambos formatos, deberán entregarse en programa MS PROJECT, MS EXCEL o similar.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:59:20 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florentino Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:44:58 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARSAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:05:00 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tibeño Ceyo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:36:15 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA COLEGIO VOTIVO INDUSTRIAL N° 11 CRISTO REY Y LA LOMA DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Luis Escobar Bel
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA COLEGIO VOTIVO INDUSTRIAL N° 11 CRISTO REY Y LA LOMA DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Richard Wilver Cancho Vargá
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

FORMATO N° 03

FORMATO N°03: DESAGREGADO DE COSTOS

DESAGREGADO DE COSTOS DE BIENES A ENTREGAR A LA(S) INSTITUCION(ES) BENEFICIADA(S)

REGIÓN	INSTITUCIONES DE DESTINO	DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD	COSTO UNITARIO DE ADQUISICIÓN (FABRICACIÓN Y EMBALAJE)	COSTO UNITARIO DE ENTREGA (TRANSPORTE Y ENTREGA)	COSTO UNITARIO SUB TOTAL	COSTO DE BIENES
	(1)	(2)	(C)	(A)	(B)	(A+B)	[(A+B)*C]
"A"	Institución 01	Bien "A"		SI.	SI.	SI.	SI.
		Bien "B"		SI.	SI.	SI.	SI.
		Bien "n"		SI.	SI.	SI.	SI.
	Institución 02			SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
"B"	Institución 01			SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
	Institución 02			SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.
				SI.	SI.	SI.	SI.

RESUMEN DE COSTOS

COSTO TOTAL

SI.

Consideraciones:

- (1) Se contabiliza según el número de orden del "Formato de Direcciones para la Entrega", del Anexo 01.
- (2) Según nomenclaturas del Cuadro N°01 de las presentes especificaciones técnicas.
- (A) Incluye costo del Control de Calidad, según el numeral 2.2.8.

Notas:

- Se precisa que todos los costos deben contener como máximo 02 decimales y las sumatorias deben coincidir con los totales a adjudicar.
- Asimismo, dicho formato debidamente llenado, deberá entregarse en archivo digital editable.
- Toda incompatibilidad, incluso a nivel de decimales u ordenamiento del formato distinto a lo estipulado, será tratada como observación.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:58:27 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:45:16 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Mana Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:05:16 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:36:22 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.L.
COLEGIO MICO INDUSTRIAL DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO
CIP: 211541



Versión 02

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.L.
COLEGIO MICO INDUSTRIAL DE CORA CORA PROVINCIA DE AYACUCHO
CIP: 211541

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Página 40 de 52

FORMATO N° 04

FORMATO N°04: DIRECCIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN Y ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA						
Nombre de contratista o de cada empresa que conforma el consorcio	Av., Jr., Calle, Pasaje, Mz. Lote, Etc.	N°	Urbanización, Sector, Etc.	Teléfono del Local y de Propietarios	Referencia	Distrito Provincia Región

Notas:

- Máximo declarar 04 instalaciones de almacenamiento y/o talleres.
- En caso se necesite modificar los datos de la(s) dirección(es) declaradas, el Contratista deberá notificar a la Entidad mediante una carta por mesa de partes de la ENTIDAD, como plazo máximo antes del ingreso de la Solicitud de Verificación de Cantidad por la culminación de la etapa de "Adquisición y Embalaje de la totalidad de los bienes".

FORMATO N° 05

FORMATO N°05: RESPONSABLE GENERAL DE OPERACIONES					
Nombres y apellidos completos	N° DNI	Cargo	N° de celular	N° teléfono fijo	Correo electrónico Institucional

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elías FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:58:34 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN María Lupe FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:05:25 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencio Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:45:37 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANOC Tóbeno Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:38:31 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIGUEL INDUSTRIAL Y AL CRISTO REY DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA DE PACHACACHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIGUEL INDUSTRIAL Y AL CRISTO REY DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA DE PACHACACHA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

FORMATO N° 06

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Por medio de la suscripción del presente documento se autoriza a (Nombre de Entidad) a realizar la notificación electrónica de las observaciones realizadas por la Entidad durante el procedimiento para suscribir el contrato, así como, para los actos efectuados durante la ejecución del contrato.

La dirección de correo electrónico autorizada es:

Correo electrónico autorizado:

[illegible]

Repita el correo electrónico autorizado:

[illegible]

Quedan exceptuados de la presente autorización, aquellos actos cuya notificación revistan formalidades especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones pública.

La notificación electrónica se acredita con la impresión del correo electrónico enviado y la Cedula de Notificación, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmación de parte del contratista.

La notificación en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación electrónica efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

(REPRESENTANTE LEGAL)

RUC:



Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V^o B^o
Fecha: 15.03.2023 12:05:32 -05:00



Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
Móvil: Day 1° B°
Fecha: 14.03.2023 23:56:41 -05:00



Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:26:39 -05:00



Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Soy el B'
Fecha: 15.03.2023 08:45:49 -05:00



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ANEXO N° 06

MODELOS REFERENCIALES DE ACTAS PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:56:58 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencio Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 05:45:27 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:05:39 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES YANCO Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:36:47 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
COLEGIO MIXTO RUSTO MALMILLO CRISTO REY DE LA PAZ
DE CORA CORA PROVINCIA DE PARACAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Cora
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
COLEGIO MIXTO RUSTO MALMILLO CRISTO REY DE LA PAZ
DE CORA CORA PROVINCIA DE PARACAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ACTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	
CONTRATO:	
TIPO DE BIEN:	
UBICACIÓN:	
CONTRATISTA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
FECHA:	

Siendo las _____ horas del día _____ del mes _____ del año 20____, se reunieron en el sitio donde se realiza el proceso de fabricación y/o almacenaje de los bienes adquiridos mediante el procedimiento de selección arriba mencionado, sitio en la dirección antes indicada; de una parte, el Sr(a) _____ en representación de la **ENTIDAD** y de la otra parte el Sr(a) _____ en representación de la empresa Contratista _____ a fin de llevar a cabo la inspección de los trabajos materia de la adquisición, encontrándose lo siguiente:

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA GENERAL
SERVICIO EDUCATIVO DEL MEDIO RURAL
CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS Nº 109
CIUDAD DE AYACUCHO - PERÚ

Ing. Luis Escobar Bellón
Residente de la Cursa
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° S°
Fecha: 15.03.2023 12:37:05 -05:00

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas se dio lectura a la presente Acta, y no habiendo objeciones a la misma, se procedió a suscribirla por parte de los presentes.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FENIA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:05:45 -05:00

LA ENTIDAD REPRESENTANTE

Nombre

Cargo

D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU
26514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:57:04 -05:00

**CONTRATISTA
REPRESENTANTE**

Nombre

D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FILMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
• ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
• Fecha: 15.03.2023 08:48:05 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA
COLEGIO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA VILLA DE CORACORA, DISTRITO
DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINÁ, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA

ACTA DE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA

La firma de la presente acta da la conformidad de la recepción de documentos en original de los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA's) del Contrato N° _____, derivado del Procedimiento de selección para la _____.

Mediante la presente, se hace entrega de la cantidad de N° _____ PECOSA's en cuatro (04) juegos originales, para la entrega de los bienes correspondientes.

NOTA PARA SER CONSIDERADA

De conformidad con el numeral 2.8.9 ENTREGA DE LOS BIENES, de las Especificaciones técnicas de las Bases Integradas, se debe tener en consideración que los PECOSA, deberán ser suscritos (firmados y sellados) por el Encargado de la Institución de destino¹, dando fe de lo recibido, consignándose en cada documento: firma, post-firma, sello y fecha de recepción, copia de DNI del Encargado y documentación que acredite su cargo, debiendo recabar la entidad receptora un ejemplar original de los PECOSA, para sus efectos contables.

En caso de ausencia del Encargado de la Institución de destino², por motivos no imputables a la ENTIDAD o no contar con documentación que acredite su cargo, el PECOSA podrá ser firmado por un representante designado y autorizado por la ENTIDAD.

Los bienes serán entregados en perfecto estado de conservación, adecuadamente armados y embalados hasta su destino final, sin ningún defecto de ADQUISICIÓN / FABRICACIÓN, ni otro como consecuencia de la estiba o desestiba o del transporte.

Los datos de contacto en cada una de las Instituciones de destino para la recepción de los bienes y el firmado de los PECOSA, serán coordinados directamente por el CONTRATISTA.³

Atentamente;

NOMBRE :

DNI :

TELÉFONO / CELULAR:

EMPRESA :

FECHA :

HORA:

CORREO ELECTRONICO:

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANCO Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 15.03.2023 16:37:20 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:05:53 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA GUENTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:48:26 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:57:14 -05:00

**CONTRATISTA
REPRESENTANTE**

**LA ENTIDAD
REPRESENTANTE**

¹ Si es una Institución Educativa, los PECOSA deberán ser suscritos por el Director o Sub-director administrativo en ausencia de aquel.

² En caso de ausencia del Director o Sub-director administrativo de una Institución Educativa, el PECOSA podrá ser firmado por un representante designado y autorizado por la UGEL correspondiente a la Institución, previa coordinación con la ENTIDAD.

³ Para una Institución Educativa el contacto será coordinado directamente por el CONTRATISTA con las UGELES respectivas.

Versión 02

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO WILFRIDO LLANOS CRISTÓBAL DE CORACORA, DISTRITO
DE CORACORA, PROVINCIA DE PARÍ, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

1

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.
COLEGIO WILFRIDO LLANOS CRISTÓBAL DE CORACORA, DISTRITO
DE CORACORA, PROVINCIA DE PARÍ, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Página 45 de 52



Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718


ACTA DE VISITA INOPINADA N°

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	
CONTRATO:	
TIPO DE BIEN:	
UBICACIÓN:	
CONTRATISTA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
FECHA:	

Siendo las _____ horas del día ____ del mes _____ del año 20 __, se reunieron en el local donde se realiza el proceso de fabricación y/o almacenaje de los bienes adquiridos mediante el contrato arriba mencionado, sito en la ubicación antes señalada, de una parte, el Sr(a) _____ en representación de la **ENTIDAD**, y de la otra parte el Sr(a) _____ en representación de la empresa Contratista _____

Encontrándose lo siguiente:

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA. MEJORAMIENTO DEL PUERTO CARRETERO DEL NÚCLEO SECUNDARIO EN LA LÍNEA
DE JUSTA Y CANTONADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, DISTRITO DE
CORACORA, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAJ
20514347221 soft
Motivo: Dey V² B³
Fecha: 15.03.2023 18:37:37 -05:00

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas se dio lectura a la presente Acta, y no habiendo objeciones a la misma, procediendo a suscribirla los presentes en señal de conformidad.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA
FINANCIADO POR
FUNDO DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514367221 soft
Motivo: Dey 4º Bº
Fecha: 15.03.2023 12:08:06 -05:00

LA ENTIDAD REPRESENTANTE

Nombre

Cargo

D.N.I.

**CONTRATISTA
REPRESENTANTE**

Nombre

D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
Motivo: Dey V* B²
Fecha: 14.03.2023 23:57:29 -05:00

PRONIEC
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Dey V B*
Fecha: 15.03.2023 08:48:58 -05:00

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS

CONTRATO N° _____
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN _____

Siendo las _____ horas, del día _____ de _____ de 20____; se reunieron en los Almacenes de la empresa Contratista _____, el Supervisor de la ENTIDAD, el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____, el representante de la empresa Contratista el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____ y el representante del Organismo de Evaluación de Conformidad, _____, el Sr(a) _____ identificado con DNI N° _____, con la finalidad de realizar la verificación técnica a través de ensayos de funcionalidad de los bienes materia del contrato antes citado, para tales efectos se procederá a tomar el número de muestras que pasarán por control de calidad, según lo establecido en el Anexo N° 02 de las Especificaciones Técnicas, tal como se detalla a continuación:

CUADRO N° 01: MUESTRAS Y ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD			
N° DE ORDEN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE MUESTRAS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL DE MUESTRAS			

ANOTACIONES:.....
.....
.....
.....

Al término de la diligencia, siendo las _____ horas, en señal de conformidad con los términos de la presente acta, suscriben los intervinientes.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
"BRA" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.
COLEGIO MARÍA N. S. "LA V" 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTR.
DE CORA CORA, PROV. NCA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

**LA ENTIDAD
REPRESENTANTE**

Nombre

D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:47:42 -05:00

**EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN
CERTIFICADORA DE CALIDAD
REPRESENTANTE**

Nombre

D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:37:54 -05:00

**CONTRATISTA
REPRESENTANTE**

Nombre

D.N.I.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 09:07:50 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:00:19 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
"BRA" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA U.
COLEGIO "DIN. S. RAU" 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTR.
DE CORA CORA, PROV. NCA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Richard Wilver Lancha Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
Página 49 de 52 CIP: 98718

ACTA DE VERIFICACIÓN CUANTITATIVA N°

SERVICIO :
MODALIDAD :
CONTRATO :
UBICACIÓN :
CONTRATISTA :

Siendo las _____ horas, del día _____ de _____ de 20____; estando en las instalaciones de la empresa Contratista _____, se reunieron: de una parte, el(la) Sr(a) _____, identificado con DNI N° _____, en representación de la empresa contratista _____; otra parte el Sr(a) _____, identificado con DNI N° _____, quien actúa en representación del área¹ _____; y el Sr(a) _____, identificado con DNI N° _____, en representación del área usuaria, para realizar la verificación cuantitativa del Contrato N° _____; derivado de la _____ de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, a fin de realizar la verificación cuantitativa de los bienes.

De la verificación realizada, se observan las siguientes cantidades:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD VERIFICADA

CONCLUSIÓN:.....

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ROBLES
YANOC Tiberio Cayo FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 13:38:02 -05:00

Siendo las _____ horas del día _____ de _____ del año 20____, se procedió a firmar el presente Acta por triplicado.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CASTILLO
FARFAN Maria Lupe FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:06:26 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:58:04 -05:00

ÁREA DESIGNADA POR LA
ENTIDAD
REPRESENTANTE

ÁREA USUARIA
REPRESENTANTE

CONTRATISTA
REPRESENTANTE

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
ZORRILLA QUINTANA Florencio
FAU 20514347221 soft

¹ La Entidad define quien es el área competente de emitir la conformidad cuantitativa.

Versión 02

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. "DR. JOSE GARCIA" DE CORA CORA - PROVINCIA DE PARINACOCHE - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. "DR. JOSE GARCIA" DE CORA CORA - PROVINCIA DE PARINACOCHE - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ing. Richard Wilver Cancho Vargas
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 98718

Página 50 de 52

ANEXO N° 7

FICHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO



Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.03.2023 23:58:10 -05:00



Firmado digitalmente por ZORRILLA QUINTANA Florencio Antonio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 08:49:28 -05:00



Firmado digitalmente por CASILLLO FARFAN Maria Lupe FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 12:00:31 -05:00



Firmado digitalmente por ROBLES YANOS Tiberio Cayo FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2023 18:38:10 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTA JUSTICIAL CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARACUTIAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Ing. Luis Escobar Bellido
Residente de Obra
CIP: 211541



Ficha de presentación del producto

Nombre del requerimiento		
Nº	Especie(s) maderable(s) con la(s) que atenderá el requerimiento (véase Nota 1)	Nombre o Razón social del Postor
1		
2		
...		

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 "AREA" MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIÑO
 COLEGIO MIGUEL CRISTO REY DE LA L. DE COLOMBIA EN LA L.
 DE CORA CORA P. OVINO DE PATINACOC EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

 Ing. Luis Escobar Bellido
 Presidente de Obra
 CIP: 211541
