

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/09/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO (ENTRE AV. JHON F. KENNEDY Y JR. MARIANO G. TREVITAZO), DISTRITO DE CALLERIA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION UCAYALI" - CUI N° 2378342.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	93					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2378342				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 4069-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	4/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
1								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
1	SE ADJUNTA AL FINAL							
DE LA ENTIDAD								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
1	SE ADJUNTA AL FINAL							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 491,400.86					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			11/08/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			23/11/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI	NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>								
<p>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p>----- Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>								

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.


ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISION DE OBRA

OBRA	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO (ENTRE AV. JHON F. KENNEDY Y JR. MARIANO GANOSA TREVITAZO) – DISTRITO DE CALLERIA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION UCAYALI"
------	--

Fecha de Precio AGOSTO 2023
 Plazo de Ejecucion 180 Días Calendario

1 GASTOS FIJOS DE SUPERVISION					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitacion				6,200.00
	1.01.01. Elaboracion de Propuesta	Glb	1.00	3,000.00	3,000.00
	1.01.02. Gastos de Legalizacion de Documentos	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
	1.01.03. Gastos Varios (Fotocopias, escaneados, anillados, passajes, etc.)	Glb	1.00	1,200.00	1,200.00
	1.01.04. Gastos de Tramites ante el OSCE	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
	Gastos Legales y Notariales				800.00
	1.02.01. Legalizacion de Documentos Durante la Ejecucion	Glb	1.00	800.00	800.00
1.03	Liquidacion de Contrato y Obra				9,500.00
	1.03.01. Supervisor de Obra	mes	0.5	7000	3,500.00
	1.03.02. Liquidador de Contrato de Supervision	mes	1	6000	6,000.00
SUB TOTAL S/.					16,500.00

2 GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION						
	PERSONAL CLAVE						
1.01	Supervisor de Obra	Und	100%	1.00	6.00	7,000.00	42,000.00
1.02	Especialista de Calidad	Und	100%	1.00	6.00	5,500.00	33,000.00
1.03	Especialista Ambiental	Und	50%	1.00	6.00	4,500.00	13,500.00
1.04	Especialista de Seguridad en Obra y Slud en el Trabajo	Und	100%	1.00	6.00	4,500.00	27,000.00
SUB TOTAL S/.							115,500.00


 CONSULTOR DE OBRAS
 Ing. Celso Antonio Delgado Vasquez
 C. A. 11111

143

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Secretaria	Und	100%	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00
SUB TOTAL S/							9,000.00


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
C	PERSONAL DE SUPERVISION						
1	Cadista 1 - Oficina Tecnica	Und	100%	1.00	6.00	2,000.00	12,000.00
2	Asistente de Supervisor de Obra - Oficina Tecnica	Und	100%	1.00	6.00	2,500.00	15,000.00
SUB TOTAL S/							27,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
D	LEYES SOCIALES						
	Personal Profesional	%		52.00%		118,200.00	61,464.00
2	Personal Administrativo	%		52.00%		8,150.00	4,238.00
3	Personal Tecnico	Und		52.00%		26,750.00	13,910.00
SUB TOTAL S/							79,612.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
E	ALIMENTACION						
1	Alimentacion y viaticos	Und		7.00	6.00	500.00	21,000.00
SUB TOTAL S/							21,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
F	OFICINA						
	Alquiler de Oficina	Und	100%	1.00	6.00	1,800.00	10,800.00
SUB TOTAL S/							10,800.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
G	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Camioneta en Obra para Personal	Und	100%	1.00	6.00	10,000.00	60,000.00
2	Combustible para camioneta	Gln	100%	50.00	6.00	50.00	15,000.00
SUB TOTAL S/							75,000.00

CONSULTOR DE OBRAS

 Ing. Geison Madaleno Delgado Vasquez
 C. 9699

142

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
H	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	Computadoras e impresoras	Und	100%	7.00		2,200.00	15,400.00
2	Mobiliario	Und	100%	7.00		750.00	5,250.00
3	Materiales de oficina	Glb	100%	1.00	6.00	420.00	2,520.00
4	Copias en general	Glb	100%	1.00	6.00	400.00	2,400.00
5	Telefono, Internet y otras comunicaciones	Glb	100%	1.00	6.00	130.00	780.00
6	Roturas de testigos de concreto	Glb	100%	1.00		2,100.00	2,100.00
7	Proctor, densidad de campo; y CBR	Glb	100%	1.00		7,000.00	7,000.00
8	Diseño de Mezcla y Estudio de Canteras	Glb	100%	1.00		2,000.00	2,000.00
SUB TOTAL S/							37,450.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco	Und	100%	7.00		48.00	336.00
2	Botas	Und	100%	7.00		65.00	455.00
3	Guantes	Und	100%	7.00		40.00	280.00
4	Zapatos de Seguridad	Und	100%	7.00		400.00	2,800.00
5	Indumentaria	Und	100%	7.00		350.00	2,450.00
6	Otros Implementos de Seguridad	Glb	100%	7.00		250.00	1,750.00
SUB TOTAL S/							8,071.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
J	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantia de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und		1.00		1,465.50	1,465.50
2	Garantia de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Und		1.00		725.60	725.60
3	Garantia de Beneficios Sociales de los trabajadores	Und		1.00		5,000.00	5,000.00
SUB TOTAL S/							7,191.10

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Geisen Rodríguez Delgado Vasquez
C 6538

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
K	SEGUROS						
1	Seguro de Accidentes Personales	Est.		4.00	6.00	600.00	14,400.00
SUB TOTAL S/							14,400.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
L	COSTOS DE OFICINA CENTRAL						
1	Participacion Oficina Central	%	1.5%			1,727,367.50	25,910.51
2	Asesoramiento tecnico, legal administrativo central	mes	20.0%	0.50	15.00	8,500.00	12,750.00
SUB TOTAL S/							38,660.51

3 RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
1	Gastos Fijos de Supervisión de Obra	Glb	1	16,500.00	16,500.00
2	Gastos Variables de Supervisión de Obra	Glb	1	443,684.61	443,684.61
	COSTO DIRECTO				460,184.61
	UTILIDADES (8%)				36,814.77
	SUB TOTAL				496,999.38
	I.G.V. (18%)				0.00
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION			S/	496,999.38

CONSULTOR DE OBRAS

 Ing. Gerson Bladimir Delgado Vasquez
 C. 8498

FERNANDO PEÑA CORAL
INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 39406
Registro Consultor CO-0965

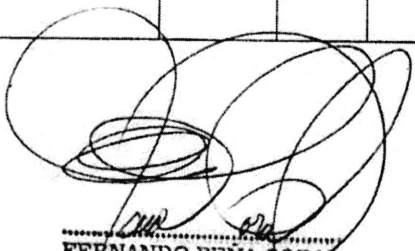
Jr. GONZALES VIGIL N° 269 - IQUITOS

TELEFAX 26-3075
CELULAR 965-671026

e-mail: delcoral@hotmail.com

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	GLB	1	S/ 13,700.00	S/ 13,700.00
GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	GLB	1	S/ 430,501.03	S/ 430,501.03
COSTO DIRECTO				S/ 444,201.03
UTILIDAD	8%			S/ 35,536.08
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION SIN IGV				S/ 479,737.12


FERNANDO PEÑA CORAL
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 39406
Reg. CONSULTOR CO-0965

FERNANDO PEÑA CORAL
INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 39406
Registro Consultor C0-0965

Jr. GONZALES VIGIL N° 269 - IQUITOS

TELEFAX 26-3075
CELULAR 965-671026

e-mail: delcoral@hotmail.com

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO (ENTRE AV. JHON F. KENNEDY Y JR. MARIANO GANOSA TREVITAZO) - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAVALI"

Plazo Ejecución: 210 DIAS CALENDARIOS

FECHA: AGOSTO DE 2023

I. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	PARCIAL
01.00	GASTOS DE LICITACION				S/ 4,300.00
01.01	ELABORACION DE PROPUESTA	GLB	1.00	2,000.00	S/ 2,000.00
1.02	GASTOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	600.00	S/ 600.00
1.03	GASTOS VARIOS (fotocopias, escaneados, anillados, pasajes, etc.)	GLB	1.00	1,000.00	S/ 1,000.00
1.04	GASTOS DE TRAMITES ANTE EL OSCE	GLB	1.00	700.00	S/ 700.00
02.00	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES				S/ 600.00
2.01	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS DURANTE LA EJECUCION	GLB	1.00	600.00	S/ 600.00
03.00	LIQUIDACION DE CONTRATO Y OBRA				S/ 8,800.00
3.01	SUPERVISION DE OBRA	mes	0.50	6,600.00	S/ 3,300.00
3.02	LIQUIDADOR DE CONTRATO DE SUPERVISION	mes	1.00	5,500.00	S/ 5,500.00
	SUB TOTAL				S/ 13,700.00

FERNANDO PEÑA CORAL
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 39406
Reg. CONSULTOR C0-0965

FERNANDO PEÑA CORAL

INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 39406
Registro Consultor CO-0965

Jr. GONZALES VIGIL N° 269 - IQUITOS

TELEFAX 26-3075
CELULAR 965-671026

e-mail: delcoral@hotmail.com

II. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEF. PART.	CANT.	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
01.00	PERSONAL DE SUPERVISION						
1.01	PERSONAL CLAVE						
1.01.01	SUPERVISOR DE OBRA	UND	100%	1.00	6.00	6,600.00	S/ 39,600.00
1.01.02	ESPECIALISTA DE CALIDAD	UND	100%	1.00	6.00	5,300.00	S/ 31,800.00
1.01.03	ESPECIALISTA AMBIENTAL	UND	50%	1.00	6.00	10,000.00	S/ 30,000.00
1.01.04	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	UND	100%	1.00	6.00	5,000.00	S/ 30,000.00
	SUB TOTAL						S/ 131,400.00
02.00	AREA ADMINISTRATIVA						
2.01	SECRETARIA	UND	100%	1.00	6.00	1,400.00	S/ 8,400.00
	SUB TOTAL						S/ 8,400.00
03.00	ASISTENCIA TECNICA						
3.01	CADISTA - OFICINA TECNICA	UND	100%	1.00	6.00	2,500.00	S/ 15,000.00
3.02	ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA - OFICINA TECNICA	UND	100%	1.00	6.00	2,400.00	S/ 14,400.00
	SUB TOTAL						S/ 29,400.00
04.00	LEYES SOCIALES						
4.01	PERSONAL PROFESIONAL	%		52%		116,750.00	S/ 60,710.00
4.02	PERSONAL ADMINISTRATIVO	%		52%		8,000.00	S/ 4,160.00
4.03	PERSONAL TECNICO	%		52%		25,860.56	S/ 13,447.49
	SUB TOTAL						S/ 78,317.49
05.00	ALIMENTACION						
5.01	ALIMENTACION Y VIATICOS	UND		7.00	6.00	450.00	S/ 18,900.00
	SUB TOTAL						S/ 18,900.00
06.00	OFICINA						
6.01	ALQUILER DE OFICINA	UND	100%	1.00	6.00	1,500.00	S/ 9,000.00
	SUB TOTAL						S/ 9,000.00
07.00	VEHICULOS Y EQUIPOS						
7.01	CAMIONETA EN OBRA PARA PERSONAL	UND	100%	1.00	6.00	8,000.00	S/ 48,000.00
7.02	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA	GLN	100%	50.00	6.00	25.00	S/ 7,500.00
	SUB TOTAL						S/ 55,500.00
08.00	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
8.01	COMPUTADORAS E IMPRESORAS	UND	100%	7.00		2,100.00	S/ 14,700.00
8.02	MOBILIARIO	UND	100%	7.00		800.00	S/ 5,600.00
8.03	MATERIALES DE OFICINA	GLB	100%	1.00	6.00	400.00	S/ 2,400.00
8.04	COPIAS EN GENERAL	GLB	100%	1.00	6.00	420.00	S/ 2,520.00
8.05	TELEFONO, INTERNET Y OTRAS COMUNICACIONES	GLB	100%	1.00	6.00	150.00	S/ 900.00
8.06	ROTURAS DE TESTIGOS DE CONCRETO	GLB	100%	1.00		2,200.00	S/ 2,200.00
8.07	PROCTOR, DENSIDAD DE CAMPO Y CBR	GLB	100%	1.00		6,000.00	S/ 6,000.00
8.08	DISEÑO DE MEZCLA Y ESTUDIO DE CANTERAS	GLB	100%	1.00		1,600.00	S/ 1,600.00
	SUB TOTAL						S/ 35,920.00

FERNANDO PEÑA CORAL
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 39406
Reg. CONSULTOR CO-0965

FERNANDO PEÑA CORAL

INGENIERO CIVIL


Reg. CIP N° 39406
Registro Consultor CO-0965

Jr. GONZALES VIGIL N° 269 - IQUITOS

TELEFAX 26-3075
CELULAR 965-671026

e-mail: delcoral@hotmail.com

09.00	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO							
9.01	CASCO	UND	100%	7.00		50.00	S/	350.00
9.02	BOTAS	UND	100%	7.00		70.00	S/	490.00
9.03	GUANTES	UND	100%	7.00		35.00	S/	245.00
9.04	ZAPATOS DE SEGURIDAD	UND	100%	7.00		380.00	S/	2,660.00
9.05	INDUMENTARIA	UND	100%	7.00		330.00	S/	2,310.00
9.06	OTROS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	GLB	100%	7.00		240.00	S/	1,680.00
	SUB TOTAL						S/	7,735.00
10.00	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC							
10.01	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (CARTA FIANZA MC)	UND		1.00		1,400.00	S/	1,400.00
10.02	GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (CARTA FIANZA MC)	UND		1.00		650.00	S/	650.00
10.03	GARANTIA DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES	UND		1.00		4,900.00	S/	4,900.00
	SUB TOTAL						S/	6,950.00
11.00	SEGUROS							
11.01	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	EST		4.00	6.00	450.00	S/	10,800.00
	SUB TOTAL						S/	10,800.00
12.00	COSTOS DE OFICINA CENTRAL							
12.01	PARTICIPACION OFICINA CENTRAL	%	1.5%			1,725,236.25	S/	25,878.54
12.02	ASESORAMIENTO TECNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO CENTRAL	MES	20%	0.50	15.00	8,200.00	S/	12,300.00
	SUB TOTAL						S/	38,178.54


FERNANDO PEÑA CORAL
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 39406
Reg. CONSULTOR CO-0965



CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 576746

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

OBRA	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO (ENTRE AV. JHON F. KENNEDY Y JR. MARIANO GANOSA TREVITAZO) - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI"				
Fecha de Precio	AGOSTO 2023				
Plazo de Ejecucion	180 Dias Calendario				
1	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitacion				2,660.00
1.01.01.	Elaboracion de Propuesta	Glb	1.00	1,100.00	1,100.00
1.01.02.	Gastos de Legalizacion de Documentos	Glb	1.00	520.00	520.00
1.01.03.	Gastos Varios (Fotocopias, escaneados, anillados, passajes, etc.)	Glb	1.00	520.00	520.00
1.01.04.	Gastos de Tramites ante el OSCE	Glb	1.00	520.00	520.00
1.02	Gastos Legales y Notariales				520.00
1.02.01.	Legalizacion de Documentos Durante la Ejecucion	Glb	1.00	520.00	520.00
1.03	Liquidacion de Contrato y Obra				8,450.00
1.03.01.	Supervisor de Obra	mes	0.5	6,600.00	3,300.00
1.03.02.	Liquidador de Contrato de Supervision	mes	1	5,150.00	5,150.00
SUBTOTAL S/.					11,630.00

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 - REG. OSCE, C-1781

Ing. Ivan Cruz Cabudivo
APODERADO



CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 576746

2	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION						
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	Supervisor de Obra	Und	100%	1.00	6.00	6,600.00	39,600.00
1.02	Especialista de Calidad	Und	100%	1.00	6.00	5,270.00	31,620.00
1.03	Especialista Ambiental	Und	50%	1.00	6.00	4,606.00	13,818.00
1.04	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Und	100%	1.00	6.00	4,606.00	27,636.00
SUB TOTAL S/.							112,674.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Secretaria	Und	100%	1.00	6.00	1,250.00	7,500.00
SUB TOTAL S/							7,500.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
C	ASISTENCIA TECNICA						
1	Cadista 1 - Oficina Tecnica	Und	100%	1.00	6.00	1,990.60	11,943.60
2	Asistente de Supervisor de Obra - Oficina Tecnica	Und	100%	1.00	6.00	2,307.80	13,846.80
SUB TOTAL S/							25,790.40
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
D	LEYES SOCIALES						
1	Personal Profesional	%		52.00%		115,810.30	60,221.36
2	Personal Administrativo	%		52.00%		7,990.60	4,155.11
3	Personal Tecnico	Und		52.00%		25,688.90	13,358.23
SUB TOTAL S/							77,734.70
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
E	ALIMENTACION						
1	Alimentacion y viaticos	Und		7.00	6.00	310.00	13,020.00
SUB TOTAL S/							13,020.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
F	OFICINA						
1	Alquiler de Oficina	Und	100%	1.00	6.00	1,100.00	6,600.00
SUB TOTAL S/							6,600.00

Ing. Ivan Cruz Cabudivo
APODERADO

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 - REG. OSCE: C-1781



CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 576746

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
G	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Camioneta en Obra para Personal	Und	100%	1.00	6.00	6,100.00	36,600.00
2	Combustible para camioneta	Gln	100%	50.00	6.00	18.00	5,400.00
SUB TOTAL S/							42,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
H	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	Computadoras e impresoras	Und	100%	7.00		2,050.00	14,350.00
2	Mobiliario	Und	100%	7.00		550.00	3,850.00
3	Materiales de oficina	Glb	100%	1.00	6.00	410.00	2,460.00
4	Copias en general	Glb	100%	1.00	6.00	350.00	2,100.00
5	Telefono, Internet y otras comunicaciones	Glb	100%	1.00	6.00	180.00	1,080.00
6	Roturas de testigos de concreto	Glb	100%	1.00		2,150.00	2,150.00
7	Proctor, densidad de campo: y CBR	Glb	100%	1.00		5,500.00	5,500.00
8	Diseño de Mezcla y Estudio de Canteras	Glb	100%	1.00		1,600.00	1,600.00
SUB TOTAL S/							33,090.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
I	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco	Und	100%	7.00		46.00	322.00
2	Botas	Und	100%	7.00		63.00	441.00
3	Guantes	Und	100%	7.00		33.00	231.00
4	Zapatos de Seguridad	Und	100%	7.00		355.00	2,485.00
5	Indumentaria	Und	100%	7.00		303.00	2,121.00
6	Otros Implementos de Seguridad	Glb	100%	7.00		220.00	1,540.00
SUB TOTAL S/							7,140.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
J	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantia de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und		1.00		1,396.20	1,396.20
2	Garantia de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Und		1.00		625.76	625.76
3	Garantia de Beneficios Sociales de los trabajadores	Und		1.00		4,950.80	4,950.80
SUB TOTAL S/							6,972.76
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
K	SEGUROS						
1	Seguro de Accidentes Personales	Est.		4.00	6.00	420.00	10,080.00
SUB TOTAL S/							10,080.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
L	COSTOS DE OFICINA CENTRAL						
1	Participacion Oficina Central	%	1.5%			1,724,306.62	25,864.60
2	Asesoramiento tecnico, legal administrativo central	mes	20.0%	0.50	15.00	8,200.00	12,300.00
SUB TOTAL S/							38,164.60

Ing. Ivan Cruz Cabudivo
APODERADO



CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 576746

3	RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
1	Gastos Fijos de Supervision de Obra	Glb	1	11,630.00	11,630.00
2	Gastos Variables de Supervision de Obra	Glb	1	380,766.46	380,766.46
	COSTO DIRECTO				392,396.46
	UTILIDADES (8%)				31,391.72
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION SIN INCLUIR IGV				423,788.17

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 - REG. OSCE C-1781

Ing. Ivan Cruz Cabudivo
APODERADO

OBRA :

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. SANTIAGO ANTUNES DE MAYOLO (ENTRE AV. JHONN F. KENNEDY Y JR. MARIANO GANOSA TREVITASO), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-REGION UCAYALI"

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS: MAYO DEL 2023

PLAZO DE JECUCION: 180 DIAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO:**1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitacion				2,500.00
	1.01.01. Elaboracion de Propuesta	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
	1.01.02. Gastos de Legalizacion de Documentos	Glb	1.00	500.00	500.00
	1.01.03. Gastos Varios (Fotocopias, escaneados, anillados, pasajes, etc.)	Glb	1.00	500.00	500.00
	1.01.04. Gastos de Tramites ante el OSCE	Glb	1.00	500.00	500.00
1.02	Gastos Legales y Notariales				500.00
	1.02.01. Legalizacion de Documentos Durante la Ejecucion	Glb	1.00	500.00	500.00
1.03	Liquidacion de Contrato y Obra				8,289.47
	1.03.01. Supervision de obra (Ingeniero Sanitario o Ingenie	mes	0.50	6,578.95	3,289.47
	1.03.02. Liquidador de Contrato de Supervision	mes	1.00	5,000.00	5,000.00

11,289.47**SUB TOTAL SI.**



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS



2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION						
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	Supervisor de Obra (Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	6.00	6,578.95	39,473.68
1.02	Especialista de Calidad (Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	6.00	5,263.16	31,578.95
1.03	Especialista Ambiental (Ing. Civil o Ing. Ambiental o Ing. De Gestion Ambiental o Ing. Ambiental y de Rec. Amb., o Ing. De Rec. Nat Y Energia Renovable, o Ing. Ambiental y de Recursos Naturales)	Und	50%	1.00	6.00	4,605.26	13,815.79
1.04	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Ing. Civil o Ing. De Higiene y Seguridad Industrial o Ing. De Seguridad y Salud en el Trabajo)	Und	100%	1.00	6.00	4,605.26	27,631.58
SUB TOTAL S/.						21,052.63	112,500.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Secretaria	Und	100%	1.00	6.00	1,315.79	7,894.74
SUB TOTAL S/.							7,894.74

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
C	ASISTENCIA TECNICA						
1	Cadista 1 - Oficina Técnica	Und	100%	1.00	6.00	1,973.68	11,842.11
2	Asistente de Supervisor de obra - Oficina Técnica	Und	100%	1.00	6.00	2,302.63	13,815.79
SUB TOTAL S/.							25,657.89

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
E	LEYES SOCIALES						
1	Personal Profesional	%		52.00%		115,789.47	60,210.53
2	Personal Administrativo	%		52.00%		7,894.74	4,105.26
3	Personal Técnico	%		52.00%		25,657.89	13,342.11
SUB TOTAL S/.							77,657.89

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
F	ALIMENTACION						
1	Alimentacion y Viaticos	Und		7.00	6.00	300.00	12,600.00
SUB TOTAL S/.							12,600.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
G	OFICINA						
1	Alquiler de Oficina	Und	100%	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00
SUB TOTAL S/.							6,000.00



JHON MIGUEL MELGAR MALPARTIDA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 230279



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
H	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Camioneta en Obra Para Personal	Und	100%	1.00	6.00	6,000.00	36,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln	100%	50.00	6.00	14.00	4,200.00
SUB TOTAL S/.							40,200.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
I	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	Computadoras e impresoras	Und	100%	7.00		2,000.00	14,000.00
2	Mobiliario	Und	100%	7.00		500.00	3,500.00
3	Materiales de Oficina	Glb	100%	1.00	6.00	350.00	2,100.00
4	Copias en General	Glb	100%	1.00	6.00	300.00	1,800.00
5	Telefono, Internet y Otras Comunicaciones	Glb	100%	1.00	6.00	100.00	600.00
6	Roturas de testigos de concreto	Glb	100%	1.00		2,000.00	2,000.00
7	Proctor, densidad de campo; y CBR	Glb	100%	1.00		5,000.00	5,000.00
8	Diseño de Mezcla y Estudio de canteras	Glb	100%	1.00		1,500.00	1,500.00
SUB TOTAL S/.							30,500.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
J	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco	Und	100%	7.00		45.00	315.00
2	Botas	Und	100%	7.00		60.00	420.00
3	Guantes	Und	100%	7.00		30.00	210.00
4	Zapatos de Seguridad	Und	100%	7.00		350.00	2,450.00
5	Indumentaria	Und	100%	7.00		300.00	2,100.00
6	Otros Implementos de Seguridad	Glb	100%	7.00		200.00	1,400.00
SUB TOTAL S/.							6,895.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
K	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und		1.00		1,388.14	1,388.14
2	Garantía de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Und		1.00		624.66	624.66
3	Garantía de Beneficios Sociales de los Trabajadores	Und		1.00		4,921.63	4,921.63
SUB TOTAL S/.							6,934.44

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
L	SEGUROS						
1	Seguro de Accidentes Personales	Est		4.00	6.00	400.00	9,600.00
SUB TOTAL S/.							9,600.00





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
M	COSTOS DE OFICINA CENTRAL						
1	Participacion Oficina Central	%	1.5%			1,724,297.61	25,864.46
2	Asesoramiento Técnico, Legal y Administrativo Central	mes	20%	0.50	15.00	8,000.00	12,000.00
SUB TOTAL S/.							37,864.46

3. RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	Glb	1.00	11,289.47	11,289.47
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	Glb	1.00	374,304.43	374,304.43
COSTO DIRECTO					385,593.90
UTILIDADES (8.00%)					30,847.51
SUB TOTAL					416,441.41
I.G.V. (18.00%)					74,959.45
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION				S/.	491,400.86


JOHN MICHAEL MELGAR MALPARTIDA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 230279



CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCAL 2023

TRAMITE SISGEDO DE CUADRO COMPARATIVO Nº	18	REGISTRO Nº	1405389	EXPEDIENTE Nº	887892
AREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			FECHA	23/08/2023
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	CONCURSO PUBLICO				
DENOMINACIÓN:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO (ENTRE AV. JHON F. KENNEDY Y JR. MARIANO G. TREVITAZO, CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI" - CUI Nº 2378342				
PLAZO:	180 DIAS CALENDARIOS				
CODIGO UNICO DE INVERSIONES CUI Nº	2378342				

DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS										FUENTE N° 2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD			VALOR REFERENCIAL		
	DELGADO VASQUEZ GEICEN BLADISLAV		SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.		FERNANDO PERA RORAL								VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV		
	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:								
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO (ENTRE AV. JHON F. KENNEDY Y JR. MARIANO G. TREVITAZO, CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI" - CUI Nº 2378342	10011010534	Geicén B. Delgado Vasquez	20393504081	Richard Angelo Lopez	10053721350	Fernando Pera Roral										
	958030383	958030383	961998477	961998477	965671026	965671026										
	escc2378342@gmail.com	escc2378342@gmail.com	ralsagt_srl@hotmail.com	ralsagt_srl@hotmail.com	delgado@hmail.com	delgado@hmail.com										
	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL			PRECIO TOTAL						
	496,999.38		423,788.17		479,737.12		416,441.41			416,441.41				491,400.86		
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	210 días calendarios	210 días calendarios	210 días calendarios	210 días calendarios	210 días calendarios	210 días calendarios									
	SOBRE EL IGV	SIN IGV	NO INCLUYE IGV	NO INCLUYE IGV	NO INCLUYE IGV	NO INCLUYE IGV	NO INCLUYE IGV									
	FECHA DE SOLICITUD	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023									
	FECHA DE RECEPCIÓN	21/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	21/05/2023	21/05/2023									
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	SI	SI	SI	SI									
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)									
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI	SI	SI	SI	SI										

JUSTIFICACION Y VALIDACION:	 LUC ADAM TELLO DIRECTOR DE CONTRATACIONES				
-----------------------------	--	--	--	--	--

172
