

LICITACION PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.

Acta de Admisión y Evaluación de Ofertas

En Lima el día martes 28 de noviembre del 2023 a las 14:00 horas, se reunieron los miembros integrantes del comité de selección que se detalla a continuación:

- RENAN CANSAYA HERRERA Titular presidente
- LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA Titular Miembro 1
- GUSTAVO EDINSON CRISTOBAL ALVAREZ Titular Miembro 2

El presidente del Comité de Selección verifica el quorum respectivo, da por iniciada la sesión y expone a los miembros presentes que la reunión tiene por finalidad la apertura electrónica de las ofertas y de la revisión de la documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas.

El presente acto se desarrolló de la siguiente manera:

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

De conformidad con el Artículo Artículo 55º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto al "Registro de participantes" se precisa que en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE, se registraron los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
1	10257778113	ESPINOZA MELENDEZ FREDDY	08/11/2023	Válido	08/11/2023
2	10404896445	ANTON MATTIA JIMMY ANGELO	24/11/2023	Válido	24/11/2023
3	20103349932	LUIS IBAÑEZ CUADRA S.A.	22/10/2023	Válido	22/10/2023
4	20126533447	CONSTRUCTORA QR S.A.	25/11/2023	Válido	25/11/2023
5	20215342345	CONST.MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL	25/10/2023	Válido	25/10/2023
6	20215462910	NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L	23/11/2023	Válido	23/11/2023
7	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	20/10/2023	Válido	20/10/2023

LICITACION PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
8	20268887785	CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	25/10/2023	Válido	25/10/2023
9	20296884783	MULTISERVICIOS VICA S.A.	23/11/2023	Válido	23/11/2023
10	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	20/10/2023	Válido	20/10/2023
11	20383676411	K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.	03/11/2023	Válido	03/11/2023
12	20393252848	JUNGLE'S KING EIRL	21/10/2023	Válido	21/10/2023
13	20399019355	MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL	23/10/2023	Válido	23/10/2023
14	20416167509	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A - CCODEINGESA	27/10/2023	Válido	27/10/2023
15	20433901712	P & V CONSTRUCCIONES S.A.C.	03/11/2023	Válido	03/11/2023
16	20440439129	CORPORACION V & V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	26/11/2023	Válido	26/11/2023
17	20442737640	TRACTO BRAS E.I.R.L.	22/10/2023	Válido	22/10/2023
18	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	27/10/2023	Válido	27/10/2023
19	20445575411	OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	21/11/2023	Válido	21/11/2023
20	20450324184	CONSTRUCTORA PEREZ & PEREZ SAC	24/11/2023	Válido	24/11/2023
21	20452457726	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	26/10/2023	Válido	26/10/2023
22	20452562864	CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.	26/10/2023	Válido	26/10/2023
23	20461112227	GRUPO EMPRESARIAL DE LOGISTICA INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GELI S.A.C.	23/11/2023	Válido	23/11/2023
24	20471553639	OMZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	26/11/2023	Válido	26/11/2023
25	20479780847	C&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	26/11/2023	Válido	26/11/2023

LICITACION PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
26	20480403496	BETA KONCRET SAC.	06/11/2023	Válido	06/11/2023
27	20489536979	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	25/10/2023	Válido	25/10/2023
28	20494183294	CONSTRUCTORA LCD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	02/11/2023	Válido	02/11/2023
29	20494535409	EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA S.A.C.	20/10/2023	Válido	20/10/2023
30	20494686369	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	23/10/2023	Válido	23/10/2023
31	20503578485	CORPORACION ORDOÑEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	24/11/2023	Válido	24/11/2023
32	20504553516	CONSTRUCTORA JHEMSA INGENIEROS S.A.C.	04/11/2023	Válido	04/11/2023
33	20504718027	CONSTRUCTORA ALTOMAYO S.A.C.	24/11/2023	Válido	24/11/2023
34	20505566468	CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.C.	20/10/2023	Válido	20/10/2023
35	20505789092	DITRANSERVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/10/2023	Válido	24/10/2023
36	20506003351	MEJESA S.R.L.	24/10/2023	Válido	24/10/2023
37	20508274701	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	02/11/2023	Válido	02/11/2023
38	20508326433	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	26/10/2023	Válido	26/10/2023
39	20510591829	SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C.	29/10/2023	Válido	29/10/2023
40	20510874022	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	09/11/2023	Válido	09/11/2023
41	20511570957	ADOBE CONSTRUCCION SAC	25/11/2023	Válido	25/11/2023
42	20511631760	CONCRETETA S.A.C.	06/11/2023	Válido	06/11/2023
43	20512158189	CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERU SAC	26/11/2023	Válido	26/11/2023

LICITACION PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
44	20512419837	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	27/10/2023	Válido	27/10/2023
45	20513051833	3G CONSTRUCTORA S.A.C.	07/11/2023	Válido	07/11/2023
46	20515294725	CONSTRUCTORA CAMARGO VERGARA S.R.L.	20/11/2023	Válido	20/11/2023
47	20515300121	PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC	20/10/2023	Válido	20/10/2023
48	20517520587	ZVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	13/11/2023	Válido	13/11/2023
49	20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/10/2023	Válido	20/10/2023
50	20518861604	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	03/11/2023	Válido	03/11/2023
51	20521403587	CORPORACION SERCON S.A.C.	22/10/2023	Válido	22/10/2023
52	20522045421	COMPAÑIA GRA CONSTRUCCIONES S.A.C.	04/11/2023	Válido	04/11/2023
53	20523071042	CONSTRUCTORA COPAO S.A.C.	06/11/2023	Válido	06/11/2023
54	20524892881	INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.	04/11/2023	Válido	04/11/2023
55	20527814261	ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- ORION SAC	18/11/2023	Válido	18/11/2023
56	20528003401	LOS DELFINES CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	26/10/2023	Válido	26/10/2023
57	20531659075	CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU S.A.C.	21/11/2023	Válido	21/11/2023
58	20532002819	INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI S.A.C.	21/11/2023	Válido	21/11/2023
59	20534991399	MUNARES & ASOCIADOS S.R.L.	24/11/2023	Válido	24/11/2023
60	20535152587	LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.	24/11/2023	Válido	24/11/2023
61	20536351303	TOPASA INGENIEROS E.I.R.L.	17/11/2023	Válido	17/11/2023

LICITACION PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
62	20536704231	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES JD & HN E.I.R.L.	25/10/2023	Válido	25/10/2023
63	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	20/10/2023	Válido	20/10/2023
64	20544848012	ELILOSA CONSTRUCTORA S.A.C.	26/11/2023	Válido	26/11/2023
65	20547097069	M & S PROYECTS S.A.C.	24/10/2023	Válido	24/10/2023
66	20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	20/10/2023	Válido	20/10/2023
67	20549521551	CONSTRUCTORA CB & J CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	31/10/2023	Válido	31/10/2023
68	20600172744	INVERSIONES CNC2 ARQ DESING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	22/10/2023	Válido	22/10/2023
69	20600221303	CORPORACION GIMAHU E.I.R.L.	23/10/2023	Válido	23/10/2023
70	20600471148	AG METALICA Y CONSTRUCCION S.A.C.	26/10/2023	Válido	26/10/2023
71	20600689020	ADESERG PERU S.A.C. - ADESERG S.A.C.	21/11/2023	Válido	21/11/2023
72	20600979192	EMPRESA ZRR & ASOCIADOS S.R.L.	21/11/2023	Válido	21/11/2023
73	20601777968	GOFASA INGENIERIA ELECTROMECHANICA S.A.C. - GOFASA S.A.C.	25/11/2023	Válido	25/11/2023
74	20602052282	INVERTIR CONSTRUCTORES S.A.C.	03/11/2023	Válido	03/11/2023
75	20602145167	SVT CONSTRUCTORES E.I.R.L.	29/10/2023	Válido	29/10/2023
76	20602205275	ALKAR CONTRATISTAS E.I.R.L.	08/11/2023	Válido	08/11/2023
77	20602267491	INGECOL SUCURSAL DE PERU	30/10/2023	Válido	30/10/2023
78	20602633412	CORPORACION VALLE DEL NORTE S.R.L.	15/11/2023	Válido	15/11/2023
79	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/10/2023	Válido	27/10/2023

LICITACION PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
80	20603550677	VCP CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.	31/10/2023	Válido	31/10/2023
81	20605324151	CORPORACION DAGOBA S.A.C. - CORP.DAGOBA S.A.C.	20/10/2023	Válido	20/10/2023
82	20605438424	INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L	13/11/2023	Válido	13/11/2023
83	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	23/10/2023	Válido	23/10/2023
84	20611143428	DAFARGA S.A.C.	29/10/2023	Válido	29/10/2023
85	20611610379	MAJERTOP OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	12/11/2023	Válido	12/11/2023

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

En fecha 27 de noviembre de 2023, se programó la etapa de presentación de ofertas a través del SEACE, habiéndose presentado las ofertas de los siguientes postores, de conformidad con el Artículo 73º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
 Nomenclatura : LP-SM-2-2023-MML-GRML-1
 Nro. de convocatoria : 1
 Objeto de contratación : Obra
 Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA, CUI N° 2340830

Nro. ítem	Descripción del ítem	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código					
1	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA, CUI N° 2340830				
20399019355	MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL		27/11/2023	10:26:38	Electronico
10257778113	ESPINOZA MELENDEZ FREDDY		27/11/2023	15:03:12	Electronico
20506003351	MEJESA S.R.L.		27/11/2023	16:00:30	Electronico
20494680369	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		27/11/2023	18:28:29	Electronico
20534991399	CONSORCIO DEL DIVINO NINO		27/11/2023	19:08:57	Electronico
20450324184	CONSTRUCTORA PEREZ & PEREZ SAC		27/11/2023	19:36:58	Electronico
20416167509	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A.		27/11/2023	19:53:51	Electronico
20452562864	CONSTRUCTORA J.O. S.R.L.		27/11/2023	20:19:49	Electronico
20215462910	CONSORCIO ZARUMILLA		27/11/2023	20:30:06	Electronico
20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL		27/11/2023	20:51:34	Electronico
20452457726	CONSORCIO CAQUETA		27/11/2023	20:56:24	Electronico
20605714197	CONSORCIO SMAOC		27/11/2023	21:01:59	Electronico
20602267491	INGECOL SUCURSAL DE PERU		27/11/2023	21:36:07	Electronico
20268887785	CONSORCIO CVJ ASOCIADOS		27/11/2023	21:58:41	Electronico
20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.		27/11/2023	22:28:41	Electronico
20494535409	CONSORCIO SAN MARTIN		27/11/2023	22:37:29	Electronico
20600689020	ADESERG PERU S.A.C. - ADESERG S.A.C.		27/11/2023	22:37:40	Electronico
20215342345	CONSORCIO SAN MATEO		27/11/2023	22:40:17	Electronico
20536351303	CONSORCIO SAN MARTIN		27/11/2023	22:54:04	Electronico
20512419837	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.		27/11/2023	23:01:24	Electronico
20505789092	DITRANSERVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		27/11/2023	23:08:39	Electronico
20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L		27/11/2023	23:11:08	Electronico
20480403496	BETA KONCRET SAC.		27/11/2023	23:22:40	Electronico
20517623394	CONSORCIO ESPERANZA		27/11/2023	23:54:55	Electronico

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.

III. ADMISIÓN DE OFERTAS

Acto seguido el comité de selección procedió a la apertura electrónica de las ofertas a fin de verificar el cumplimiento de la presentación de la documentación obligatoria para la admisión de las ofertas, señaladas en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, de conformidad con el numeral 81.2 del Artículo 81º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Luego de la revisión de las Veinticuatro (24) ofertas presentadas se identifica las siguientes observaciones:

a) CONSORCIO ZARUMILLA

De la revisión del anexo N° 05 se desprende que no se encuentra legalizado. Por lo que, se solicitará su subsanación.

b) CONSTRUCTORA PEREZ & PEREZ S.A.C.

De la revisión del anexo N° 01 se desprende que no se encuentra de acuerdo al formato de las bases integradas. Por lo que, se solicitará su subsanación.

c) ESPINOZA MELENDEZ FREDDY

De la revisión de los documentos que acreditan la representación de quien suscribe la oferta no se encuentra legible. Por lo que, se solicita la subsanación.

d) CONSORCIO DEL DIVINO NIÑO

De la revisión del anexo N° 05 se desprende que no se encuentra legalizado. A su vez, los documentos que acreditan la representación de quien suscribe la oferta no se encuentra legible. Por lo que, se solicitará su subsanación.

e) CONSORCIO CAQUETA

De la revisión del anexo N° 05 se desprende que no se encuentra legalizado. Por lo que, se solicitará su subsanación.

LICITACION PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.


En tal sentido por decisión unánime se acuerda proceder al pedido de subsanación de los siguientes postores:

- **CONSORCIO ZARUMILLA:** Subsanación del Anexo 5
- **CONSTRUCTORA PEREZ & PEREZ S.A.C.:** Subsanación del Anexo 1
- **ESPINOZA MELENDEZ FREDDY:** Subsanación de los documentos que acreditan la representación de quien suscribe la oferta.
- **CONSORCIO DEL DIVINO NIÑO:** Subsanación del Anexo 5 y los documentos que acreditan la representación de quien suscribe la oferta.
- **CONSORCIO CAQUETA:** Subsanación del Anexo 5


Siendo las 18:40 horas del martes 28 de noviembre del 2023 y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección dan por culminada la presente sesión, debiéndose cursar las cartas de subsanación a través del SEACE y continuar con la admisión; y por unanimidad, suscriben el documento.



RENAN CANSAYA HERRERA
Presidente Titular



LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA
Titular Miembro 1

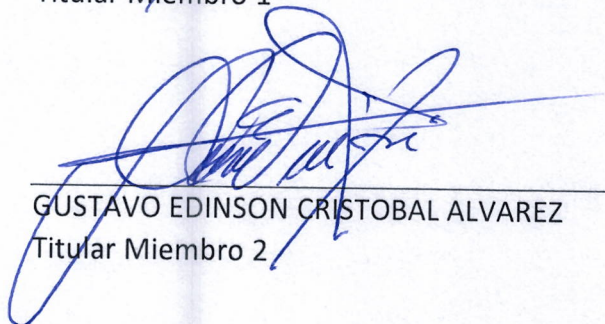

GUSTAVO EDINSON CRISTOBAL ALVAREZ
Titular Miembro 2

LICITACION PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.

Acta de Admisión y Evaluación de Ofertas

En Lima el día jueves 30 de noviembre del 2023 a las 12:05 horas, se reunieron los miembros integrantes del comité de selección que se detalla a continuación:

- RENAN CANSAYA HERRERA Titular presidente
- LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA Titular Miembro 1
- GUSTAVO EDINSON CRISTOBAL ALVAREZ Titular Miembro 2

El presidente del Comité de Selección verifica el quorum respectivo, da por iniciada la sesión continuada y expone a los miembros presentes que la reunión tiene por finalidad la revisión de la documentación de presentación obligatoria de los postores y la subsanación requerida para la admisión de las ofertas.

Se procedió a informar sobre la subsanación de ofertas que realizaron los postores, teniendo los siguientes resultados:

- **CONSORCIO ZARUMILLA:** Subsanó su oferta.

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura	LP-SM-2-2023-MML-GRML-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA, CUI N° 2340830
Número de Contratación	GRML-2023-202

Datos del postor	
RUC / Código	20219482910
Consorcio	SI
Nombre o razón social	CONSORCIO ZARUMILLA

Solicitud de Subsanación	
Acta de Observación	4787726 KB
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	28/11/2023
Observación	LEGALIZACION DE ANEXO 05
Usuario quien publicó	41935863
Fecha y hora publicación	28/11/2023 19:39:43 PM

Presentación de Subsanación	
Fecha Presentación	29/11/2023
Usuario quien subanó	20235482910
Fecha y Hora Subsanación	29/11/2023 10:29:51 AM

Detalle de archivos de subsanación de oferta				
Nº	Nombre del archivo	Tipo de Archivo	Tamaño de Archivo	Presentación
1	(PROPUESTA TECNICA_CONSORCIO ZARUMILLA_Parte1.pdf KB)	pdf	261263284	SI
2	(PROPUESTA TECNICA_CONSORCIO ZARUMILLA_Parte2.pdf KB)	pdf	238674252	SI

Resumen	
Nº	Descripción del Licitación
1	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA, CUI N° 2340830

1 registro ingresado, mostrados 1 registros de 1 a 1. Página 1 / 1

- **CONSTRUCTORA PEREZ & PEREZ S.A.C.:** Subsano su oferta.

LICITACION PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Monedatario	LP-SM-2-2023-MML-GRML-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obras
Descripción del objeto	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA, CUI N° 2340830
Número de Contratación	GRML-2023-262

Datos del postor	
Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	20450324184
Consorcio	No
Nombre o razón social	CONSTRUCTORA PEREZ S. PEREZ SAC

Solicitud de Subsanación	
Acta de Observación	1 (513386 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	28/11/2023
Observación	ANEXO 01 NO CONCUERDA CON LAS BASES INTEGRADAS
Usuario quien publicó	41035863
Fecha y hora publicación	28/11/2023 19:43:48 PM

Presentación de Subsanación	
Fecha Presentación	28/11/2023
Usuario quien subanó	20450324184
Fecha y hora Subsanación	28/11/2023 22:00:43 PM

Detalle de archivos de subsanación de oferta				
Nro.	Nombre del archivo	Tipo de Archivo	Tamaño de Archivo	Documento
1	(CARTA GERENCIA 0452023SUBSANACION PROCEO GRML DE NML.pdf KB)	pdf	937189	

Presupuesto del ítem	
1	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA, CUI N° 2340830

1 registro encontrado, mostrando 1 registro, de 1 a 1. Página 1 / 1

- **ESPINOZA MELENDEZ FREDDY: Subsanó su oferta.**

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Monedatario	LP-SM-2-2023-MML-GRML-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obras
Descripción del objeto	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA, CUI N° 2340830
Número de Contratación	GRML-2023-262

Datos del postor	
Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	1025778113
Consorcio	No
Nombre o razón social	SEPINOZA MELENDEZ FREDDY

Solicitud de Subsanación	
Acta de Observación	1 (409527 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	28/11/2023
Observación	LEGIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITA LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA
Usuario quien publicó	41035863
Fecha y hora publicación	28/11/2023 19:30:43 PM

Presentación de Subsanación	
Fecha Presentación	29/11/2023
Usuario quien subanó	1025778113
Fecha y hora Subsanación	29/11/2023 11:15:10 AM

Detalle de archivos de subsanación de oferta				
Nro.	Nombre del archivo	Tipo de Archivo	Tamaño de Archivo	Documento
1	(CARTA DE SUBSANACION LP 02.pdf KB)	pdf	247863	
2	(DOCUMENTO DE SUBSANACION.pdf KB)	pdf	6737203	

Presupuesto del ítem	
1	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA, CUI N° 2340830

1 registro encontrado, mostrando 1 registro, de 1 a 1. Página 1 / 1

- **CONSORCIO DEL DIVINO NIÑO: Subsano su oferta.**

LICITACION PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura	LP-SM-2-2023-MML-GRML-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obras
Descripción del objeto	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA, CUI N° 2340830
Número de Contratación	GRML-2023-262

Datos del postor	
RUC / Código	20324991295
Consejo	SI
Nombre o razón social	CONSORCIO DEL DIVINO NIÑO
Solicitud de Subsanación	
Acta de Observación	1 (520067 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	28/11/2023
Observación	LEGIBILIDAD DE DOCUMENTO DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA Y LEGALIZACION DE ANEXO 05
Usuario quien publicó	41935863
Fecha y hora publicación	28/11/2023 19:42:13 PH

Presentación de Subsanación	
Fecha Presentación	29/11/2023
Usuario quien subanó	20324991295
Fecha y hora Subsanación	29/11/2023 16:30:05 PH

Detalle de archivos de subsanación de oferta				
Nro.	Nombre del archivo	Tipo de Archivo	Tamaño del Archivo	Documento
1	(SUBSANACION LP0022023.pdf KB)	pdf	6472830	

Historial de Subsanación	
Nro. Postor	1
EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA, CUI N° 2340830	
1 registro encontrado, mostrando 1 registro(s) de 1 a 1. Página 1 / 1.	

- **CONSORCIO CAQUETA:** Subsanó su oferta.

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura	LP-SM-2-2023-MML-GRML-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obras
Descripción del objeto	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA, CUI N° 2340830
Número de Contratación	GRML-2023-262

Datos del postor	
RUC / Código	20452457726
Consejo	SI
Nombre o razón social	CONSORCIO CAQUETA
Solicitud de Subsanación	
Acta de Observación	1 (505165 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	28/11/2023
Observación	LEGALIZACION DE ANEXO 05
Usuario quien publicó	41935863
Fecha y hora publicación	28/11/2023 19:45:24 PH

Presentación de Subsanación	
Fecha Presentación	29/11/2023
Usuario quien subanó	20452457726
Fecha y hora Subsanación	29/11/2023 12:18:07 PH

Detalle de archivos de subsanación de oferta				
Nro.	Nombre del archivo	Tipo de Archivo	Tamaño del Archivo	Documento
1	(CARTA DE SUBSANACION.pdf KB)	pdf	975084	

Historial de Subsanación	
Nro. Postor	1
EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA, CUI N° 2340830	
1 registro encontrado, mostrando 1 registro(s) de 1 a 1. Página 1 / 1.	

Acto seguido, se continuó con la revisión de los documentos de admisión de las Veinticuatro (24) ofertas presentadas se identifica las siguientes observaciones:

LICITACION PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.

- a) **CONSORCIO ESPERANZA (JOMF CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. RUC 20445639321 & CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20517623394)**

Se advierte que el postor en su Anexo N° 06, ha incurrido en un error aritmético, la sumatoria de los costos directos el cual incide en el costo total. Habiendo realizado la corrección aritmética, se verifica que se encuentra por debajo del valor referencial, por lo que la oferta es rechazada.)

De lo descrito anteriormente, al no cumplir con lo estipulado con las bases, la oferta del postor CONSORCIO ESPERANZA se considera **NO ADMITIDO**.

- b) **EL HORIZONTE S.R.L. con RUC 20365809179**

Se advierte que el postor en su Anexo N° 06, ha incurrido en un error aritmético, la sumatoria de los costos directos el cual incide en el costo total. Habiendo realizado la corrección aritmética, se verifica que se encuentra por debajo del valor referencial, por lo que la oferta es rechazada.)

De lo descrito anteriormente, al no cumplir con lo estipulado con las bases, la oferta del postor EL HORIZONTE S.R.L. se considera **NO ADMITIDO**.

- c) **CONSORCIO SAN MARTIN (EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA S.A.C. RUC 20494535409 & K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A. RUC 20383676411)**

Se advierte que el postor presenta su anexo N° 06, lo firma el apoderado legal de la empresa EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS, NO como representante común del consorcio, no siendo esto subsanable.

Por lo que la oferta del postor CONSORCIO SAN MARTIN es **NO ADMITIDO**.

- d) **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con RUC 20494686369**

De lo revisado, se advierte que el postor ha incurrido en un error al no consignar en su oferta el ítem 06.02.01 "conformación y compactación de subrasante (con equipo)", y por consiguiente tampoco consigna monto en el ítem), afectando de esta manera los costos directos del cual incide el costo total de la oferta, por lo que, al realizar el cálculo, el monto es inferior al valor referencial, no siendo este error subsanable.

LICITACION PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.

Por lo que la oferta del postor CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA es **NO ADMITIDO**.

e) CONSORCIO CVJ ASOCIADOS (CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. RUC 20268887785 & VCP CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. RUC 20603550677)

Se advierte que el postor en su anexo N° 06, ha incurrido en error al registrar las partidas correspondientes al anexo n° 06, tales como el ítem 05.02.04 dice "suministro y colocación de acero para doweels h=12.5cm, l=50cm incluye canastilla", debe decir "suministro y colocación de acero para doweels h=12.5cm, l=70cm incluye canastilla", siendo el mismo caso para el ítem 06.02.04, a su vez, vuelve a incurrir en error con el ítem 05.01.02, el cual dice "relleno compactado con material de préstamo", y debe decir "relleno compactado con material de préstamo c/equipo en pistas".

Por lo que la oferta del postor CONSORCIO CVJ ASOCIADOS (CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. RUC 20268887785 & VCP CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. RUC 20603550677) es **NO ADMITIDO**.

f) INGECOL SUCURSAL DE PERU con RUC 20602267491

Se advierte que el postor en su anexo N° 06, ha incurrido en error al registrar las partidas correspondientes al anexo N° 06, tales como el ítem 06.02.04, dice "suministro y colocación de acero para doweels h=12.5 cm, l=50cm incluye canastilla", debe decir "suministro y colocación de acero para doweels h=12.5cm, l=70cm incluye canastilla", a su vez, vuelve a incurrir en error con el ítem 05.01.02, el cual dice "relleno compactado con material de préstamo" debe decir "relleno compactado con material de préstamo c/equipo en pistas"

Por lo que la oferta del postor INGECOL SUCURSAL DE PERU es **NO ADMITIDO**.

g) BETA KONCRET S.A.C. con RUC 20480403496

Se advierte que el postor en su anexo N° 06, ha incurrido en error aritmético. luego de la corrección, se verifica que el valor referencial es de 10,847837.68 Soles.

h) ESPINOZA MELENDEZ FREDDY con RUC 10257778113

Se advierte que el postor en su anexo N° 06, ha incurrido en un error aritmético en la sumatoria de los costos directos el cual incide en el costo total, luego de la corrección, se verifica que se encuentra por debajo del valor referencial.

De lo descrito anteriormente, al no cumplir con lo estipulado con las bases, la oferta del postor ESPINOZA MELENDEZ FREDDY se considera **NO ADMITIDO**.

LICITACION PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.

- i) **CONSORCIO ZARUMILLA (NOSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. RUC 20215462910 & CONSTRUCCIONES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERU RUC 20603476400)**

Se advierte que el postor en su anexo N° 06, ha incurrido en un error al registrar las partidas correspondientes al anexo N° 06, tales como 05.02.04 dice "suministro y colocación de acero para doweels h=12.5cm, l=50cm incluye canastilla" debe decir "suministro y colocación de acero para doweels h=12.5cm, l=70cm incluye canastilla", siendo el mismo caso para el ítem 06.02.04, a su vez, vuelve a incurrir en error con el ítem 05.01.02, el cual dice "relleno compactado con material de préstamo" pero debe decir "relleno compactado con material de préstamo c/equipo en pistas"

De lo descrito anteriormente, al no cumplir con lo estipulado con las bases, la oferta del postor CONSORCIO ZARUMILLA se considera **NO ADMITIDO**.

- j) **CONSORCIO DEL DIVINO NIÑO (MUNARES & ASOCIADOS S.R.L. RUC 20534991399 & ANTON MATTA JIMMY ANGELO RUC 10404896445)**

Se advierte que el postor en su anexo N° 06, ha incurrido en un imposible jurídico al presentar una legalización de firma, de uno de los consorciados con fecha anterior al documento existente, puesto que la legalización indica fecha de 24 de noviembre y la promesa de consorcio tiene fecha de 27 de noviembre.

De lo descrito anteriormente, al no cumplir con lo estipulado con las bases, la oferta del postor CONSORCIO DEL DIVINO NIÑO se considera **NO ADMITIDO**.

- k) **CONSTRUCTORA PEREZ & PEREZ SAC RUC 20450324184**

Se advierte que el postor en su anexo N° 06, ha incurrido en error aritmético. luego de la corrección, se verifica que el valor referencial es de 10,847837.68 Soles.

Por lo expuesto, de la revisión de los documentos de presentación obligatoria para la admisión se tiene el siguiente resultado:

SEGÚN ANEXO N° 01 – ADMISIÓN DE OFERTAS.

Acto seguido se procede a la evaluación de las ofertas de los postores que han sido declarados admitidos, conforme a los factores de evaluación establecidos en las bases, Asimismo se procede a determinar el orden de prelación:


ANEXO N° 02 – CUADRO DE EVALUACIÓN.

LICITACION PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.


Y de conformidad a lo señalado en el Artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, se procederá a publicar los resultados en el portal del SEACE.

Siendo las 17:49 horas del jueves 30 de noviembre del 2023 y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección dan por culminada la presente sesión, debiéndose constituir para continuar con la revisión de los documentos acreditados para la calificación y otorgamiento de la Buena Pro; y por unanimidad, suscriben el documento.




RENAN CANSAYA HERRERA

Presidente Titular



LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA

Titular Miembro 1



GUSTAVO EDINSON CRISTOBAL ALVAREZ

Titular Miembro 2

LP-004-02-2023-MML-GRMIL-3		ANEXO Nº 01									
DECISION DE OBRAS: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y BL. USORIO ALGARAS, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZAMUILLA (PANAAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA, CUI Nº 23.008.03											
ADMONICION DE LA OFERTA		POSTOR Nº 01	POSTOR Nº 02	POSTOR Nº 03	POSTOR Nº 04	POSTOR Nº 05	POSTOR Nº 06				
22.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA		PM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. RUC 20261295246	CONSORCIO ESPERANZA (CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. RUC 20445639281 & CORPORACION XANTY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 2053762394)	EL HORIZONTE S.R.L. RUC 20385809179	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS SRL RUC 2054732559	CONSORCIO SAN MARTIN (EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA S.A.C. RUC 20494535409 & K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A. RUC 20388676411)	MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL RUC 20399019555				
A) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
B) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
C) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
D) Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
E) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo Nº 4)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
F) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)		NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CORRESPONDE				
G) El precio de la oferta en SOLES y: ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. Además, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo Nº 6)	VR										
	MONTO S/	12,053,152.96 S/	12,053,152.96 S/	12,053,152.96 S/	12,053,152.96 S/	12,053,152.96 S/	12,053,152.96 S/				
	LIMITE INFERIOR S/	10,847,837.67 S/	10,847,837.67 S/	10,847,837.67 S/	10,847,837.67 S/	10,847,837.67 S/	10,847,837.67 S/				
	LIMITE SUPERIOR S/	13,258,468.25 S/	13,258,468.25 S/	13,258,468.25 S/	13,258,468.25 S/	13,258,468.25 S/	13,258,468.25 S/				
	PRECIO DE LA OFERTA	10,847,837.67 S/	10,847,837.67 S/	10,847,837.67 S/	10,847,837.67 S/	10,847,837.67 S/	10,847,837.67 S/				
PRECIO CORREGIDO		S/.	10,893,660.96 S/.	10,735,854.58							
CUMPLE /NO CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE				
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.		ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO				
RESULTADO DE ADMISION		(ESTE COLEGIADO NO ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR, PUESTO QUE HA INCURRIDO EN UN ERROR ARITMETICO, LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DIRECTOS EL CUAL INCIDE EN EL COSTO TOTAL LUEGO DE LA CORRECCION, SE VERIFICA QUE SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL VALOR REFERENCIAL)	(ESTE COLEGIADO NO ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR, PUESTO QUE HA INCURRIDO EN UN ERROR ARITMETICO, LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DIRECTOS EL CUAL INCIDE EN EL COSTO TOTAL LUEGO DE LA CORRECCION, SE VERIFICA QUE SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL VALOR REFERENCIAL)	(ESTE COLEGIADO NO ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR, PUESTO QUE HA INCURRIDO EN UN ERROR ARITMETICO, LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DIRECTOS EL CUAL INCIDE EN EL COSTO TOTAL LUEGO DE LA CORRECCION, SE VERIFICA QUE SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL VALOR REFERENCIAL)	(ESTE COLEGIADO NO ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR, PUESTO QUE HA INCURRIDO EN UN ERROR ARITMETICO, LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DIRECTOS EL CUAL INCIDE EN EL COSTO TOTAL LUEGO DE LA CORRECCION, SE VERIFICA QUE SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL VALOR REFERENCIAL)	(Este colegiado no admite la oferta del postor, puesto que su Anexo 6 lo firma el apoderado legal de la empresa EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS, NO como representante comun del consorcio, no siendo esto subsanable.)	ADMITIDO				

DECLARACIÓN DE OBRAS: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. PEDRO ALCIBANI, TIEMPO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NOROCCIDENTAL) DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI Nº 240810

LP-04-02-2023-MPM-SERVI-1

ADMONICIÓN DE LA OFERTA	POSTOR Nº 07	POSTOR Nº 08	POSTOR Nº 09	POSTOR Nº 10	POSTOR Nº 11	POSTOR Nº 12	POSTOR Nº 13
	CONSTRUTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 2049468369	CONSORCIO SNAOC (CONSTRUCCION & CONSULTORIA I.I.P. S.A.C. RUC 2060571437 & INVERSIONES ROMANOS S.A.C. RUC 20524892881)	MEJESA S.R.L. RUC 2050600351	DITANERVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 2050578992	CONSORCIO SAN MATEO (I.F.X. INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - I.F.X. S.A.C. RUC 20535132587 & CONST. MANTAMITAS Y DE LA SUPERFICIE SRL RUC 2011542345)	CONSORCIO CVI ASOCIADOS (CVI CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. RUC 2026888775 & V.P. CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. RUC 20603558677)	CONSORCIO CAQUETA (E. & C. CONTRATISTAS S.R.L. RUC 20452457706 & CONSTRUCCION GREEN S.A.C. RUC 2060377818)
2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE							
A) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
B) Documento que acredite la representación de quien suscribe En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad, o del certificado de vigencia de poder otorgado a apoderado o mandatario, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, con el consentimiento de los demás integrantes del consorcio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
C) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de construcción. (Anexo Nº 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
F) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, de los integrantes, el representante común, el domicilio común y las firmas de los integrantes del consorcio.	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
G) El precio de la oferta en SOLES y:							
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.	S/ 12,053,152.96 S/ 10,847,837.67 S/ 13,258,468.25 S/ 10,847,837.67	S/ 12,053,152.96 S/ 10,847,837.67 S/ 13,258,468.25 S/ 10,847,837.67	S/ 12,053,152.96 S/ 10,847,837.67 S/ 13,258,468.25 S/ 10,847,837.67	S/ 12,053,152.96 S/ 10,847,837.67 S/ 13,258,468.25 S/ 10,847,837.67	S/ 12,053,152.96 S/ 10,847,837.67 S/ 13,258,468.25 S/ 10,847,837.67	S/ 12,053,152.96 S/ 10,847,837.67 S/ 13,258,468.25 S/ 10,847,837.67	S/ 12,053,152.96 S/ 10,847,837.67 S/ 13,258,468.25 S/ 10,847,837.67
✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.							
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorio, cuando corresponda. (Anexo Nº 6)							
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO DE ADMISION	NO ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO
	(EL POSTOR HA INCURRIDO EN UN ERROR AL NO CONSIGNAR EN SU OFERTA EL ÍTEM 06.02.01 "CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE (CON EQUIPO)", Y POR CONSIGUIENTE TAMPOCO CONSIGNA MONTO EN EL ÍTEM, NO SIENDO ESTE ERROR SUBSANABLE.)					(ESTE COLEGADO NO ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR PUESTO QUE HA INCURRIDO EN ERROR AL REGISTRAR LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL ANEXO Nº 06. TALES COMO 05.02.04 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO PARA DOWELS H=12.5CM, L=8CM INCLUYE CANASTILLA" CUANDO DEBE DECIR "SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO PARA DOWELS H=12.5CM, L=7CM INCLUYE CANASTILLA", SIENDO EL MISMO CASO PARA EL ÍTEM 06.02.04, A SU VEZ, VUELVE A INCURRIDO EN ERROR CON EL ÍTEM 06.01.02, EL CUAL DICE "RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMP" PERO DEBE DECIR "RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMP C/ EQUIPO EN PARTES".)	

ADMONICION DE LA OFERTA	POSTOR N° 14	POSTOR N° 15	POSTOR N° 16	POSTOR N° 17	POSTOR N° 18	POSTOR N° 19	POSTOR N° 20
2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE	CONSTRUCTORA I.Q. S.R.L. RUC 20452562864	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.R.L. RUC 2041167250	NIEMAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. RUC 20512419387	INGECOL SUCUSAL DE PERU S.R.L. RUC 20602267491	BETA KONCRET S.A.C. RUC 20400409496	ESPINOZA MELERUEZ PREDY RUC 10837778113	CONSORCIO SAN MARTIN (TOPASA INGENIEROS E.I.R.L. RUC 205845351303 & GRUPO EMPRESARIAL DE LOGISTICA INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEI S.A.C. RUC 20461112227)
A) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
B) Documento que acredite la representación de quien suscribe En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad, o del certificado de vigencia de poder otorgado al apoderado o mandatario, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
C) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
D) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de construcción. (Anexo N° 4).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
F) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, de los integrantes, el representante común, el domicilio común y las firmas de los integrantes del consorcio compromete cada uno de los integrantes del consorcio a cumplir con las obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	CUMPLE
G) El precio de la oferta en SOLES y:	S/ 12,053,152.96 S/ 10,847,837.67 S/ 13,258,468.25 S/ 10,847,837.67	12,053,152.96 S/ 10,847,837.67 S/ 13,258,468.25 S/ 10,847,837.67	12,053,152.96 S/ 10,847,837.67 S/ 13,258,468.25 S/ 10,847,837.67	12,053,152.96 S/ 10,847,837.67 S/ 13,258,468.25 S/ 10,847,837.67	12,053,152.96 S/ 10,847,837.67 S/ 13,258,468.25 S/ 10,847,837.67	12,053,152.96 S/ 10,847,837.67 S/ 13,258,468.25 S/ 10,847,837.67	12,053,152.96 S/ 10,847,837.67 S/ 13,258,468.25 S/ 10,847,837.67
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorio, cuando corresponda. (Anexo N° 6)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO
RESULTADO DE ADMISION						(EL POSTOR HA INCURRIDO EN UN ERROR ARITMETICO EN LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DIRECTOS EL CUAL INCIDE EN EL COSTO TOTAL, LUEGO DE LA CORRECCION SE VERIFICA QUE EL VALOR SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL VALOR REFERENCIAL.)	

ANEXO Nº 01				
Ejecución de obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAY V. (B. SUSO ALCAIN, TIEMPO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PAMAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, C.U.P. 234069)				
IP-5M-02-2023-MML-GRM-1	ADMONICION DE LA OFERTA			
	POSTOR Nº 21	POSTOR Nº 22	POSTOR Nº 23	POSTOR Nº 24
2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE	ADERSERG PERU S.A.C. - ADERSERG S.A.C. RUC: 20600689020	CONSORCIO ZARUMILLA (INDSA CENTRALES INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y PANAMERICANA NORTE) LTDA SUCURSAL DEL PERU RUC 20603476400	CONSORCIO DEL DIVINO NIÑO (MUNANES & ASOCIADOS S.R.L. RUC 20534891199 & ANTON MATTA JIMMY ANGEL RUC 10404886445)	CONSTRUCTORA PEREZ & PEREZ SAC RUC 20450324184
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO DE ADMISION	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CUMPLE (ESTE COLEGADO NO ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR, PUESTO QUE HA INCURRIDO EN UN IMPROBABLE JURIDICO AL PRESENTAR UNA LEGALIZACION DE FIRMA DE UNO DE LOS CONSORCIADOS CON FECHA ANTERIOR AL DOCUMENTO EXISTENTE, PUESTO QUE LA LEGALIZACION INDICA FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE Y LA PROMESA DE CONSORCIO TIENE FECHA DE 27 DE NOVIEMBRE)	NO CORRESPONDE
	S/	12,053,152.96 S/	12,053,152.96 S/	12,053,152.96 S/
	S/	10,847,837.67 S/	10,847,837.67 S/	10,847,837.67 S/
	S/	13,258,468.25 S/	13,258,468.25 S/	13,258,468.25 S/
	S/	10,847,837.67 S/	10,847,837.67 S/	10,847,837.67 S/
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO
	(ESTE COLEGADO NO ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR PUESTO QUE HA INCURRIDO EN ERROR AL REGISTRAR LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL ANEXO N° 06, TALES COMO 05.02.04 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO PARA DOWELS H12.0CM, L=90CM INCLUYE CANASTILLA" CUANDO DEBE DECIR "SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO PARA DOWELS H12.0CM, L=70CM INCLUYE CANASTILLA", SIENDO EL MISMO CASO PARA EL ITEM 05.02.04, A SU VEZ, VUELVE A INCURRIR EN ERROR CON EL ITEM 05.01.02, EL CUAL DICE "RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO" PERO DEBE DECIR "RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CIEQUPO DEPARTISTAS")			(PERO EL POSTOR HA INCURRIDO EN UN ERROR ANTERIOR LUEGO DE LA CORRECCION, SE VERIFICA QUE LA DIFERENCIA ES DE 10.84783768)

IP-SM-02-2023-MML-GRM-L1		ANEXO Nº 02 - FACTORES DE EVALUACION						
EJECUCION DE OBRAS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSISTABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCOBA, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZANUNILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA, C.U. Nº 2340810								
EVALUACION DE LA OFERTA		POSTOR Nº 01	POSTOR Nº 02	POSTOR Nº 03	POSTOR Nº 04	POSTOR Nº 05	POSTOR Nº 06	POSTOR Nº 07
EVALUACION ECONOMICA		FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. RUC 20261295246	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL RUC 20547282559	MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL RUC 20399019355	CONSORCIO SMAOC (CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.I.P. S.A.C. RUC 20605714197 & INVERSIONES ROMANSE S.A.C. RUC 20524892881)	MEJESA S.R.L. RUC 20506003351	DITRANSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 2050789092	CONSORCIO SAN MATEO (LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C. RUC 20535152587 & CONST. MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL RUC 20213342345)
A. PRECIO (15 PUNTOS)		PI = Om x DMP OI						
Puntaje de la oferta a evaluar (PI)		95	95	95	95	95	86.36	95
Precio Oferta (OI)		10,847,837.67	10,847,837.67	10,847,837.67	10,847,837.67	10,847,837.67	11,293,012.83	10,847,837.67
Precio de la Oferta más baja (Om)		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
Puntaje Máximo del Precio (PMP)		95	95	95	95	95	95	95
Puntaje		95	95	95	95	95	86.36	95
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL (3 PUNTOS)		3	3	3	3	3	3	3
B.1. Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya), cuyo alcance o campo de aplicación considere		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
[AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO, O LA COMBINACIÓN DE ESTAS, DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y/O INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y/O TRANSISTABILIDAD VEHICULAR EN VÍAS URBANAS Y/O RURALES]								
B.2. Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social (acorde con el estándar SA 8000:2014)								
B.3. Certificación del sistema de gestión ambiental (acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere [AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO, O LA COMBINACIÓN DE ESTAS, DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y/O INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y/O TRANSISTABILIDAD VEHICULAR EN VÍAS URBANAS Y/O RURALES], B.4. Responsabilidad hídrica								
B.5. Certificación del sistema de gestión de la energía (acorde con la norma ISO 50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 50001) o norma que la sustituya), cuyo alcance o campo de aplicación considere [AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO, O LA COMBINACIÓN DE ESTAS, DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y/O INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y/O TRANSISTABILIDAD VEHICULAR EN VÍAS URBANAS Y/O RURALES]								
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (2 PUNTOS)		2	2	2	2	2	2	2
acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PUNTAJE TOTAL		100	100	100	100	100	91.36	100



ANEXO Nº 02 - FACTORES DE EVALUACION						
EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAY Y R. ISIDRO ALCAIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA, CUI Nº 2346330						
EVALUACION DE LA OFERTA						
	POSTOR Nº 08	POSTOR Nº 09	POSTOR Nº 10	POSTOR Nº 11	POSTOR Nº 12	POSTOR Nº 13
EVALUACION ECONOMICA	CONSORCIO CAQUETA (E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. RUC 20452457728 & CONSTRUCTORA GREEN S.A.C. RUC 20600377818)	CONSTRUCTORA I.Q. S.R.L. RUC 20452562864	CONSTRUTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A - CCODEINGESA RUC 20416167509	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. RUC 20512419837	BETA KONCRET SAC. RUC 20480403496	CONSORCIO SAN MARTIN (TOPASA INGENIEROS E.I.R.L. RUC 20536351303 & GRUPO EMPRESARIAL DE LOGISTICA INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GELI S.A.C. RUC 20461112227)
	A. PRECIO (95 PUNTOS)					
	P _i = Om x PMP / O _i					
	Puntaje de la oferta a evaluar (P _i)					
	Precio Oferta (O _i)					
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL (3 PUNTOS)	Puntaje Máximo del Precio (PMP)					
	Puntaje					
	B.1. Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya), cuyo alcance o campo de aplicación considere					
	(AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO, O LA COMBINACION DE ESTAS, DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y/O INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN VÍAS URBANAS Y/O RURALES					
	B.2. Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social [acorde con el estándar SA 8000:2014]					
C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA (2 PUNTOS)	B.3. Certificación del sistema de gestión ambiental. [acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere (AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO, O LA COMBINACION DE ESTAS, DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y/O INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN VÍAS URBANAS Y/O RURALES).					
	B.4. Responsabilidad hídrica					
	B.5. Certificación del sistema de gestión de la energía [acorde con la norma ISO 50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 50001) o norma que la sustituya], cuyo alcance o campo de aplicación considere (AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO, O LA COMBINACION DE ESTAS, DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y/O INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN VÍAS URBANAS Y/O RURALES).					
	E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA (2 PUNTOS)					
	acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017)					
PUNTAJE TOTAL		100	100	100	99.99999991	95

LICITACIÓN PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.

En, la ciudad de Lima, a los 01 días del mes de DICIEMBRE del año 2023, en la sala de reuniones del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, a las 14:20 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección LICITACIÓN PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML-1, cuyo objeto de convocatoria es **EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830**, a fin de Calificar las ofertas.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	RENAN CANSAYA HERRERA	Titular	x	Dependencia:	SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
		Suplente			
Primer Miembro	LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA	Titular	x	Dependencia:	SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
		Suplente			
Segundo Miembro	GUSTAVO EDINSON CRISTOBAL ALVAREZ	Titular	x	Dependencia:	AREA DE LOGISTICA
		Suplente			

PRIMERO:

Determinado el orden de prelación, mediante sorteo electrónico, realizado a través del sistema electrónico de contrataciones del estado – SEACE, se procederá a Calificar a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente, verificando que cumpla con los requisitos de calificación especificados en las bases integradas.

Listado del Resultado del Desempeño

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Praelación
20416167509	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A - CCODEINGESA	100.0	1
20512419837	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	100.0	2
20452562864	CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.	100.0	3
20452457726	CONSORCIO CAQUETA	100.0	4
20605714197	CONSORCIO SMAOC	100.0	5
20506003351	MEJESA S.R.L.	100.0	6
20399019355	MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL	100.0	7
20215342345	CONSORCIO SAN MATEO	100.0	8
20600689020	ADESERG PERU S.A.C. - ADESERG S.A.C.	100.0	9
20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	100.0	10
20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	100.0	11
20480403496	BETA KONCRET SAC.	99.99	12
20450324184	CONSTRUCTORA PEREZ & PEREZ SAC	96.99	13
20536351303	CONSORCIO SAN MARTIN	95.0	14
20505789092	DITRANSERVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	91.36	15



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Asimismo, se procede con realizar la revisión de los documentos presentados a fin de acreditar los requisitos de calificación, contando con los miembros del comité de selección con conocimiento técnico en materia de la presente contratación.

1.- CONSTRUCTORA CONSTRATISTAS DE INGENIERIA S.A. - CCODEINGESA

N/O	CONTRATO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES	EXPERIENCIA VALIDA
1	CONTRATO N° 040-2017-MDP/GAF	1,398,949.40	1,398,949.40	-	1,398,949.40
2	CONTRATO N° 077-2016-MDP/GAF	4,066,952.21	4,115,105.85	-	4,115,105.85
3	CONTRATO N° 005-2014-PGRLM	21,971,842.47	23,625,853.82	-	11,576,668.37
4	CONTRATO N° 035-2013-PGRLM	4,641,069.00	4,787,238.33	-	4,787,238.33
5	CONTRATO S/N	3,293,460.43	3,797,654.69	-	3,607,771.96
MONTO FINAL TOTAL					25,485,733.91

- Este colegiado, luego de verificar la información obrante en la oferta del postor, concluye que, el monto facturado acreditado fehacientemente asciende al monto de S/ 25'485,733.91 soles. Por lo tanto, adquiere la condición de CALIFICADA.

2.- NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

N/O	CONTRATO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES	EXPERIENCIA VALIDA
1	003-2017-MDVO	9,568,720.60	9,733,577.27	-	9,733,577.27
2	S/N	2,275,202.55	2,203,662.49	-	2,203,662.49
3	S/N	1,791,692.88	1,820,081.28	-	1,820,081.28
4	001-2014/CE.CEO/MDVO	7,297,865.13	7,429,001.46	-	7,057,551.39
5	S/N	3,554,063.98	3,591,034.13	-	3,231,930.72
MONTO FINAL TOTAL					24,046,803.15

- Este colegiado, luego de verificar la información obrante en la oferta del postor, concluye que, el monto facturado acreditado fehacientemente asciende al monto de S/ 24,046,803.15 soles. Por lo tanto, adquiere la condición de CALIFICADA.

3.- CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.

N/O	CONTRATO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES	EXPERIENCIA VALIDA
1	002-2018-MDSA/SGLGP	917,726.36	917,726.36	-	917,726.36
2	005-2019-MPP-UACP	3,606,446.58	4,095,737.63	-	4,095,737.63
3	S/N	7,015,261.12	7,014,774.06	-	4,208,864.44

4	026-2016-MDLCH/OBRA	1,512,652.75	1,512,652.75	-	1,512,652.75
5	012-2018-MDTAI	513,959.83	513,959.83	Según resolución de alcaldía N° 0730-2018-ALC-MDTAI, resolución donde se aprueba la liquidación final de la ejecución de obra, el monto facturado y pagado es de s/ 505,814.12, por lo cual es el monto que se tomara en consideración.	505,814.12
6	005-2020-MDP	4,413,776.51	4,472,231.01	-	4,472,231.01
7	S/N	7,152,471.84	2,145,741.55	-	2,145,741.55
8	001-2022-MDLT/ALC	1,721,874.33	1,636,746.34	-	1,636,746.34
9	049-2020-GM-MPI	1,887,311.32	2,130,063.80	-	2,130,063.80
MONTO FINAL TOTAL					21,625,578.00

- Este colegiado, luego de verificar la información obrante en la oferta del postor, concluye que, el monto facturado acreditado fehacientemente asciende al monto de S/ 21'625,578.00 soles. Por lo tanto, adquiere la condición de CALIFICADA.

4.- CONSORCIO CAQUETA

N/O	CONTRATO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL DE EJECUCION	OBERVACIONES	EXPERIENCIA VALIDA
1	S/N	7,152,471.84	7,152,471.84	-	2,145,741.55
2	001-2016-CE/MDSJB	7,015,261.12	7,014,774.06	-	2,805,909.62
3	005-2022-GORE-ICA	4,803,066.82	5,289,511.24	-	4,760,560.12
4	001-2023-MDS-GM	818,395.74	818,395.74	-	818,395.74
5	007-2022-MDLT/ALC	8,774,998.63	8,774,998.63	-	2,632,499.59
6	004-2020-MDSH/A	8,594,996.39	9,680,308.32	-	5,808,184.99
7	009-2018-MDM	1,166,230.54	1,251,174.64	-	625,587.32
MONTO FINAL TOTAL					19,596,878.93

- Este colegiado, luego de verificar la información obrante en la oferta del postor, concluye que, el monto facturado acreditado fehacientemente asciende al monto de S/ 19'596,878.93 soles. Por lo tanto, adquiere la condición de CALIFICADA.

Siendo las 20:10 horas del viernes 01 de diciembre del 2023 y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección de acuerdo a las atribuciones conferidas proceden a dar por culminada la presente sesión, expresando los miembros integrantes su conformidad y adhesión a la presente acta, suscriben el documento.



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

RENÁN CANSAYA HERRERA
Presidente

LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA
Primer Miembro

GUSTAVO EDINSON CRISTOBAL ALVAREZ
Segundo Miembro

ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

LICITACIÓN PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.

En, la ciudad de Lima, a los 01 días del mes de DICIEMBRE del año 2023, en la sala de reuniones del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, a las 14:20 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección LICITACIÓN PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML-1, cuyo objeto de convocatoria es EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830, a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN					
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	RENAN CANSAYA HERRERA	Titular	x	Dependencia:	SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
		Suplente			
Primer Miembro	LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA	Titular	x	Dependencia:	SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
		Suplente			
Segundo Miembro	GUSTAVO EDINSON CRISTOBAL ALVAREZ	Titular	x	Dependencia:	AREA DE LOGISTICA
		Suplente			

PRIMERO:

Que, habiéndose determinado la calificación de los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente, a fin de continuar con la conducción del procedimiento de selección, se debe proceder con el otorgamiento de la Buena Pro.

ACUERDOS ADOPTADOS:

Luego de la verificación del cumplimiento de los requisitos de calificación establecidos en las Bases Integradas, el Comité de Selección por unanimidad procede a determinar lo siguiente:


1. Que, habiendo el postor **CONSTRUCTORA CONSTRATISTAS DE INGENIERIA S.A. - CCODEINGESA** ocupado el 1er lugar en el orden de prelación y habiendo cumplido con acreditar fehacientemente los requisitos de calificación, se ha verificado la vigencia del RNP en el capítulo de Ejecutor de Obras, advirtiendo que el postor cuenta con RNP vigente en el capítulo de Ejecutor de Obras en la fecha de otorgamiento de Buena Pro, según detalle:


POSTOR	RUC	RNP
CONSTRUCTORA CONSTRATISTAS DE INGENIERIA S.A. - CCODEINGESA	20416167509	VIGENTE DESDE 01/09/2023


El Comité de Selección procede a Otorgar la Buena Pro al postor CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A. - CCODEINGESA por el monto de S/ 10,847,837.67 (Diez Millones Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Siete con 67/100 Soles), en el procedimiento de selección LICITACIÓN PUBLICA N° 02-2023-MML-GRML-1, cuyo objeto de convocatoria es EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU Y JR. ISIDRO ALCIBAR, TRAMO AV. CAQUETA AV. ZARUMILLA (PANAMERICANA NORTE) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA, CUI N° 2340830.

No habiendo más temas que tratar, el Comité de Selección de acuerdo a las atribuciones conferidas procede a notificar los resultados a través de la publicación en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Finalmente, el Comité de Selección concluye la sesión, expresando los miembros integrantes su conformidad y adhesión a la presente acta.


RENAN CANSAYA HERRERA
Presidente del Comité de Selección


LUIS ALBERTO LLANOS JULCARIMA
Primer Miembro del Comité de Selección

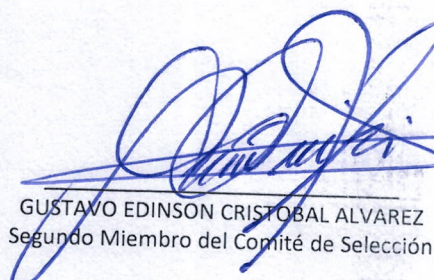
GUSTAVO EDINSON CRISTOBAL ALVAREZ
Segundo Miembro del Comité de Selección
