

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		25/09/2023					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Contratación de SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO ENRIQUE LÓPEZ ALBUJAR – DISTRITO PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE FERREÑAFE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, con CUI N° 2344932.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO ENRIQUE LÓPEZ ALBUJAR – DISTRITO PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE FERREÑAFE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		91					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2344932			
			Documento que declaró la viabilidad		INFORME TECNICO N 09-2017-GR.LAMB/ORPP-OFEPI-EERS			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° 001482-2023-GR.LAMB/GRIN [4584416-1]		Fecha de recepción	2/05/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	21/07/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	24/07/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	3	OFICIO N° 001289	20/07/2023
	PLAZO DE LA CONTRAPRESTACION, VALOR REFERENCIAL Y VERIFICACION LOS TERMINOS DE REFERENCIA							
	1	2	2	OFICIO N° 001349	26/07/2023

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
PLAZO TOTAL DE LA CONTRAPRESTACION (SUPERVISION Y LIQUIDACION) Y PROPUESTA DE COMITÉ							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	5	5	OFICIO N° 2547	14/08/2023
SUBSANACION DE OFERTAS							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	UNIFORMIZAR EL PLAZO DE PRESTACION DE LA OBRA Y EL PLAZO DE PRESTACION DE LA SUPERVISION, MAS LO DISPUESTO EN EL ART 209 DEL RLCE						
.....						
.....						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR: ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJEUTORES E.I.R.L.							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - 2023"							
PLAZO DE EJECUCION	:	18.00 Meses					
MODALIDAD EJECUCION	:	CONTRATA A SUMA ALZADA					
SUPERVISION	:	EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDIENDO DEL MONTO DEL PROYECTO)					
VALOR REFERENCIAL	:	S/ 98,881,752.01					
SUPERVISION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							2,202,750.00
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	Und	1.00	18,000.00	18.0	1.00	324,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Ing. Civil)	Und	1.00	16,000.00	18.0	0.50	144,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (Arquitecto)	Und	1.00	14,500.00	18.0	0.50	130,500.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (Ing. Sanitario)	Und	1.00	14,500.00	18.0	0.50	130,500.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS (Ing. Electricista, Ing. Mec)	Und	1.00	14,500.00	18.0	0.50	130,500.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE VOZ Y DATA (Ing. De Sistemas, Ing.)	Und	1.00	14,500.00	18.0	0.25	65,250.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS (Ing. Mecanico Electrico)	Und	1.00	14,500.00	18.0	0.25	65,250.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS (Ing. Civil, Ing. Geologo)	Und	1.00	14,500.00	18.0	0.25	65,250.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD (Ing. De distintas especialidades)	Und	1.00	14,500.00	18.0	1.00	261,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (Ing. De distintas especialidades)	Und	1.00	14,500.00	18.0	0.50	130,500.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD (Ing. De distintas especialidades)	Und	1.00	14,500.00	18.0	1.00	261,000.00	
PERSONAL DE APOYO							
ASISTENTE DE SUPERVISION (Ing. Civil / Arquitecto)	Und	1.00	11,000.00	18.0	1.00	198,000.00	
PROFESIONAL DE LA SALUD	Und	1.00	8,000.00	18.0	1.00	108,000.00	
TOPOGRAFO	Und	1.00	10,500.00	18.0	1.00	189,000.00	
ADMINISTRACION							243,000.00
SECRETARIA	Und	1.00	4,000.00	18.0	1.00	72,000.00	
CONTADOR	Und	1.00	8,000.00	18.0	0.50	72,000.00	
CHOFER	Und	1.00	5,500.00	18.0	1.00	99,000.00	
VEHICULOS (incluye combustible)							234,000.00
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (Alquiler)	Mes	1.00	13,000.00	18.0	1.00	234,000.00	
EQUIPAMIENTO							189,026.00
LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR, 2.50GHz, 8GB DDR4, 1TB SATA, Video	Und	6.00	15,000.00		0.20	18,000.00	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N	Und	2.00	8,500.00		0.20	3,400.00	
ESCRITORIO	Und	6.00	2,000.00		0.30	3,600.00	
SILLA GIRATORIA	Und	6.00	1,500.00		0.30	2,700.00	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	und	17.00	180.00			3,060.00	
CASCO DE INGENIERO	und	17.00	150.00			2,550.00	
PROTECTOR FACIAL	und	17.00	3.00			51.00	
MASCARILLAS	und	5805.00	1.00			5,805.00	
OVEROL	und	17.00	220.00			3,740.00	
MASCARILLA N95 (PERSONAL DE SALUD)	und	300.00	5.00			1,500.00	
GUANTES (PERSONAL DE SALUD)	und	310.00	2.00			620.00	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER (ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, OTROS)	Mes	18.00	8,000.00			144,000.00	
SERVICIOS VARIOS							113,400.00
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA	Mes	1.00	3,500.00	18.0	1.00	63,000.00	
PAGO DE SERVICIOS (energía eléctrica, agua, desagüe, etc).	Mes	1.00	1,500.00	18.0	1.00	27,000.00	
COMUNICACIONES (Telefonía e internet)	Mes	1.00	1,300.00	18.0	1.00	23,400.00	
MATERIALES Y GASTOS VARIOS							63,000.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archiveros, Tinta para impresora, Fotocopias, Punteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Glb	1.00	17,000.00	1.00	1.00	17,000.00	
ARTICULOS DE LIMPIEZA	mes	1.00	1,300.00	18.00	1.00	23,400.00	
ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	mes	1.00	1,300.00	18.00	1.00	23,400.00	
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)							
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	12,000.00	18.00	1.00	216,000.00	216,000.00
EXAMENES MEDICOS - PRUEBAS SEREOLÓGICAS							
PRUEBAS SEREOLÓGICAS COVID-19	und	17.00	100.00	18.00	1.00	30,600.00	30,600.00


ACUÑA TROYES
 REPRESENTANTE LEGAL

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - 2023"							
PLAZO DE EJECUCION	:	18.00 Meses					
MODALIDAD EJECUCION	:	CONTRATA A SUMA ALZADA					
SUPERVISION	:	EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDIENDO DEL MONTO DEL PROYECTO)					
VALOR REFERENCIAL	:	S/. 98,881,752.01					
SUPERVISION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PRUEBAS DE LABORATORIO:							61,500.00
PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO	und	100.00	90.00			9,000.00	
ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO	und	100.00	90.00			9,000.00	
DISEÑO DE MEZCLA	und	10.00	1,200.00			12,000.00	
ANALISIS GRANULOMETRICO	und	10.00	900.00			9,000.00	
DENSIDAD DE CAMPO	und	50.00	180.00			9,000.00	
UNIDADES Y MUROS DE ALBAÑILERIA	und	10.00	800.00			8,000.00	
PRUEBAS HIDRAULICAS	und	1.00	5,500.00			5,500.00	
COSTO DIRECTO						S/.	3,354,076.00
UTILIDAD (8%) de C.D						S/.	268,326.08
TOTAL PARCIAL						S/.	3,622,402.08
IGV (18%)						S/.	652,032.37
PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA						S/.	4,274,434.45
LIQUIDACION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							18,000.00
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	Und	1.00	18,000.00	1.0	1.00	18,000.00	
UTILES DE ESCRITORIO:							8,000.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archivadores, Tinta para impresora, Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Glb	1.00	8,000.00	1.00	1.00	8000.00	
COSTO DIRECTO						S/.	26,000.00
UTILIDAD (8%) de C.D						S/.	2,080.00
TOTAL PARCIAL						S/.	28,080.00
IGV (18%)						S/.	5,054.40
PRESUPUESTO LIQUIDACION DE OBRA						S/.	33,134.40
VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (4.36% VR)						S/.	4,307,568.85
PORCENTAJE (V.R.)							4.356282896%


ACUÑA VEGA
ING. CARLOS ANTONIO ACUÑA TROYES
REP. LEGAL

DEL PROVEEDOR: FELITA SAC

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - 2023"							
PLAZO DE EJECUCION	:	18.00 Meses					
MODALIDAD EJECUCION	:	CONTRATA A SUMA ALZADA					
SUPERVISION	:	EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDIENDO DEL MONTO DEL PROYECTO)					
VALOR REFERENCIAL	:	S/ 66,881,752.01					
SUPERVISION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							1,652,500.00
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	Und	1.00	20,000.00	18.0	1.00	360,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Ing. Civil)	Und	1.00	9,000.00	18.0	0.50	81,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (Arquitecto)	Und	1.00	9,000.00	18.0	0.50	81,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (Ing. Sanitario)	Und	1.00	9,000.00	18.0	0.50	81,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS (Ing. Electricista, Ing. Mec.)	Und	1.00	9,000.00	18.0	0.50	81,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE VOZ Y DATA (Ing. De Sistemas, Ing.)	Und	1.00	9,000.00	18.0	0.25	40,500.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS (Ing. Mecánico Eléctrico)	Und	1.00	9,000.00	18.0	0.25	40,500.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS (Ing. Civil, Ing. Geólogo)	Und	1.00	9,000.00	18.0	0.25	40,500.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD (Ing. De distintas especialidades)	Und	1.00	9,000.00	18.0	1.00	162,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (Ing. De distintas especialidades)	Und	1.00	9,000.00	18.0	0.50	81,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD (Ing. De distintas especialidades)	Und	1.00	9,000.00	18.0	1.00	162,000.00	
PERSONAL DE APOYO							
ASISTENTE DE SUPERVISION (Ing. Civil / Arquitecto)	Und	1.00	6,000.00	18.0	1.00	144,000.00	
PROFESIONAL DE LA SALUD	Und	1.00	4,000.00	18.0	1.00	72,000.00	
TOPOGRAFO	Und	1.00	7,000.00	18.0	1.00	126,000.00	
ADMINISTRACION							153,000.00
SECRETARIA	Und	1.00	3,000.00	18.0	1.00	54,000.00	
CONTADOR	Und	1.00	6,000.00	18.0	0.50	54,000.00	
CHOFER	Und	1.00	2,500.00	18.0	1.00	45,000.00	
VEHICULOS (incluye combustible)							108,000.00
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (Alquiler)	Mes	1.00	6,000.00	18.0	1.00	108,000.00	
EQUIPAMIENTO							216,761.66
LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR, 2.50GHz, 8GB DDR4, 1TB SATA, Video	Und	6.00	6,000.00		0.20	7,200.00	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N	Und	2.00	5,000.00		0.20	2,200.00	
ESCRITORIO	Und	6.00	800.00		0.30	1,440.00	
SILLA GIRATORIA	Und	6.00	120.00		0.30	624.00	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	und	17.00	180.00			3,060.00	
CASCO DE INGENIERO	und	17.00	180.00			3,060.00	
PROTECTOR FACIAL	und	17.00	60.00			1,020.00	
MASCARILLAS	und	5805.00	15.00			87,075.00	
OVEROL	und	17.00	160.00			2,720.00	
MASCARILLA N95 (PERSONAL DE SALUD)	und	300.00	45.00			13,500.00	
GUANTES (PERSONAL DE SALUD)	und	310.00	45.00			13,950.00	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER (ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, OTROS)	Mes	18.00	4,500.00			81,000.00	
SERVICIOS VARIOS							133,200.00
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA	Mes	1.00	6,000.00	18.0	1.00	108,000.00	
PAGO DE SERVICIOS (energía eléctrica, agua, desagüe, etc).	Mes	1.00	800.00	18.0	1.00	14,400.00	
COMUNICACIONES (Telefonia e Internet)	Mes	1.00	600.00	18.0	1.00	10,800.00	
MATERIALES Y GASTOS VARIOS							366,000.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archiveros, Tinta para impresora, Fotocopias, Plotados de planos, Papel A4-A3, otros)	Glo	1.00	6,000.00	1.00	1.00	6,000.00	
ARTICULOS DE LIMPIEZA	mes	1.00	8,000.00	18.00	1.00	144,000.00	
ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	mes	1.00	12,000.00	18.00	1.00	216,000.00	
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)							
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	1,800.00	18.00	1.00	32,400.00	32,400.00
EXAMENES MEDICOS - PRUEBAS SEROLOGICAS							
PRUEBAS SEROLOGICAS COVID-19	und	17.00	80.00	18.00	1.00	24,480.00	24,480.00

FELITA S.A.C.
[Firma]
c. Adm. Irma Batolmino Ruiz
DNI: 20049458
GERENTE GENERAL

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - 2023"							
PLAZO DE EJECUCION	:	18.00 Meses					
MODALIDAD EJECUCION	:	CONTRATA A SUMA ALZADA					
SUPERVISION	:	EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDIENDO DEL MONTO DEL PROYECTO)					
VALOR REFERENCIAL	:	S/. 98,881,762.81					
SUPERVISION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PRUEBAS DE LABORATORIO:							58,993.00
PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO	und	100.00	180.00			18,000.00	
ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO	und	100.00	300.00			30,000.00	
DISEÑO DE MEZCLA	und	10.00	350.00			3,500.00	
ANALISIS GRANULOMETRICO	und	10.00	100.00			1,000.00	
DENSIDAD DE CAMPO	und	50.00	50.00			2,500.00	
UNIDADES Y MUROS DE ALBAÑILERIA	und	10.00	200.00			2,000.00	
PRUEBAS HIDRAULICAS	und	1.00	1,800.00			1,800.00	
COSTO DIRECTO						S/.	2,645,161.00
UTILIDAD (12%) de C.D						S/.	317,419.32
TOTAL PARCIAL						S/.	2,962,580.32
IGV (18%)						S/.	533,264.46
PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA						S/.	3,495,844.78
LIQUIDACION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							20,000.00
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	Und	1.00	20,000.00	1.0	1.00	20,000.00	
UTILES DE ESCRITORIO:							8,000.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archivadores, Tinta para impresora, Fotocopias, Poteados de planos, Papel A4-A5, otros)	Glb	1.00	8,000.00	1.00	1.00	8,000.00	
COSTO DIRECTO						S/.	28,000.00
UTILIDAD (12%) de C.D						S/.	3,360.00
TOTAL PARCIAL						S/.	31,360.00
IGV (18%)						S/.	5,644.80
PRESUPUESTO LIQUIDACION DE OBRA						S/.	37,004.80
VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3.57% VR)						S/.	3,532,849.58
PORCENTAJE (V.R.)							3.572802371%


FELITA S.A.C.
 Lic. Adm. Irma Palomino Ruiz
 DNI: 20089456
 GERENTE GENERAL

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DEL PROVEEDOR: **ALABASTRO SAC**


GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - 2023"							
PLAZO DE EJECUCION	:	18.00 Meses					
MODALIDAD EJECUCION	:	CONTRATA A SUMA ALZADA					
SUPERVISION	:	EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDIENDO DEL MONTO DEL PROYECTO)					
VALOR REFERENCIAL	:	S/. 96,881,752.91					
SUPERVISION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							1,586,400.00
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	Und	1.00	15,000.00	18.0	1.00	270,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Ing. Civil)	Und	1.00	10,000.00	18.0	0.50	90,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (Arquitecto)	Und	1.00	10,000.00	18.0	0.50	90,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (Ing. Sanitario)	Und	1.00	10,000.00	18.0	0.50	90,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS (Ing. Electricista, Ing. Mec)	Und	1.00	10,000.00	18.0	0.50	90,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE VOZ Y DATA (Ing. De Sistemas, Ing)	Und	1.00	10,000.00	18.0	0.25	45,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS (Ing. Mecanico Electrico)	Und	1.00	10,000.00	18.0	0.25	45,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS (Ing. Civil, Ing. Geologo)	Und	1.00	10,000.00	18.0	0.25	45,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD (Ing. De distintas especialidades)	Und	1.00	10,000.00	18.0	1.00	180,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (Ing. De distintas especialidades)	Und	1.00	10,000.00	18.0	0.50	90,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD (Ing. De distintas especialidades)	Und	1.00	10,000.00	18.0	1.00	180,000.00	
PERSONAL DE APOYO							
ASISTENTE DE SUPERVISION (Ing. Civil / Arquitecto)	Und	1.00	8,500.00	18.0	1.00	153,000.00	
PROFESIONAL DE LA SALUD	Und	1.00	4,800.00	18.0	1.00	86,400.00	
TOPOGRAFO	Und	1.00	8,000.00	18.0	1.00	144,000.00	
ADMINISTRACION							226,800.00
SECRETARIA	Und	1.00	4,500.00	18.0	1.00	81,000.00	
CONTADOR	Und	1.00	8,000.00	18.0	0.50	72,000.00	
CHOFER	Und	1.00	4,000.00	18.0	1.00	72,000.00	
VEHICULOS (incluye combustible)							144,000.00
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (Alquiler)	Mes	1.00	6,000.00	18.0	1.00	144,000.00	
EQUIPAMIENTO							130,856.00
LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR, 2.50Ghz, 8GB DDR4, 1TB SATA, Video	Und	6.00	6,000.00		0.20	7,200.00	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N	Und	2.00	8,500.00		0.20	3,400.00	
ESCRITORIO	Und	6.00	1,200.00		0.30	2,160.00	
SILLA GIRATORIA	Und	6.00	220.00		0.30	836.00	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	und	17.00	200.00			3,400.00	
CASCO DE INGENIERO	und	17.00	200.00			3,400.00	
PROTECTOR FACIAL	und	17.00	50.00			850.00	
MASCARILLAS	und	5805.00	10.00			58,050.00	
OVEROL	und	17.00	150.00			2,550.00	
MASCARILLA N95 (PERSONAL DE SALUD)	und	300.00	45.00			13,500.00	
GUANTES (PERSONAL DE SALUD)	und	310.00	45.00			13,950.00	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER (ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, OTROS)	Mes	18.00	4,000.00			72,000.00	
SERVICIOS VARIOS							135,000.00
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA	Mes	1.00	6,000.00	18.0	1.00	108,000.00	
PAGO DE SERVICIOS (energía eléctrica, agua, desagüe, etc).	Mes	1.00	1,000.00	18.0	1.00	18,000.00	
COMUNICACIONES (Telefonía e internet)	Mes	1.00	500.00	18.0	1.00	9,000.00	
MATERIALES Y GASTOS VARIOS							366,900.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archivadores, Tinta para impresora, Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Glb	1.00	6,500.00	1.00	1.00	6,500.00	
ARTICULOS DE LIMPIEZA	mes	1.00	10,000.00	18.00	1.00	180,000.00	
ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	mes	1.00	10,000.00	18.00	1.00	180,000.00	
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)							
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO). PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	2,000.00	18.00	1.00	36,000.00	36,000.00
EXAMENES MEDICOS - PRUEBAS SEROLOGICAS							
PRUEBAS SEROLOGICAS COVID-19	und	17.00	1,800.00	18.00	1.00	30,600.00	30,600.00

ALABASTRO S.A.C.

Jose Luis Palomino Gutiérrez
 DIRECTOR GENERAL

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - 2023"							
PLAZO DE EJECUCION : 18.00 Meses MODALIDAD EJECUCION : CONTRATA A SUMA ALZADA SUPERVISION : EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDIENDO DEL MONTO DEL PROYECTO) VALOR REFERENCIAL : S/. 98,881,732.61							
SUPERVISION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PRUEBAS DE LABORATORIO:							10,600.00
PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO	und	100.00	200.00			20,000.00	
ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO	und	100.00	350.00			35,000.00	
DISEÑO DE MEZCLA	und	10.00	400.00			4,000.00	
ANALISIS GRANULOMETRICO	und	10.00	150.00			1,500.00	
DENSIDAD DE CAMPO	und	50.00	80.00			4,000.00	
UNIDADES Y MUROS DE ALBAÑILERIA	und	10.00	300.00			3,000.00	
PRUEBAS HIDRAULICAS	und	1.00	2,500.00			2,500.00	
COSTO DIRECTO						S/	2,786,356.00
UTILIDAD (12%) de C.D						S/	334,362.72
TOTAL PARCIAL						S/	3,120,718.72
IGV (18%)						S/	561,729.37
PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA						S/	3,682,448.09
LIQUIDACION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							15,000.00
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	Und	1.00	15,000.00	1.0	1.00	15,000.00	
UTILES DE ESCRITORIO:							6,500.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archiveros, Tinta para impresora, Fotocopias, Pósteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Glb	1.00	6,500.00	1.00	1.00	6,500.00	
COSTO DIRECTO						S/	21,500.00
UTILIDAD (12%) de C.D						S/	2,580.00
TOTAL PARCIAL						S/	24,080.00
IGV (18%)						S/	4,334.40
PRESUPUESTO LIQUIDACION DE OBRA						S/	28,414.40
VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3.76% VR)						S/	3,713,505.69
PORCENTAJE (V.R.)							3.755561510%

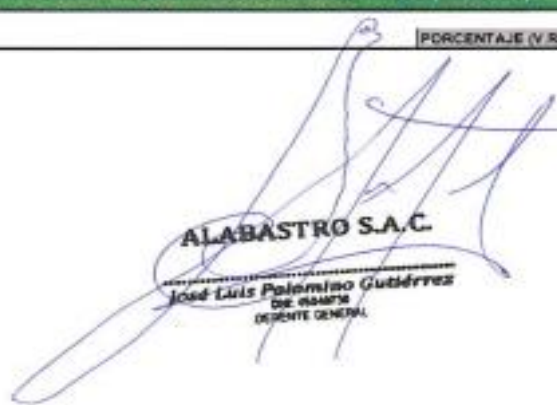

ALABASTRO S.A.C.
José Luis Palomino Gutiérrez
 DESENTE GENERAL

DE LA ENTIDAD: ESTRUCTURA DE COSTOS

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - 2023"							
PLAZO DE EJECUCION	:	18.00 Meses					
MODALIDAD EJECUCION	:	CONTRATA A SUMA ALZADA					
SUPERVISION	:	EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDIENDO DEL MONTO DEL PROYECTO)					
VALOR REFERENCIAL	:	S/. 98,881,752.01					
SUPERVISION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							1,574,000.00
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	Und	1.00	15,000.00	18.0	1.00	270,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Ing. Civil)	Und	1.00	12,000.00	18.0	0.50	108,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (Arquitecto)	Und	1.00	12,000.00	18.0	0.50	108,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (Ing. Sanitario)	Und	1.00	12,000.00	18.0	0.50	108,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS (Ing. Electricista, Ing. Mec)	Und	1.00	12,000.00	18.0	0.50	108,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE VOZ Y DATA (Ing. De Sistemas, Ing)	Und	1.00	12,000.00	18.0	0.25	54,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS (Ing. Mecanico Electrico)	Und	1.00	12,000.00	18.0	0.25	54,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS (Ing. Civil, Ing. Geologo)	Und	1.00	12,000.00	18.0	0.25	54,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD (Ing. De distintas especialidades)	Und	1.00	12,000.00	18.0	1.00	216,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (Ing. De distintas especialidades)	Und	1.00	12,000.00	18.0	0.50	108,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD (Ing. De distintas especialidades)	Und	1.00	12,000.00	18.0	1.00	216,000.00	
PERSONAL DE APOYO							
ASISTENTE DE SUPERVISION (Ing. Civil / Arquitecto)	Und	1.00	7,000.00	18.0	1.00	126,000.00	
PROFESIONAL DE LA SALUD	Und	1.00	4,000.00	18.0	1.00	72,000.00	
TOPOGRAFO	Und	1.00	4,000.00	18.0	1.00	72,000.00	
ADMINISTRACION							196,200.00
SECRETARIA	Und	1.00	2,300.00	18.0	1.00	41,400.00	
CONTADOR	Und	1.00	6,000.00	18.0	0.50	54,000.00	
CHOFER	Und	2.00	2,800.00	18.0	1.00	100,800.00	
VEHICULOS (incluye combustible)							117,000.00
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (Alquiler)- Infraestructura Principal	Mes	1.00	6,000.00	18.0	1.00	108,000.00	
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (Alquiler)- Plan de Contingencia	Mes	1.00	6,000.00	1.5	1.00	9,000.00	
EQUIPAMIENTO							113,954.93
LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR, 2.50GHz, 8GB DDR4, 1TB SATA, Video	Und	6.00	5,509.00		0.20	6,610.80	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N	Und	2.00	3,900.00		0.20	1,560.00	
ESCRITORIO	Und	6.00	592.03		0.30	1,065.66	
SILLA GIRATORIA	Und	6.00	287.29		0.30	0,517.12	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	und	18.00	31.27			562.88	
CASCO DE INGENIERO	und	18.00	31.68			570.51	
PROTECTOR FACIAL	und	18.00	21.95			395.10	
MASCARILLAS	und	6345.00	0.85			5,393.25	
OVEROL	und	18.00	42.37			762.66	
MASCARILLA N95 (PERSONAL DE SALUD)	und	300.00	50.85			15,254.24	
GUANTES (PERSONAL DE SALUD)	und	310.00	0.85			262.71	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER (ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS DIFERENCIAL)	Mes	18.00	4,500.00			81,000.00	
SERVICIOS VARIOS							36720.00
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA	Mes	1.00	1,400.00	18.0	1.00	25,200.00	
PAGO DE SERVICIOS (energía eléctrica, agua, desagüe, etc).	Mes	1.00	430.00	18.0	1.00	7,740.00	
COMUNICACIONES (Telefonia e internet)	Mes	1.00	210.00	18.0	1.00	3,780.00	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)							
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	10,040.90	18.00	1.00	180,736.20	180,736.20
PRUEBAS DE LABORATORIO:							17,700.00
PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO	und	100.00	35.00			3,500.00	
ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO	und	100.00	35.00			3,500.00	
DISEÑO DE MEZCLA	und	10.00	450.00			4,500.00	
ANALISIS GRANULOMETRICO	und	10.00	90.00			900.00	
DENSIDAD DE CAMPO	und	50.00	32.00			1,600.00	
UNIDADES Y MUROS DE ALBAÑILERIA	und	10.00	70.00			700.00	
PRUEBAS HIDRAULICAS	und	1.00	3,000.00			3,000.00	
COSTO DIRECTO						S/.	2,351,175.54
UTILIDAD (10%) de C.D						S/.	235,117.55
TOTAL PARCIAL						S/.	2,586,293.09
IGV (18%)						S/.	465,532.76
PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA						S/.	3,051,825.85
LIQUIDACION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	Und	1.00	15,000.00	1.0	1.00	15,000.00	15,000.00
UTILES DE ESCRITORIO :							3,000.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archivadores, Tinta para impresora, Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Glb	1.00	3,000.00	1.00	1.00	3000.00	
COSTO DIRECTO						S/.	18,000.00
UTILIDAD (8%) de C.D						S/.	1,440.00
TOTAL PARCIAL						S/.	19,440.00
IGV (18%)						S/.	3,499.20
PRESUPUESTO LIQUIDACION DE OBRA						S/.	22,939.20
VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3.11% VR)						S/.	3,074,765.05
PORCENTAJE (V.R.)							3.109537389%

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 3,074.765.05 (TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 05/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		6/09/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	<p style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL Mg. Walter Orlando Mori Pinedo JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA </p>						
----	--	--	--	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</p>
--

	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
--	---

<p><u>NOTA:</u> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>
--
